



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR DESEMBER 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir Desember 2022

Disperakim

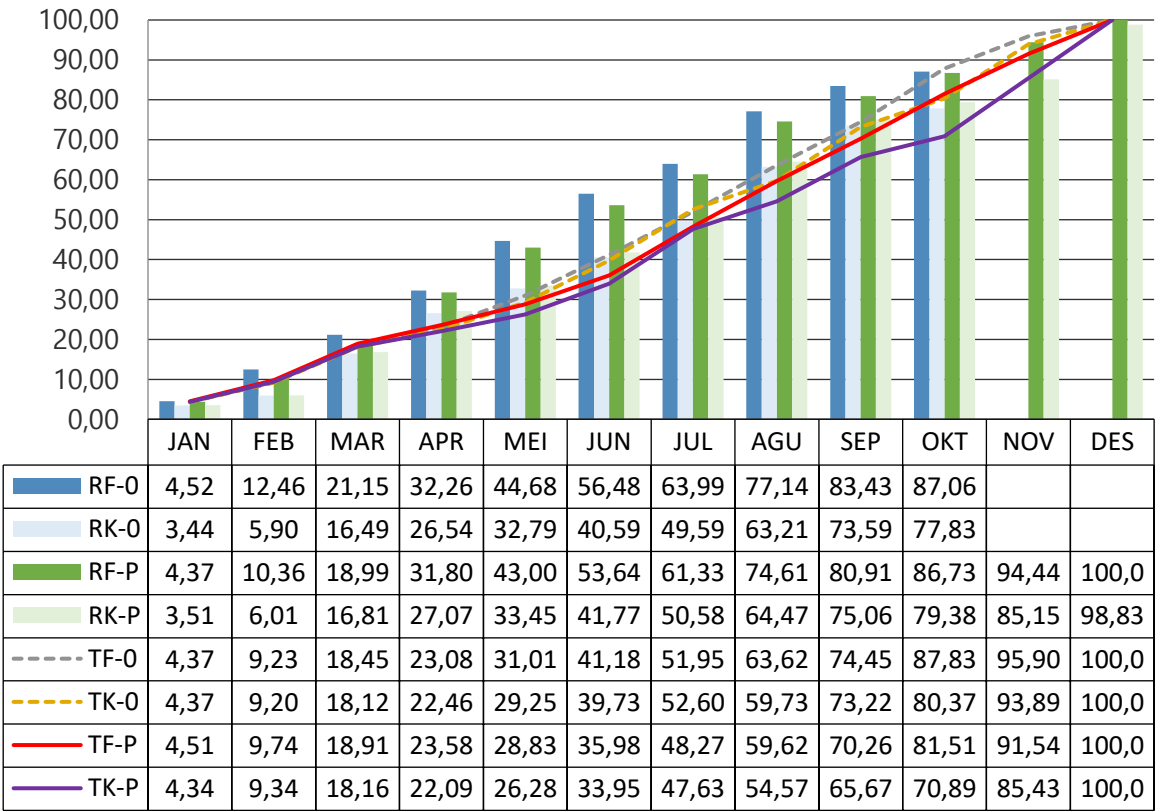

	Desember
Target Fisik	100,00
Target Keu	100,00
Real. Fisik	100,00
Real. Keu	98,83
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	-1,17

SILPA sebesar
Rp. 522.564.499,-

RINCIAN SILPA TA. 2022

NO	JENIS BELANJA	MURNI	PERUBAHAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	%	SILPA	%
	BELANJA DAERAH	45.424.693.000	44.538.221.000	100%	44.015.656.501	98,83%	522.564.499	1,17%
I	BELANJA OPERASI	43.316.603.000	43.672.297.000	100%	43.156.187.051	98,82%	516.109.949	1,16%
	BELANJA PEGAWAI	11.939.213.000	12.220.101.000	100%	12.121.145.166	99,19%	98.955.834	0,22%
	BELANJA BARANG DAN JASA	18.940.390.000	18.480.196.000	100%	18.063.041.885	97,74%	417.154.115	0,94%
	BELANJA BANSOS	12.437.000.000	12.972.000.000	100%	12.972.000.000	100,00%	-	0,00%
II	BELANJA MODAL	2.108.090.000	865.924.000	100%	859.469.450	99,25%	6.454.550	0,01%
	BELANJA MODAL TANAH	1.200.000.000	-	100%	-	-	-	0,00%
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	907.000.000	864.881.000	100%	858.426.450	99,25%	6.454.550	0,01%
	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	1.090.000	1.043.000	100%	1.043.000	100,00%	-	0,00%

- **Total Anggaran** Rp. 44.538.221.000,-
- **Realisasi Anggaran** Rp. 44.015.565.501,- (98,83%)
- **SILPA sebesar** Rp. 522.564.499,- (1,17 %)
- **REALISASI FISIK** 100%

RINCIAN SILPA

NO	BELANJA	Nominal	%
1	BELANJA JASA LANGGANAN AIR, LISTRIK, KOMUNIKASI	200.289.670	0,45%
2	BELANJA BARANG UNTUK PIHAK KETIGA (HADIAH FISIK LOMBA HABITAT)	63.642.000	0,14%
3	BELANJA JASA KONSULTANSI	52.167.000	0,12%
4	BELANJA HONOR NARASUMBER DAN MODERATOR	12.909.000	0,03%
5	BELANJA PERJALANAN DINAS	51.147.155	0,11%
6	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT	4.656.000	0,01%
7	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN PERALATAN	5.138.000	0,01%
8	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	1.901.216	0,00%
9	BELANJA CETAK - PENGGANDAAN	2.465.600	0,01%
10	BELANJA JASA IURAN ASURANSI (KESEHATAN, JKK,JKM)	10.525.000	0,02%
11	BELANJA JASA ASURANSI GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS	4.900.265	0,01%
12	BELANJA PEGAWAI	98.955.834	0,22%
13	BELANJA MODAL	6.454.550	0,01%
	TOTAL	522.564.499	1,17%


BELANJA PEGAWAI

Rp. 98.955.834,-


Terdapat 6 orang ASN yang purna tugas pada TA. 2022

SISA KONTRAK :

Rp. 121.276.246,-

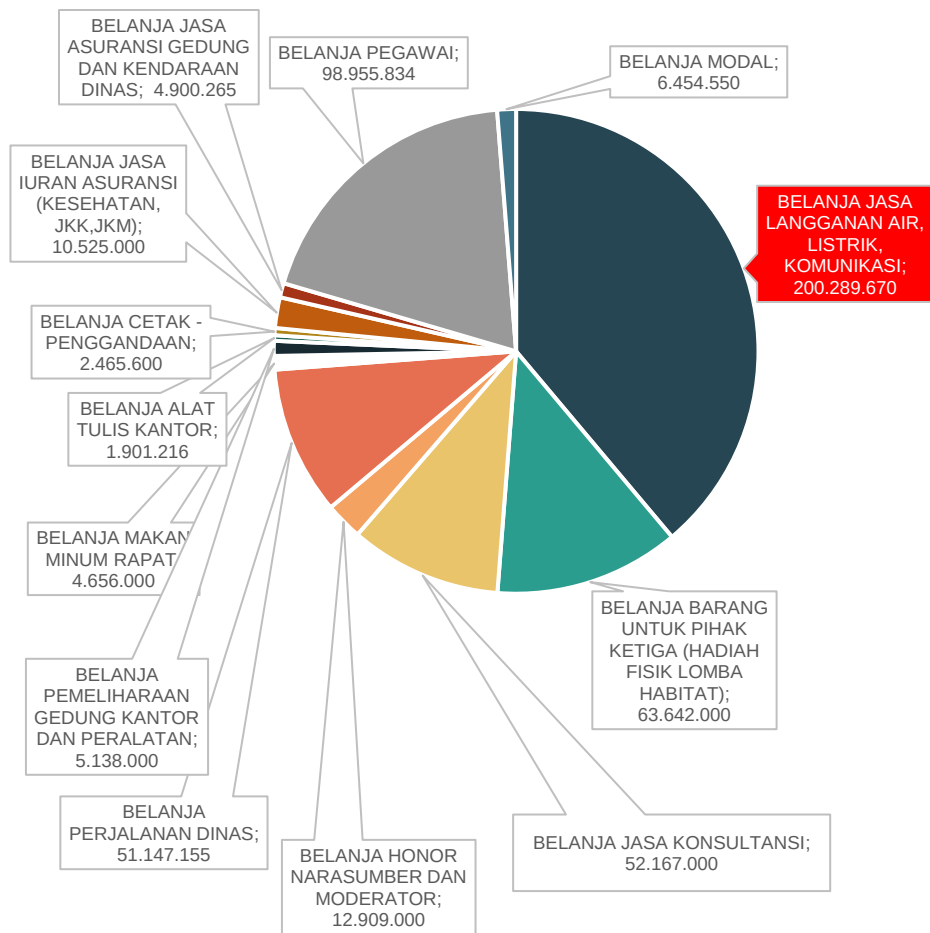

Sekretariat

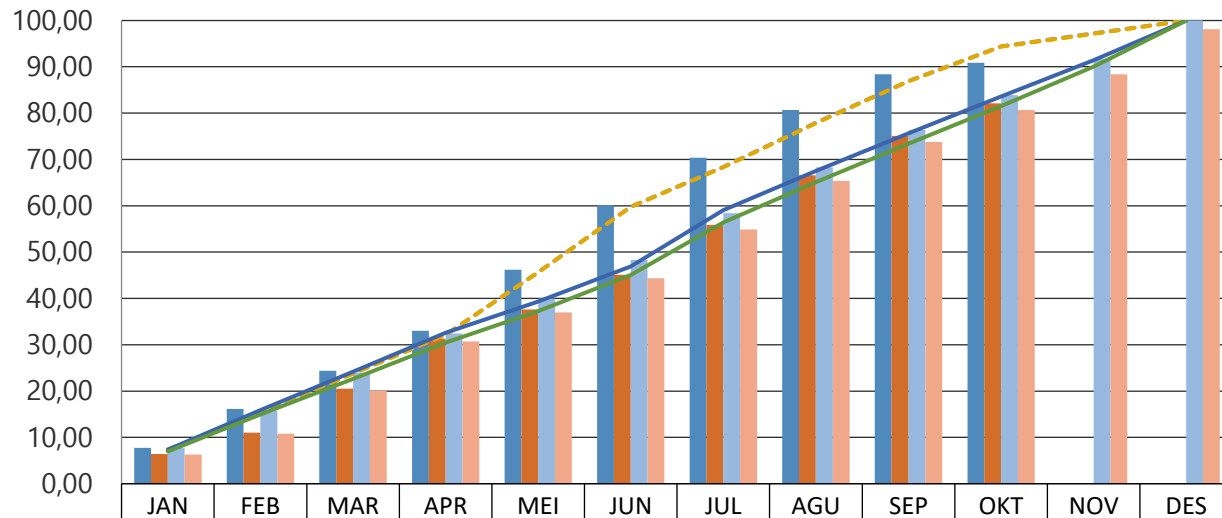


	Desember
Target Fisik	100,00
Target Keu	100,00
Real. Fisik	100,00
Real. Keu	98,09
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	-1,91

SILPA sebesar Rp 338.989.743 yang terdiri dari:

- **sisa pembayaran tagihan air dan listrik Rp 200.289.670** dikarenakan menyesuaikan dengan pemakaian
- sisa gaji dan tunjangan sebesar Rp 98.955.834 yang menyesuaikan kebutuhan dan dinamika kepegawaian dinas.
- Adapun sisa lainnya dari efisiensi pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian pada kebutuhan.

Bidang Perumahan

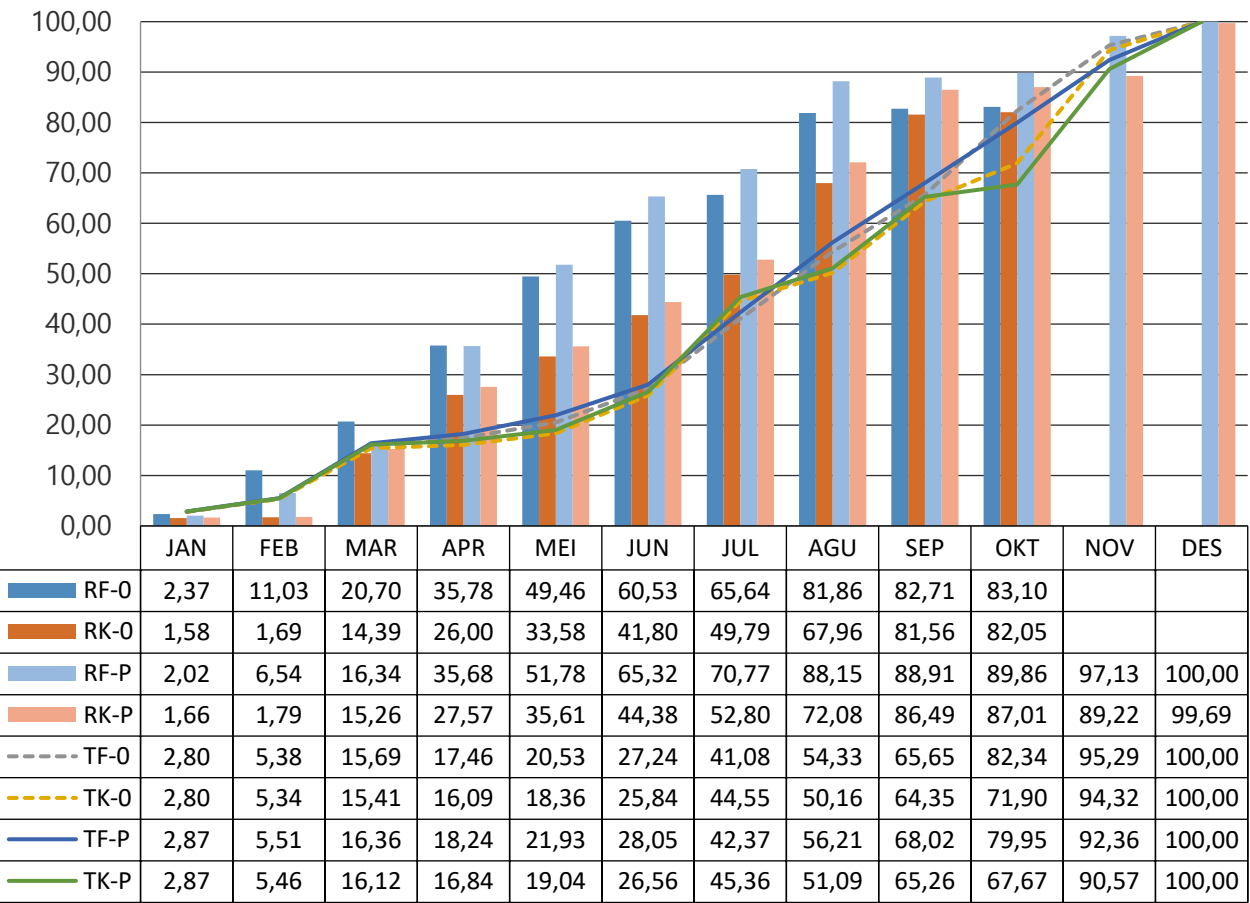

	Des
Target Fisik	100,00
Target Keu	100,00
Real. Fisik	100,00
Real. Keu	99,69
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	-0,31

SILPA sebesar Rp 49.955.341 yang terdiri dari sisa biaya jasa konsultansi dan efisiensi anggaran perjalanan dinas, cetak MMT, honor narasumber, dsb.

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
(Rp. 19.825.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)

% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)

TARGET 2022

7,39 %

11,84 %

TARGET 2022 PERUBAHAN


6,71%

11,84%


REALISASI S.D DESEMBER

6,71%

11,86%
(Realisasi melebihi target)

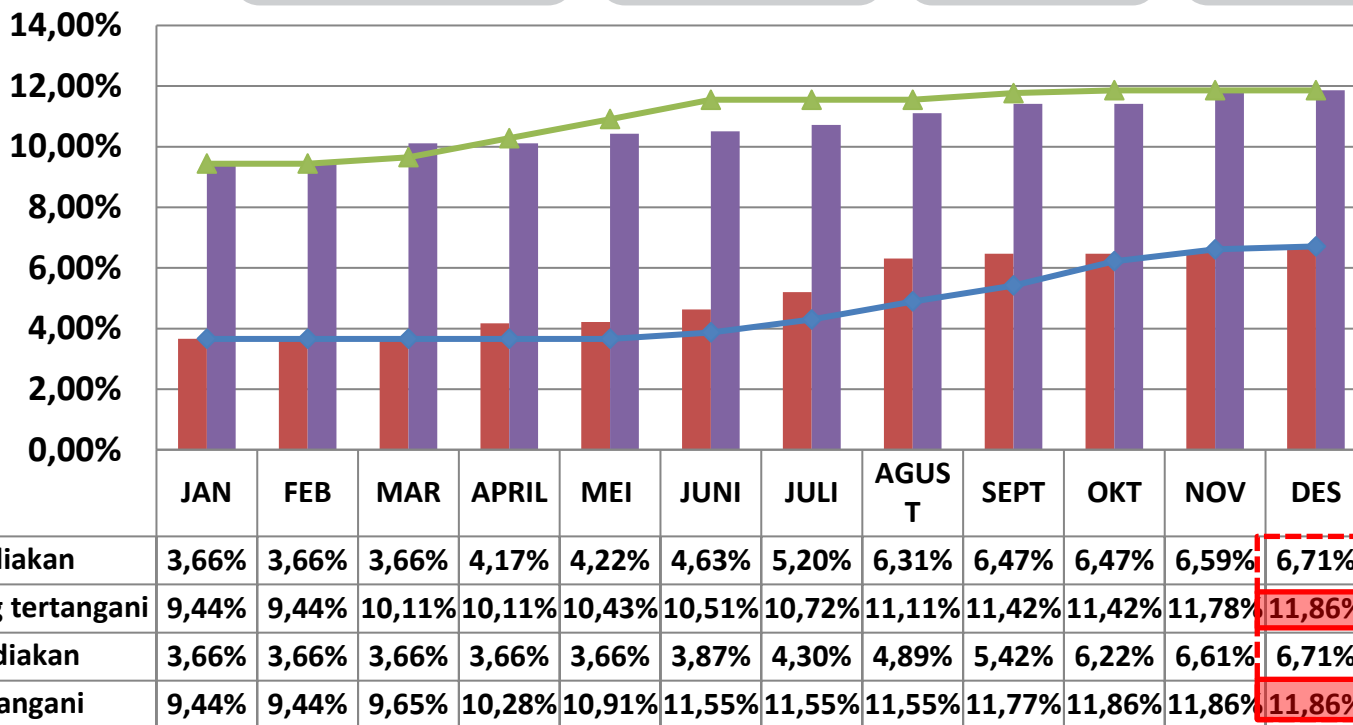

Bidang Kaw. Permukiman

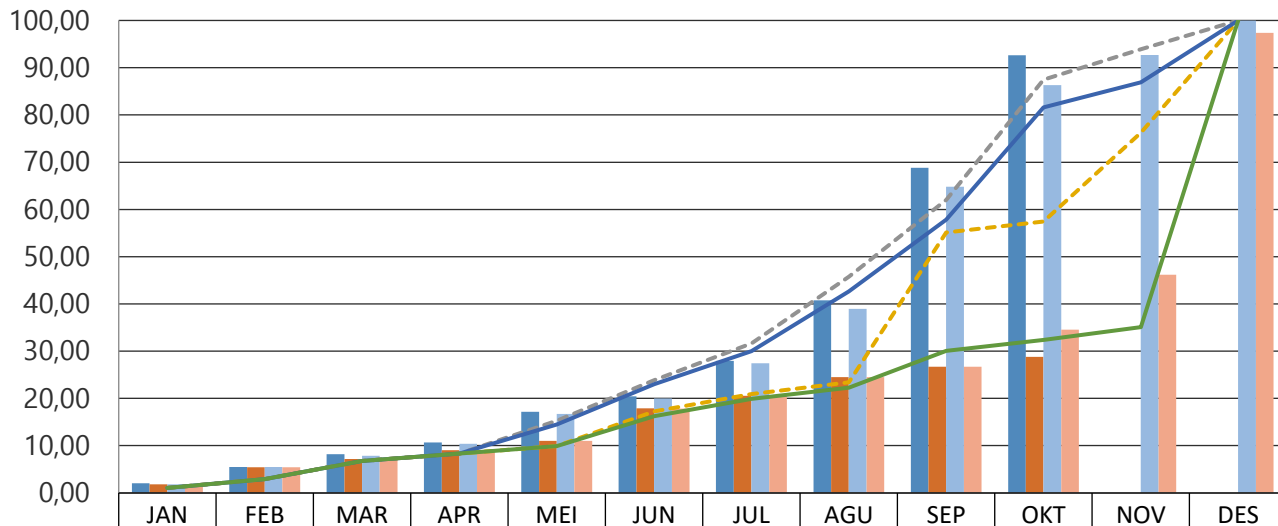

	Des.
Target Fisik	100,00
Target Keu	100,00
Real. Fisik	100,00
Real. Keu	97,41
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	-2,59

SILPA sebesar Rp 101.128.934 yang terdiri dari:

- sisa lelang kegiatan fisik lomba hari habitat sebesar Rp 63.432.785 yang baru terkontrak setelah adanya pengusulan perubahan anggaran TA 2022.
- Sisa/efisiensi perjalanan dinas, makan minum rapat, honorarium narasumber, ATK, cetak penggandaan, dan cetak MMT.

**PROGRAM
PENINGKATAN PSU
(Rp. 3.300.000.000)**

% Luasan Kawasan permukiman kumuh yang tertangani

23,37 %


29,97 %

**PROGRAM
KAWASAN
PERMUKIMAN
(Rp. 610.000.000,-)**

% Kawasan permukiman kumuh yang tertangani

17,00%

27,5 %

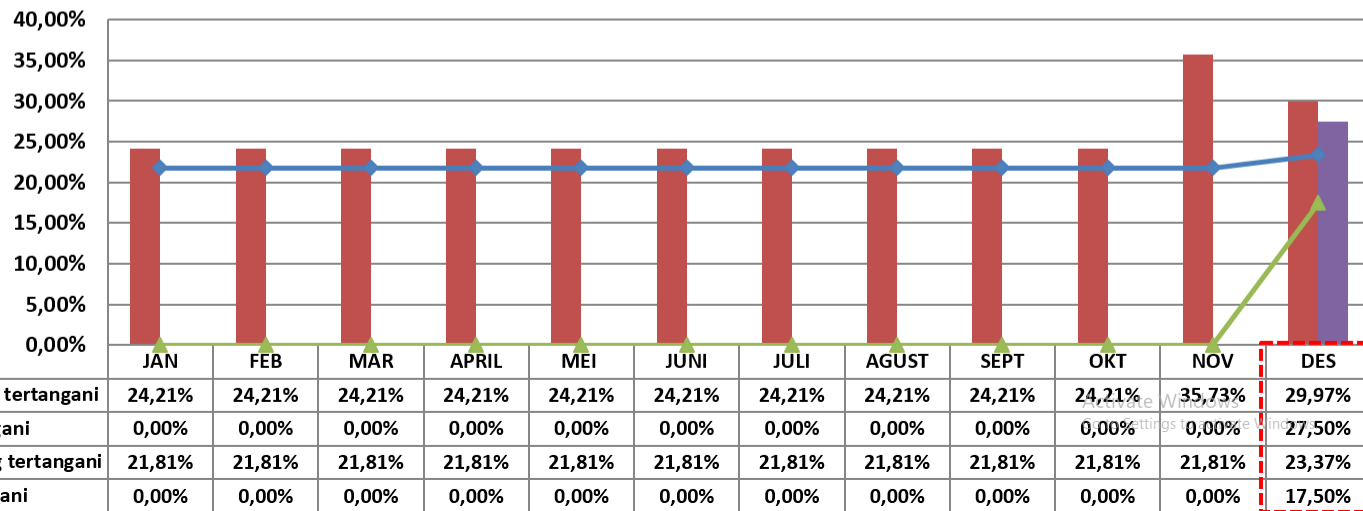

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 3.300.000.000)


Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D DESEMBER
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	6 Lokasi Juara I (Kota Semarang), II (Banyumas), III (Kota Magelang)- (Juara Harapan : I -Kab.Pati), II - Kota Salatiga, III - Kab. Temanggung) <i>Keterangan Konversi Luasan Kumuh yang tertangani:</i> <i>1. Kota Semarang: 5,43 ha (Non RPJMD); 2. Kab Banyumas: 3,08 ha (Non RPJMD); 3. Kota Magelang: 0,05 ha (Non RPJMD); 4. Kab Pati: 0,00 ha (tidak mengurangi luas kumuh, hanya menurunkan skor kumuh); 5. Kota Salatiga: 1,60 ha (Non RPJMD); 6. Kab Temanggung: 1,24 ha (RPJMD)</i>
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	1 Dokumen
	Tugas Tambahan	• <i>Penyusunan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)</i> • <i>Penyusunan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah</i> • <i>Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman</i>

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 610.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D DESEMBER
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	11 Lokasi (Kel Cebongan-Salatiga; Desa Dengkek-Pati; Kel Bejalen & Kel Bandungan - Kab. Semarang; Desa Tersobo, Kel Jatiluhur & Kel Gombang -Kebumen; Desa Jatisaba-Purbalingga; Desa Ngasem-Karanganyar; Desa Cangkol - Sukoharjo; Desa Sendang - Wonogiri
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	1 Dokumen (<i>Koordinasi internal inventarisasi usulan bankeu Kab/Kota, Monev pelaksanaan fisik Bankeu Sarpras ke Pati</i>) <i>Koordinasi dengan Kab Jepara terkait progres pembangunan Bankeu Sarparas di Kawasan Kumuh yang berlokasi di Desa Karimunjawa Kec. Karimunjawa)</i>
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen - <i>FGD peran pemerintah Desa dalam penanganan kawasan kumuh</i> - <i>Koordinasi BKM di kawasan permukiman kumuh di Kab. Boyolali dan Jepara</i> - <i>Studi lapangan pengelolaan sampah pada kawasan permukiman di Provinsi Jawa Barat</i> - <i>Kunjungan Lapangan Pengelolaan SPALDT (Sistem Pengelolaan Air Limah Domestik Terpusat) Sewon - Kec. Sewon Yogyakarta</i>
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	1 Dokumen - <i>Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi studi identifikasi kawasan permukiman kumuh skala prioritas provinsi di Kab. Grobogan dan Kota Surakarta</i> - <i>Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kab. Wonosobo, Magelang, Sragen, Demak, Kendal, Kota Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten Kab. Batang, Kab. Rembang, Kab. Brebes dan Kab. Blora</i> - <i>FGD penanganan kawasan permukiman pesisir utara Provinsi Jawa Tengah</i> - <i>Rapat Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh degan Kab/kota melalui SIKAPER (Sistem Informasi Kawasan Permukiman)</i>


Bidang Pertanahan

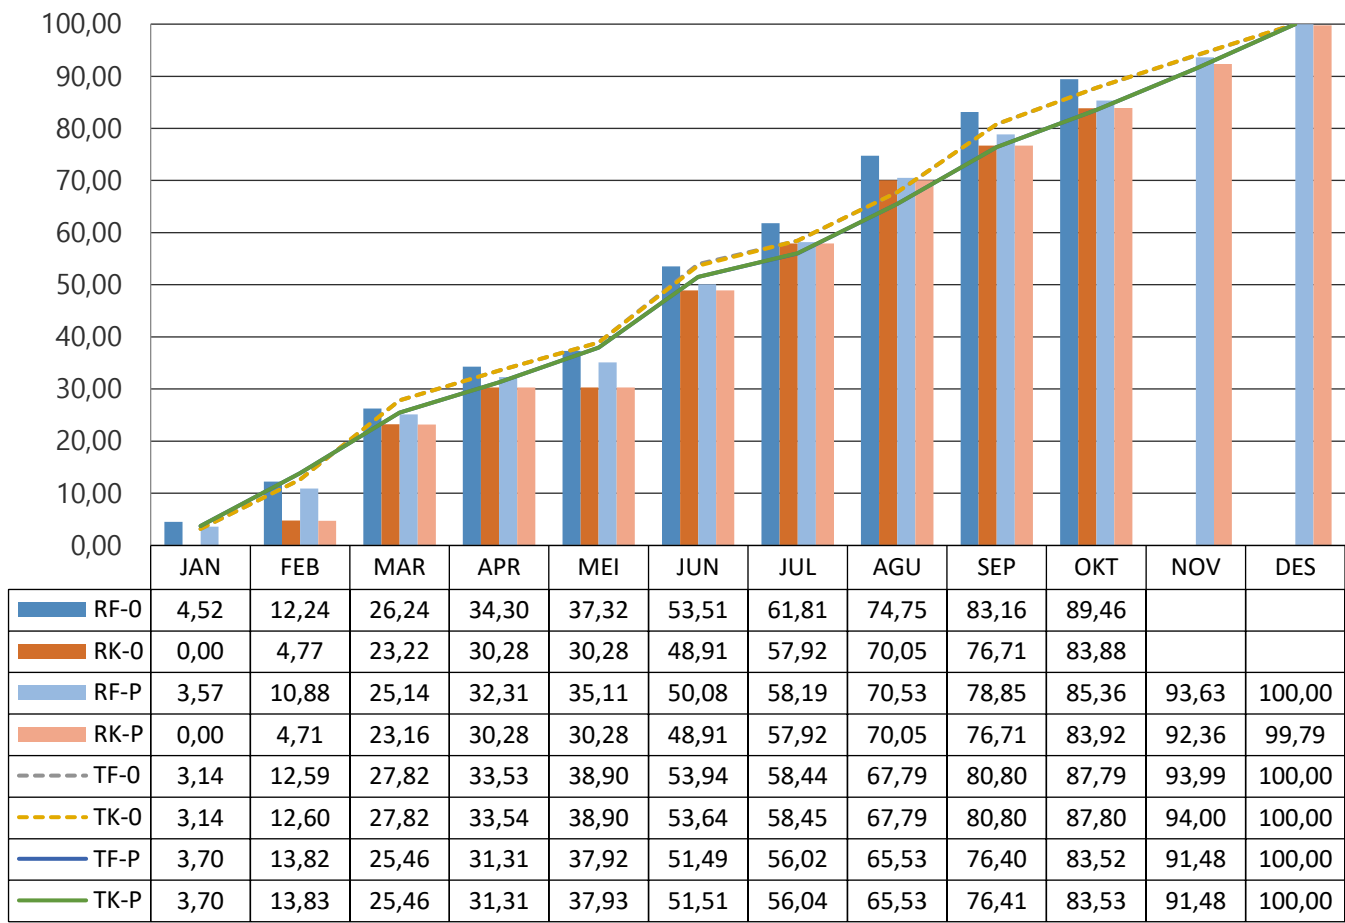

	Des.
Target Fisik	100,00
Target Keu	100,00
Real. Fisik	100,00
Real. Keu	99,79
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	-0,21

SILPA sebesar Rp 3.204.460 yang terdiri dari sisa honorarium narasumber dan efisiensi anggaran

BIDANG PERTANAHAN

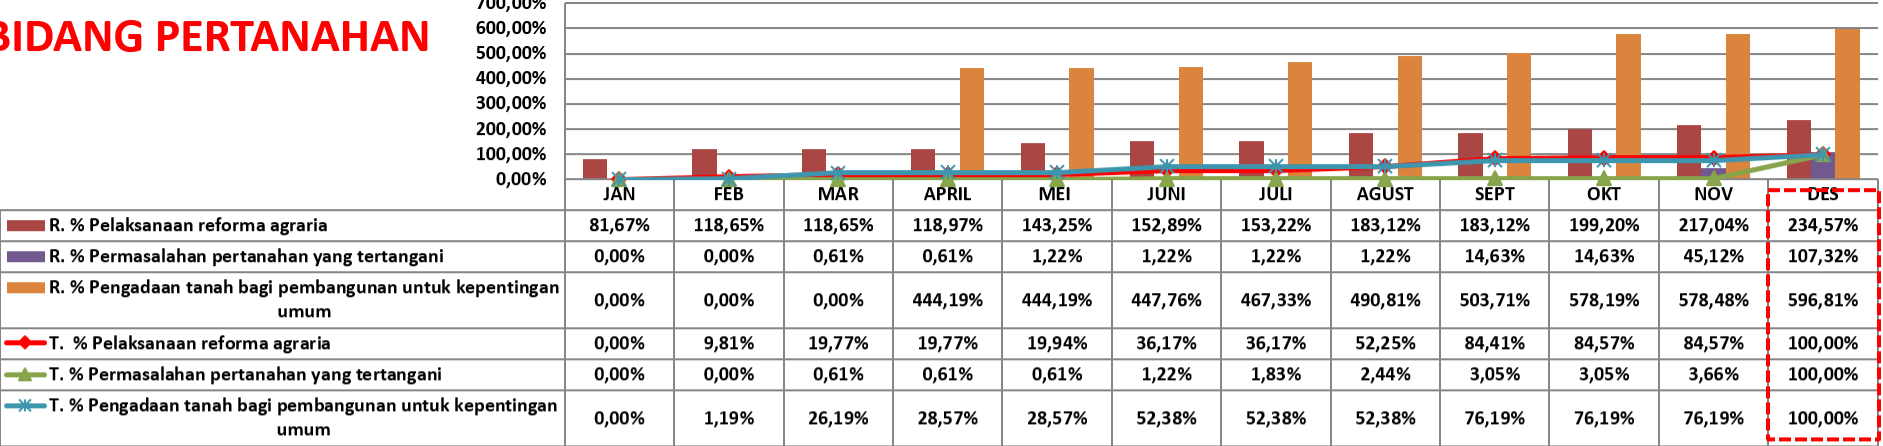

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Persentase pelaksanaan reforma agraria

TARGET 2022

100%

REALISASI S.D DESEMBER

234,57%

INDIKATOR KINERJA

Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan

20%

TARGET 2022

REALISASI S.D. DESEMBER

46,91%

Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)

415 Bidang:
5 Bidang HGU
15 Bidang HP
400 Bidang Pemantauan Penlok
1 kali Diseminasi/rakor bidang pertanahan

927 Bidang:
7 Bidang HGU
23 Bidang HP
898 Bidang
1 kali

Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)

2 Lokasi

3 Lokasi

Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)

200 bidang Pemantauan Sertifikasi
7 Lokasi Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA
5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA

529 Bidang
5 Lokasi
8 Kabupaten/Kota

Lanjutan ...

PROGRAM PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Rp. 550.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

TARGET 2022

100%

REALISASI S.D DESEMBER

596,81 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D DESEMBER
Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	20%	119,36%
Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	2.000 Bidang Penlok	12.433 Bidang Penlok (Penerbitan SK Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Cilacap, Bendungan Jlantah-Karanganyar, Bendungan Pidekso-Wonogiri dan TPST Kab. Magelang); Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500kV <i>pedan sirkuit 2 section 2</i> di Kab. Klaten, Boyolali & Semarang); Pelaksanaan pengadaan tanah (Konsultasi Publik Pengadaan Tanah DI Pidekso & TPST Magelang)
Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	100 Bidang ZNT	100 Bidang ZNT (Perkiraan Nilai Zonasi Nilai Tanah di Daerah)

PROGRAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN
(Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Permasalahan pertanahan yang tertangani

TARGET 2022


100%

REALISASI S.D DESEMBER

134,15 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. DESEMBER
Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	20%	26,83%
Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	150 Bidang LP2B 8 Bidang TKD	150 Bidang LP2B (Kab. Semarang, Blora, Cilacap) 63 Bidang TKD (Kab. Klaten & Magelang)
Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	6 Sengketa	7 Sengketa

Bidang Keterpaduan PKP

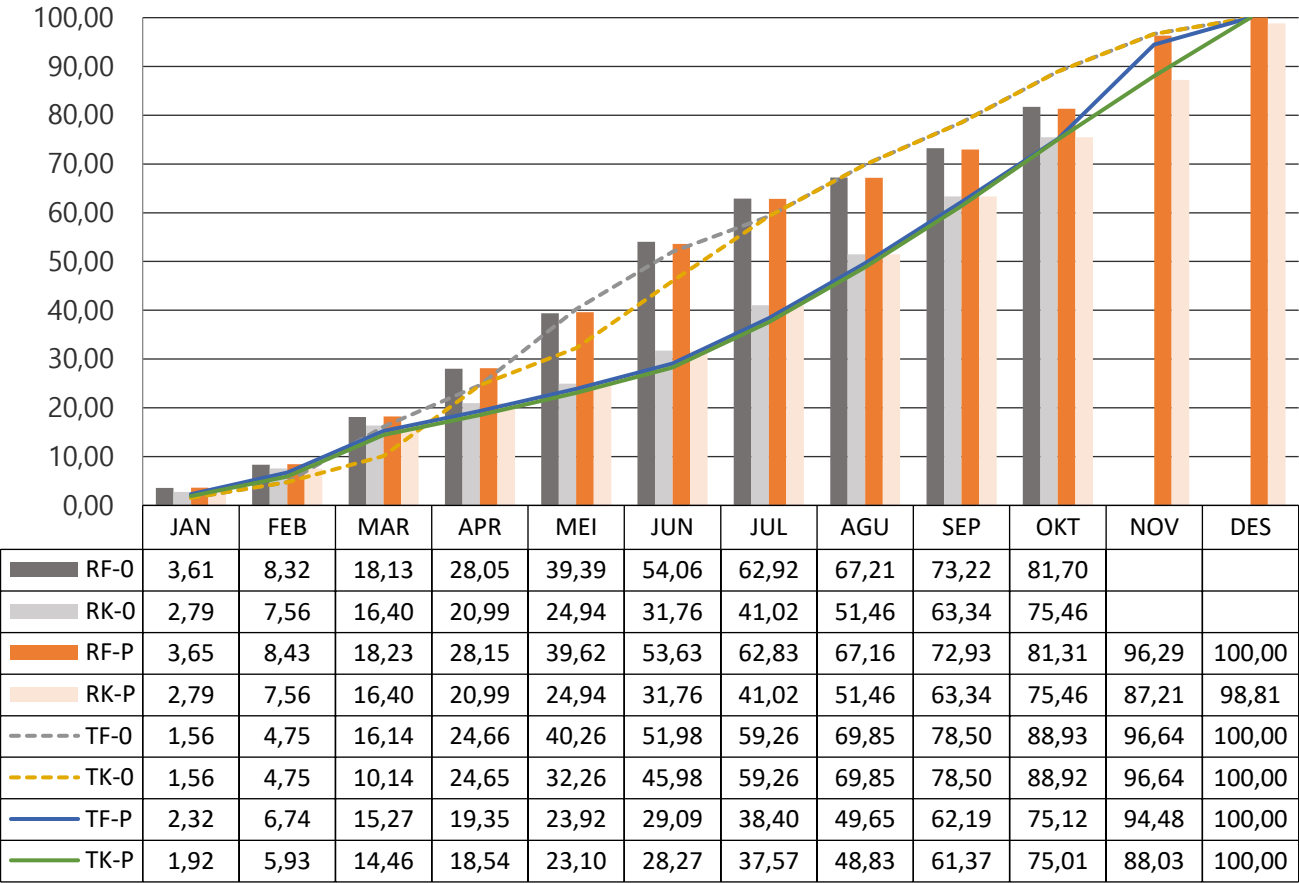

	Des.
Target Fisik	100,00
Target Keu	100,00
Real. Fisik	100,00
Real. Keu	98,81
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	-1,19

SILPA sebesar Rp 17.776.191 yang terdiri dari sisa gaji tenaga pendukung, honorarium narasumber, sisa kontrak dan efisiensi anggaran

BIDANG KETERPADUAN PKP

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,
DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 1.500.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA


% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman

TARGET 2022

100%

REALISASI s.d DESEMBER

100 %

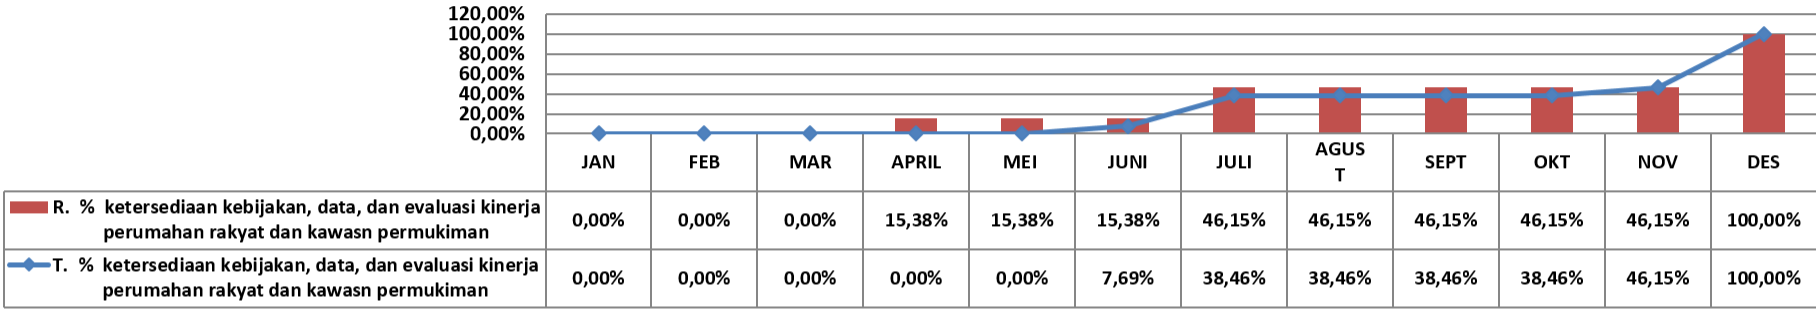


INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D DESEMBER
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5 Dokumen	5 Dokumen 1). <i>Dokumen Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi,</i> 2). <i>Dokumen Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,</i> 3). <i>Dokumen Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,</i> 4). <i>Dokumen Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan, dan</i> 5). <i>Dokumen Proceeding Pelaksanaan KKN Tematik Kemitraan</i>
Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	3 Dokumen	3 Dokumen (1). <i>Dokumen Pembinaan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,</i> 2). <i>Dokumen Monitoring Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,</i> 3). <i>Dokumen Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen 1). <i>Dokumen Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data PKP Provinsi Jawa Tengah,</i> 2). <i>Dokumen Review Keterisian Data PKP Provinsi Jawa Tengah,</i> 3). <i>Dokumen Pelaksanaan Forum Data PKP Provinsi Jawa Tengah,</i> 4). <i>Dokumen Buku Data PKPP Provinsi Jawa Tengah,</i> 5). <i>Dokumen Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi PKPP Provinsi Jawa Tengah</i> <i>Tugas Tambahan : Rapat Persiapan Forum Data; Forum Data; Koordinasi Pengumpulan Data ; Penyusunan Buku Data; Pengembangan Aplikasi; Penyusunan Laporan Pengembangan Aplikasi Konsultan</i>

**RINCIAN
RENCANA UMUM
PENGADAAN (RUP)
TA 2022**

RINCIAN RUP TA 2022

PAGU RUP BERDASARKAN CARA PENGADAAN



TOTAL PAGU RUP:
32.318.120.000

- SWAKELOLA
- PENYEDIA
- PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

RINCIAN RUP TA 2022

	PAKET	PAGU RUP	%
RUP MELALUI PENYEDIA	329	10.574.465.000	32,7%
PENGADAAN LANGSUNG	166	6.340.897.000	19,6%
E-PURCHASING	78	1.587.531.000	4,9%
TENDER	3	1.019.149.000	3,2%
SELEKSI	3	598.857.000	1,9%
DIKECUALIKAN	79	1.028.031.000	3,2%
RUP SWAKELOLA	121	19.985.130.000	61,8%
PENYEDIA DLM SWAKELOLA	45	1.758.525.000	5,4%
TOTAL RUP	495	32.318.120.000	

INDEX PBJ DISPERAKIM

PAGU RUP PENYEDIA	12.332.990.000	REALISASI PDN	8.541.148.803
PAGU RUP TAGGING PDN	12.023.905.000	INDEX REALISASI PDN	71,03%
INDEX RUP ALOKASI PDN	97,49%		

PAGU RUP ALOKASI UMK	9.127.453.000	RUP Belanja Barjas ≤ 200Jt	5.508.270.000
INDEX RUP ALOKASI UMK	100%	Transaksi Blangkon	935.552.426
		Persentase Transaksi Blangkon	16,98%

Note: target stranas minimal 10% dari total RUP dengan paket s.d 200Jt

RINCIAN RUP TA 2022

INDEX PBJ DISPERAKIM

PAGU RUP TENDER	1.618.006.000	PAGU RUP E-PURCHASING	1.587.531.000	PAGU RUP NON TENDER	9.127.453.000	PAGU RUP SWAKELOLA	19.985.130.000
REALISASI TENDER	1.554.571.205	REALISASI E-PURCHASING	1.405.048.066	REALISASI NON TENDER	5.768.097.809	REALISASI SWAKELOLA	23.116.371.311
INDEX TENDER	96,08%	INDEX E-PURCHASING	88,51%	INDEX NON TENDER SPSE 63,20%		INDEX SWAKELOLA	115,67%

REKAP PAKET TENDER TA 2022

No	Kode Tender	Nama Paket	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi	Status Tender
1	26867042	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Juara 1)	500.000.000	499.992.924	439.977.000	60.023.000	Tender Selesai
2	26866042	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Juara 2)	400.000.000	399.965.648	319.972.518	80.027.482	Tender Selesai
3	26865042	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Juara 3)	250.000.000	249.990.678	195.766.697	54.233.303	Tender Selesai
4	26705042	Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	199.911.000	150.385.020	49.614.980	Tender Selesai
5	26704042	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	249.972.000	223.778.220	26.221.780	Tender Selesai
6	26359042	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	249.861.000	224.691.750	25.308.250	Tender Selesai

PAKET TENDER SELESAI

JUMLAH PAKET	E-KONTRAK TENDER	PERSENTASE
6	6	100%


PAKET NON TENDER TRANSAKSIONAL

JUMLAH PAKET	E-KONTRAK TENDER	PERSENTASE
38	38	100%

Sumber : **SIMONBAJA**,
Status Akhir Desember 2022




P3DN TA 2022
SIERA BPKP




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status s.d 1 Januari 2023



Laporan LaporGub

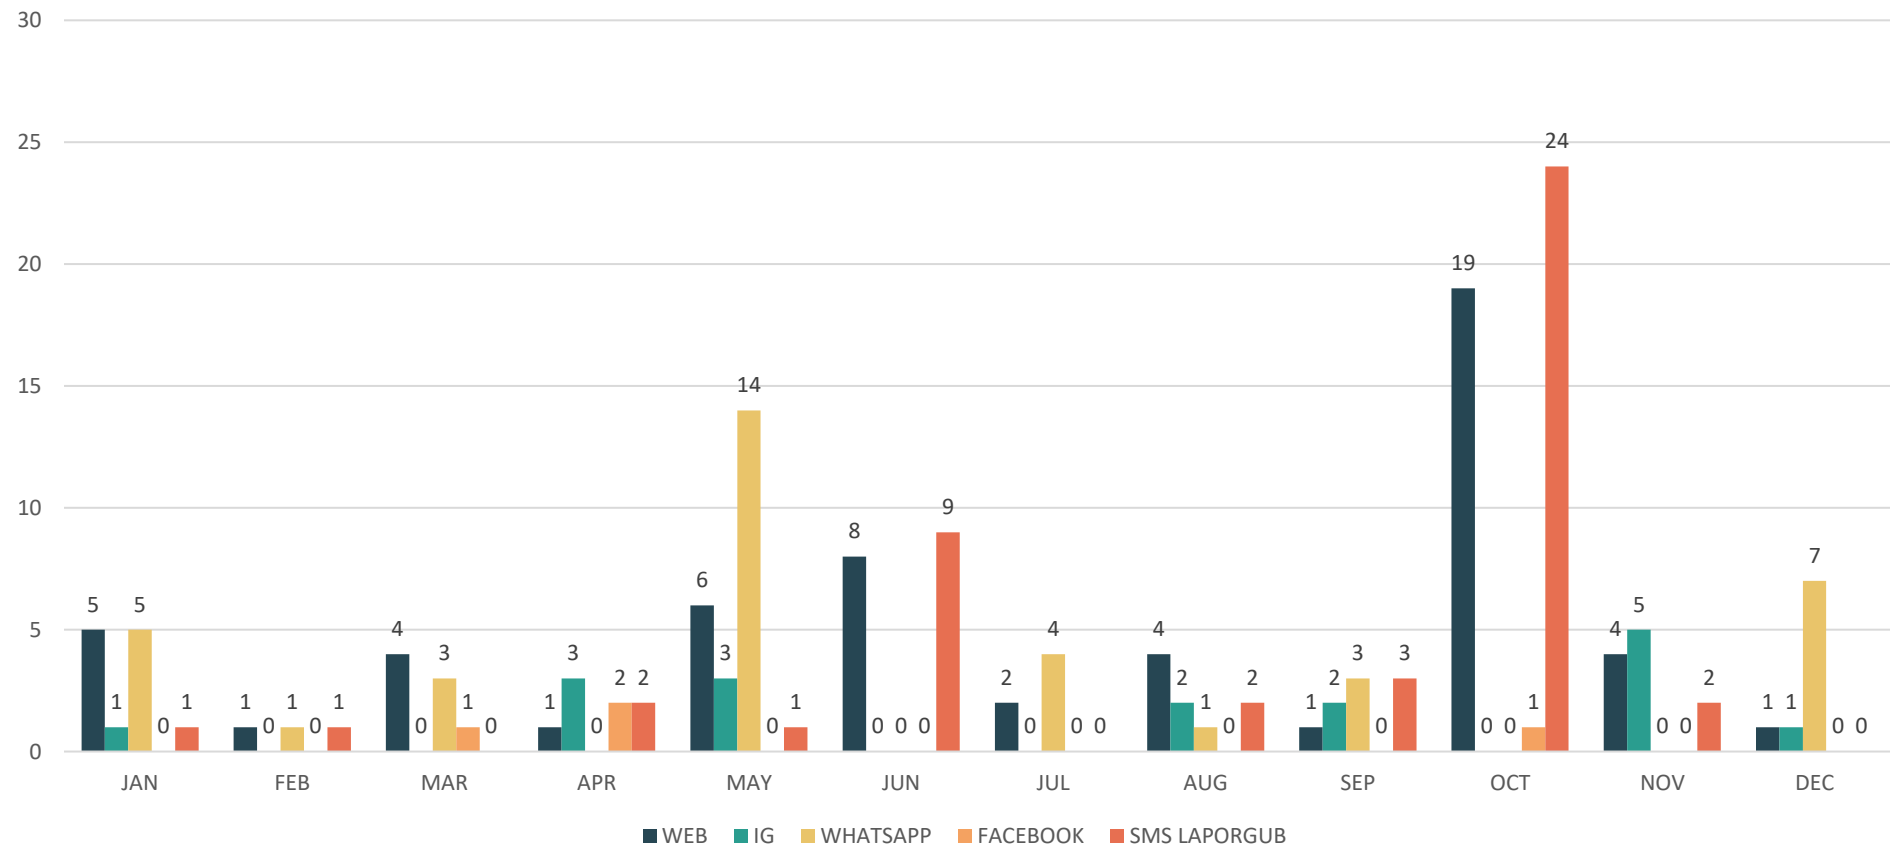



Konten Media Sosial

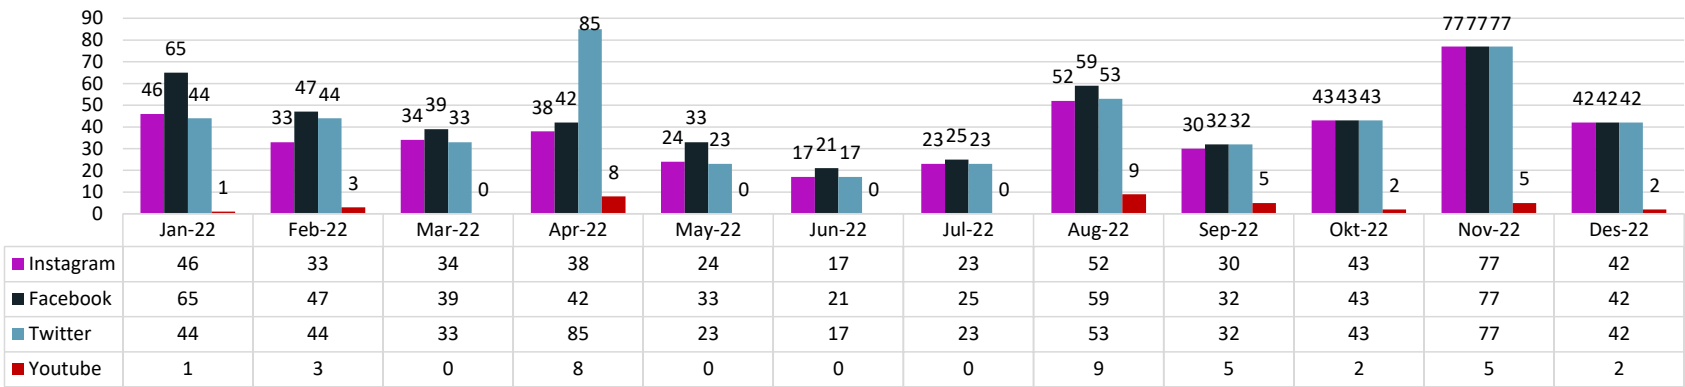



Konten Berita Web Dinas

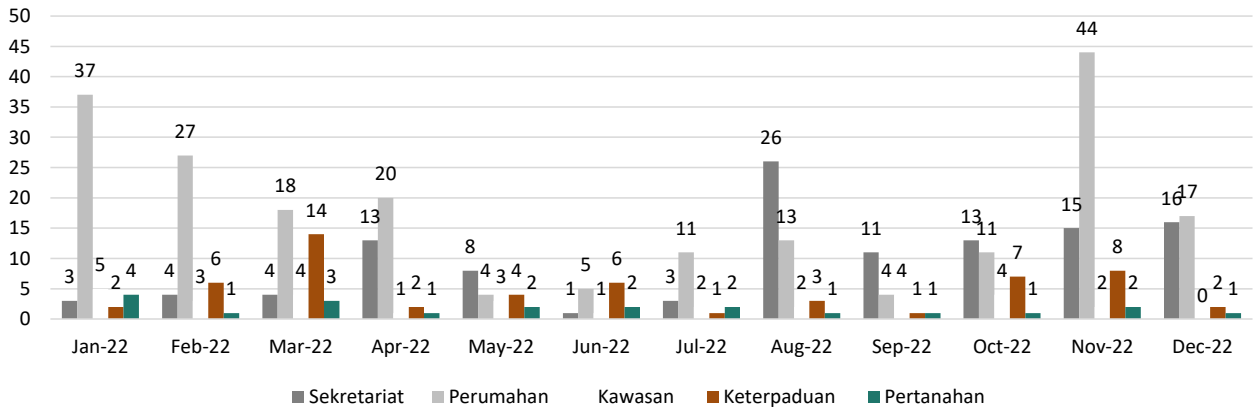


Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos



Laporan Hasil Survey Kepuasan Website




Jumlah Akumulatif Permohonan Informasi LaporanGub, PPID, dan PPID Pelaksana



Laporan Jumlah Kenaikan Pengunjung Website


Minggu IV



Laporan Pelayanan Publik Semester 2

Media Komunikasi LapoGub


Mayoritas pemohon informasi mengajukan permohonan melalui website (35%)



■ WEB ■ IG ■ WHATSAPP ■ FACEBOOK ■ SMS LAPORGUB

Jenis Layanan Yang Diterima


Pelayanan Informasi Paling Banyak diterima Melalui LapoGub (67%)



■ Layanan Informasi Melalui PPID Pelaksana
■ Layanan Informasi Melalui PPID
■ Aduan LapoGub

Media Komunikasi PPID Pelaksana

Mayoritas pemohon informasi mengajukan permohonan melalui Instagram (75%)




■ IG ■ TWITTER ■ FACEBOOK ■ EMAIL

Laporan Pelayanan Publik

Semester 2

Jenis Klasifikasi Informasi


Jenis informasi yang paling banyak dibutuhkan adalah "informasi setiap saat"



■ Informasi Berkala ■ Informasi Setiap Saat ■ Informasi Serta Merta ■ Informasi Dikecualikan


Jenis Klasifikasi Informasi

Sebanyak 64% masyarakat menyatakan Informasi Website Sangat Informatif



■ Sangat Informatif ■ Cukup Informatif ■ Kurang Informatif

Tweet Anda memperoleh **3.5K tayangan** selama periode **22 hari** ini



TWEET ANDA
Selama periode 22 hari ini, Anda memperoleh **147 penayangan** per hari.

- Tweet
- Tweet Populer
- Tweet dan balasan
- Promosi
- Tayangan
- Engagement
- Tingkat engagement



DisperakimJtg #JatengTangguh @DisperakimJtg · 3 Des

Pada Selasa (29/11), Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meninjau beberapa lokasi di Desa Banyusidi sebagai Desa Dampingan Disperakim Prov. Jateng

#jatenggayeng
#desadampingan pic.twitter.com/BF9M6nEoNv

Lihat aktivitas Tweet

446


60

13,5%




Hasil


Jangkauan Halaman Facebook 693 ↑ 58.9%



Kunjungan Halaman Facebook 173 ↓ 9.9%



Halaman Facebook Suka Baru 2 ↓ 50%




ANALITIK FACEBOOK

Jangkauan
Bandingkan jangkauan Anda dari periode ini dengan yang sebelumnya.

[Lihat selengkapnya tentang kinerja konten Anda](#)

Jangkauan Halaman Facebook 693 ↑ 58.9%




Pemirsa

[Lihat laporan pemirsa](#)

Pengikut Halaman Facebook

1.238

Usia & jenis kelamin



2.776 akun dijangkau dalam 30 hari terakhir
1.552 bukan pengikut



ANALITIK INSTAGRAM

Gambaran Umum

Anda mencapai **+56,9%** akun lebih banyak dibandingkan dengan 10 Nov – 30 Nov

Akun yang dijangkau	2.385	>
	+56,9%	
Akun yang berinteraksi	245	>
	+62,2%	
Total pengikut	2.366	>
	+2%	



RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA.2023

ISU STRATEGIS PKP DAN PERTANAHAN



STRATEGI PENANGANAN URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA USULAN TAHUN 2023

1. STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN RUMAH LAYAK HUNI

2. STRATEGI SEKTOR PEMBIAYAAN dan OPTIMALISASI KEMITRAAN (Kemitraan Lintas Sektor)

3. STRATEGI SEKTOR JARING PENGAMAN EKONOMI dengan mekanisme PADAT KARYA

Pemenuhan Backlog

Bansos PB Backlog
615 unit

Pemenuhan Backlog mll Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Bansos Relokasi Program Pemerintah Provinsi
Total 280 unit

Peningkatan Kualitas RTLH

TOTAL 15.000 UNIT
@ Rp 20.000.000,-
Integrasi penanganan RTLH dan jamban
melalui Bantuan Keuangan kepada
pemerintah Desa (BANKEUPEMDES)

Penanganan Pasca Bencana

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
Bansos PK Bencana
345 unit

Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana
Bansos PB Bencanan
105 unit

Kawasan Kumuh

- Penanganan Kumuh tahun 2023 di 6 lokasi melalui Lomba Hari Habitat di lokasi sesuai dengan SK Kumuh
- Hibah PSU Kawasan permukiman piloting di 1 lokasi
- Hibah penanganan Kawasan Kumuh piloting di 1 lokasi

Intervensi lain dapat melalui integrasi program,/kegiatan dan keterlibatan dari peran Swasta melalui CSR dan melalui sumber pembiayaan dari APBN, APBD.Prov dan APBD Kab/Kota

STRATEGI PENANGANAN URUSAN PERTANAHAN

USULAN TAHUN 2023

4. DUKUNGAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SINERGITAS DAN OPTIMALISASI KEMITRAAN REFORMA AGRARIA

PERTANAHAN

Proyek Prioritas Nasional (PSN)

✓ **Penyelenggaraan Reforma Agraria**

Penataan Aset Reform

Penataan Kembali atas struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah

Pensertipikatan LP2B : 650 Bidang
(3 Kabupaten)

Pensertipikatan Tanah Kas Desa (TKD) 37 bidang

Penataan Akses Reform

Pemberian Akses ketrampilan kepada masyarakat mengenai produksi, pengembangan hingga pemasaran

- Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Hak Pakai (HP) dan Hak Guna Usaha (HGU) : 32 bidang
- Penyelenggaraan Akses Reforma Agraria di 7 Kab/Kota
- Rencana Aksi Reforma Agraria

5. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN SEBAGAI DUKUNGAN PSN

✓ **Pelaksanaan Administrasi Pertanahan**

Dukungan Persiapan Penyediaan Tanah untuk pembagunan kepentingan umum dan PSN

- Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 1.000 Bidang (8 Penlok)
- Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah (ZNT) 250 bidang

Penanganan Permasalahan Pertanahan

- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan


RENCANA KERJA TA 2023

PAGU INDIKATIF TA. 2023

Rp 82.584.067.000 ,-

- Pembiayaan **19** kegiatan dan **45** Sub kegiatan
(**27** Sub Kegiatan Rutin dan **18** Sub Kegiatan Teknis)
- Pencapaian **10** Indikator Program, **25** Indikator Kegiatan,
53 Indikator Sub Kegiatan
- Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN (tahun 2023)
Rp 14.772.828.000,-

PAGU ANGGARAN TA. 2023

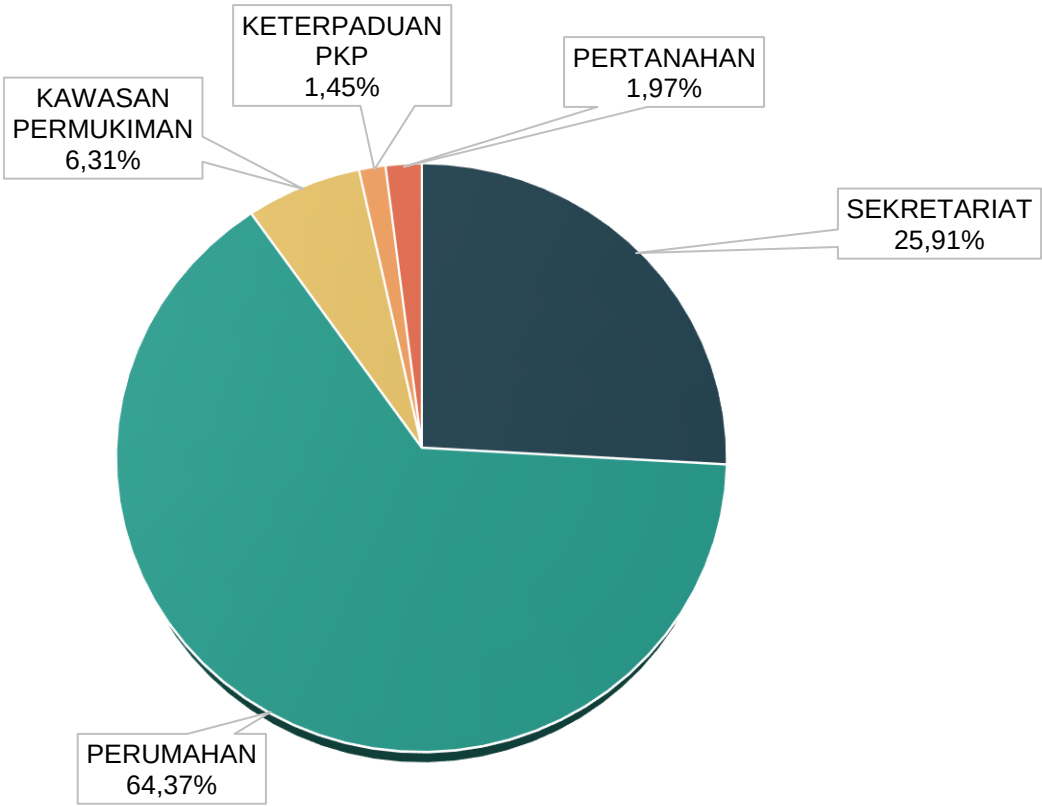


NO	BIDANG	PAGU
1	SEKRETARIAT	21.393.820.000
2	PERUMAHAN	53.156.654.000
3	KAWASAN PERMUKIMAN	5.213.249.000
4	KETERPADUAN PKP	1.194.000.000
5	PERTANAHAN	1.626.344.000
	TOTAL	82.584.067.000

KOMPOSISI BELANJA TA. 2023


Rp 82.584.067.000,-

BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL
Rp 81.787.617.000	Rp 796.450.000
99,04 %	0,96 %



BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANSOS	BELANJA HIBAH
15.252.068.000	22.466.549.000	42.815.000.000	1.254.000.000
18,47	27,20	51,84	1,52

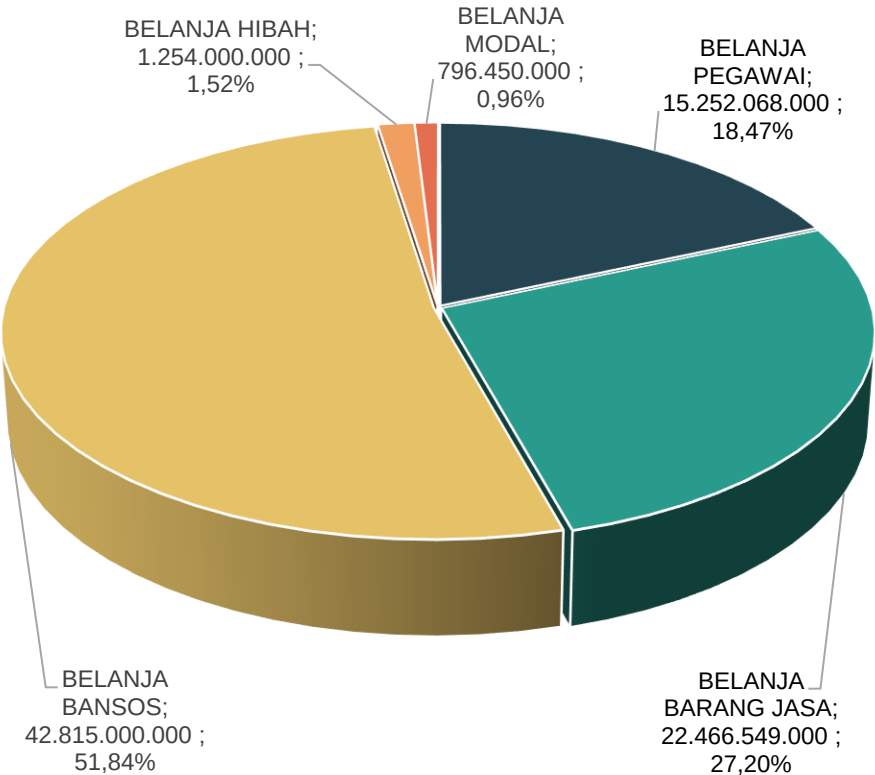

TA. 2022

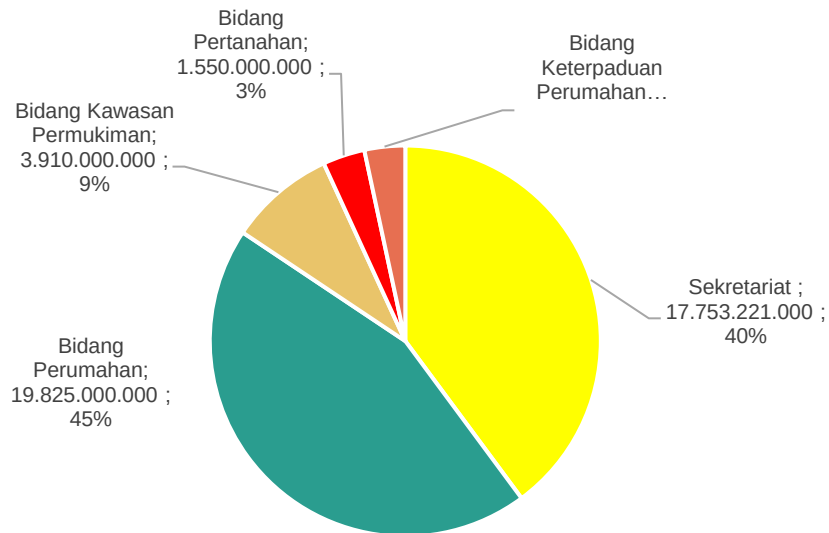


TA. 2023

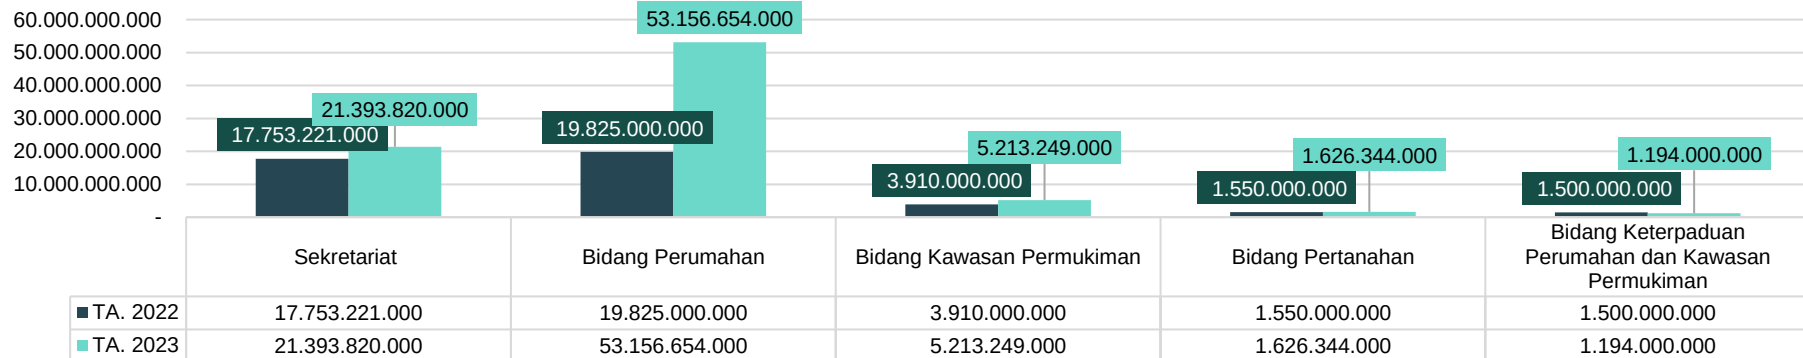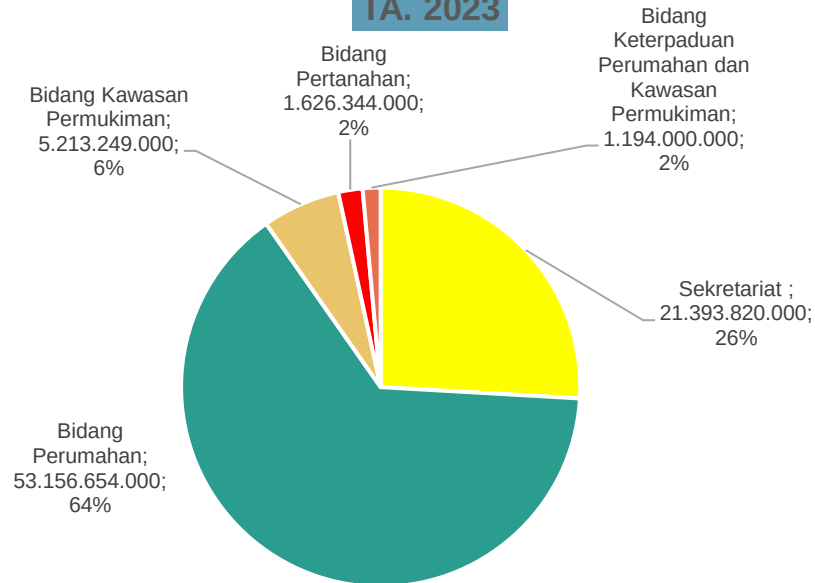


**RENCANA KERJA
OPERASIONAL (RKO)
TA 2023**

RKO DISPERAKIM TA. 2023


DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DAN REALISASI TA 2022

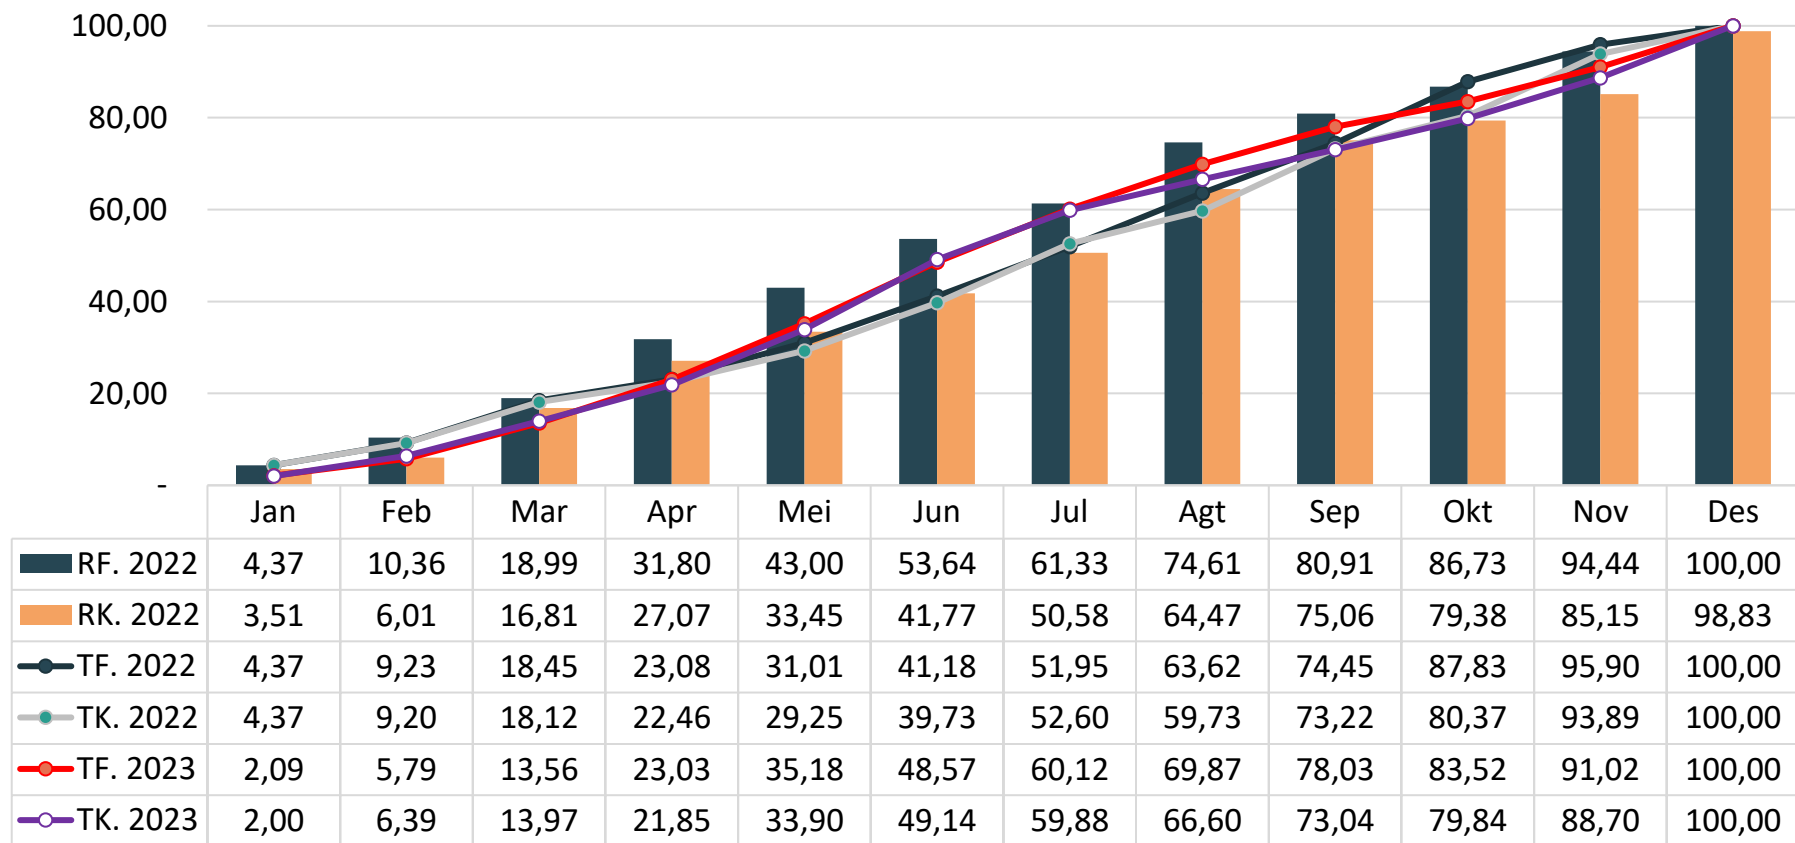

SEKRETARIAT

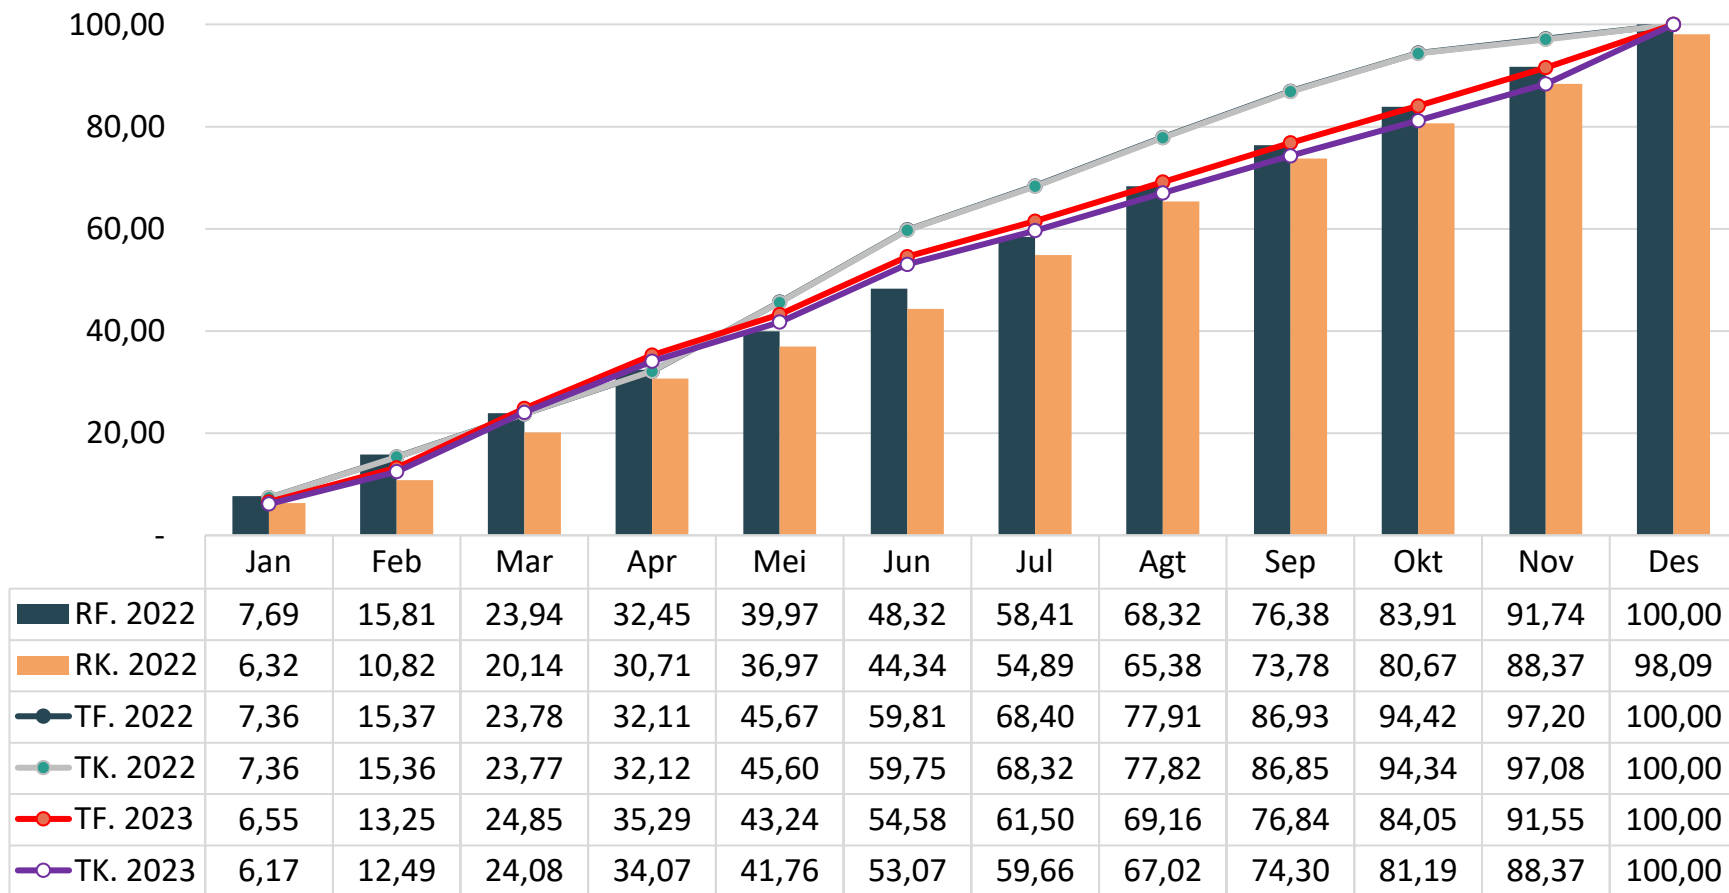


BIDANG PERUMAHAN

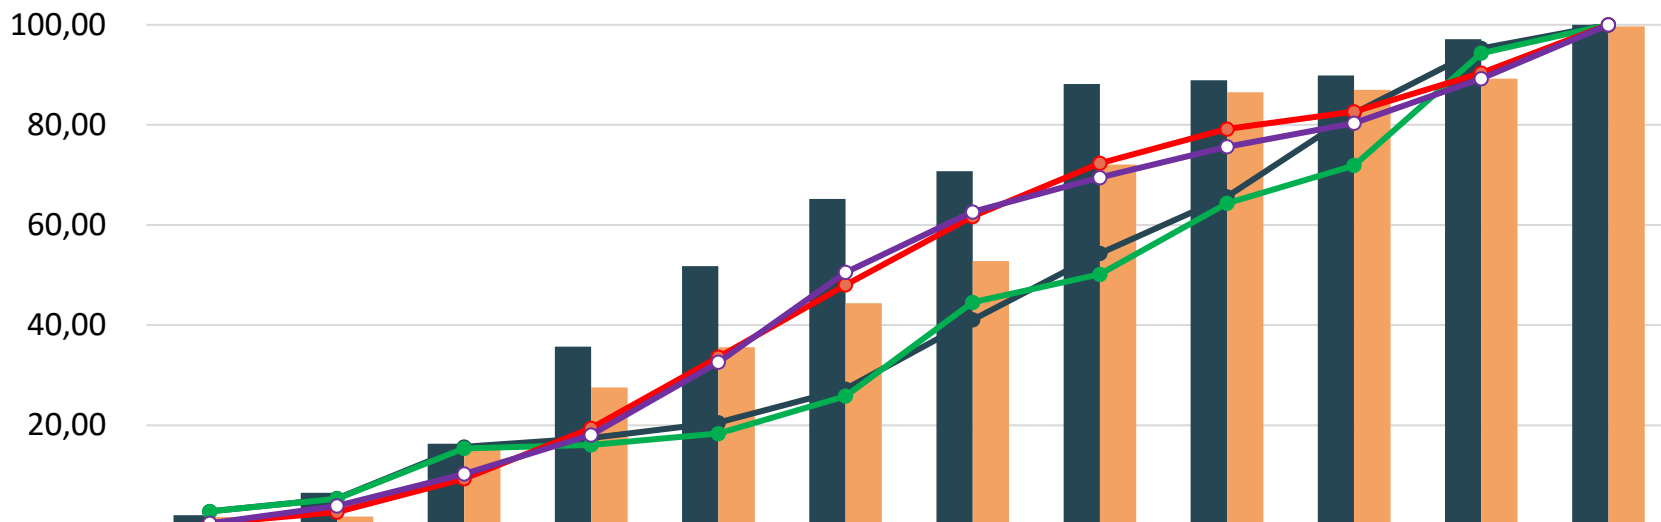


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
RF. 2022	2,02	6,54	16,34	35,68	51,78	65,23	70,77	88,15	88,91	89,86	97,12	100,00
RK. 2022	1,66	1,79	15,26	27,57	35,61	44,38	52,80	72,08	86,49	87,01	89,22	99,69
TF. 2022	2,80	5,38	15,69	17,46	20,53	27,24	41,08	54,33	65,65	82,34	95,29	100,00
TK. 2022	2,80	5,34	15,41	16,09	18,36	25,84	44,55	50,16	64,35	71,90	94,32	100,00
TF. 2023	0,41	2,66	9,34	19,41	33,61	48,05	61,72	72,33	79,18	82,65	90,37	100,00
TK. 2023	0,42	3,91	10,27	18,07	32,61	50,54	62,60	69,48	75,63	80,35	89,24	100,00

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

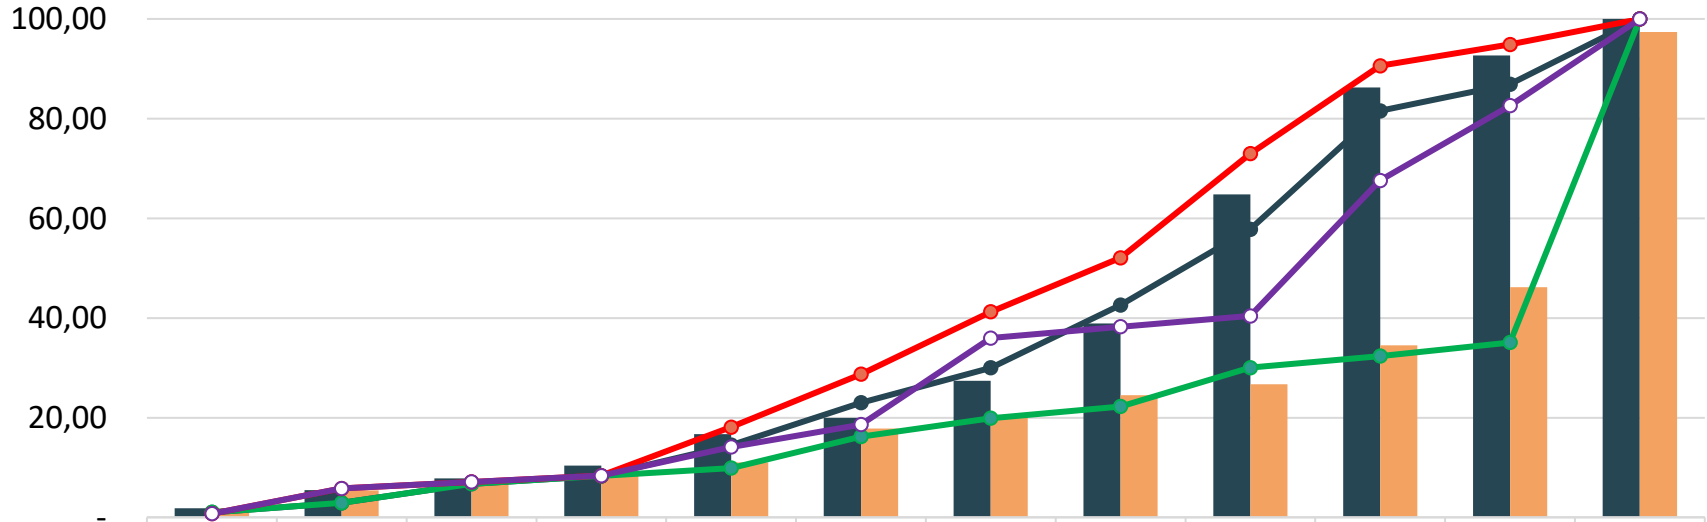


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
RF. 2022	1,83	5,49	7,82	10,38	16,71	19,99	27,41	38,94	64,83	86,30	92,68	100,00
RK. 2022	1,81	5,44	7,16	9,06	11,03	17,86	20,54	24,52	26,70	34,53	46,20	97,41
TF. 2022	1,02	2,91	6,76	8,32	14,50	23,01	30,01	42,63	57,82	81,59	86,92	100,00
TK. 2022	1,02	2,91	6,76	8,32	9,90	16,23	19,92	22,27	30,04	32,37	35,10	100,00
TF. 2023	0,74	5,80	7,11	8,39	18,13	28,75	41,26	52,10	72,99	90,63	94,91	100,00
TK. 2023	0,74	5,80	7,11	8,38	14,13	18,62	36,00	38,26	40,42	67,60	82,63	100,00

BIDANG PERTANAHAN

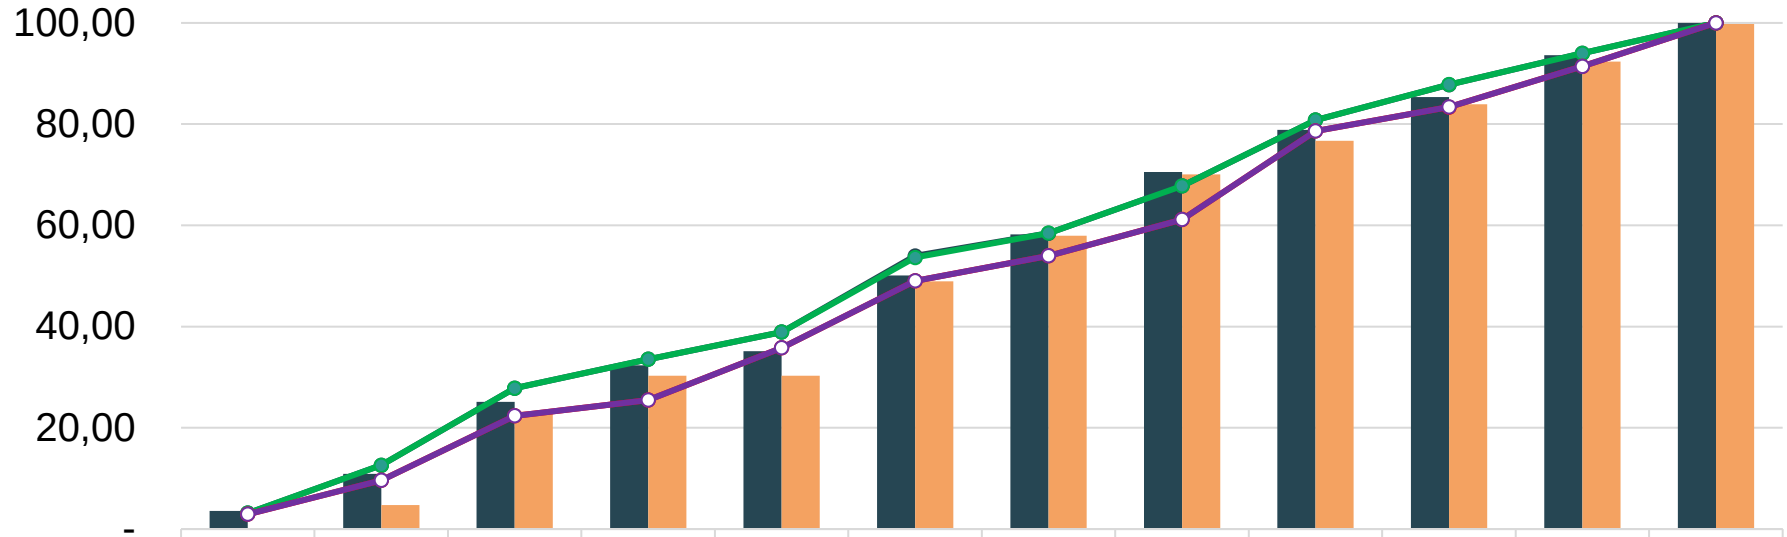

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
RF. 2022	3,57	10,88	25,14	32,31	35,11	50,08	58,19	70,53	78,85	85,36	93,63	100,00
RK. 2022	-	4,71	23,16	30,28	30,28	48,91	57,92	70,05	76,71	83,92	92,36	99,79
TF. 2022	3,14	12,59	27,82	33,53	38,90	53,94	58,44	67,79	80,80	87,79	93,99	100,00
TK. 2022	3,14	12,60	27,82	33,54	38,90	53,64	58,45	67,79	80,80	87,80	94,00	100,00
TF. 2023	2,91	9,62	22,37	25,48	35,80	49,03	53,97	61,15	78,64	83,37	91,42	100,00
TK. 2023	2,91	9,62	22,37	25,48	35,79	49,03	53,97	61,15	78,64	83,37	91,43	100,00

BIDANG KETERPADUAN PKP

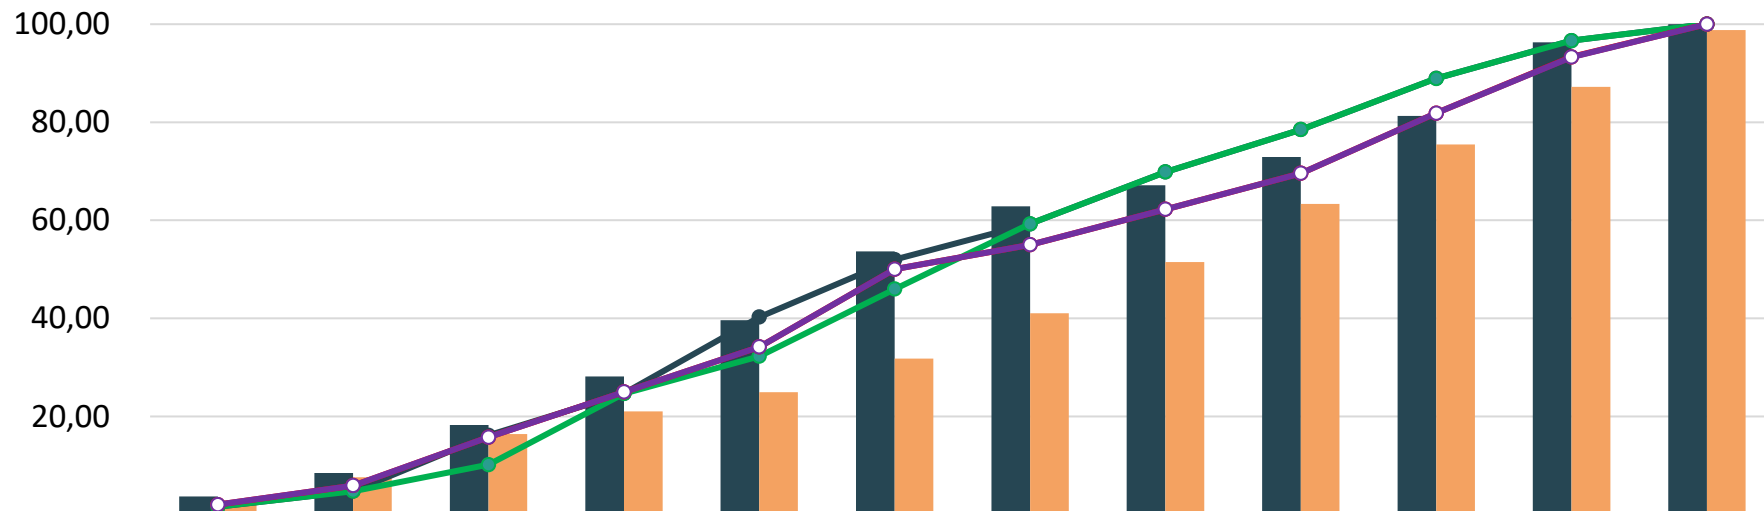

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
RF. 2022	3,65	8,43	18,23	28,15	39,62	53,63	62,83	67,16	72,93	81,31	96,29	100,00
RK. 2022	2,79	7,56	16,40	20,99	24,94	31,76	41,02	51,46	63,34	75,46	87,21	98,81
TF. 2022	1,56	4,75	16,14	24,66	40,26	51,98	59,26	69,85	78,50	88,93	96,64	100,00
TK. 2022	1,56	4,75	10,14	24,65	32,26	45,98	59,26	69,85	78,50	88,92	96,64	100,00
TF. 2023	2,00	5,87	15,74	24,98	34,17	50,02	55,00	62,23	69,57	81,85	93,32	100,00
TK. 2023	2,00	5,87	15,74	24,98	34,17	50,01	55,00	62,22	69,57	81,84	93,30	100,00

**RINCIAN
RENCANA UMUM
PENGADAAN (RUP)
TA 2023**


RINCIAN RUP TA 2023

No	Unit	Penyedia		Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Sekretariat	80	4.184.605.000	20	1.967.347.000	100	6.151.952.000
2	Bidang Perumahan	53	1.385.042.000	91	51.771.612.000	144	53.156.654.000
3	Bidang Kawasan Permukiman	45	4.090.323.000	12	1.114.766.000	57	5.205.089.000
4	Bidang Pertanahan	29	308.160.000	14	1.318.184.000	43	1.626.344.000
5	Bidang Keterpaduan PKP	77	528.346.000	25	663.614.000	102	1.191.960.000
TOTAL		284	10.496.476.000	162	56.835.523.000	446	67.331.999.000

PAGU RUP BERDASARKAN CARA PENGADAAN

RINCIAN RUP TA 2023

**TOTAL PAGU
RUP:
67.331.991.000**

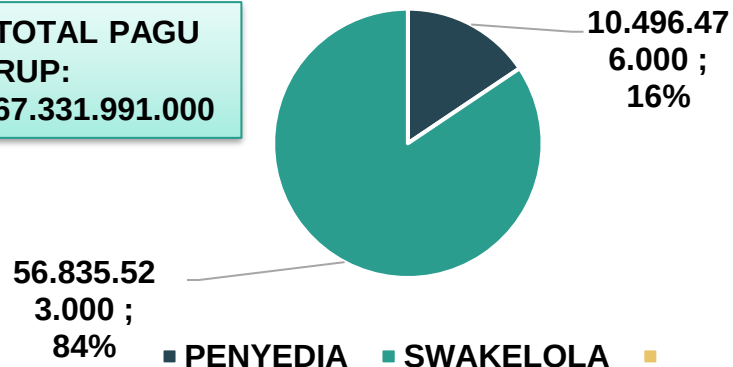

	PAKET	PAGU RUP	%
RUP MELALUI PENYEDIA	284	10.496.476.000	15,6%
PENGADAAN LANGSUNG	94	2.856.734.000	4,2%
E-PURCHASING	110	3.807.253.000	5,7%
TENDER	5	2.454.000.000	3,6%
SELEKSI	1	130.000.000	0,2%
DIKECUALIKAN	74	1.248.489.000	1,9%
RUP SWAKELOLA	162	56.835.523.000	84,4%
TOTAL RUP	446	67.331.999.000	100,0%

RINCIAN RUP TA 2023

INDEX PBJ TA 2023

Status: 08 Jan 2023

PAGU RUP PENYEDIA	10.496.476.000	REALISASI PDN	-	PAGU RUP ALOKASI UMK	10.496.476.000	RUP Belanja Barjas ≤ 200JT	3.853.721.000
PAGU RUP TAGGING PDN	10.356.710.000	INDEX REALISASI PDN	0,00%	INDEX RUP ALOKASI UMK	100%	Transaksi Blangkon	-
INDEX RUP ALOKASI PDN	98,67%					Persentase Transaksi Blangkon	0,00%
Note: target stranas minimal 10% dari total RUP dengan paket s.d 200Jt							
PAGU RUP TENDER	2.584.000.000	PAGU RUP E-PURCHASING	3.807.253.000	PAGU RUP NON TENDER	4.105.223.000	PAGU RUP SWAKELOLA	56.835.523.000
REALISASI TENDER	0	REALISASI E-PURCHASING	0	REALISASI NON TENDER	0	REALISASI SWAKELOLA	0
INDEX TENDER	0,00%	INDEX E-PURCHASING	0,00%	INDEX NON TENDER SPSE	0,00%	INDEX SWAKELOLA	0,00%

RINCIAN RUP TA 2023

REKAP RUP TENDER & SELEKSI TA 2023

NO	NAMA PAKET	METODE	PAGU	KODE RUPL	WAKTU PEMILIHAN
1	Hibah Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (TPS 3R dan Motor Sampah BKM Kismoyoso Makmur)	Tender	614.000.000	540001115	01 Maret 2023
2	Hibah Sarana dan Prasarana Perumahan Komunitas Kabupaten Jepara	Tender	640.000.000	540001097	03 April 2023
3	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3)	Tender	300.000.000	540000258	01 Mei 2023
4	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)	Tender	400.000.000	540000254	01 Mei 2023
5	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1)	Tender	500.000.000	54000025	01 Mei 2023
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Seleksi	130.000.000	520001246	02 Januari 2023
TOTAL			2.584.000.000		



BANKEU, BANSOS dan HIBAH



REKAP BANTUANKEU, BANSOS DAN PADAT KARYA TA.2023

NO.	URAIAN KEGIATAN	BANKEU/BANSOS			TENAGA PADAT KARYA YANG TERSERAP		MAKAN MINUM TENAGA PADAT KARYA (Rp)	LOKASI
		NILAI BANTUAN PER UNIT (Rp)	JUMLAH	ANGGARAN (Rp)	JUMLAH	ANGGARAN (Rp)		
1.	BANKEU PEMDES PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	18.000.000 (belanja material)	15.225 unit	274.050.000.000	45.675 orang	27.405.000.000	3.045.000.000	29 KABUPATEN
2.	BANSOS PEMBANGUNAN BARU RUMAH SEDERHANA SEHAT (PB BACKLOG)	35.000.000	615 unit	21.525.000.000	1.845 orang	1.107.000.000		13 KABUPATEN/KOTA
3.	BANSOS PEMBANGUNAN BARU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH							9 KABUPATEN/KOTA
	a. Rumah Tapak (1 lantai)	35.000.000	131 unit	4.585.000.000	393 orang	235.800.000		
	b. OPTIMIS (2 lantai)	50.000.000	149 unit	7.450.000.000	447 orang	268.200.000		
4.	BANSOS PEMBANGUNAN BARU RUMAH PASCA BENCANA (PB BENCANA)	50.000.000	105 unit	5.250.000.000	315 orang	189.000.000		7 KABUPATEN
5.	BANSOS REHABILITASI RUMAH PASCA BENCANA (PK BENCANA)	12.000.000	345 unit	4.140.000.000	1.035 orang	621.000.000		6 KABUPATEN/KOTA

BANKEU DAN BANSOS

Penanganan RTLH

Melalui BANTUAN KEUANGAN kpd
Pemdes Peningkatan Kualitas RTLH

JUMLAH
UNIT

• 15.000
UNIT

TOTAL
ANGGARAN

• 15.000 unit x
@20Juta
•Rp 300.000.000.000,-

JUMLAH
TENAGA
PADAT
KARYA
TERSERAP

• 45.000 orang

LOKASI

• 29 Kab

Pemenuhan Backlog

JUMLAH
UNIT

• 615 UNIT

TOTAL
ANGGARAN

• 615 unit x @35
Juta
•Rp 21.525.000.000,-

JUMLAH
TENAGA
PADAT
KARYA
TERSERAP

• 1.845 orang
(Rp 1.107.000.000,-)

LOKASI

• 13 Kab/Kota

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan

Relokasi Program Pemerintah

JUMLAH UNIT

• 131 unit Rumah
TAPAK (1 lantai)
• 149 unit Rumah
OPTIMIS (2 lantai)

TOTAL
ANGGARAN

• 131 unit x @35 Juta
= 4.585.000.000,-
• 149 unit x @50 Juta
= 7.450.000.000,-

JUMLAH
TENAGA
PADAT
KARYA
TERSERAP

• 840 orang
(Rp 504.000.000)

LOKASI

• 9 Kab/Kota

BANSOS

Penanganan Pasca Bencana

Rehabilitasi Pasca Bencana (PK Bencana)

JUMLAH UNIT

• 345 UNIT

TOTAL ANGGARAN

• 345 unit x @12 Juta
• Rp 4.140.000.000,-

JUMLAH TENAGA PADAT KARYA TERSERAP

• 1.035 orang (Rp
621.000.000,-)

LOKASI

• 6 Kabupaten/Kota

Pembangunan Baru Pasca Bencana (PB Bencana)

JUMLAH UNIT

• 105 UNIT

TOTAL ANGGARAN

• 105 unit x @50 Juta
• Rp 5.250.000.000,-

JUMLAH TENAGA PADAT KARYA TERSERAP

• 315 orang (Rp
189.000.000,-)

LOKASI

• 7 Kabupaten

HIBAH

Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh - PSU Kawasan Permukiman

JUMLAH

• 1 LOKASI

TOTAL ANGGARAN

• Rp 640.000.000,-

LOKASI

Ds. Kedungcino
Kec. Jepara
Kab. Jepara

Penanganan Kawasan Kumuh

JUMLAH

• 1 unit TPS3R dan
unit motor sampah

TOTAL ANGGARAN

• Rp 614.000.000,-

LOKASI

• **BKM KISMOYOSO
MAKMUR**
Ds. Kismoyoso,
Kec. Ngemplak,
Kab. Boyolali



Matur Nuwun

disperakimjtg



disperakimprovjateng



disperakim provinsi jawatengah



disperakim.jatengprov.go.id





RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR NOVEMBER 2022



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir November TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan


KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

NO.	PROGRAM	MURNI		PERUBAHAN	
		(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000	39,86	17.753.221.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000	44,51	19.825.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000	1,37	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000	7,41	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000	3,37	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000	1,23	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000	1,12	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000	1,12	500.000.000
	TOTAL	100	45.424.693.000	100	44.538.221.000

M
U
R
N
I

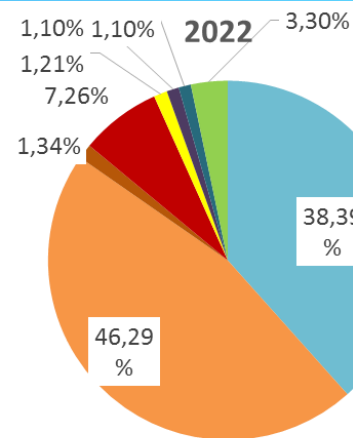

P
E
R
U
B
A
H
A
N

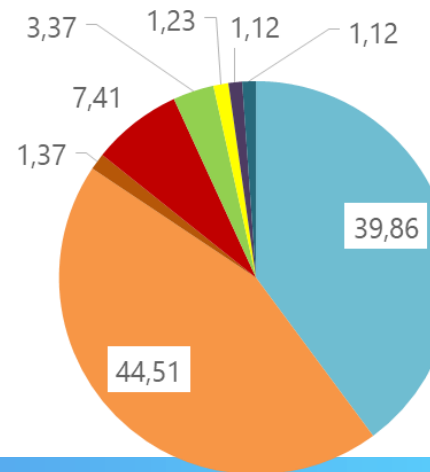




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir November 2022

^{*)}Realisasi keuangan diambil dari e-controlling status Jumat, 2 Desember 2022


Disperakim

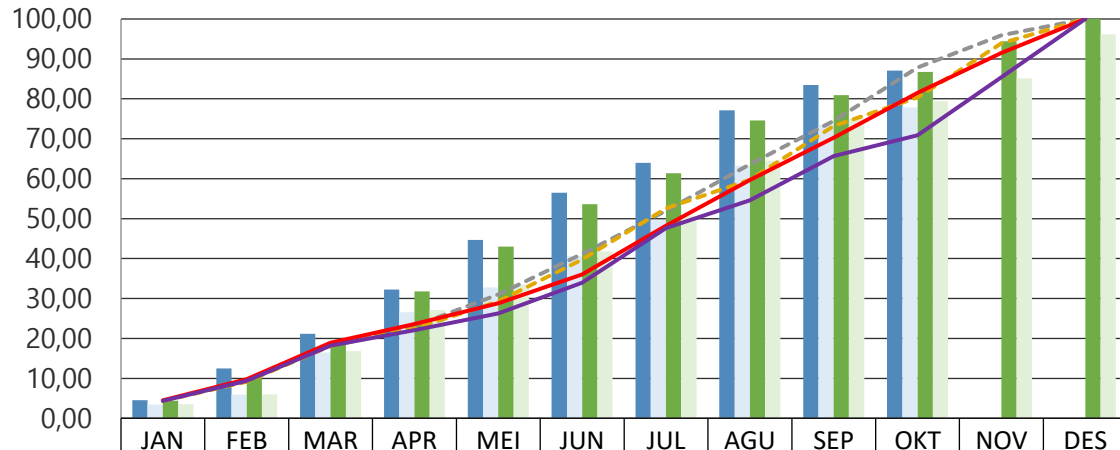

	Desember
Target Fisik	100,00
Target Keu	100,00
Real. Fisik	100,00
Real. Keu	95,69
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	-3,82

**Progres Fisik dan
Keuangan Prov. Jateng**
(STATUS 30 NOV 2022)
Realisasi Fisik: 79,57%
Realisasi Keuangan: 76,61%

Sekretariat

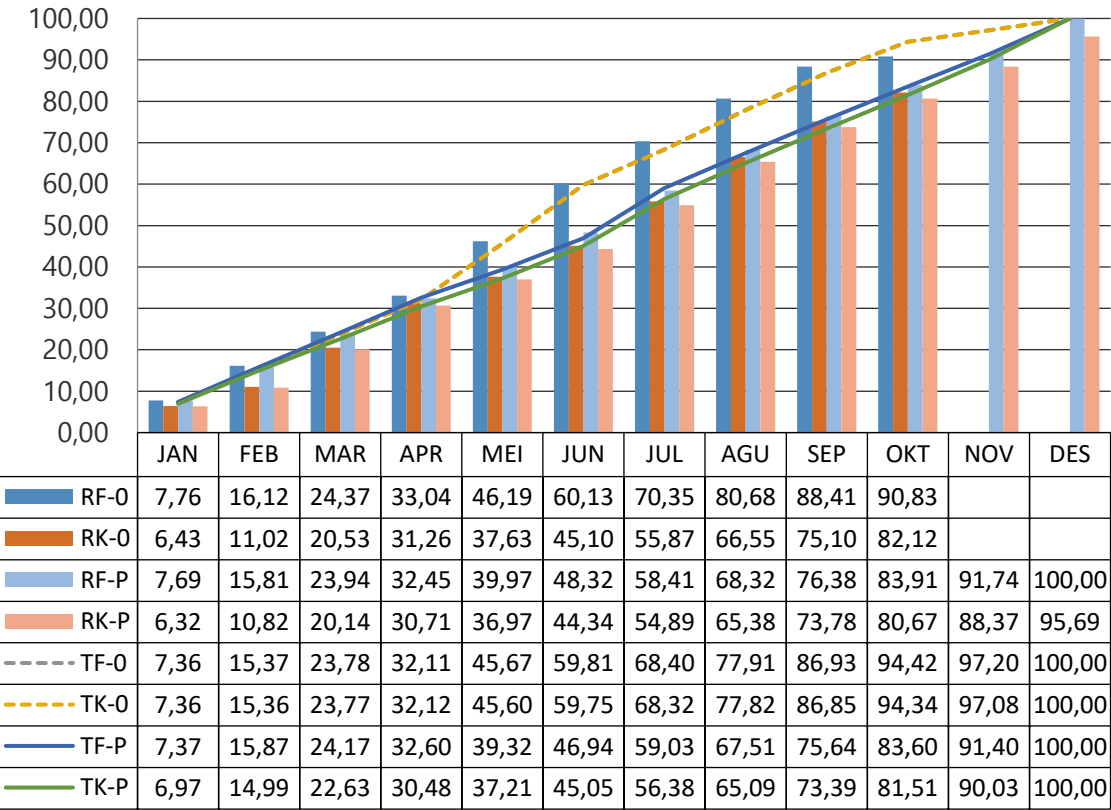

	Desember
Target Fisik	100,00
Target Keu	100,00
Real. Fisik	100,00
Real. Keu	95,69
Dev. Fisik	0,00
Dev. Keu	-4,31


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fis	Keu		
Subbag Program								
1	Forum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023	29.152.000	100,00	95,88	0,00	-4,12	penggandaan dan cetak buku RENJA TA. 2023 dibelanjakan pada bulan Desember	percepatan proses administrasi keuangan setelah dilakukan cetak dan penggandaan.
2	Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	52.102.000	99,50	78,71	0,00	-9,13	Penggandaan dan cetak DPA TA. 2023 belum dilaksanakan menunggu penetapan APBD	percepatan proses administrasi keuangan setelah dilakukan cetak dan penggandaan.
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	154.960.000	87,00	70,68	0,00	-5,63	pembahasan dilaksanakan akhir November 2022	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
4	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.575.000	82,19	61,98	0,00	-1,63	Pelaksanaan Visitasi KIP dilaksanakan pada 28 Nov 2022	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	80.765.000	85,51	72,63	0,00	-5,23	Penyusunan Draft LKPD, LPPD sudah dilaksanakan	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
6	Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.660.000	86,61	49,97	0,00	-19,67	Monev dan Fasilitasi melalui kunjungan Wagub ke Desa Dampingan dilaksanakan 29 Nov 2022	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

Keterangan Deviasi Negatif

No	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fis	Keu		
Subbag Keuangan								
1	Pelaksanaan koordinasi Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	65.600.000	83,72	73,65	0,00	-2,24	- Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan undangan - Terdapat agenda perjalanan dinas pada tanggal 30 November	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
2	Pelaksanaan Rapat Persiapan Sosialisasi Semesteran dan Sosialisasi Semesteran	21.700.000	100,00	96,25	0,00	-3,75	Rapat internal evaluasi keuangan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan November	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
Subbag Umum dan Kepegawaian								
1	Pembayaran Kursus dan Pelatihan Singkat	50.000.000	90,00	45,89	0,00	-35,31	- Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan - Diklat dilaksanakan secara hybrid daring dan luring	Akan dilaksanakan Pengembangan Karakter ASN Berakhlak pada Selasa, 6 Desember 2022 di The Hills Bukit Sari
2	Pembayaran Listrik	570.504.000	92,18	58,45	0,00	-33,62	Dibayarkan sesuai dengan tagihan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

Bidang Perumahan

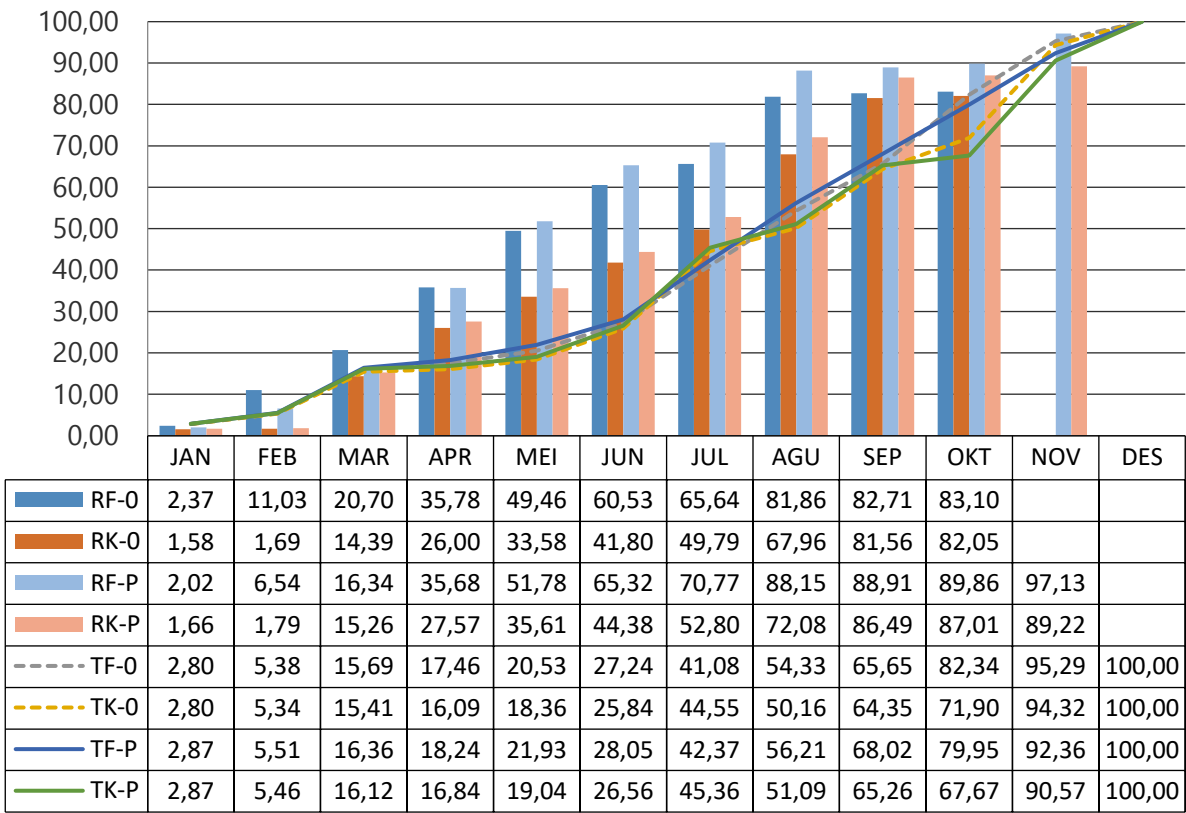

	Okt (Murni)	Nov. (PA)	Des (Prognosis)
Target Fisik	82,34	92,36	100,00
Target Keu	71,90	90,57	100,00
Real. Fisik	83,10	97,13	100,00
Real. Keu	82,05	89,22	99,99
Dev. Fisik	0,76	4,77	0,00
Dev. Keu	10,15	-1,35	-0,01

Potensi SILPA s.d. Akhir November:
Rp. 10.657.465,00
Sumber:
Sisa belanja makan minum rapat,
perjalanan dinas, dsb.

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan								
1	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.826.000	97,78	69,79	0,00	-28,00	Rapat koordinasi Renaksi SPM yang telah dilaksanakan tanggal 14 November 2022 belum terbayarkan	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
2	Rapat Rencana Aksi SPM Bidang Perumahan Rakyat	2.662.000	100,00	26,38	0,00	-73,62	Belanja ATK belum dibayarkan karena pembelian dikelola langsung dalam lingkup bidang	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
3	Koordinasi Lapangan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	178.512.000	98,17	92,28	0,52	-5,37	Progres fisik sudah terlaksana sesuai target, realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Desember	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
4	Pelaksanaan Verivali Lapangan Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	96.536.000	96,13	89,58	0,00	-6,54	Belanja ATK belum dibayarkan karena pembelian dikelola langsung dalam lingkup bidang	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
5	Bimtek Validasi Data SIMPERUM	13.519.000	80,53	59,64	0,00	-20,90	- Rapat persiapan Bimtek validasi data simperum telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022, biaya makan minum rapat belum terbayarkan - Bimtek validasi simperum telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022, biaya makan minum rapat belum terbayarkan	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
6	Sosialisasi Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Sederhana Sehat atau Relokasi Program Pemerintah	7.703.000	100,00	83,65	0,55	-15,81	Sisa pelaksanaan kegiatan (makan minum rapat)	Dioptimalkan untuk sosialisasi PB Bencana dan Relokasi pada masyarakat

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fis	Keu		
7	Workshop Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	51.980.000	100,00	98,52	0,03	-1,45	Sisa pelaksanaan kegiatan (belanja sewa ruang)	Dioptimalkan untuk pelaksanaan sosialisasi HUNTAP pada Masyarakat
8	Sosialisasi Hunian Tetap (HUNTAP), Hunian Sementara (HUNTARA), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat / Komunitas Rusus/Rusun di Jawa Tengah	13.350.000	98,65	70,55	4,50	-23,61	Sosialisasi HUNTAP di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022, biaya makan minum rapat belum terbayarkan	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
9	Pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah, HUNTAP, HUNTARA, Fasilitas Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat	87.887.000	93,31	83,33	0,00	-9,98	Biaya perjalanan dinas untuk sosialisasi huntap di Temanggung belum terbayarkan dan belanja ATK belum terbayarkan	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
10	Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	5.223.000	99,44	64,10	0,00	-35,32	- Sisa belanja makan minum rapat	- Dioptimalkan untuk rapat koordinasi stakeholder pembiayaan perumahan

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fis	Keu		
Seksi Perumahan Umum								
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	34.422.000	74,84	49,44	0,00	-25,40	Perjalanan dinas bulan November belum dibayarkan	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
2	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	141.965.000	97,08	75,31	0,00	-21,67	upah tenaga kerja padat karya belum dibayarkan	pembayaran upah tenaga kerja padat karya dilakukan bulan Desember
3	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	4.305.000	100,00	54,53	0,00	-45,47	Belanja makan minum rapat belum dibayarkan	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
4	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	102.242.000	100,00	56,77	22,60	-20,63	Fisik sudah selesai, efisiensi belanja perjalanan dinas	- Potensi SILPA - Progres keuangan dilaporkan di bulan selanjutnya
5	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	87.245.000	93,30	76,48	10,30	-6,50	upah tenaga kerja padat karya belum dibayarkan	pembayaran upah tenaga kerja padat karya dilakukan bulan Desember
6	Pendampingan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Lingkungan	44.299.000	92,67	84,02	0,10	-8,53	Progres fisik sudah terlaksana sesuai target, realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Desember	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fis	Keu		
7	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	3.000.000	100,00	45,00	50,00	-5,00	Progres fisik sudah selesai, realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Desember	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
8	Pendampingan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang/ Material Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah	53.745.000	100,00	79,16	3,89	-16,96	efisiensi anggaran perjalanan dinas	anggaran perjadi akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi
9	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah	255.515.000	85,40	60,71	4,91	-19,80	upah tenaga kerja padat karya dan perjalanan dinas dalam rangka penyaluran dan monev PB Relokasi belum dibayarkan	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fisik	Keu		
Seksi Perumahan Swadaya								
1	Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	8.855.000.000	98,29	96,40	0,66	-1,54	proses pengajuan termin 2 swakelola	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
2	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	785.800.000	93,62	65,31	9,91	-18,39	Progres fisik sudah terlaksana sesuai target, realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Desember	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
3	Persiapan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	44.875.000	100,00	92,13	0,00	-7,87	Sisa kegiatan	dioptimalkan untuk pelaksanaan monev PB
4	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	54.690.000	83,02	30,61	13,33	-39,07	Progres fisik sudah terlaksana sesuai target, realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Desember	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
5	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	941.413.000	87,36	68,32	2,16	-16,88	Progres fisik sudah terlaksana sesuai target, realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Desember	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
6	Koordinasi Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	478.489.000	99,97	57,87	31,88	-10,21	Progres fisik sudah terlaksana sesuai target, realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Desember	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
(Rp. 19.825.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)

% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)

TARGET 2022

7,39 %

11,84 %

TARGET 2022 PERUBAHAN


6,71%





11,84%

REALISASI S.D NOVEMBER


6,59%

11,78%
(Realisasi dibawah target)

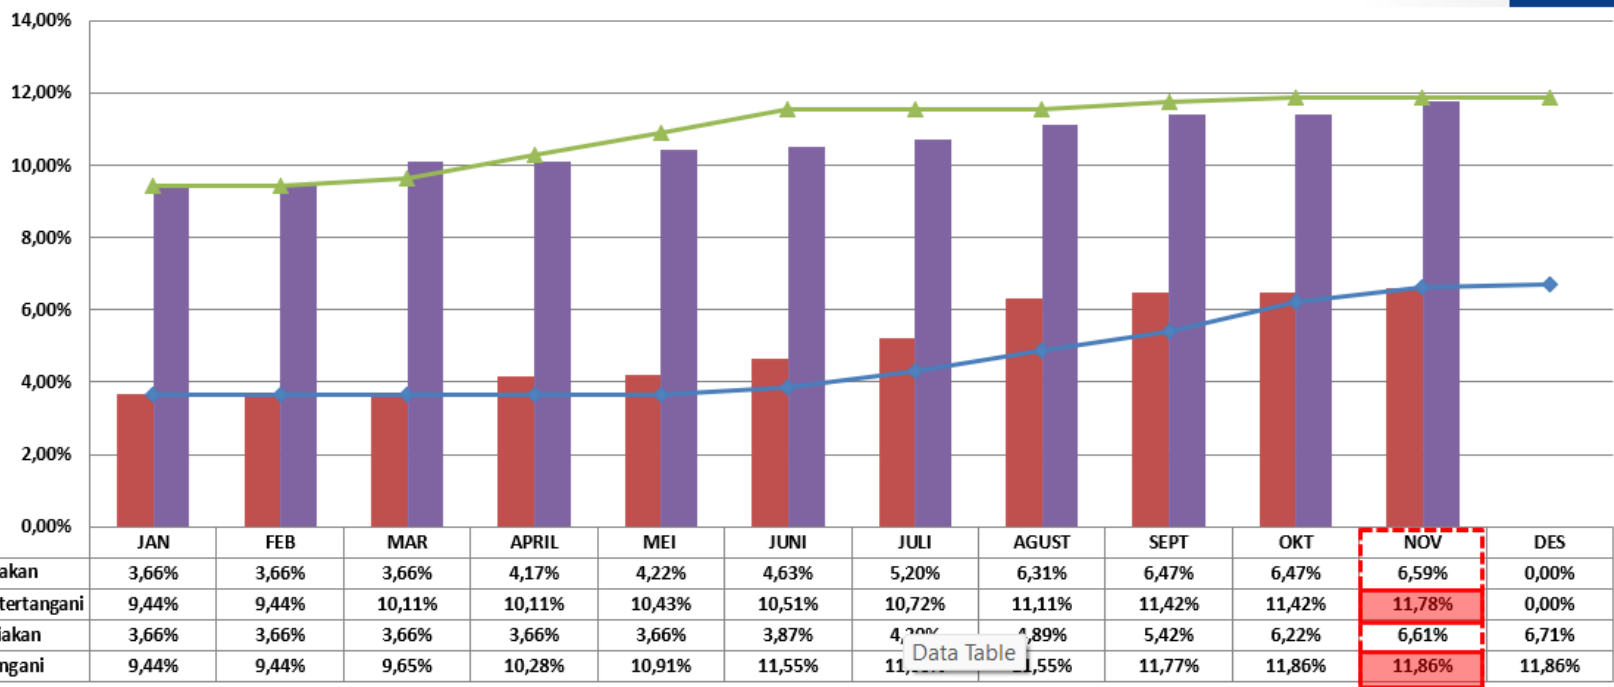




IK SUB KEGIATAN	T.P 2022	REALISASI S.D NOVEMBER
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupemdes RTLH)	11.417 unit	11.040 Sunit - Finalisasi Revisi Perqub Bankeupemdes - Pencapaian Rekam 9 = 1715 Unit - Penaikan 364 Unit ke BPKAD tgl 30 November 2022 (masuk realisasi Desember), 13 Unit sisanya diajukan awal Desember 2022
Jumlah unit rumah yang dibangun (Bantuan Stimulan PB RSS - Backlog)	253 unit	253 Unit PB Backlog 13 unit mengalami pergantian BNBA melalui PA TH. 2022 (di Kab Purwareja, Desa Tegol Sari 3 Unit dan Desa Watuduwur 10 Unit Kec. Bruna) - Sudah dicairkan Termin 2 - Pelaksanaan Pembangunan & Penyaluran Upah Padat Karya - Pembuatan Pondasi, pengiriman Material RUSPIN dan Non RUSPIN
Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi (Bantuan Stimulan PK Bencana)	51 unit	51 Unit PK Bencana 4 BNBA pengganti pada PA Th. 2022 - Pelaksanaan pembangunan rumah
Jumlah unit rumah korban bencana yang direlokasi (Bantuan Stimulan PB Bencana)	19 unit	19 unit PB-Bencana (Murni 16 Unit) 2 BNBA pengganti pada PA Th. 2022 3 unit Penambahan pada PA Th. 2022 - Pelaksanaan pembangunan rumah
Jumlah unit rumah yang dibangun - Fasilitas Relokasi Pemerintah (Bantuan Stimulan PB Relokasi)	73 Unit	73 unit (Murni 62 unit) 2 unit BNBA Pengganti pada PA 2022 11 unit penambahan bansos pada PA 2022 - Pelaksanaan pembangunan rumah
Jumlah dok perencanaan	1 Dok	- Laporan Antara → Dokumen Rencana Induk Rusunawa (4 lokasi) - Laporan Antara → Pelaksanaan Pematangan Lahan Rusunawa (4 lokasi)
Jumlah dokumen yang disusun	5 Dok	4 Dokumen - rasiding kegiatan Workshop sosialisasi kebijakan bidang perumahan, - Sosialisasi Pembangunan Rumah Baru, PK dan RTLH, Hantap dan Hantara - Database dan profil calon penerima bantuan sosial pembangunan rumah baru, - Database dan profil calon penerima bantuan sosial pembangunan rumah baru akibat bencana dan rehabilitasi rumah akibat bencana



Bidang Kaw. Permukiman

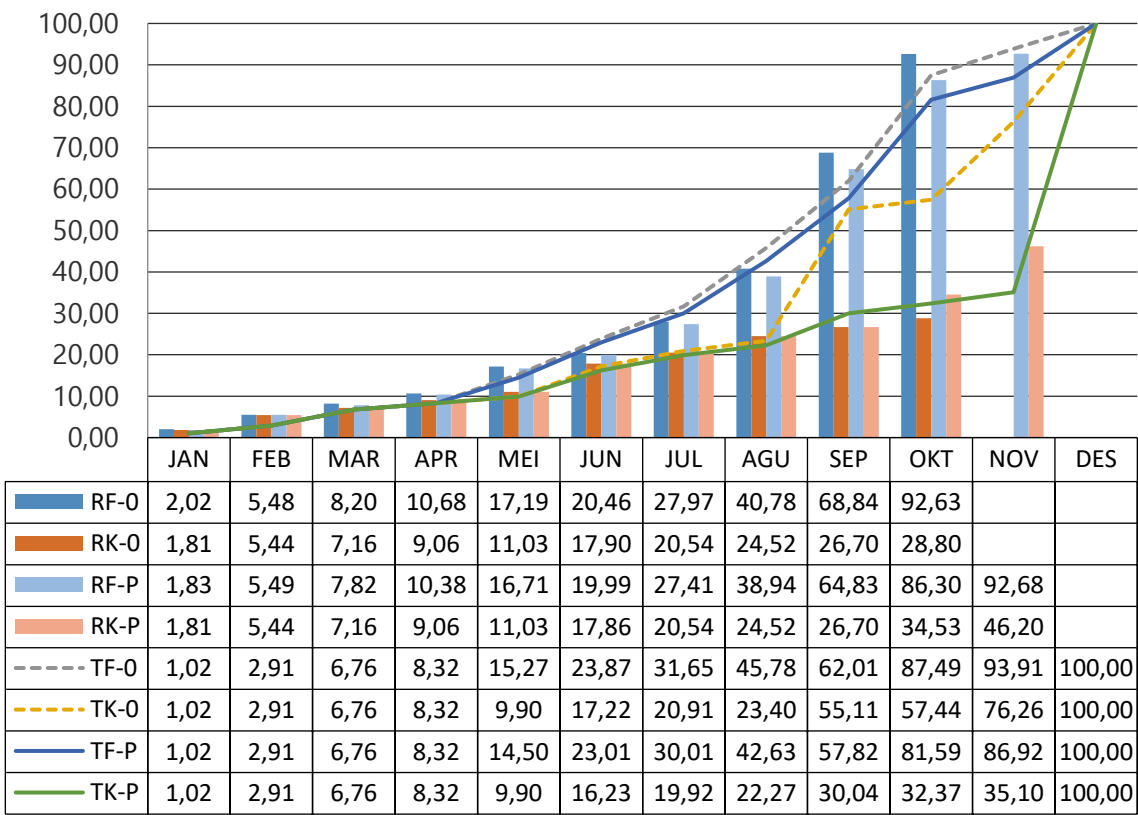

	Okt (Murni)	Nov. (PA)	Des. (Prognosis)
Target Fisik	87,49	86,92	100,00
Target Keu	57,44	35,10	100,00
Real. Fisik	92,63	92,68	100,00
Real. Keu	28,80	46,20	98,12
Dev. Fisik	5,14	5,76	0,00
Dev. Keu	-28,64	11,10	-1,88

Potensi SILPA s.d. Akhir November:
Rp. 73.699.629,-

Sumber:
Sisa kontrak hadiah lomba hari habitat
(63.434.335), studi, sisa belanja makan minum
rapat, honor narasumber, perjalanan dinas, dll.

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman								
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	58.500.000	91,27	88,09	0,00	-3,18	Sisa transport	akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan Desember
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman								
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	93,02	79,53	0,00	-13,48	Sisa belanja perjalanan dinas monev RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	akan dioptimalkan untuk monev RTLH di kawasan permukiman kumuh bulan Desember
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kawasan Permukiman	126.851.000	94,33	85,44	0,00	-8,88	Peninjauan penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Kab/Kota telah dilaksanakan secara koordinatif.	Peninjauan lapangan ke Kab/Kota akan dijadwalkan kembali di bulan Desember

**PROGRAM
PENINGKATAN PSU
(Rp. 3.300.000.000)**

% Kawasan permukiman kumuh yang tertangani

17,00%


0 %

**PROGRAM
KAWASAN
PERMUKIMAN
(Rp. 610.000.000,-)**

% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani

23,37 %

35,73 %

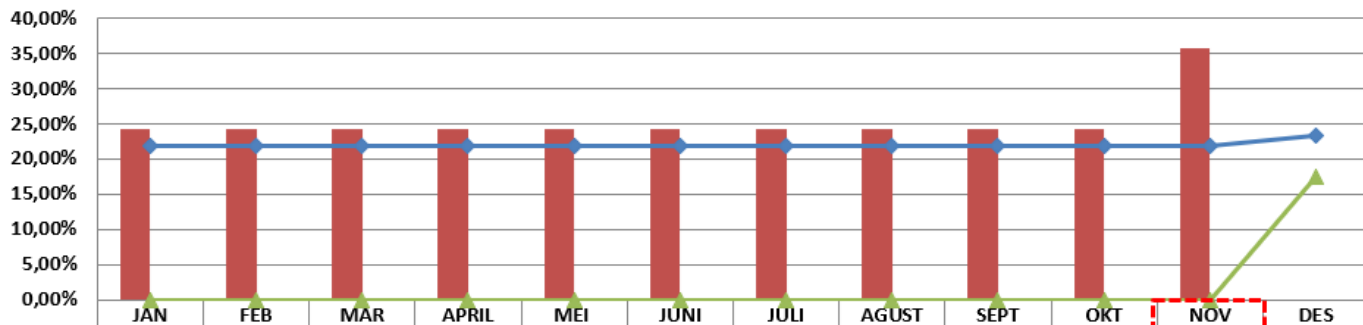[illegible]

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 3.300.000.000)


Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D NOVEMBER
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	6 Lokasi <u>Juara I</u> (Kota Semarang), <u>II</u> (Banyumas), <u>III</u> (Kota Magelang)- (<u>Juara Harapan : I -Kab.Pati</u>), <u>II - Kota Salatiga</u> , <u>III - Kab. Temanggung</u>) <u>Keterangan Konversi Luasan Kumuh yang tertangani:</u> <u>1. Kota Semarang: 5,43 ha (Non RPJMD); 2. Kab Banyumas: 3,08 ha (Non RPJMD); 3.Kota Magelang: 0,05 ha (Non RPJMD); 4. Kab Pati: 0,00 ha (tidak mengurangi luas kumuh, hanya menurunkan skor kumuh); 5. Kota Salatiga: 1,60 ha (Non RPJMD); 6. Kab Temanggung: 1,24 ha (RPJMD)</u>
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	0 Dokumen
	Tugas Tambahan	• <u>Penyusunan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)</u> • <u>Penyusunan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah</u> • <u>Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman</u> • <u>Kompetisi Kawasan Sayung (PA 2022)</u>

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 610.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D NOVEMBER
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	0 Lokasi (<u>koordinasi pelaksanaan integrasi penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan, Surakarta, Tegal, Kab. Purworejo, Kab. Demak</u> <u>Pengelolaan database penanganan RTLH di kawasan kumuh, FGD Pendampingan penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh</u>) <u>Rapat internal pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh bersama Bidang Perumahan, Koordinasi berupa pendataan RTLH di Kawasan Kumuh Provinsi Jawa Tengah</u> <u>Verivali RTLH di Kawasan Kumuh (5 Lokasi → Kebumen, Salatiga, Batang < Kab Semarang dan Pati)</u>
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	0 Dokumen (<u>Koordinasi internal inventarisasi usulan bankeu Kab/Kota, Monev pelaksanaan fisik Bankeu Sarpras ke Pati</u>) <u>Koordinasi dengan Kab Jepara terkait progres pembangunan Bankeu Sarpras di Kawasan Kumuh yang berlokasi di Ds. Karimunjawa Kec. Karimunjawa)</u>
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen - <u>FGD peran pemerintah Desa dalam penanganan kawasan kumuh</u> - <u>Koordinasi BKM di kawasan permukiman kumuh di Kab. Boyolali dan Jepara</u> - <u>Studi lapangan pengelolaan sampah pada kawasan permukiman di Provinsi Jawa Barat</u> - <u>Kunjungan Lapangan Pengelolaan SPALDT (Sistem Pengelolaan Air Limah Domestik Terpusat) Sewon - Kec. Sewon Yogyakarta</u>
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	0 Dokumen - <u>Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi studi identifikasi kawasan permukiman kumuh skala prioritas provinsi di Kab. Grobogan dan Kota Surakarta</u> - <u>Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kab. Wonosobo, Magelang, Sragen, Demak, Kendal, Kota Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten Kab. Batang, Kab. Rembang, Kab. Brebes dan Kab. Blora</u> - <u>FGD penanganan kawasan permukiman pesisir utara Provinsi Jawa Tengah</u> - <u>Rapat Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh degan Kab/kota melalui SIKAPER (Sistem Informasi Kawasan Permukiman)</u>

Bidang Pertanahan

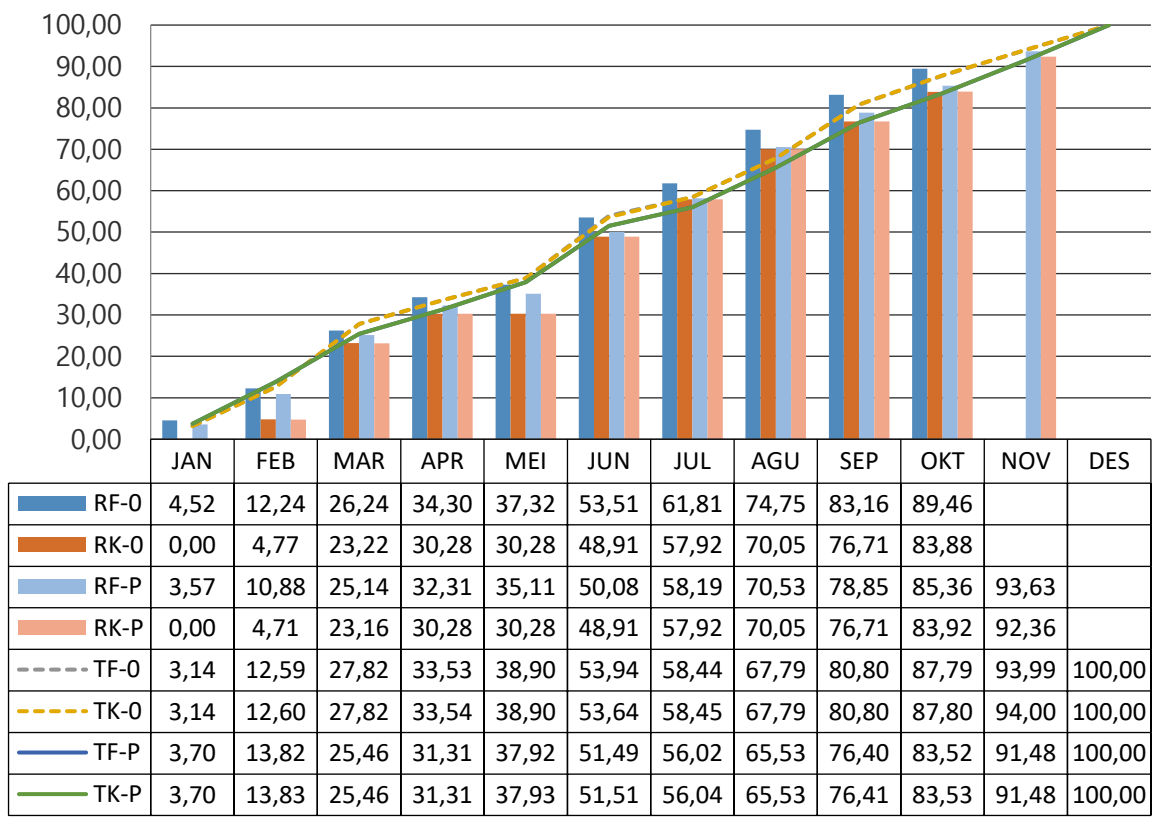

	Okt (Murni)	Nov. (PA)	Des. (Prognosis)
Target Fisik	87,79	93,99	100,00
Target Keu	87,80	94,00	100,00
Real. Fisik	89,46	96,01	100,00
Real. Keu	83,88	95,29	99,79
Dev. Fisik	1,67	2,02	0,00
Dev. Keu	-3,92	1,29	0,21


Potensi SILPA s.d. Akhir November:
Rp. 3.198.676,-

Sumber:
Sisa belanja makan minum rapat, ATK, honor
narasumber, perjalanan dinas, BPJS.

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah								
1	Identifikasi Kepemilikan Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan	74.830.000	90,16	90,16	-1,42	-1,42	Pendataan Kepemilikan Tanah PLN yang Terdampak Pembangunan SUTET di Kab. Semarang akan dilaksanakan di bulan Desember karena menyesuaikan kesiapan dari instansi yang memerlukan tanah	Dilaksanakan pada minggu ke-1 atau 2 Desember 2022
2	Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pada Trase atau Basic Design di Lokasi Rencana Pembangunan	74.844.000	95,92	95,92	-4,08	-4,08	Kepemilikan Tanah PLN yang Terdampak Pembangunan SUTET di Kab. Semarang akan dilaksanakan di bulan Desember karena menyesuaikan kesiapan dari instansi yang memerlukan tanah	Dilaksanakan pada minggu ke-1 atau 2 Desember 2022
Seksi Fasilitas Permasalahan Pertanahan								
1	Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	15.750.000	51,43	51,43	-34,29	-34,29	Pelaksanaan Rapat Penyelesaian Tanah Makam Daksinoloyo dan Pracimaloyo akan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, rapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	akan dilaksanakan bulan Desember
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan								
1	Pemantauan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (LP2B)	22.100.000	80,00	59,88	-20,00	-40,12	Pelaksanaan pemantauan menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembagian sertifikasi LP2B di Kab. Cilacap pada tanggal 1 Desember 2022	akan di realisasikan pada bulan Desember

BIDANG PERTANAHAN

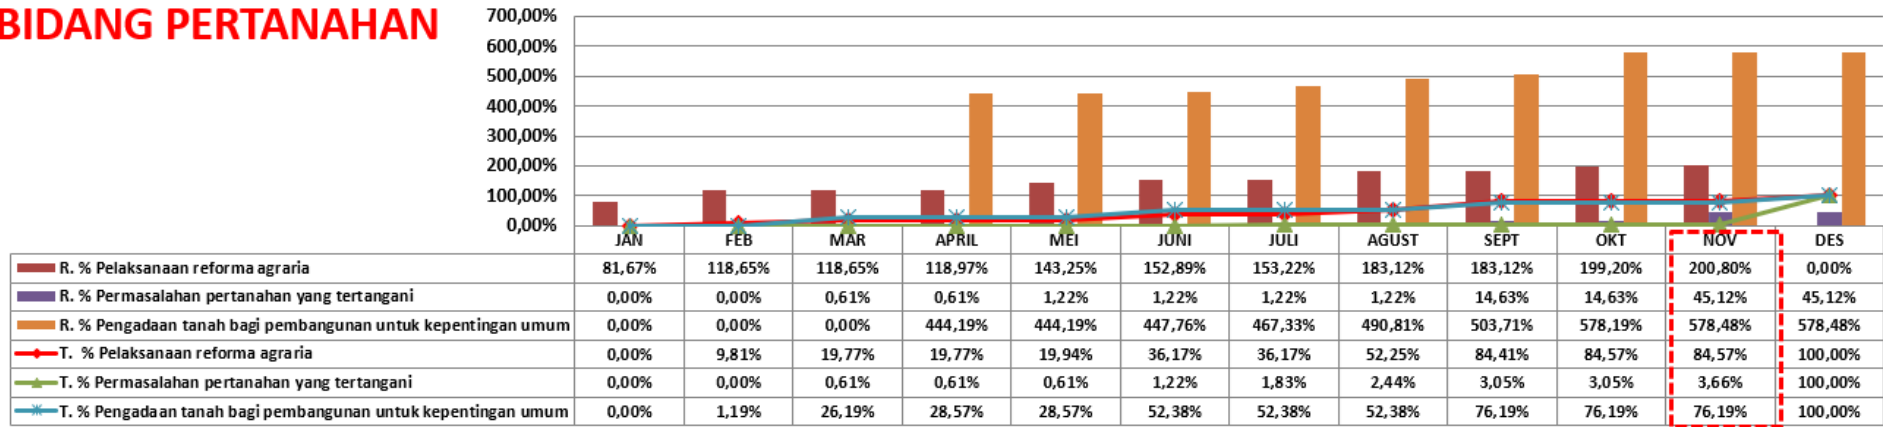

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA
% Persentase pelaksanaan reforma agraria

TARGET 2022
100%

REALISASI S.D NOVEMBER
200,80%

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. NOVEMBER
Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan	20%	40,16%
Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)	420 Bidang: 5 Bidang HGU 15 Bidang HP 400 Bidang Pemantauan Penlok 1 kali <u>Diseminasi/rakor bidang pertanahan</u>	917 Bidang: 6 Bidang HGU 13 Bidang HP 898 Bidang 1 kali
Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)	2 <u>Lokasi</u>	3 <u>Lokasi</u>
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)	200 bidang Pemantauan Sertifikasi 7 <u>Lokasi</u> Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA 5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA	329 Bidang 6 Lokasi 6 <u>Kabupaten/Kota</u>


Lanjutan ...	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Rp. 550.000.000)	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D NOVEMBER
		% Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	100%	578,48 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D NOVEMBER
Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	20%	115,70%
Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	2.000 Bidang Penlok	12.042 Bidang Penlok (Penerbitan SK Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Cilacap, Bendungan Jlantah-Karangannyar, Bendungan Pidekso-Wonogiri dan TPST Kab. Magelang); Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500kV <i>pedan sirkuit 2 section 2</i> di Kab. Klaten, Boyolali & Semarang); Pelaksanaan pengadaan tanah (Konsultasi Publik Pengadaan Tanah DI Pidekso & TPST Magelang)
Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	100 Bidang ZNT	100 Bidang ZNT (Perkiraan Nilai Zonasi Nilai Tanah di Daerah)

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Rp. 500.000.000)	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D NOVEMBER
	% Permasalahan pertanahan yang tertangani	100%	45,12 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. NOVEMBER
Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	20%	9,02%
Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	150 Bidang LP2B 8 Bidang TKD	50 Bidang LP2B (di Kab. Blora) 20 Bidang TKD (di Kab. Klaten) - Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikat LP2B & TKD - Koordinasi Penetapan Lokasi Objek Bidang Tanah yang akan disertifikat - Pelaksanaan pra sertipikasi, Pelaksanaan Verifikasi Berkas Persvaratan , Koordinasi dalam rangka persiapan pendampingan pemasangan tanda batas tanah LP2B di Kab. Semarang, Cilacap, Blora, Kab. Magelang - Pengukuran Tanda Batas Tanah Kab. Blora - Pembayaran biaya PNPB Kabupaten Blora & Cilacap
Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	6 Sengketa	4 Sengketa - Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanjung Mas (Pemberian Santunan) & Permasalahan keberatan pemberian santunan bangunan madrasah pada kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan Tanjung Mas - Penanganan Permasalahan Pertanahan TPU Dasiknoloyo dan Pracimoloyo di Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo , 1. Permasalahan pertanahan di wilayah perbatasan Kab. Karanganyar dan Kab. Sragen di Desa Dan Desa - Mediasi Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kab. Sukoharjo, Surakarta (TPU), dan Sragen terkait Pemanfaatan ruang (Batas Tanah di Desa Bulungkulon Kec. Jekulo) - Mediasi sengketa pengelolaan Umbul Jetak di Kab. Semarang dan Boyolali

Bidang Keterpaduan PKP

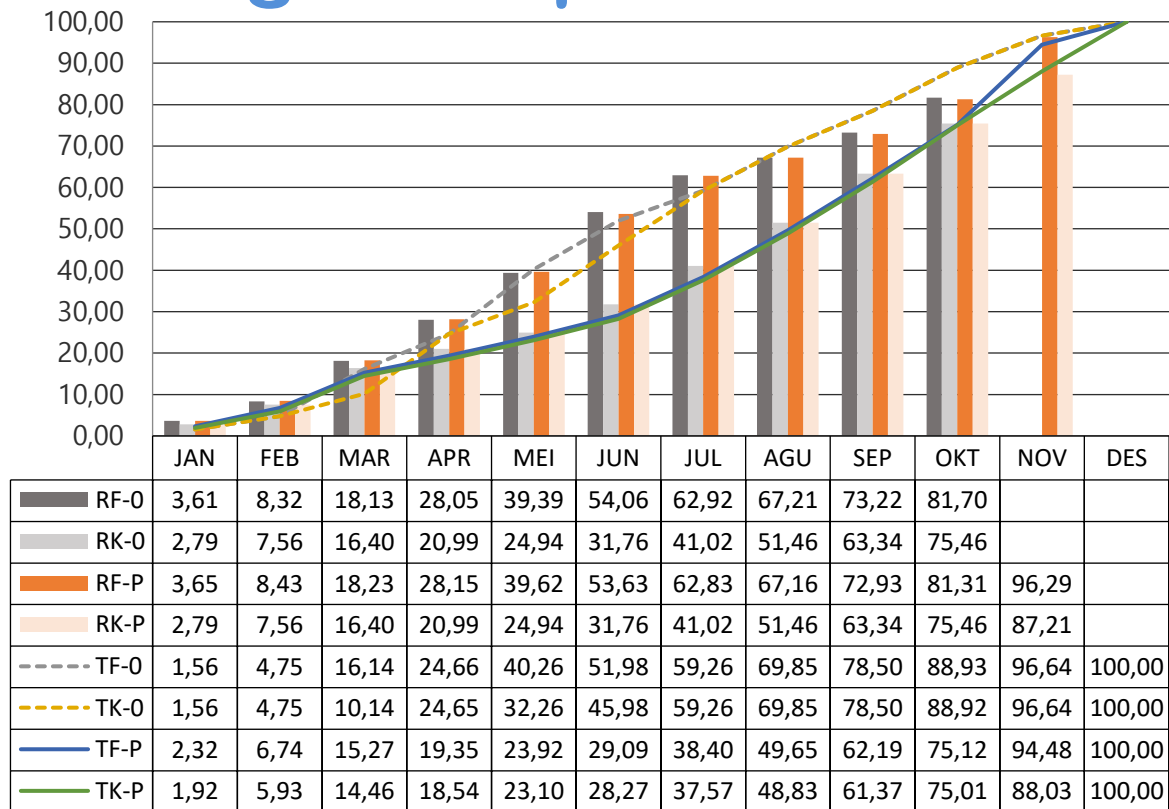

	Okt (Murni)	Nov. (PA)	Des. (Prognosis)
Target Fisik	88,93	94,48	100,00
Target Keu	88,92	88,03	100,00
Real. Fisik	81,70	96,29	100,00
Real. Keu	75,46	87,21	99,79
Dev. Fisik	-7,23	1,81	0,00
Dev. Keu	-13,46	-0,82	-0,21

Potensi SILPA s.d. Akhir November:
Rp. 5.190.237,-

Sumber:
Sisa kontrak, belanja makan minum rapat,
perjalanan dinas, BPJS, honor tenaga
pendukung.

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Realisasi (%)		Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fis	Keu	Fis	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur								
1	Workshop Implementasi dan Pengembangan Pelayanan Klinik PKP	23.114.000	91,52	13,90	0,44	-77,18	Workshop Klinik PKP dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan Desember
2	Fasilitasi Pelaksanaan KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	151.741.000	99,97	99,85	0,00	-0,11	Progres fisik sudah terlaksana sesuai target, realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Desember	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan Desember
3	Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	16.781.000	78,55	29,68	27,40	-21,45	- Terdapat sisa honor narasumber - Pelaksanaan Talkshow Gelar KKN Expo pada 29 November 2022	Penyerapan anggaran honorarium untuk FGD RPD-Renstra di bulan Desember
Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman								
1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	44.421.000	100,00	95,73	0,00	-4,27	Perjalanan dinas ke Kab. Pekalongan terkait acara Sosialisasi Kegiatan SRPP dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan Desember

BIDANG KETERPADUAN PKP

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,
DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(Rp. 1.500.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA


% Ketersediaan kebijakan, data, dan
evaluasi kinerja perumahan rakyat dan
kawasan permukiman

TARGET 2022

100%

REALISASI s.d NOVEMBER

53,85 %

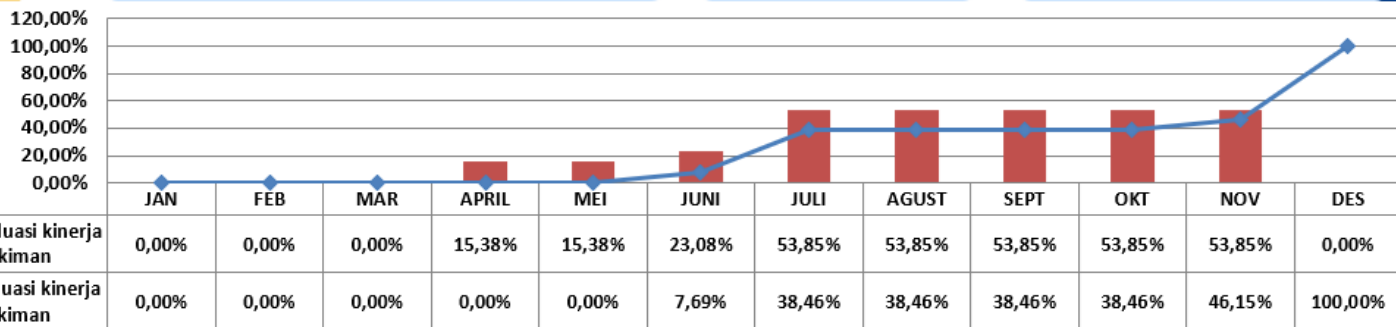

■ R. % ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman
◆ T. % ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

TARGET 2022

REALISASI S.D NOVEMBER

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

5 Dokumen

3 Dokumen (1 Dokumen Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi, 1 Dokumen Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 1 Dokumen Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
- Rapat Koordinasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah
- KKN Tematik Periode III
- Workshop Klinik PKP Tahap 1
- Koordinasi dengan Pokmas Calon Penerima Izin Pemanfaatan Alat
- Rapat Koordinasi Forum Kemitraan
- Talk Show Gelar KKN Expo Rumah Lavak Huni

Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan

3 Dokumen

1 Dokumen Evaluasi Lingkup Bidang PKPP Tahun 2021, TA 2022
• Rapat Evluasi Lingkup PKP
• Uji Petik Juknis Pedoman Evaluasi PKP

Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan

5 Dokumen

2 (Dokumen Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data PKP Provinsi Jawa Tengah & Review Keterisian Data PKP Provinsi Jawa Tengah)
Tugas Tambahan : Rapat Persiapan Forum Data; Forum Data; Koordinasi Pengumpulan Data; Penyusunan Buku Data; Pengembangan Aplikasi; Penyusunan Laporan Pengembangan Aplikasi Konsultan




PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir November 2022

Bidang Keterpaduan PKP

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 11 November 2022	November (20 hari)
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 10 Maret 2022	Maret s.d. Oktober 2022



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir November 2022


Respon LapoGub

TOTAL ADUAN JAN-NOV = 151

Pada bulan **NOVEMBER 2022**, terdapat 11 laporan permintaan informasi melalui web LAPORGUB dan SUDAH TERJAWAB TUNTAS.

Adapun rincian laporan tersebut terdiri dari :

- a. RTLH = 8 laporan
- b. BSPS = 3 laporan

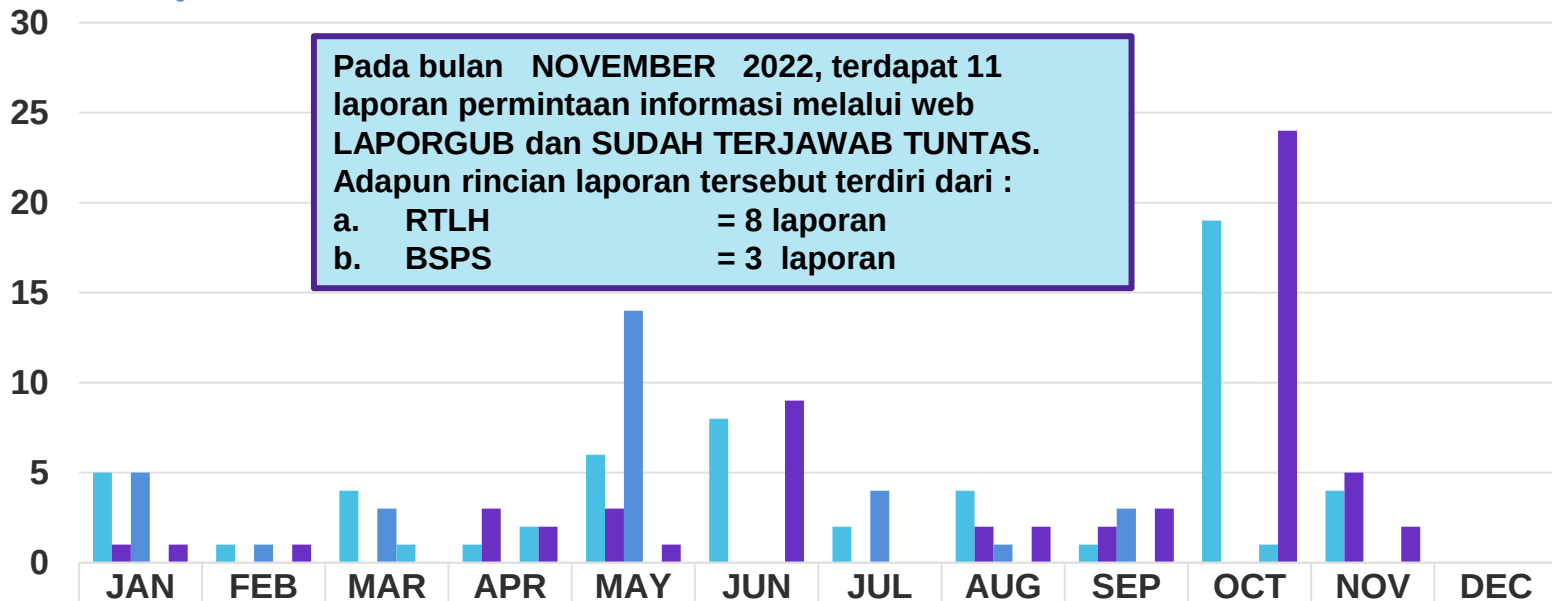

WEB	5	1	4	1	6	8	2	4	1	19	4	
IG	1	0	0	3	3	0	0	2	2	0	5	
WHATSAPP	5	1	3	0	14	0	4	1	3	0	0	
FACEBOOK	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	
SMS LAPORGUB	1	1	0	2	1	9	0	2	3	24	2	

TOTAL

12

3

8

8

24

17

6


9

9

44


11

Konten Berita Web Dinas

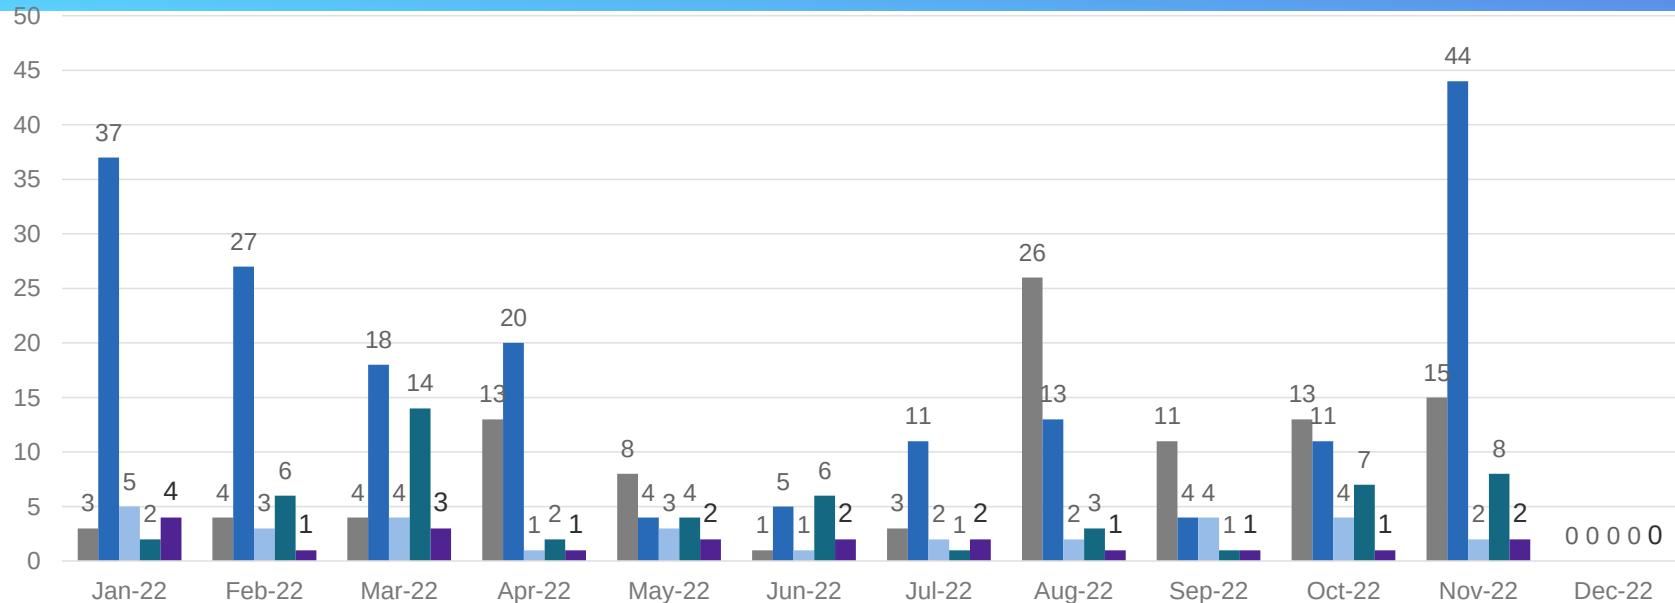


	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
■ Sekretariat	3	4	4	13	8	1	3	26	11	13	15	0
■ Perumahan	37	27	18	20	4	5	11	13	4	11	44	0
■ Kawasan	5	3	4	1	3	1	2	2	4	4	2	0
■ Keterpaduan	2	6	14	2	4	6	1	3	1	7	8	0
■ Pertanian	4	1	3	1	2	2	2	1	1	1	2	0
TOTAL	51	41	43	37	21	15	19	45	21	36	71	

Laporan Hasil Survey Kepuasan Website




Laporan Jumlah Kenaikan Pengunjung Website

Minggu IV




Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website


Minggu IV



Konten Media Sosial



Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos



ANALITIK TWITTER

Iklan **Analitik** ▼


Bantuan? Ada umpan balik? DisperakimJtg ▼ 

Aktivitas Tweet

📅 November 2022 ▼

📄 Ekspor data ▼

Tweet Anda memperoleh **8.0K tayangan** selama periode **30 hari** ini



TWEET ANDA

Selama periode 30 hari ini, Anda memperoleh **265 penayangan** per hari.

Tweet

Tweet Populer

Tweet dan balasan

Promosi

Tayangan

Engagement

Tingkat engagement



DisperakimJtg #JatengTangguh @DisperakimJtg · 29 Nov
PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng menerima Kunjungan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah pd kegiatan "Visitasi dan Verifikasi Badan Publik Tahun 2022", pada Senin (28/11), yang merupakan tahapan ke-3 dalam rangkaian pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik. pic.twitter.com/bobsyry9qm

Lihat aktivitas Tweet

54

2

3,7%

Engagement

Menampilkan 30 hari dengan frekuensi harian

Tingkat engagement

2.0%

2.0% tingkat engagement rata-rata



ANALITIK FACEBOOK

Gambaran umum konten
Jelajahi tren berharga dari konten yang baru saja Anda buat dan bagikan.

Postingan Facebook Cerita Facebook

Jangkauan

Jangkauan postingan ①


341

Total dari 90 hari terakhir vs 90 hari sebelumnya




Jangkauan postingan median per jenis media ①

Untuk postingan yang dibuat dalam 90 hari terakhir



Jangkauan postingan median per format konten ①

Untuk postingan yang dibuat dalam 90 hari terakhir




Interaksi

Tanggapan, komentar, dan berbagi postingan


105

Total dari 90 hari terakhir vs 90 hari sebelumnya




Rata-rata tanggapan, komentar, dan frekuensi postingan dibagikan per jenis media ①

Untuk postingan yang dibuat dalam 90 hari terakhir



Rata-rata tanggapan, komentar, dan frekuensi postingan dibagikan per format konten ①

Untuk postingan yang dibuat dalam 90 hari terakhir



Postingan organik dengan kinerja tinggi

Berikut ini adalah postingan yang memiliki kinerja baik sepanjang 90 hari terakhir. Memahami apa yang bekerja bisa membantu Anda memutuskan apa yang akan dikerjakan dan berbagi dengan orang sekitar sehingga Anda bisa tetap meningkatkan kinerja bagus tersebut.

Jangkauan tertinggi pada postingan ①



Postingan Facebook
KOMPETISI PENATAAN KAWASAN PESISIR SAYUN...
19 Sep 2022 20:06

Postingan ini menjangkau 330% lebih banyak orang (99 orang) daripada postingan median Anda (23 orang) di Facebook.

Tanggapan tertinggi pada postingan ①



Postingan Facebook
KOMPETISI PENATAAN KAWASAN PESISIR SAYUN...
19 Sep 2022 20:06

Postingan ini menerima 6 tanggapan dibandingkan dengan postingan median Anda (0 tanggapan) di Facebook.

Komentar tertinggi pada postingan ①




Postingan Facebook
Pemerintah Provinsi Jawa Ten melalui Disperakim ProvJater
7 Okt 2022 23:59

Postingan ini menerima 6 komentar dibandingkan dengan postingan median Anda (0 komentar) di Facebook.

Hasil

Jangkauan Halaman Facebook ①

492 ↑ 34.8%




Kunjungan Halaman Facebook ①

233 ↑ 52.3%



Halaman Facebook Suka Baru ①

7 ↓ 46.2%



Insight akun

Lihat semua

ANALITIK INSTAGRAM

1.870 akun dijangkau dalam 30 hari terakhir
990 bukan pengikut



Gambaran Umum

Anda mendapatkan 47 pengikut lebih banyak dibandingkan dengan 4 Okt – 2 Nov.

Akun yang dijangkau	1.870	-9,6%	>
Akun yang berinteraksi	177	-12,4%	>
Total pengikut	2.326	+2%	>

PENEKANAN

1. Pelaksanaan kegiatan TA 2022 :
 - Percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2022, laporkan setiap progressnya
 - Percepatan **penginputan realisasi swakelola pada SPSE** terutama untuk **Bidang Perumahan dan Subbag Umpeg,**
 - Potensi SILPA agar segera dilaporkan (koordinasi dengan subbag Keuangan dan subbag Program)
 - Data – data capaian dan evaluasi pelaksanaan untuk laporan pengendalian TW IV dan penyusunan LKPJ, LPPD, LKJIP, LKJ Tahun 2022
 - Laporan akhir pekerjaan Jasa Konsultansi (termasuk studi/kajian), Prosiding, laporan – laporan kegiatan agar dikompilir oleh Subbag Program (dalam bentuk hard dan soft file)
2. Kegiatan dengan perhatian khusus :
 - Penyusunan Renstra - RPD segera dipercepat, cek timeline dan sesuaikan. Batas waktu Penyusunan Draft Dokumen Renstra – RPD adalah Akhir Desember 2022 (Bidang Keterpaduan),
 - Pelaksanaan Kompetisi Sayung, koordinasi dengan Bappeda (administrasi kegiatan dan substansi oleh bidang Kawasan (termasuk spj), administrasi pendaftaran oleh subbag program)
3. Persiapan TA 2023, Bidang dan Sekretariat agar cermati kembali :
 - **RKA-SKPD dan RAB dengan mendasarkan target kinerja tahun 2023,**
 - **Rencana Kerja Operasional (RKO) Fisik dan Keuangan** Tahun 2023, sesuai dengan Rincian Anggaran Kas yang telah diinput, serta mempertimbangkan proses pengadaan barang dan jasa,

PENEKANAN

- **Rencana Kerja Operasional (RKO) Kinerja Tahun 2023**, dengan memperhatikan target kinerja setiap bulan (ada progress aktivitas bulanan),
 - **Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2023**, dengan menyebutkan nama paket sesuai dengan Sub Sub Kegiatan (SSK),
 - draft **Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023** disusun berdasarkan DPA Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan memperhatikan Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada *E-Planning* RKPD Tahun 2023,
 - **Paket – paket pekerjaan yang dapat dilaksanakan lelang dini** (percepatan di awal tahun) dan mengkoordinasikannya dengan Biro Adm Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ),
 - **BNBA Bansos/Hibah yang berpotensi tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2023**, dan segera mempersiapkan BNBA pengganti yang dapat diusulkan melalui mekanisme perubahan anggaran.
4. Guna melengkapi Dokumen Evaluasi SPIP Semester 2, mohon **dokumen pendukung tindak lanjut deviasi negatif (berupa nota dinas/ notulen/ dokumentasi, dll)** diunggah ke <https://bit.ly/DAKDUKEVALUASISIPSMS2> s.d. **13 Desember 2022**.

PENEKANAN

Persiapan proses **Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2024 :**

- 1. Mempersiapkan Usulan kegiatan (aktivitas) yang direncanakan akan dilaksanakan pada TA 2024 simultan dengan penyusunan cascading Sebagai bridging perencanaan.**
- 2. Menyiapkan usulan dan memastikan kesiapan readiness criteria** sesuai ketentuan yang berlaku, terutama pada kegiatan :
 - Bantuan stimulan terkait penyediaan rumah untuk mengurangi backlog, relokasi program pemerintah dan penanganan pasca bencana,
 - Bantuan stimulan terkait peningkatan kualitas rumah penanganan pasca bencana,
 - Bansos/Hibah/Bankeu terkait pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh,
- 3. Point 1 dan 2 tersebut diarahkan untuk mendukung hal - hal sebagai berikut :**
 - Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah,
 - Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang,
 - Pengelolaan Kawasan Pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan,
 - Implementasi SPM Perumahan Rakyat,
 - Arah Kebijakan lainnya yang menjadi fokus intervensi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PENEKANAN

**Rencana Pelaksanaan kegiatan Rapat Konsolidasi
Akhir Tahun (Evaluasi Tahun 2022) dan
Persiapan Pelaksanaan kegiatan TA 2023,
akan dilaksanakan pada tanggal
26 – 27 Desember 2022**



Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR OKTOBER 2022



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir Oktober TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan


KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

NO.	PROGRAM	MURNI		PERUBAHAN	
		(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000	39,86	17.753.221.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000	44,51	19.825.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000	1,37	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000	7,41	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000	3,37	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000	1,23	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000	1,12	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000	1,12	500.000.000
	TOTAL	100	45.424.693.000	100	44.538.221.000

M
U
R
N
I

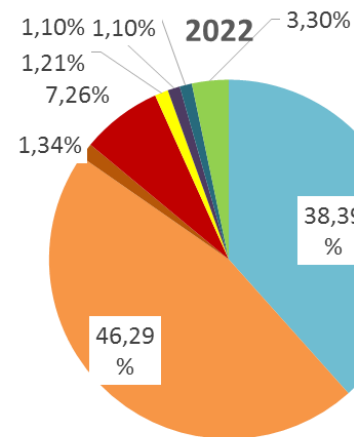

P
E
R
U
B
A
H
A
N

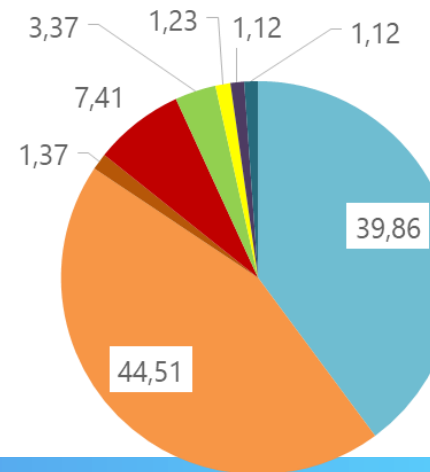




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir Oktober 2022

^{*)}Realisasi keuangan diambil dari e-controlling status Senin, 31 Oktober 2022

Disperakim

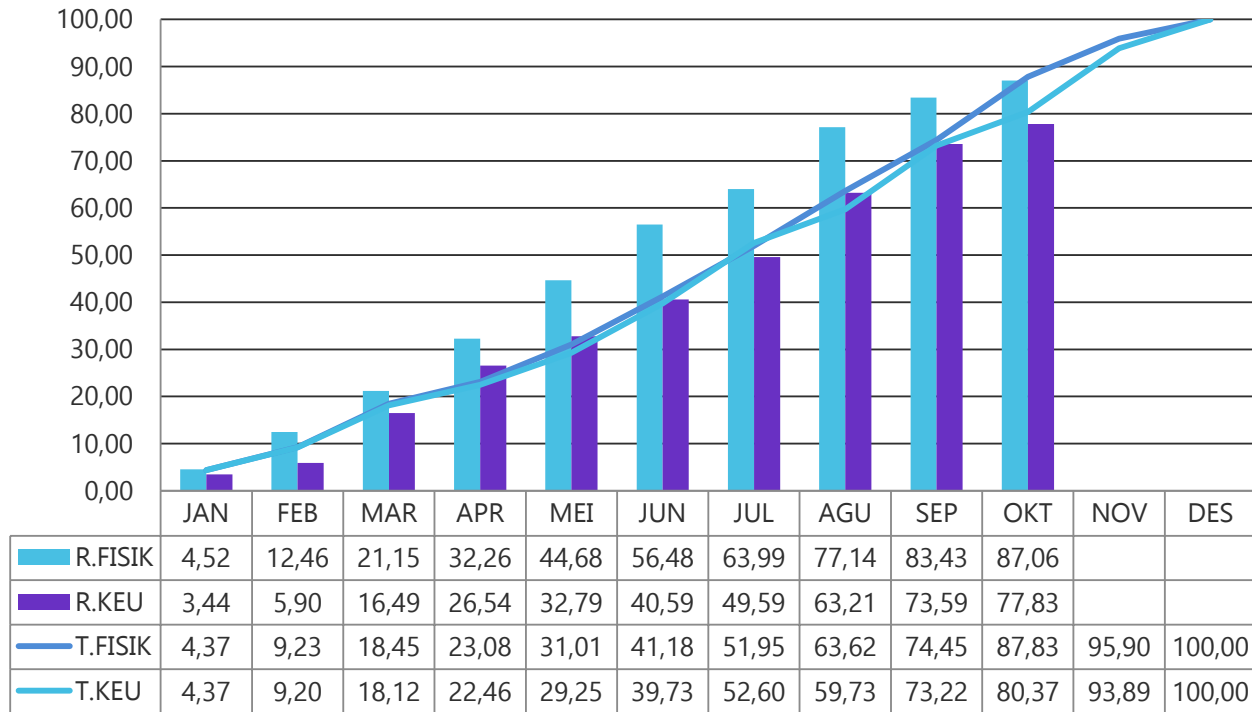

	Oktober	Nov. (Prognosis)
Target Fisik	87,83	87,83
Target Keu	80,37	80,37
Real. Fisik	87,06	92,06
Real. Keu	77,83	89,89
Dev. Fisik	-0,77	-3,84
Dev. Keu	-2,54	-4,00

Progres Fisik dan Keuangan Prov. Jateng


(STATUS 1 NOV 2022)

Target Fisik: 75,99%

Realisasi Fisik: 68,98%

Realisasi Keuangan: 68,50%

Sekretariat

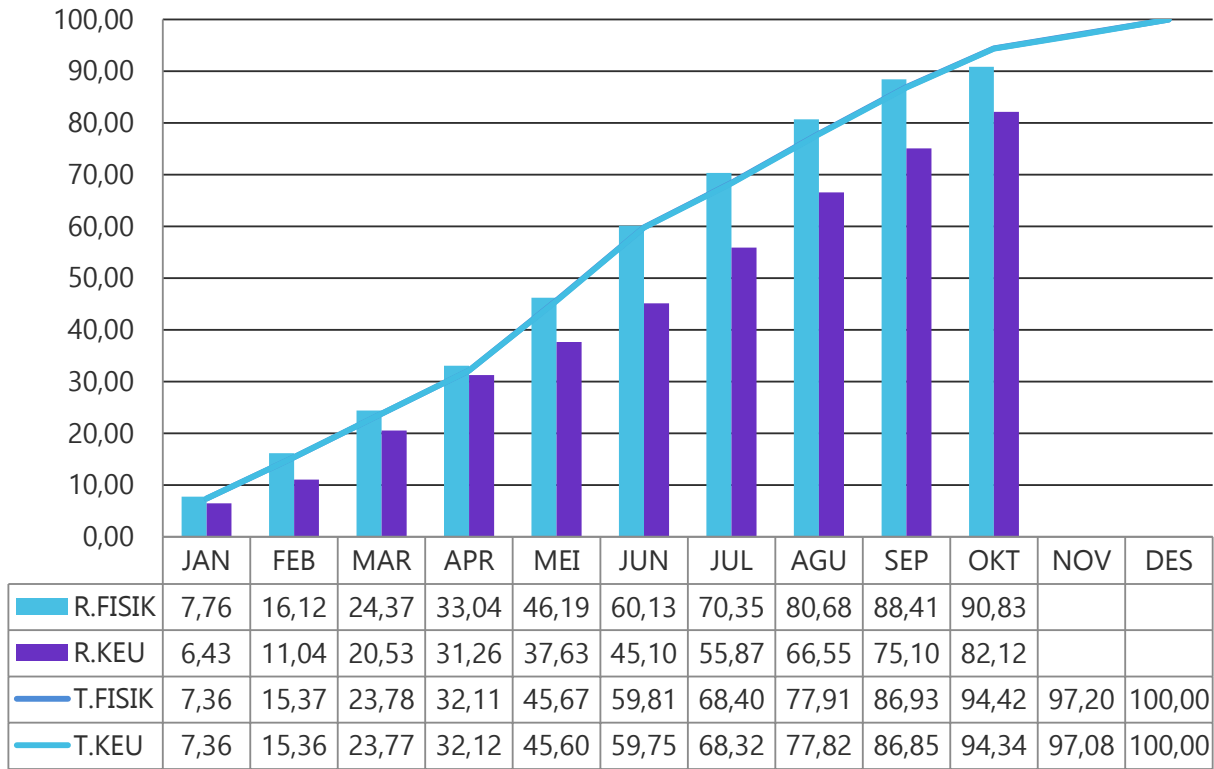


	Oktober	Nov. (Prognosis)
Target Fisik	94,42	97,20
Target Keu	94,34	97,08
Real. Fisik	90,83	94,94
Real. Keu	82,12	93,56
Dev. Fisik	-3,59	-2,26
Dev. Keu	-12,22	-3,52

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Keuangan						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.524.693.000	-6,00	-14,47	- Dibayarkan sesuai dengan dinamika kepegawaian - Penganggaran semula dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama 10 bulan.	Akan ada tambahan alokasi anggaran melalui Perubahan Anggaran

Bidang Perumahan

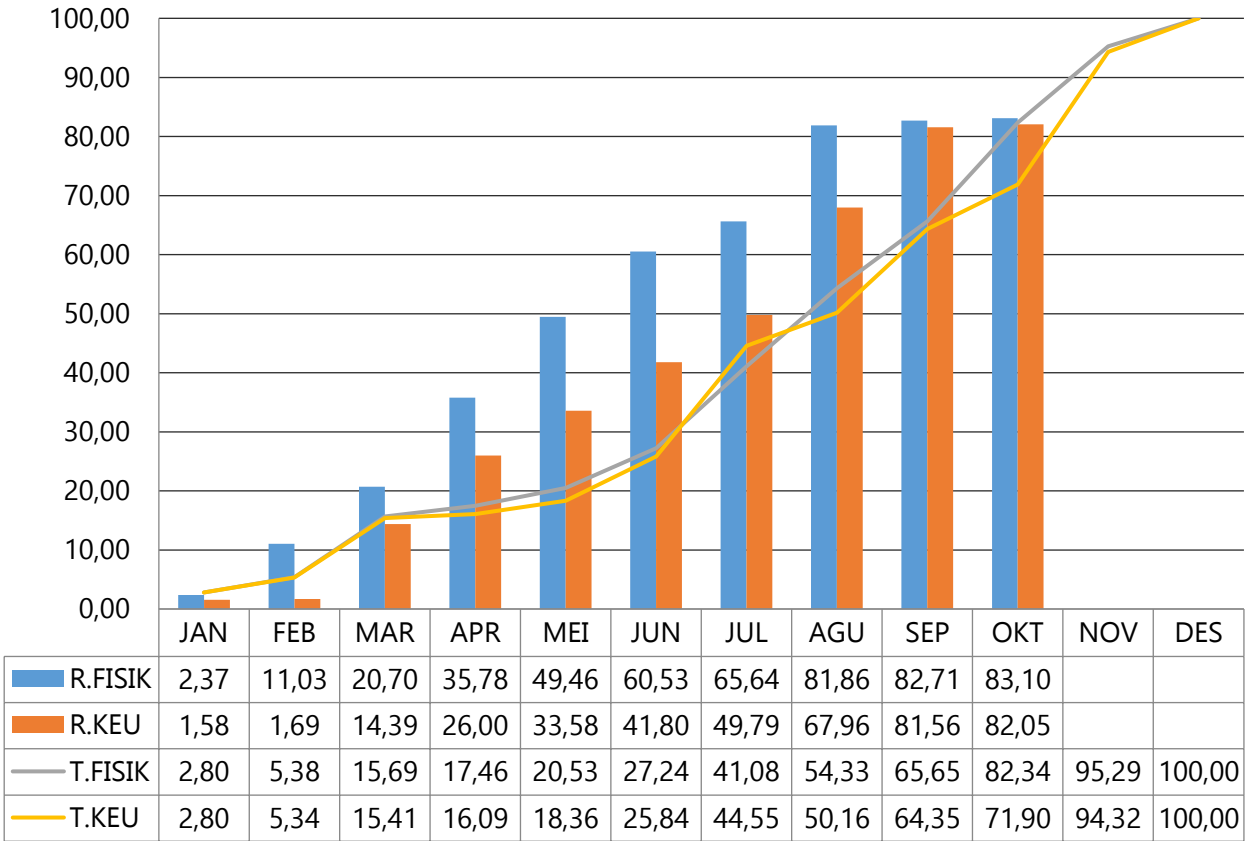

	Oktober	Nov. (Prognosis)
Target Fisik	82,34	95,29
Target Keu	71,90	94,32
Real. Fisik	83,10	88,55
Real. Keu	82,05	88,34
Dev. Fisik	0,76	-6,74
Dev. Keu	10,15	-5,98

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.826.000	5,90	-11,26	Rapat koordinasi Renaksi SPM yang telah dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2022 belum dibayarkan	Realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
2	Rapat Rencana Aksi SPM Bidang Perumahan Rakyat	2.662.000	0,01	-38,72	Belanja ATK belum dibayarkan karena pembelian dikelola langsung dalam lingkup bidang	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
3	Pelaksanaan Verivali Lapangan Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	96.536.000	4,19	-1,95	Belanja ATK belum dibayarkan karena pembelian dikelola langsung dalam lingkup bidang	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
4	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	0,01	-1,93	Sisa kontrak 19 paket jasa konsultansi senilai Rp 48.478.000	Potensi SILPA
5	Sosialisasi Hunian Tetap (HUNTAP), Hunian Sementara (HUNTARA), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat / Komunitas Rusus/Rusun di Jawa Tengah	11.100.000	0,01	-14,61	Belanja Makan minum rapat Sosialisasi Rusun di Kota Magelang ditanggung oleh Pemkot Magelang	Dioptimalkan untuk pelaksanaan Sosialisasi HUNTAP di Kab. Pemalang dan Temanggung
6	Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	5.723.000	10,48	-18,61	- Sisa belanja makan minum rapat - Sebagian anggaran dialihkan ke SSK lain melalui perubahan anggaran	- Dioptimalkan untuk Sosialisasi BP2BT pada masyarakat di awal November
Seksi Perumahan Swadaya						
1	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	27.345.000	16,33	-8,35	Sisa belanja Perjadin akan digunakan untuk monev BNBA perubahan	Akan dijadwalkan kembali pada bulan november untuk percepatan penyelesaian pekerjaan bansos PB

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		

Seksi Perumahan Umum

1	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	612.000.000	-7,84	-7,84	4 penerima Bansos Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana mengundurkan diri karena: - 2 calon penerima akan diusulkan kembali sebagai calon penerima bantuan PB Bencana 2023 - 1 calon penerima sudah pindah domisili ke Kalimantan - 1 calon penerima sudah menerima penanganan melalui BSPS pada Oktober 2021	Akan dilaksanakan penggantian Penerima Bantuan pada Perubahan Anggaran 2022
2	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	141.965.000	-0,57	-18,77	4 Penerima Bantuan mengundurkan diri sehingga terdapat 12 Tenaga Padat Karya belum bisa dibayarkan	4 BNBA Pengganti sudah diusulkan pada Anggaran Perubahan
3	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	800.000.000	-12,50	-12,50	Penyaluran Bansos Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana yang semula direncanakan disalurkan pada bulan Maret s.d. Juni sudah tersalurkan seluruhnya s.d. bulan April kecuali 2 penerima yang mengundurkan diri karena: - 1 Penerima sudah memiliki rumah - 1 penerima tidak mampu berswadaya	Bantuan yang tidak dapat tersalurkan telah disiapkan untuk dialokasikan kembali melalui Perubahan Anggaran TA 2022.
4	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	78.170.000	-4,38	-4,50	Terdapat Upah Tenaga Kerja Padat Karya yang belum bisa dibayarkan karena Penerima Bantuan yang mengundurkan diri	Akan dilakukan penggantian Penerima Bantuan pada Anggaran Perubahan
5	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah	2.170.000.000	-3,23	-3,23	Sudah tersalurkan seluruhnya kecuali 2 penerima yang mengundurkan diri karena: - 1 Penerima sudah memiliki rumah - 1 penerima tidak mampu berswadaya	Akan dilakukan penggantian Penerima Bantuan pada Anggaran Perubahan TA 2022

BIDANG PERUMAHAN

**PROGRAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN**
(Rp. 21.025.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Rumah layak huni yang
disediakan (RLH)

% Rumah tidak layak huni
yang tertangani (RTLH)

TARGET 2022


7,39 %





11,84 %

REALISASI S.D OKTOBER


6,47%

11,42 %
(dibawah target bulanan)

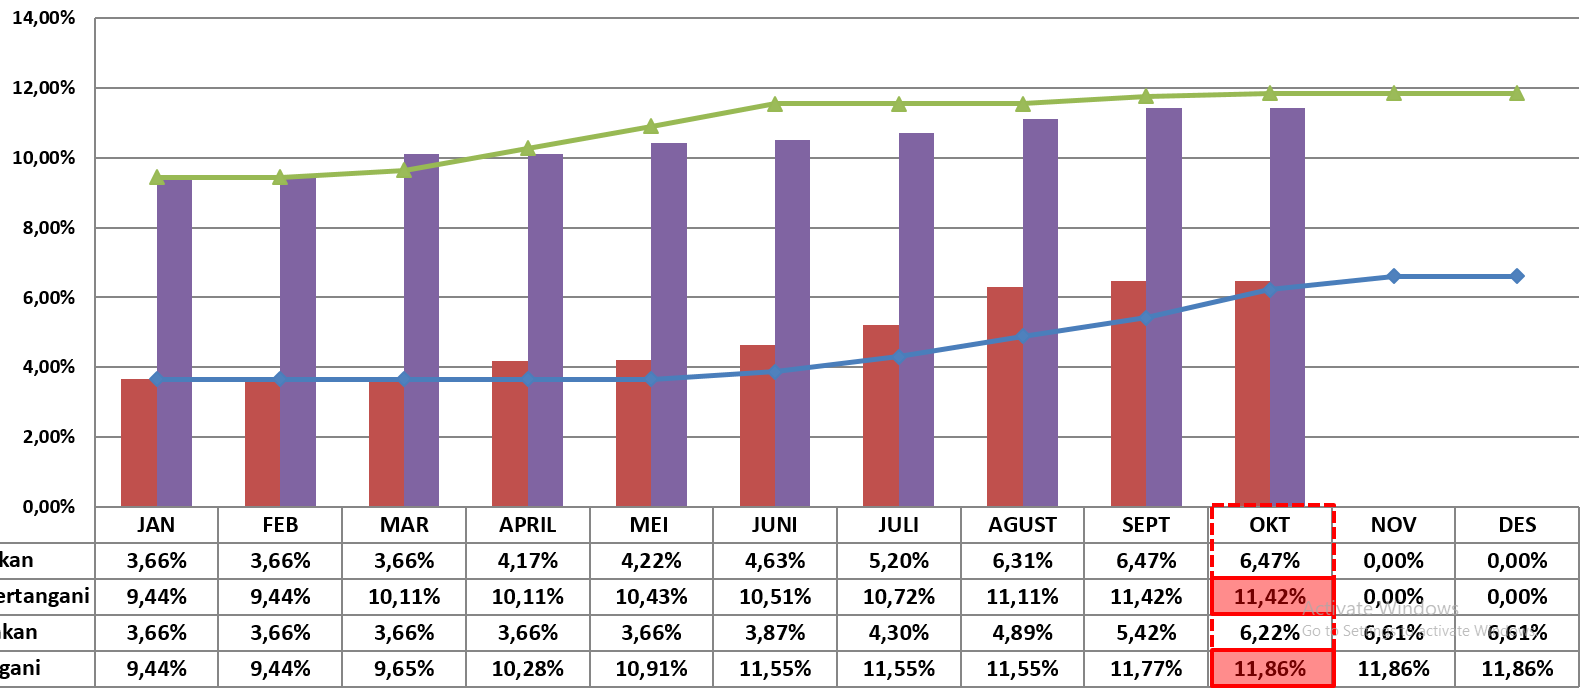


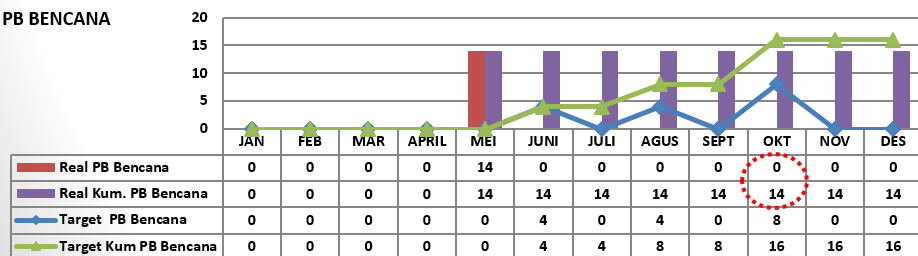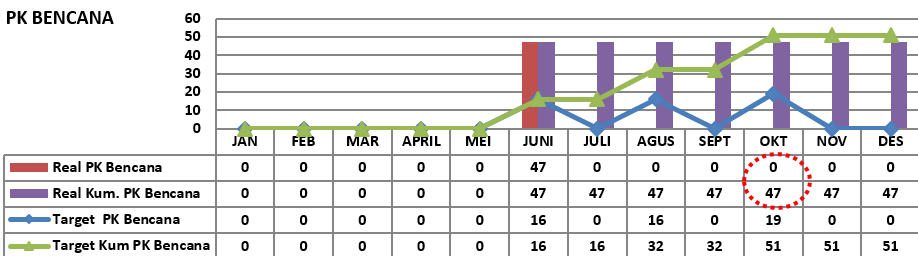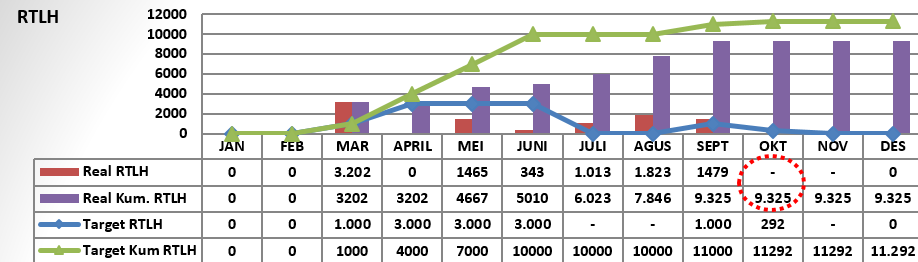

IK SUB KEGIATAN	T. 2022	REALISASI S.D OKTOBER
Jumlah unit rumah yang dibangun (PB Backlog)	253 unit	240 Unit PB Backlog 13 unit mengalami pergantian BNBA melalui PA TA 2022 - Penyelesaian termin 3 (swakelola) - Penyelesaian pembangunan 100% di: 7 unit di Kab. Purworejo, 10 unit di Kab. Sragen
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupemdes RTLH)	11.292 unit	9.325 6unit - Pencairan rekam 7 dan 8 - Desk Persiapan Pengalihan Kuota SK Gub - Finalisasi SK Gub - Movev
Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (PK dan PB Bencana, PB Relokasi)	51 unit PK 16 unit PB-B 62 unit PB-R	47 Unit PK Bencana 4 Orang gagal menerima bantuan: yang terdiri dari 2 orang Penerima mengundurkan diri karena kondisi rumah yang roboh sehingga akan diusulkan sbg calon penerima bantuan PB Bencana pada tahun 2023, 1 orang pindah domisili Kalimantan & 1 Orang sudah menerima penanganan melalui BSPS pada Oktober 2021 - Pembayaran Upah Padat Karya di Desa Bongas, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang untuk 4 x 3 orang 14 unit PB-B 2 Orang mengundurkan diri karena sudah membangun rumah secara swadaya 60 unit PB-R 2 Penerima mengundurkan diri karena 1 tidak mampu berswadaya, dan 1 orang lainnya sudah mempunyai rumah serta Penyiaapan BNBA pengganti untuk perubahan anggaran - Proses inputing Calon BNBA pengganti yang gagal untuk di proses dalam PA 2022
Jumlah dok perencanaan RUSUNAWA & RUSUS (Rencana Induk Rusun)	1 Dok	Pembangunan Rusun dan RC bukan menjadi kewenangan provinsi sehingga anggaran akan di lakukan pergeseran untuk pengoptimalan indikator kinerja yang lain.
Jumlah dokumen yang disusun	5 Dok	- Proses Verivali calon Penerima PB dan PK, Sosialisasi Teknis, Bimtek Validasi data simperum - Sosialisasi huntap & huntara kepada penghuni rusun/rusun di Kab. Kendal



Bidang Kawasan Permukiman

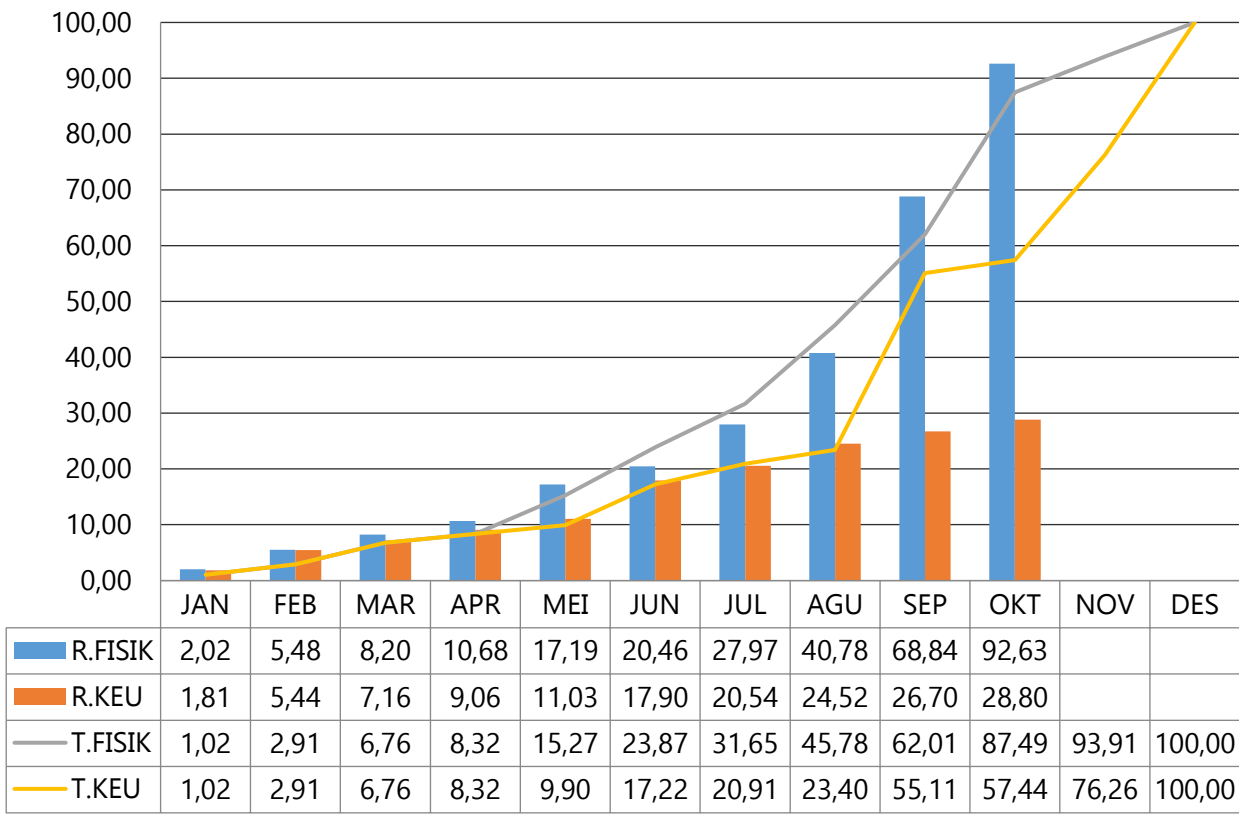

	Oktober	Nov. (Prognosis)
Target Fisik	87,49	87,49
Target Keu	57,44	57,44
Real. Fisik	92,63	94,76
Real. Keu	28,80	77,11
Dev. Fisik	5,14	0,85
Dev. Keu	-28,64	0,84

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	Persiapan Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	4.000.000	0,00	-4,98	Progres fisik sudah selesai. Sisa belanja makan minum rapat	Dioptimalkan untuk pelaksanaan rapat internal di minggu ke-3 bulan November
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	0,00	-16,89	Monev pendataan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh telah dilaksanakan melalui koordinasi ke Kab/Kota secara administratif melalui surat permohonan update data. Adapun tinjauan lapangan belum dilaksanakan.	Tinjauan lapangan akan dilaksanakan di bulan November ke 35 Kab/Kota
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kawasan Permukiman	126.851.000	0,00	-5,95	Peninjauan penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Kab/Kota telah dilaksanakan secara koordinatif. Tinjauan lapangan akan dilaksanakan menyesuaikan jadwal selesainya pelaksanaan pembangunan fisik kab/kota	Peninjauan lapangan ke Kab/Kota akan dijadwalkan kembali di bulan November-Desember

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman						
1	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2022	180.000.000	0,00	-21,5	Pembayaran Pekerjaan Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2022 sebesar 20 % akan dibayarkan setelah serah terima pertama (PHO) seluruh paket pekerjaan fisik hadiah lomba selesai.	PHO Hadiah Lomba Hari Habitat selesai di bulan November.
2	Pelaksanaan Fisik Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2022	1.890.000.000	17,14	-24,34	Uang muka tidak diambil oleh penyedia jasa	
3	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	0,00	-100,00	- Pembahasan laporan akhir dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 - Pembayaran sedang dalam proses pemenuhan kelengkapan berkas administrasi pembayaran	Akan dilaporkan sebagai progres bulan berikutnya
4	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	0,00	-10,49	Sisa kontrak	Akan dialihkan untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan lain melalui Perubahan Anggaran
5	Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	0,00	-100,00	- Pembahasan laporan akhir dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022 - Pembayaran akan diproses di bulan November	Akan dilaporkan sebagai progres bulan berikutnya

**PROGRAM
PENINGKATAN PSU
(Rp. 3.300.000.000)**

% Kawasan permukiman kumuh yang tertangani

17,00%


0 %

**PROGRAM
KAWASAN
PERMUKIMAN
(Rp. 610.000.000,-)**

% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani

23, 37 %

24,21 %

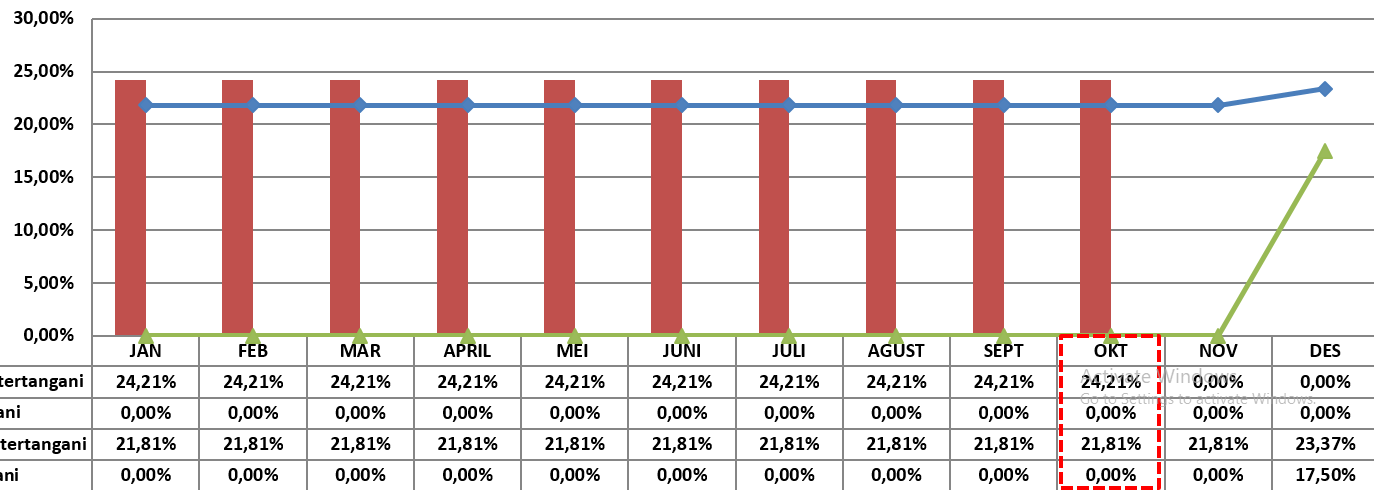

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 3.300.000.000)


Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D OKTOBER
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	3 Lokasi (Juara Harapan I -Kab.Pati), II - Kota Salatiga, III - Kab. Temanggung) Pelaksanaan konstruksi pekerjaan Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana: Juara 1 - Kota Semarang, 2 - Kab. Banyumas, 3 - Kota Magelang
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	0 Dokumen • Koordinasi internal inventarisasi serah terima PSU Perumahan Kabupaten/Kota • Pembahasan laporan antara Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Utara Prov. Jateng • Pembahasan laporan pendahuluan studi identifikasi kawasan permukiman tradisional Studi Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman Prov. Jateng • Pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 610.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D OKTOBER
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	0 Lokasi (koordinasi pelaksanaan integrasi penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan, Surakarta, Tegal, Kab. Purworejo, Kab. Demak Pengelolaan database penanganan RTLH di kawasan kumuh, FGD Pendampingan penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh) Rapat internal pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh bersama Bidang Perumahan
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	0 Dokumen (<i>Koordinasi internal inventarisasi usulan bankeu Kab/Kota, Monev pelaksanaan fisik Bankeu Sarpras ke Pati</i>)
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen - FGD peran pemerintah Desa dalam penanganan kawasan kumuh - Koordinasi BKM di kawasan permukiman kumuh di Kab. Boyolali dan Jepara - Studi lapangan pengelolaan sampah pada kawasan permukiman di Provinsi Jawa Barat
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	0 Dokumen - Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi studi identifikasi kawasan permukiman kumuh skala prioritas provinsi di Kab. Grobogan dan Kota Surakarta - Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kab. Wonosobo, Magelang, Sragen, Demak, Kendal, Kota Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten Kab. Batang, Kab. Rembang, Kab. Brebes dan Kab. Blora - FGD penanganan kawasan permukiman pesisir utara Provinsi Jawa Tengah

Bidang Pertanahan

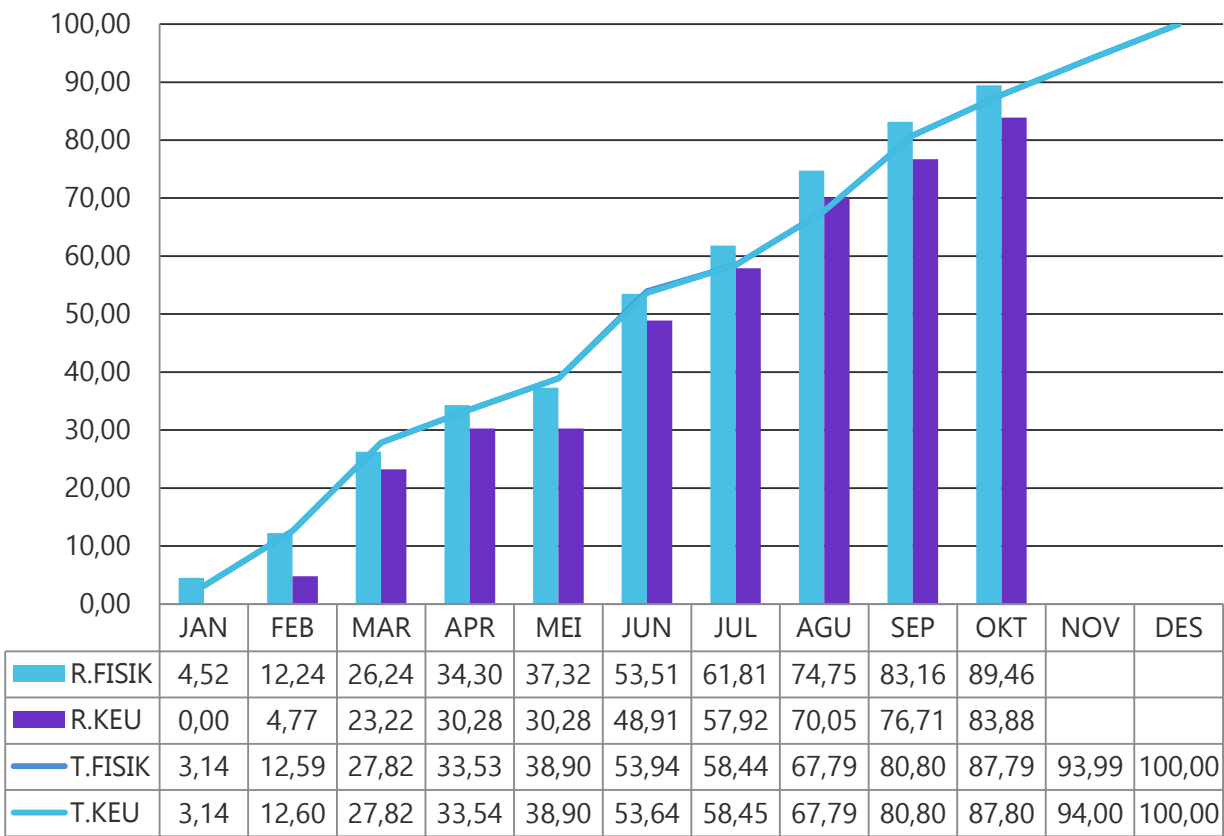


	Oktober	Nov. (Prognosis)
Target Fisik	87,79	93,99
Target Keu	87,80	94,00
Real. Fisik	89,46	96,01
Real. Keu	83,88	95,29
Dev. Fisik	1,67	2,02
Dev. Keu	-3,92	1,29

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pada Trase atau Basic Design di Lokasi Rencana Pembangunan	74.844.000	0,00	-0,90	Sisa pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan pengadaan tanah atas sisa tanah pembangunan Bendungan Randugunting di Kab. Blora	Dioptimalkan guna mendukung kegiatan pengadaan tanah Pembangunan Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai di Kab. Purworejo
Seksi Fasilitas Permasalahan Pertanahan						
1	Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Sertifikasi Tanah Kas Desa	190.720.000	0,01	-8,08	pembayaran PNBK (50 sertifikat hak atas tanah LP2B) Kab. Semarang belum dapat dibayarkan masih terkendala pada penerbitan kode e-billing	Berkoordinasi dengan Kantor Kabupaten Semarang
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan						
1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	17.165.000	-100,00	-100,00	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih dalam penyiapan substansi	Akan dilaksanakan di bulan November

BIDANG PERTANAHAN

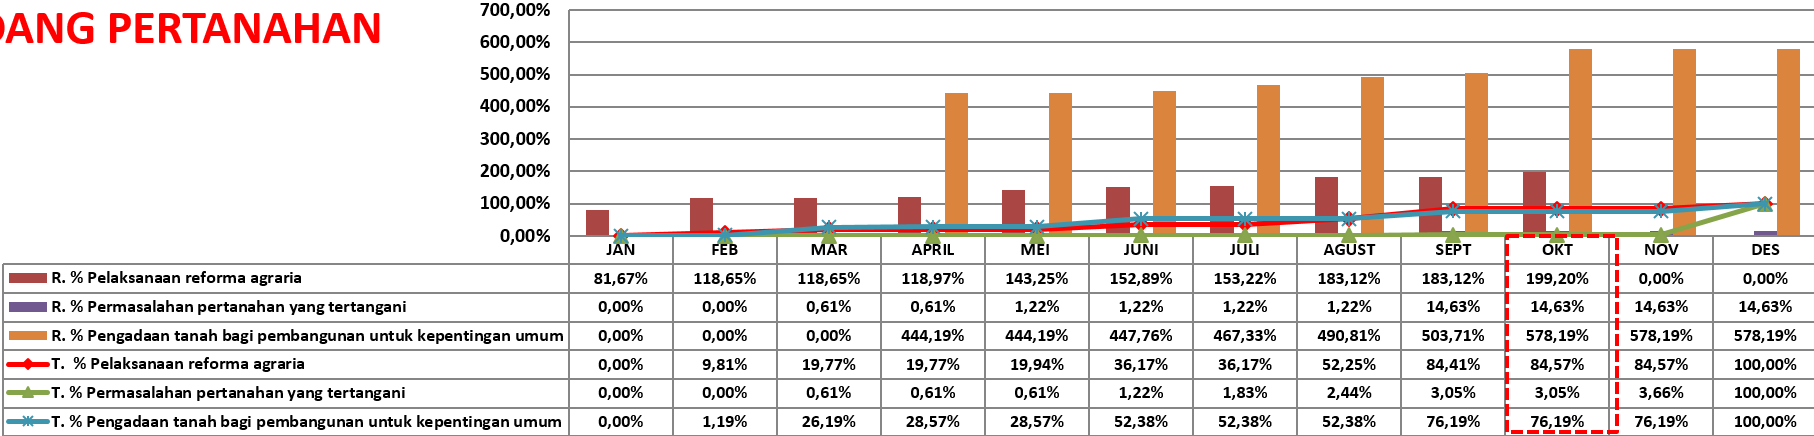

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN
GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
(Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Persentase pelaksanaan
reforma agraria

TARGET 2022

100%

REALISASI S.D OKTOBER

199,20%

INDIKATOR KINERJA

Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan

20%

Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)

420 Bidang:
5 Bidang HGU
15 Bidang HP
400 Bidang Pemantauan Penlok
1 kali Diseminasi/rakor bidang pertanahan

Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)

2 Lokasi

Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)

200 bidang Pemantauan Sertifikasi
7 Lokasi Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA
5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA

TARGET 2022

REALISASI S.D. OKTOBER

39,48%

907 Bidang:
1 Bidang HGU
8 Bidang HP
898 Bidang
1 kali

3 Lokasi

329 Bidang
6 Lokasi
6 Kabupaten/Kota

Lanjutan ...

PROGRAM PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Rp. 550.000.000)

INDIKATOR KINERJA
% Pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum

TARGET 2022
100%

REALISASI S.D OKTOBER
578,19 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D OKTOBER
Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	20%	115,64%
Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	2.000 Bidang Penlok	12.142 Bidang Penlok (Penerbitan SK Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Cilacap, Bendungan Jlantah-Karangannyar, Bendungan Pidekso-Wonogiri dan TPST Kab. Magelang); Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500kV <i>pedan sirkuit 2 section 2</i> di Kab. Klaten, Boyolali & Semarang); Pelaksanaan pengadaan tanah (Konsultasi Publik Pengadaan Tanah DI Pidekso & TPST Magelang)
Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	100 Bidang ZNT	100 Bidang ZNT (Perkiraan Nilai Zonasi Nilai Tanah di Daerah)

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN
(Rp. 500.000.000)


INDIKATOR KINERJA
% Permasalahan pertanahan yang
tertangani

TARGET 2022
100%

REALISASI S.D SEPTEMBER
14,63 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. SEPTEMBER
Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	20%	2,93%
Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	150 Bidang LP2B 8 Bidang TKD	0 Bidang LP2B 20 Bidang TKD (di Kab. Klaten) • Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikat LP2B & TKD • Koordinasi Penetapan Lokasi Objek Bidang Tanah yang akan disertifikat • Pelaksanaan pra sertipikasi, Pelaksanaan Verifikasi Berkas Persyaratan , Koordinasi dalam rangka persiapan pendampingan pemasangan tanda batas tanah LP2B di Kab. Semarang, Cilacap, Blora, Kab. Magelang • Pengukuran Tanda Batas Tanah Kab. Blora • Pembayaran biaya PNBK Kabupaten Blora & Cilacap
Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	6 Sengketa	4 Sengketa • Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanjung Mas (Pemberian Santunan) & Permasalahan keberatan pemberian santunan bangunan madrasah pada kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan Tanjung Mas • Penanganan Permasalahan Pertanahan TPU Dasiknoloyo dan Pracimoloyo di Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo , 1. Permasalahan pertanahan di wilayah perbatasan Kab. Karanganyar dan Kab. Sragen di Desa Dan Desa Go to Settings to activate Windows. • Mediasi Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kab. Sukoharjo, Surakarta (TPU), dan Sragen terkait Pemanfaatan ruang (Batas Tanah di Desa Bulungkulon Kec. Jekulo) • Mediasi sengketa pengelolaan Umbul Jetak di Kab. Semarang dan Boyolali

Bidang Keterpaduan PKP

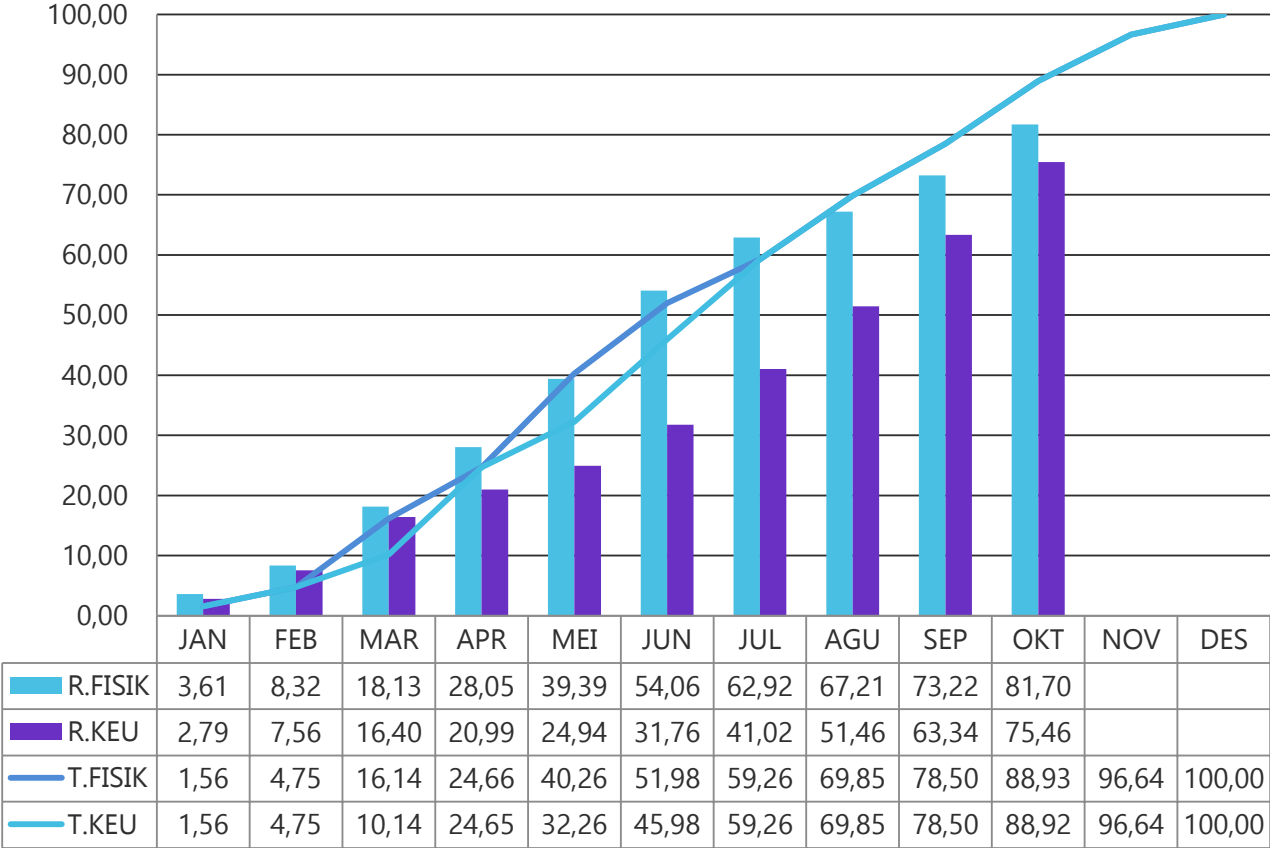

	Oktober	Nov. (Prognosis)
Target Fisik	88,93	96,64
Target Keu	88,92	96,64
Real. Fisik	81,70	96,69
Real. Keu	75,46	96,68
Dev. Fisik	-7,23	0,05
Dev. Keu	-13,46	0,04

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Workshop Implementasi dan Pengembangan Pelayanan Klinik PKP	23.114.000	-48,38	-94,75	Penundaan workshop implementasi dan pengembangan pelayanan Klinik PKP, karena sedang tahap penyiapan substansi materi	Workshop Tahap 1 telah dilaksanakan pada 28 Oktober 2022 dan Tahap 2 akan dilaksanakan di bulan November
2	Fasilitasi Pelaksanaan KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	135.613.000	-14,07	-14,07	Penerjunan KKN Tematik Periode III bersama UNNES baru dilaksanakan di minggu ke-3 bulan Oktober	Monitoring KKN Tematik Periode III akan dilaksanakan di bulan November
3	Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	25.781.000	0,00	-31,88	Sosialisasi terkait dengan Rumah Layak Huni dilaksanakan sendiri oleh mahasiswa KKN Periode II kepada masyarakat desa, sehingga alokasi narasumber tidak terealisasi	Optimalisasi alokasi anggaran narasumber untuk KKN Tematik Periode III (Oktober - November) melalui Perubahan Anggaran 2022
4	Pengadaan Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	100.000.000	-100,00	-100,00	Sedang dalam tahap pembekalan awal Pra-Pelatihan kepada Pokmas	- Finalisasi draft KAK-RAB - Koordinasi persiapan pelatihan
5	Penyediaan Honorarium Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	-50,00	-50,00	- Pengadaan alat peraga belum dilaksanakan	- Menyesuaikan penjadwalan ulang pengadaan alat peraga
Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman						
1	Koordinasi Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian	96.119.000	3,00	-3,14	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang semula direncanakan untuk koordinasi dengan pusat (SRPP), dialihkan untuk uji kelayakan FABA. Adapun koordinasi terkait SRPP tetap dilaksanakan melalui mekanisme daring.	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah akan dilaksanakan pada Bulan November ke Bandung terkait uji layak FABA

BIDANG KETERPADUAN PKP

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,
DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Rp. 1.500.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA


% Ketersediaan kebijakan, data, dan
evaluasi kinerja perumahan rakyat dan
kawasn permukiman

TARGET 2022

100%

REALISASI s.d OKTOBER

53,85 %

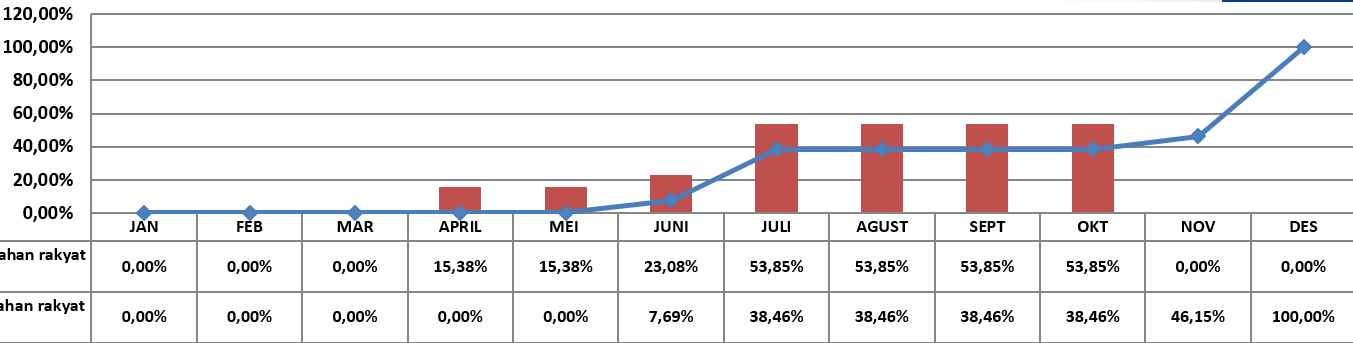

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D OKTOBER
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5 Dokumen	3 Dokumen <i>(1 Dokumen Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi, 1 Dokumen Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 1 Dokumen Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)</i> - Rapat Koordinasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah - KKN Tematik Periode III - Workshop Klinik PKP Tahap 1 - Finalisasi KAK, HPS Pengadaan Alat Peraga Pelatihan - Koordinasi dengan Pokmas Calon Penerima Izin Pemanfaatan Alat
Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	3 Dokumen	1 Dokumen Evaluasi Lingkup Bidang PKPP Tahun 2021, TA 2022 • Finalisasi evaluasi Triwulan 3 Tahun 2022 di bidang PKP • Finalisasi usulan kegiatan di bidang PKP • Persiapan Penyusunan RPD
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	5 Dokumen	2 (Dokumen Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data PKP Provinsi Jawa Tengah & Review Keterisian Data PKP Provinsi Jawa Tengah) <i>(Koordinasi Pengumpulan Data, Pengembangan Aplikasi & Pengadaan Jasa Konsultansi Koordinasi Pengumpulan Data, Rapat Internal, Pengembangan Aplikasi, Rapat Tim Teknis Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi PKPP, Persiapan Review Keterisian Data. Review Keterisian Data. Koordinasi Pengumpulan Data. Rapat Internal. Pengembangan Aplikasi)</i>



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Oktober 2022

Bidang Perumahan

No	Satuan kerja	Penyedia Non-Tender		Tender		Swakelola Tipe IV		Keterangan
		Proses	Terkontrak	Proses	Terkontrak	Proses	Tersalurkan	
1	Perumahan Umum	11	0	1	0	0	13	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran
2	Perumahan Swadaya	0	1	0	0	0	31	Sudah terkontrak seluruhnya
3	Perencanaan Teknis	0	19	0	0	0	0	Sudah terkontrak seluruhnya
Total		11	20	1	0	0	44	

Paket yang Belum Terkontrak:

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
2		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
3		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
4		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
5		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
6		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
7		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
8		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
9		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
10		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
11		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
12		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi (Terkontrak: 6/6 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana / Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender	Sudah terkontrak tanggal 9 September 2022	70 hari
2		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender	Sudah terkontrak tanggal 24 Agustus 2022	90 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender	Sudah terkontrak tanggal 24 Agustus 2022	90 hari
4		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 30 Juni 2022	120 Hari
5		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 15 Juli 2022	90 hari
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 29 Juni 2022	90 hari

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 8/8 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 8 Maret 2022	60 hari
2		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 15 Maret 2022	60 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari
5		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari
6		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 24 Agustus 2022	90 hari
7		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
8	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 31 Mei 2022	60 Hari

Bidang Keterpaduan PKP

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 10 Maret 2022	Maret s.d. Oktober 2022

Sekretariat

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 23 Agustus 2022	Agustus

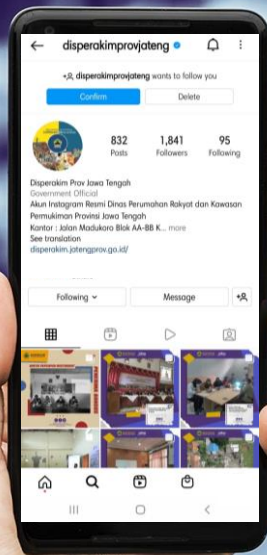

PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Oktober 2022

Respon LapoGub



TOTAL

12

3

8

8

24

17


6

9

9


44

Konten Berita Web Dinas




	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
■ Sekretariat	3	4	4	13	8	1	3	26	11	13	0	0
■ Perumahan	37	27	18	20	4	5	11	13	4	11	0	0
■ Kawasan	5	3	4	1	3	1	2	2	4	4	0	0
■ Keterpaduan	2	6	14	2	4	6	1	3	1	7	0	0
■ Pertanian	4	1	3	1	2	2	2	1	1	1	0	0
TOTAL	51	41	43	37	21	15	19	45	21	36		

Laporan Hasil Survey Kepuasan Website




Laporan Jumlah Kenaikan Pengunjung Website

Minggu IV




Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website


Minggu IV



Konten Media Sosial



Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos



ANALITIK TWITTER

Iklan Analitik

Bantuan? Ada umpan balik? DisperakimJtg

Aktivitas Tweet

October 2022

Ekspor data

Tweet Anda memperoleh **6.1K tayangan** selama periode **31 hari** ini



TWEET ANDA

Selama periode 31 hari ini, Anda memperoleh **199 penayangan** per hari.

Tweet Tweet Populer Tweet dan balasan Promosi Tayangan Engagement Tingkat engagement



DisperakimJtg #JatengTangguh @DisperakimJtg · 19 Okt

Indonesia mengoptimalkan basis data melalui REGSOSEK utk mendorong Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Data yg terkumpul di 2022 selanjutnya akan melalui beberapa tahap hingga mencapai stabilitas sistem pada 2024. Pendataan Regsosek akan berlangsung pd 15 Okt–14 Nov 2022
pic.twitter.com/Uxqx7ZZ6u8

Lihat aktivitas Tweet

579

38

6,6%

Engagement

Menampilkan 31 hari dengan frekuensi harian

Tingkat engagement

3.5%

2.4% tingkat engagement Oct 31



ANALITIK FACEBOOK

★ Anda sekarang dapat melihat bagaimana kinerja Facebook reels Anda!

Belajar dari insight dan lihat bagaimana pemirsa Anda berinteraksi dengan reel Anda di Facebook. Insight dari reel akan ditambahkan ke metrik keseluruhan Halaman atau profil Anda.

Lihat Insight Reel

1 Okt 2022 – 31 Okt 2022

Diposting

3

Menit Ditonton

▲ 10.6% dari 31 hari sebelumnya

1

Tayangan Video 1 Menit

▲ 100% dari 31 hari sebelumnya

7

Tayangan video 3 detik

▼ 41.7% dari 31 hari sebelumnya

0

Interaksi Video

▲ 0% dari 31 hari sebelumnya

14


Pengikut bersih

▼ 26.3% dari 31 hari sebelumnya

Menit Ditonton

1 Okt 2022 - 31 Okt 2022

3 Menit Ditonton 3 Periode Sebelumnya

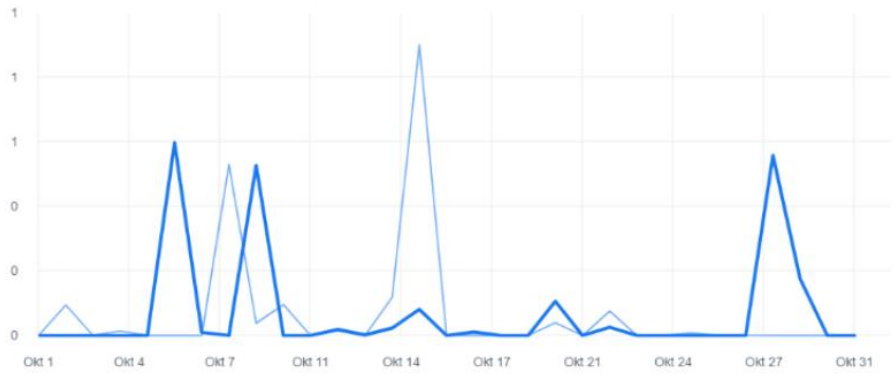

Perlihatkan berdasarkan:

Lihat kinerja postingan Anda yang berbeda-beda


- ☒ Organik 100%
- ☐ Berbayar 0%
- ☒ Diposting 100%
- ☐ Crossposting 0%
- ☐ Dibagikan 0%
- ☐ Pengikut 4.96%
- ☒ Bukan Pengikut 95%
- ☐ Langsung 0%
- ☒ Video 100%

Insight akun

Lihat semua

2.144 akun dijangkau dalam 30 hari terakhir

1.211 bukan pengikut



ANALITIK INSTAGRAM

30 Hari Terakhir ▾

1 Okt - 30 Okt

Gambaran Umum

Anda mendapatkan **88** pengikut lebih banyak dibandingkan dengan 1 Sep - 30 Sep.

Akun yang dijangkau

2.144

-68%

Akun yang berinteraksi

219

-47,2%

Total pengikut

2.251

+4%

PENEKANAN

1. Melakukan percepatan **penginputan realisasi swakelola pada SPSE** terutama untuk **Bidang Perumahan dan Subbag Umpeg**.
2. Sesuai dengan Nota Dinas No. 435/PROG/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang **Permohonan Data Dukung Penyusunan Draft LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2022**, Bidang dan Sekretariat agar mengisi **data-data realisasi kinerja Tahun 2022 (Form L1-a) serta Matrik Permasalahan dan Manfaat** sebagaimana format yg telah disampaikan baik melalui Tata Praja maupun email ke Subbag Program **paling lambat hari Jumat, tanggal 4 November 2022, pukul 09.00 WIB** baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy yg telah ditandatangani Kepala Bidang.
3. Bagi bidang yang mengajukan **perubahan target kinerja TA 2022** agar segera menyusun **RKO Kinerja Perubahan bulanan (Bidang Perumahan dan Pertanahan)** ke Subbag Program selambat-lambatnya **Jumat, 4 November 2022**.
4. Menyampaikan RKO APBD Perubahan ke Subbag Program baik hard maupun soft copy bagi yg masih belum mengumpulkan.
5. Bidang harap mulai Menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2022 dengan penyesuaian baik anggaran maupun target kinerja.
6. Progres perbaikan **hasil Evaluasi SAKIP** pada Disperakim Prov.Jateng Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Membuat pohon kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Bidang Keterpaduan PKP (didukung Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman & Bidang Pertanahan)	REVISI POHON KINERJA SESUAI FORMAT Permenpan Nomor 89 Tahun 2021
2.	Menyusun SOP atau mekanisme yang mengatur proses pengumpulan data kinerja per kegiatan	Sekretariat (Subbag Program)	SELESAI
3.	Menyusun juknis reward dan punishment berdasarkan kinerja untuk seluruh jenjang jabatan	Sekretariat (Subbag Umum & Kepegawaian)	DATA BELUM MASUK
4.	Berkoordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah terkait formulasi pengukuran pada sasaran "Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan" yang terdapat pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	Bidang Keterpaduan PKP (didukung Bidang Perumahan dan Sekretariat – Subbag Program)	Perlu Ditambahkan Surat Koordinasi Ke Bappeda Jateng terkait Rekom No.4 beserta Surat Jawabannya

PENEKANAN

Sehubungan dengan persiapan proses **Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2024**, agar **menyiapkan usulan dan memastikan kesiapan readiness criteria** sesuai ketentuan yang berlaku, terutama pada kegiatan :

1. Bantuan stimulan terkait penyediaan rumah untuk mengurangi backlog, relokasi program pemerintah dan penanganan pasca bencana.
2. Bantuan stimulan terkait peningkatan kualitas rumah penanganan pasca bencana.
3. Bansos/Hibah/Bankeu terkait pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Bantuan stimulan berupa bansos, hibah dan bantuan keuangan yang diusulkan tersebut, diarahkan untuk mendukung hal - hal sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah,
2. Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang,
3. Pengelolaan Kawasan Pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan,
4. Implementasi SPM Perumahan Rakyat,
5. Arah Kebijakan lainnya yang menjadi fokus intervensi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Usulan tersebut dilengkapi dengan data – data dukung dan disampaikan ke Sub Bagian Program, paling lambat pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 jam 10.00 WIB, dalam bentuk hardcopy yang telah ditandatangani oleh Kepala Bidang dan softcopy yang dikirimkan melalui email programdisperakim@gmail.com



Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR SEPTEMBER 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir September TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

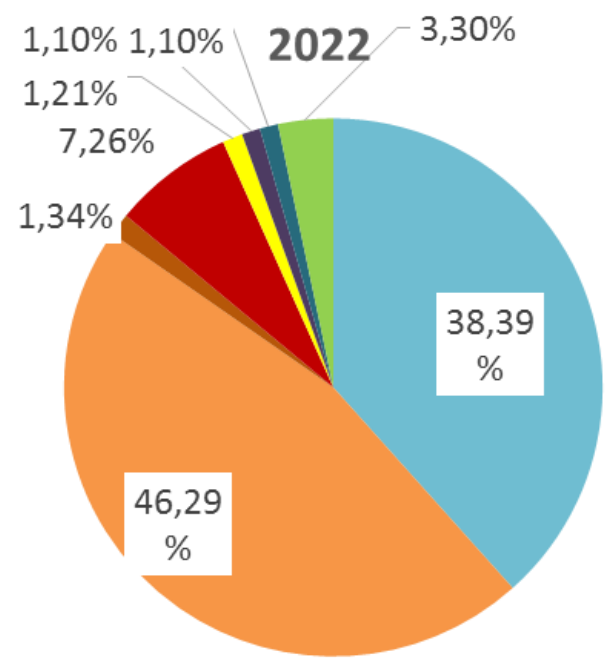

NO.	PROGRAM	2022	
		(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000
	TOTAL	100	45.424.693.000




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir September 2022

^{*)}Realisasi keuangan diambil dari e-controlling status Selasa, 4 Oktober 2022

Disperakim

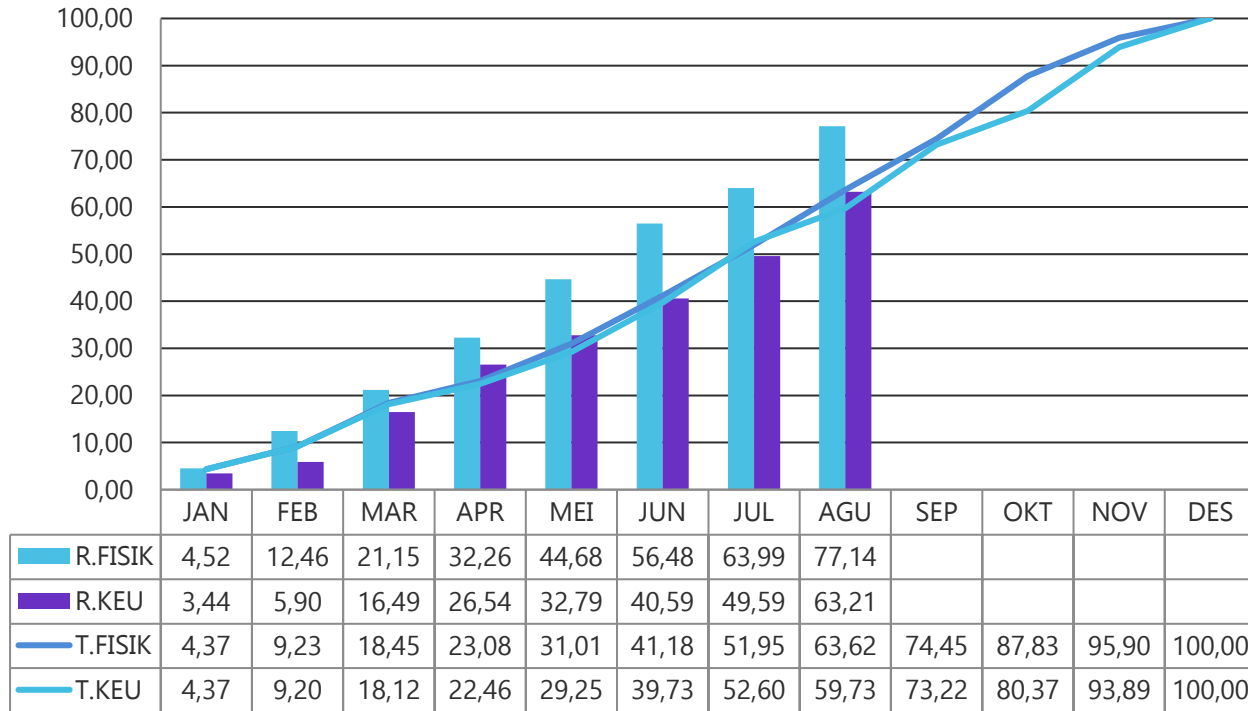

	Septem ber	Oktober (Progno sis)
Target Fisik	74,45	87,83
Target Keu	73,22	80,37
Real. Fisik	83,37	89,24
Real. Keu	73,59	83,91
Dev. Fisik	8,92	11,96
Dev. Keu	0,37	3,54

Progres Fisik dan Keuangan Prov. Jateng


(STATUS 5 SEPT 2022)

Target Fisik: 69,25%

Realisasi Fisik: 60,60%

Realisasi Keuangan: 62,66%

Sekretariat

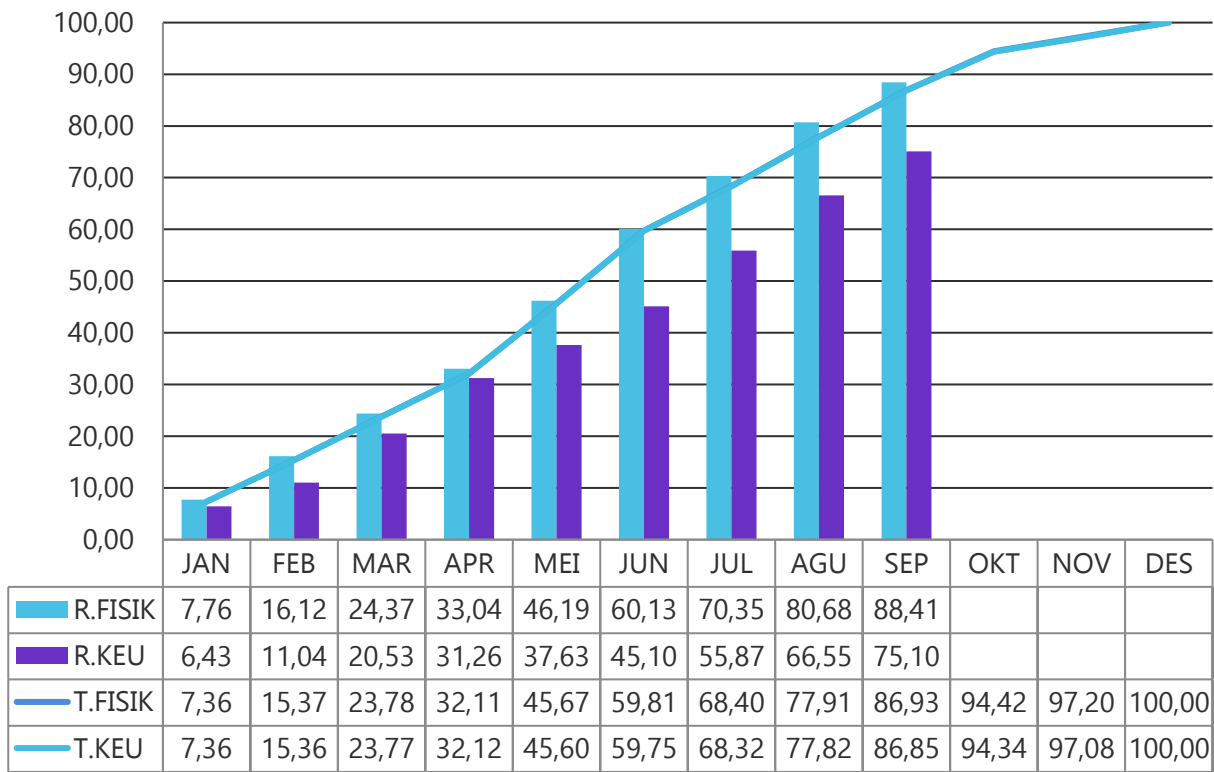


	Septem ber	Oktober (Prognos is)
Target Fisik	86,93	94,42
Target Keu	86,85	94,34
Real. Fisik	88,41	94,61
Real. Keu	75,10	88,30
Dev. Fisik	1,48	0,19
Dev. Keu	-11,75	-6,05

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Keuangan						
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Triwulanan	18.300.000	-4,59	-4,59	Optimalisasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi TW 3 yang akan digabungkan dengan TW 4	Diagendakan kembali bersama TW 4 pada bulan Oktober/November
Subbag Program						
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	71.825.000	1,14	-5,31	Desk Pra-POK status akhir September yang dijadwalkan di akhir bulan berjalan, dilaksanakan di 3 Oktober 2022	Akan dilaporkan dalam progres bulan Oktober

Bidang Perumahan

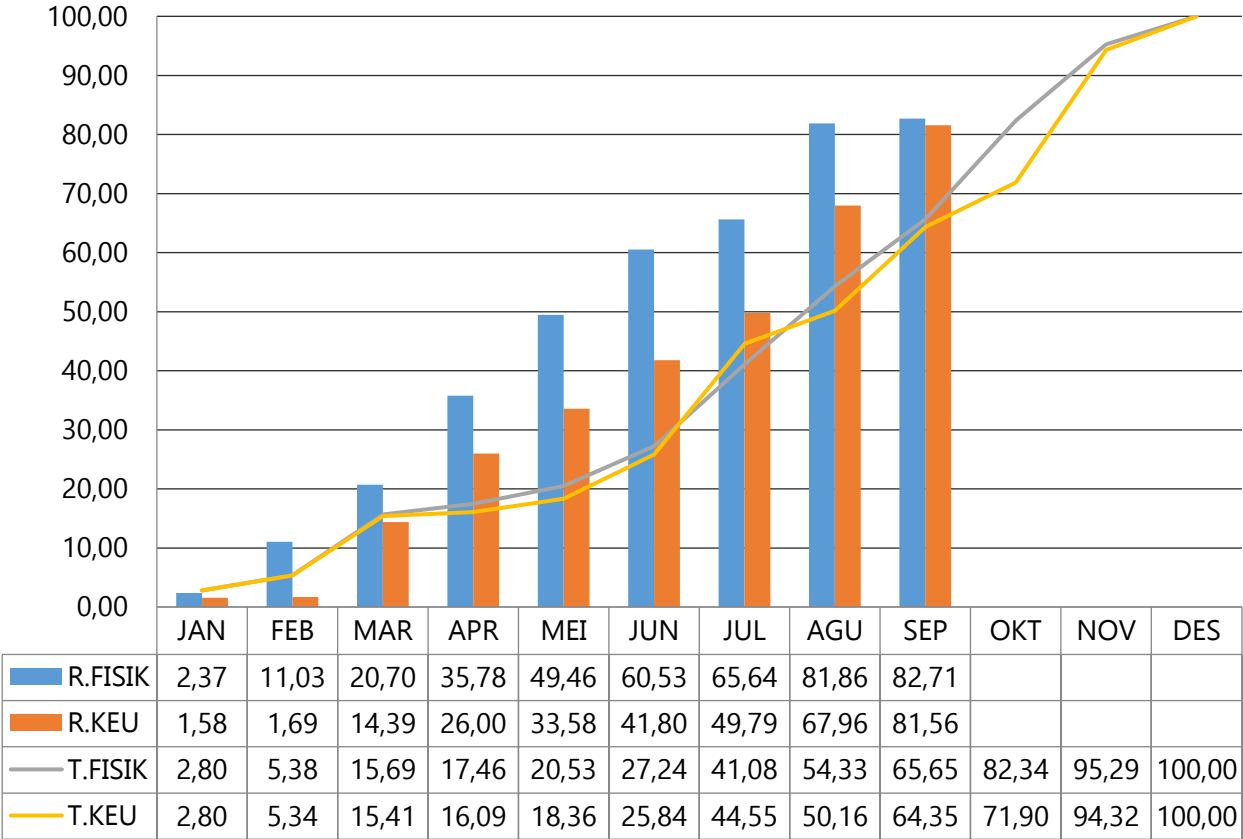

	Septem ber	Oktober (Proгно sis)
Target Fisik	65,65	82,34
Target Keu	64,35	71,90
Real. Fisik	82,71	84,82
Real. Keu	81,56	84,31
Dev. Fisik	17,06	2,48
Dev. Keu	17,21	12,42

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.826.000	2,73	-22,25	- Efisiensi makan minum rapat - Sinkronisasi pengumpulan data potensi komunitas dan relokasi program pemerintah dilaksanakan tanggal 30 September 2022	- Akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya - Realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
2	Rapat Rencana Aksi SPM Bidang Perumahan Rakyat	2.662.000	15,80	-6,74	Belanja ATK belum dibayarkan karena pembelian dikelola langsung dalam lingkup bidang	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
3	Pelaksanaan Verivali Lapangan Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	96.536.000	4,20	-1,67	Belanja ATK belum dibayarkan karena pembelian dikelola langsung dalam lingkup bidang	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
4	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	0,00	-1,55	Pelaksanaan 19 paket jasa konsultasi sudah selesai, 18 Paket sudah terbayar , 1 Paket untuk Kab. Tegal masih dalam proses pencairan di BPKAD.	Pencairan akan diselesaikan di bulan Oktober
5	Bimtek Validasi Data SIMPERUM	13.519.000	1,16	-14,92	Sisa pelaksanaan kegiatan (belanja makan minum rapat)	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan Bimtek Validasi Data Simperum ke-3 di bulan Desember
6	Sosialisasi Hunian Tetap (HUNTAP), Hunian Sementara (HUNTARA), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat / Komunitas Rusus/Rusun di Jawa Tengah	11.100.000	0,00	-14,34	Belanja Makan minum rapat Sosialisasi Rusun di Kota Magelang dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan September	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
7	Pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah, HUNTAP, HUNTARA, Fasilitas Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat	83.787.000	0,00	-3,09	Belanja perjalanan dinas Sosialisasi Rusun di Kota Magelang dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan September	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
8	Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	5.723.000	0,00	-31,22	Efisiensi belanja makan minum rapat	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		

Seksi Perumahan Umum

1	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	612.000.000	-7,84	-7,84	4 penerima Bansos Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana mengundurkan diri karena: - 2 calon penerima akan diusulkan kembali sebagai calon penerima bantuan PB Bencana 2023 - 1 calon penerima sudah pindah domisili ke Kalimantan - 1 calon penerima sudah menerima penanganan melalui BPS pada Oktober 2021	Akan dilaksanakan penggantian Penerima Bantuan pada Perubahan Anggaran 2022
2	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	800.000.000	-12,50	-12,50	Penyaluran Bansos Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana yang semula direncanakan disalurkan pada bulan Maret s.d. Juni sudah tersalurkan seluruhnya s.d. bulan April kecuali 2 penerima yang mengundurkan diri karena: - 1 Penerima sudah memiliki rumah - 1 penerima tidak mampu berswadaya	Bantuan yang tidak dapat tersalurkan telah disiapkan untuk dialokasikan kembali melalui Perubahan Anggaran TA 2022.
3	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	78.170.000	-1,55	-4,38	Terdapat Upah Tenaga Kerja Padat Karya yang belum bisa dibayarkan karena Penerima Bantuan yang mengundurkan diri	Akan dilakukan penggantian Penerima Bantuan pada Anggaran Perubahan
4	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah	2.170.000.000	-3,23	-3,23	Sudah tersalurkan seluruhnya kecuali 2 penerima yang mengundurkan diri karena: - 1 Penerima sudah memiliki rumah - 1 penerima tidak mampu berswadaya	Akan dilakukan penggantian Penerima Bantuan pada Anggaran Perubahan TA 2022

Seksi Perumahan Swadaya

1	Koordinasi Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	124.432.000	-15,62	-15,62	Perjalanan dinas luar daerah akan dialihkan ke perjalanan dinas dalam daerah karena masih kurangnya pendampingan/fasilitasi Bimtek oleh DPRD akibat penambahan kuota	Akan digeser melalui perubahan anggaran
---	--	-------------	--------	--------	--	---

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
(Rp. 21.025.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Rumah layak huni yang
disediakan (RLH)

% Rumah tidak layak huni
yang tertangani (RTLH)

TARGET 2022


7,39 %





11,84 %

REALISASI S.D SEPTEMBER


6,47%

11,42 %
(dibawah target bulanan)

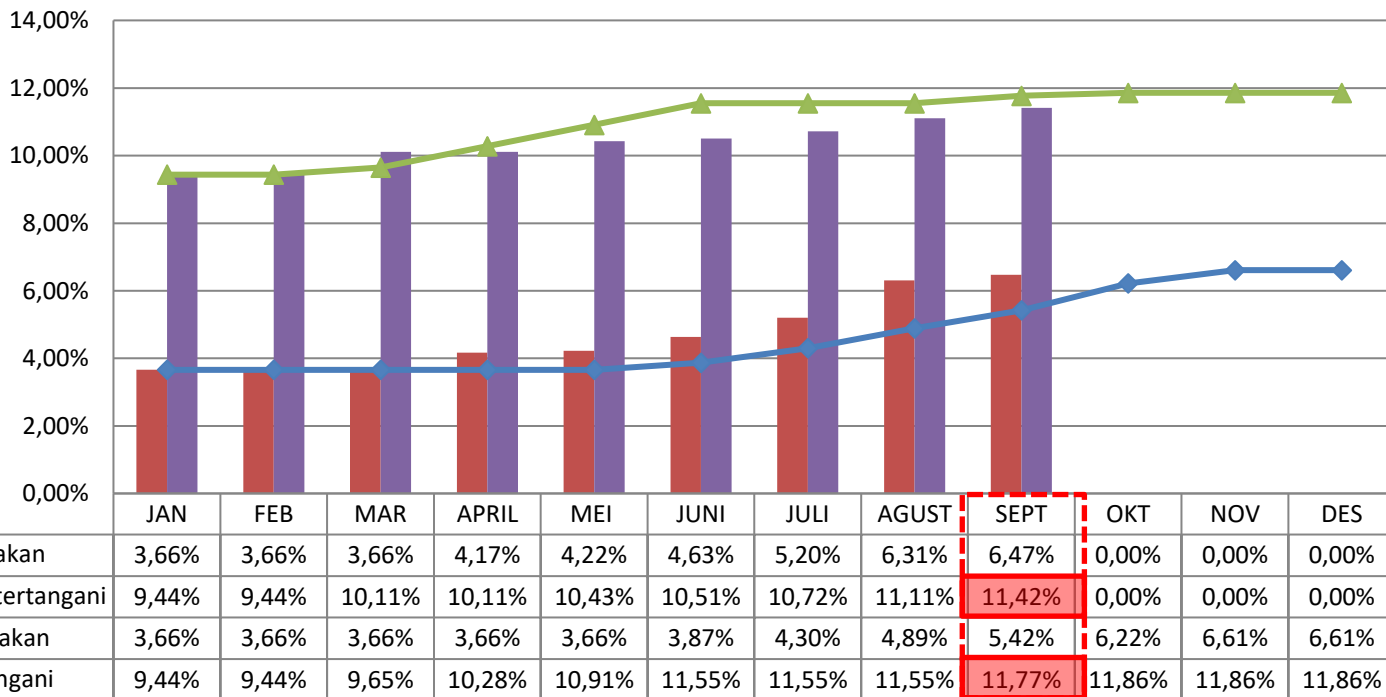


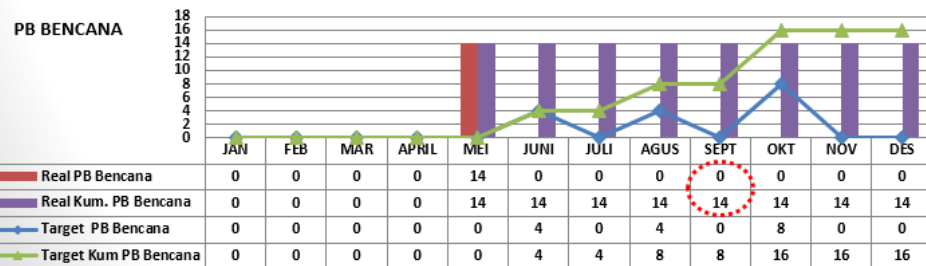

IK SUB KEGIATAN	T. 2022	REALISASI S.D SEPTEMBER
Jumlah unit rumah yang dibangun (PB Backlog)	253 unit	240 Unit PB Backlog 13 unit mengalami pengantian BNBA melalui PA TA 2022 - Penyelesaian termin 3 (swakelola) - Penyelesaian pembangunan 100% di: 7 unit di Kab. Purworejo, 10 unit di Kab. Sragen
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupemdes RTLH)	11.292 unit	9.325 6unit - Pencairan rekam 7 dan 8 - Desk Persiapan Pengalihan Kuota SK Gub - Finalisasi SK Gub - Movev
Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (PK dan PB Bencana, PB Relokasi)	51 unit PK 16 unit PB-B 62 unit PB-R	47 Unit PK Bencana 4 Orang gagal menerima bantuan: yang terdiri dari 2 orang Penerima mengundurkan diri karena kondisi rumah yang roboh sehingga akan diusulkan sbg calon penerima bantuan PB Bencana pada tahun 2023, 1 orang pindah domisili Kalimantan & 1 Orang sudah menerima penanganan melalui BSPS pada Oktober 2021 - Pembayaran Upah Padat Karya di Desa Bongas, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang untuk 4 x 3 orang 14 unit PB-B 2 Orang mengundurkan diri karena sudah membangun rumah secara swadaya - Proses inputing Calon BNBA pengganti yang gagal untuk di proses dalam PA 2022 60 unit PB-R 2 Penerima mengundurkan diri karena 1 tidak mampu berswadaya, dan 1 orang lainnya sudah mempunyai rumah serta Penyiapan BNBA pengganti untuk perubahan anggaran - Proses inputing Calon BNBA pengganti yang gagal untuk di proses dalam PA 2022
Jumlah dok perencanaan RUSUNAWA & RUSUS (Rencana Induk Rusun)	1 Dok	Pembangunan Rusun dan RC bukan menjadi kewenangan provinsi sehingga anggaran akan di lakukan pergeseran untuk pengoptimalan indikator kinerja yang lain.
Jumlah dokumen yang disusun	5 Dok	- Proses Verivali calon Penerima PB dan PK, Sosialisasi Teknis, Bimtek Validasi data simperum - Sosialisasi huntap & huntara kepada penghuni rusun/rusun di Kab. Kendal



Bidang Kawasan Permukiman

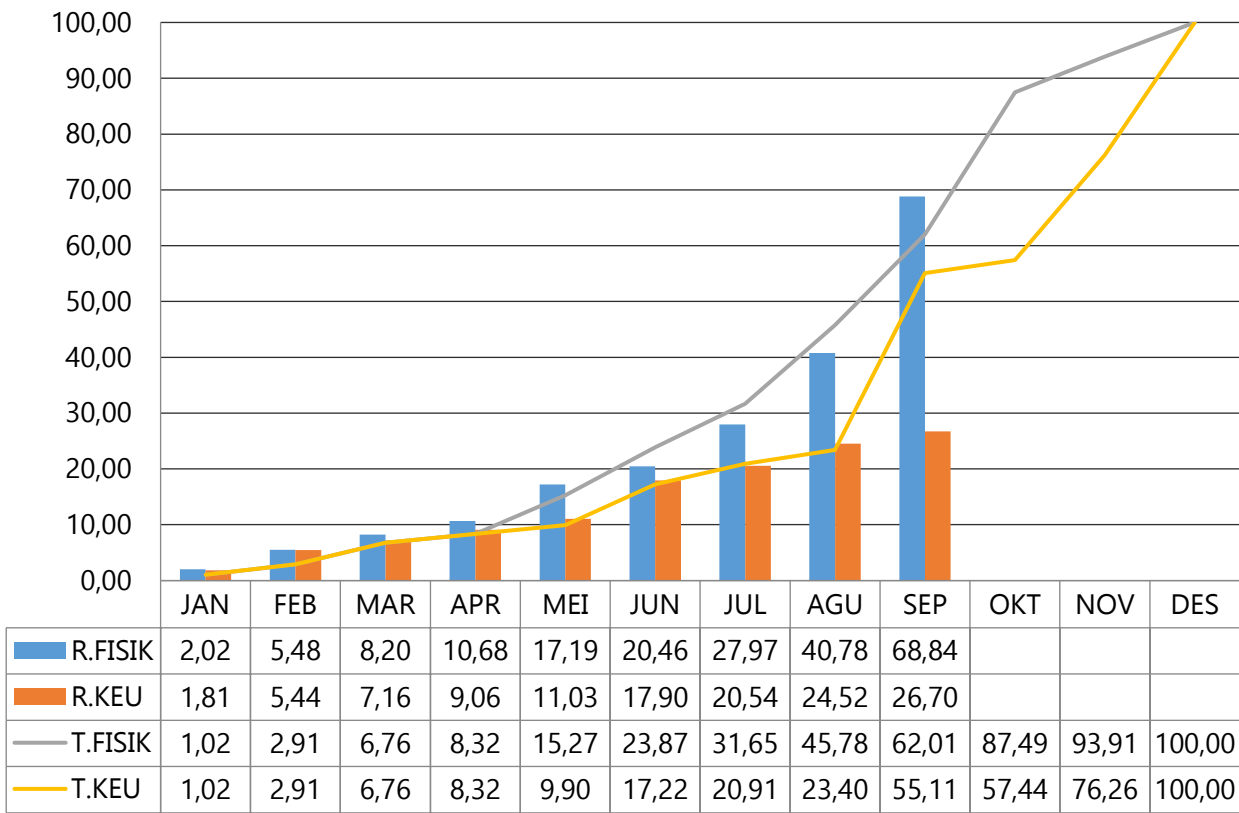

	Septem ber	Oktober (Proгно sis)
Target Fisik	62,01	87,49
Target Keu	55,11	57,44
Real. Fisik	68,84	89,20
Real. Keu	26,70	59,14
Dev. Fisik	6,83	1,71
Dev. Keu	-28,40	1,70

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	FGD Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	28.118.000	0,00	-4,98	Belanja ATK belum dilaksanakan karena menyesuaikan kebutuhan	Akan dibelanjakan untuk mendukung penyelenggaraan FGD di bulan Oktober
2	Persiapan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	35.388.000	0,00	-16,21	Sisa belanja makan minum, transport dan honorarium narasumber	- Sisa belanja makan minum dan transport menjadi potensi SILPA - Honorarium narasumber dioptimalkan untuk kegiatan bulan Oktober 2022
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	0,00	-14,22	Monev pendataan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh telah dilaksanakan melalui koordinasi secara administratif. Adapun tinjauan lapangan belum dilaksanakan	Akan dijadwalkan kembali di bulan Oktober
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman						
1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PSU Permukiman Provinsi Jawa Tengah	34.820.000	0,00	-25,94	Fisik sudah selesai, sisa belanja honor narasumber dan transportasi	Akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan bulan selanjutnya
2	Pelaksanaan Fisik Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2022	1.890.000.000	17,14	-24,34	Uang muka tidak diambil oleh penyedia jasa	

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
3	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	-40,00	-100,00	Proses pengadaan barang dan jasa Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah mundur sebagai dampak adanya rekomendasi BPKP dan adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022	Melakukan percepatan progres agar pekerjaan sesuai jadwal (masa kontrak s.d. bulan Oktober)
4	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	0,00	-100,00	Pembahasan laporan akhir dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022	Pembayaran paket pekerjaan akan dilakukan di bulan Oktober
5	Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	-40,00	-100,00	Proses pengadaan barang dan jasa Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman mundur sebagai dampak adanya rekomendasi BPKP dan adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022	Melakukan percepatan progres agar pekerjaan sesuai jadwal (masa kontrak s.d. bulan Oktober)

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

**PROGRAM
PENINGKATAN PSU
(Rp. 3.300.000.000)**

INDIKATOR KINERJA

% Kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET 2022

17,00%

REALISASI S.D SEPTEMBER

0 %

INDIKATOR KINERJA


% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET 2022

23, 37 %

REALISASI S.D SEPTEMBER

24,21 %

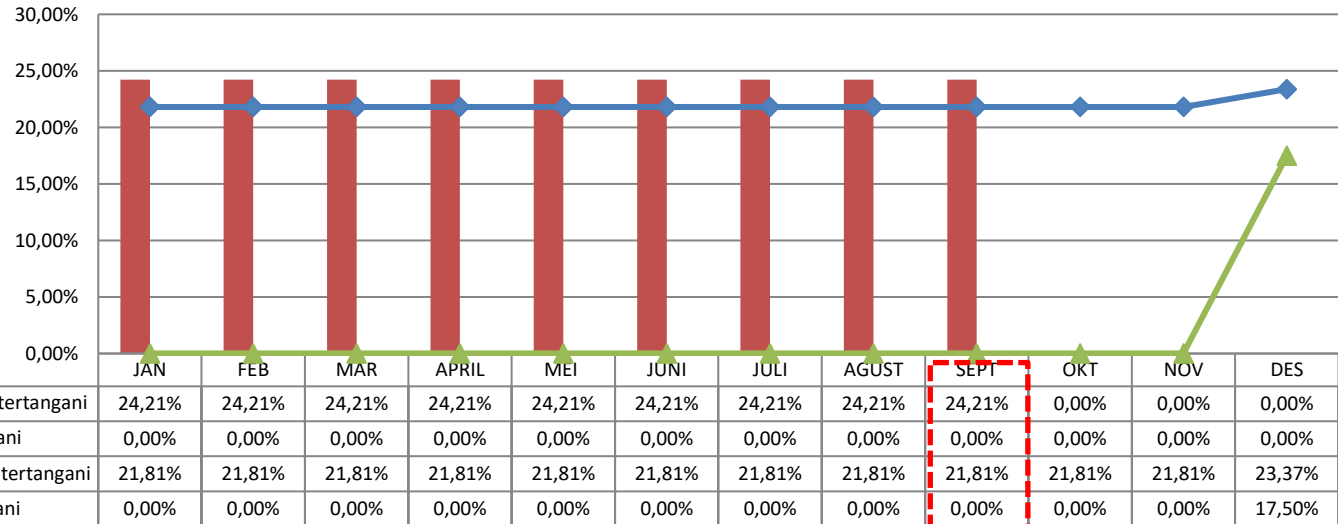


PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 3.300.000.000)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D SEPTEMBER
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	- Pelaksanaan konstruksi pekerjaan Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana: Juara I: 6,51% , Juara II: 4,11 % , Juara III: 5,56%, Juara Harapan I: 11,77%, Juara Harapan II: 11,77%, Juara Harapan III: 11,77% Supervisi Paket 1: 3,65%, Supervisi Paket 2: 1,30%, (Total Realisasi: 55,77%)
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	- • <i>Koordinasi internal inventarisasi serah terima PSU Perumahan Kabupaten/Kota</i> • <i>Pembahasan laporan antara Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Utara Prov. Jateng</i> • <i>Pembahasan laporan pendahuluan studi identifikasi kawasan permukiman tradisional Studi Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman Prov. Jateng</i> • <i>Pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana</i>

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 610.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI/PROGRESS AKTIVITAS S.D SEPTEMBER
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	- • koordinasi pelaksanaan integrasi penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan, Surakarta, Tegal, Kab. Purworejo, Kab. Demak • Pengelolaan database penanganan RTLH di kawasan kumuh, • FGD Pendampingan penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	- • <i>Koordinasi internal inventarisasi usulan bankeu Kab/Kota,</i> • <i>Monev pelaksanaan fisik Bankeu Sarpras ke Pati</i>
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	- • <i>Rakor kawasan permukiman liar (Squatter settlement) Provinsi Jawa Tengah</i> • <i>Verifikasi hibah di Kab. Boyolali dan Kab. Jepara</i> • <i>Studi lapangan pengelolaan sampah di Kab. Sukoharjo</i>
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	- • <i>Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi studi identifikasi kawasan permukiman kumuh skala prioritas provinsi di Kab. Grobogan dan Kota Surakarta</i> • <i>Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kab. Wonosobo, Magelang, Sragen, Demak, Kendal, Kota Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten Kab. Batang, Kab. Rembang, Kab. Brebes dan Kab. Blora</i> • <i>FGD penanganan kawasan permukiman pesisir utara Provinsi Jawa Tengah</i>

Bidang Pertanahan

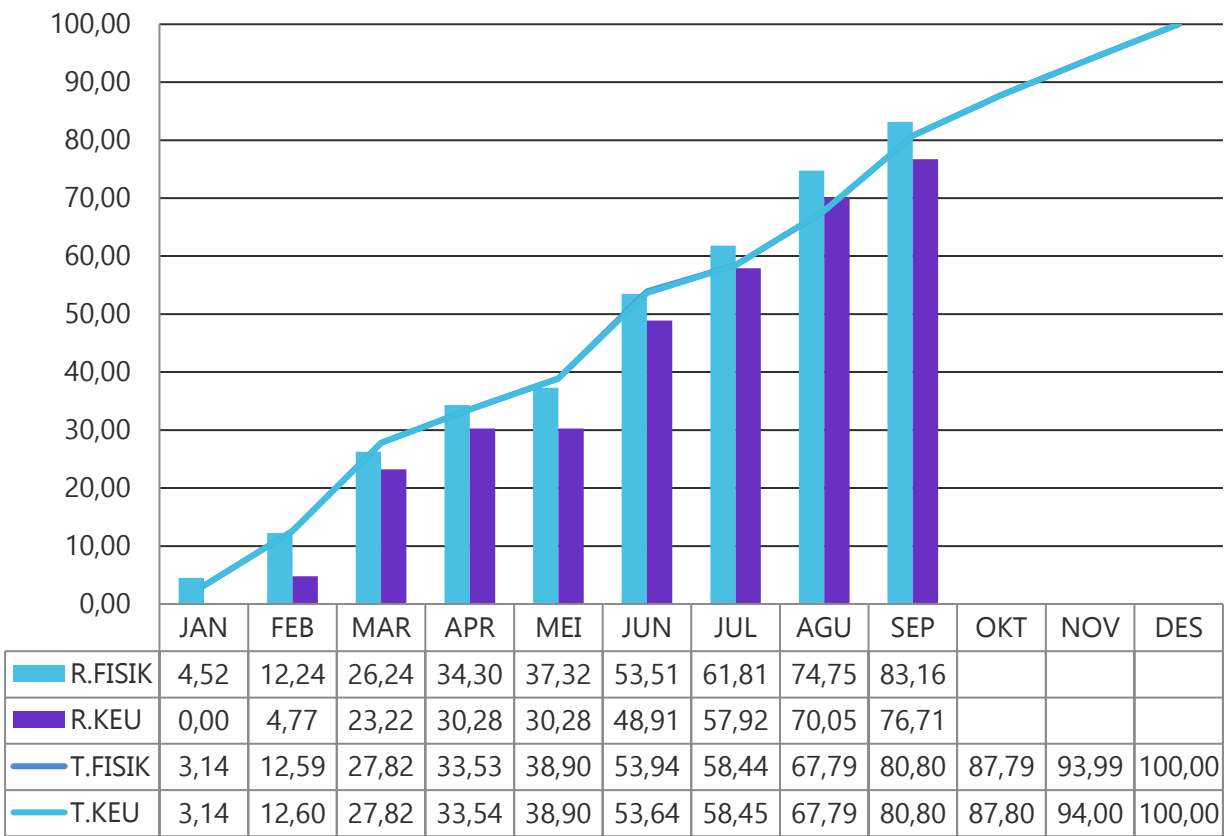


	Septem ber	Oktober (Progn sis)
Target Fisik	80,80	87,79
Target Keu	80,80	87,80
Real. Fisik	83,16	88,41
Real. Keu	76,71	86,88
Dev. Fisik	2,36	0,62
Dev. Keu	-4,10	-0,92

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	127.201.000	-2,44	-2,44	- kebijakan penyediaan tanah musnah pembangunan Tol Semarang-Demak yang semula diagendakan di bulan September masih dikonsolidasikan oleh pemerintah pusat.	Sambil menunggu hasil konsolidasi oleh pemerintah pusat, dilakukan koordinasi dengan PPK untuk penyiapan dokumen perencanaan
Seksi Fasilitas Permasalahan Pertanahan						
1	Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Sertifikasi Tanah Kas Desa	190.720.000	0,00	-7,56	- Semua berkas peserta sertifikasi LP2B di Kabupaten Semarang sudah diserahkan kepada Kantah Kab. Semarang, namun masih kendala pada entry data dan penerbitan kode billing pembayaran PNB	Berkoordinasi dengan Kantah Kabupaten Semarang
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan						
1	Pendampingan Proses Pengadaan Tanah dan Penanganan Dampak	24.350.000	-42,16	-42,16	- Pendampingan proses pengadaan tanah/penanganan dampak yang semula direncanakan akan dilaksanakan 3 kali s.d. bulan Juni (dari total 5 pelaksanaan) baru dilaksanakan 1 kali. - Pendampingan proses penetapan lokasi DI Pidekso Kab. Wonogiri yang dijadwalkan di bulan Agustus tidak dilaksanakan karena proses pengadaan tanah sudah selesai	- Pendampingan proses pengadaan tanah akan dijadwalkan kembali untuk Penambahan Lahan Tol Semarang-Demak/TPST Kab. Magelang di bulan September - Alokasi anggaran 3x pendampingan pada SSK ini akan dialihkan untuk SSK lain yang mendukung capaian target identifikasi HGU dan HP melalui perubahan anggaran

BIDANG PERTANAHAN

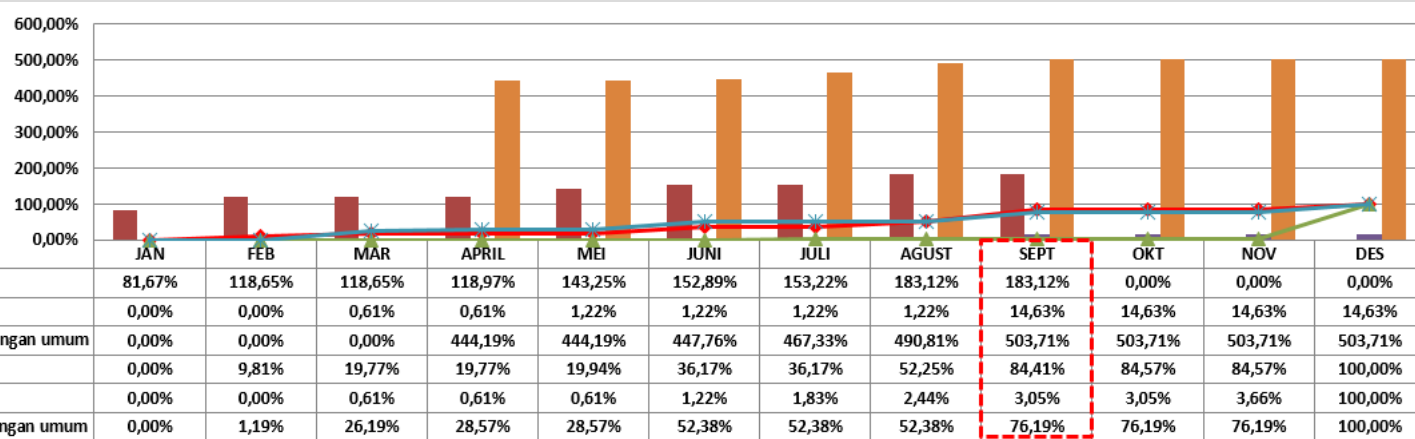

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Persentase pelaksanaan reforma agraria

TARGET 2022

100%

REALISASI S.D SEPTEMBER

183,12%

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2022

REALISASI S.D. SEPTEMBER

Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan

20%

36,62%

Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)

420 Bidang:
5 Bidang HGU
15 Bidang HP
400 Bidang Pemantauan Penlok
1 kali Diseminasi/rakor bidang pertanahan

907 Bidang:
1 Bidang HGU
8 Bidang HP
898 Bidang
1 kali

Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)

2 Lokasi

3 Lokasi

Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)

200 bidang Pemantauan Sertifikasi
7 Lokasi Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA
5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA

229 Bidang
6 Lokasi
6 Kabupaten/Kota

Lanjutan ...

PROGRAM PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Rp. 550.000.000)

INDIKATOR KINERJA
% Pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum

TARGET 2022
100%

REALISASI S.D SEPTEMBER
503,71 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D SEPTEMBER
Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	20%	100,74%
Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	2.000 Bidang Penlok	10.478 Bidang Penlok (Penerbitan SK Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Cilacap; Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500kV <i>pedan sirkuit 2 section 2</i> di Kab. Klaten, Boyolali, dan Semarang) ; Pelaksanaan pengadaan tanah (Konsultasi Publik Pengadaan Tanah DI Pidekso & TPST Magelang)
Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	100 Bidang ZNT	100 Bidang ZNT (Perkiraan Nilai Zonasi Nilai Tanah di Daerah)

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN
(Rp. 500.000.000)


INDIKATOR KINERJA
% Permasalahan pertanahan yang
tertangani

TARGET 2022
100%

REALISASI S.D SEPTEMBER
14,63 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. SEPTEMBER
Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	20%	2,93%
Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	150 Bidang LP2B 8 Bidang TKD	0 Bidang LP2B 20 Bidang TKD (di Kab. Klaten) • Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikat LP2B & TKD • Koordinasi Penetapan Lokasi Objek Bidang Tanah yang akan disertifikat • Pelaksanaan pra sertipikasi, Pelaksanaan Verifikasi Berkas Persyaratan , Koordinasi dalam rangka persiapan pendampingan pemasangan tanda batas tanah LP2B di Kab. Semarang, Cilacap, Blora, Kab. Magelang • Pengukuran Tanda Batas Tanah Kab. Blora • Pembayaran biaya PNBK Kabupaten Blora & Cilacap
Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	6 Sengketa	4 Sengketa • Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanjung Mas (Pemberian Santunan) & Permasalahan keberatan pemberian santunan bangunan madrasah pada kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan Tanjung Mas • Penanganan Permasalahan Pertanahan TPU Dasiknoloyo dan Pracimoloyo di Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo , Permasalahan pertanahan di wilayah perbatasan Kab. Karanganyar dan Kab. Sragen di Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen • Mediasi Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kab. Sukoharjo, Surakarta (TPU), dan Sragen terkait Pemanfaatan ruang (Batas Tanah di Desa Bulungkulon Kec. Jekulo) • Mediasi sengketa pengelolaan Umbul Jetak di Kab. Semarang dan Boyolali

Bidang Keterpaduan PKP

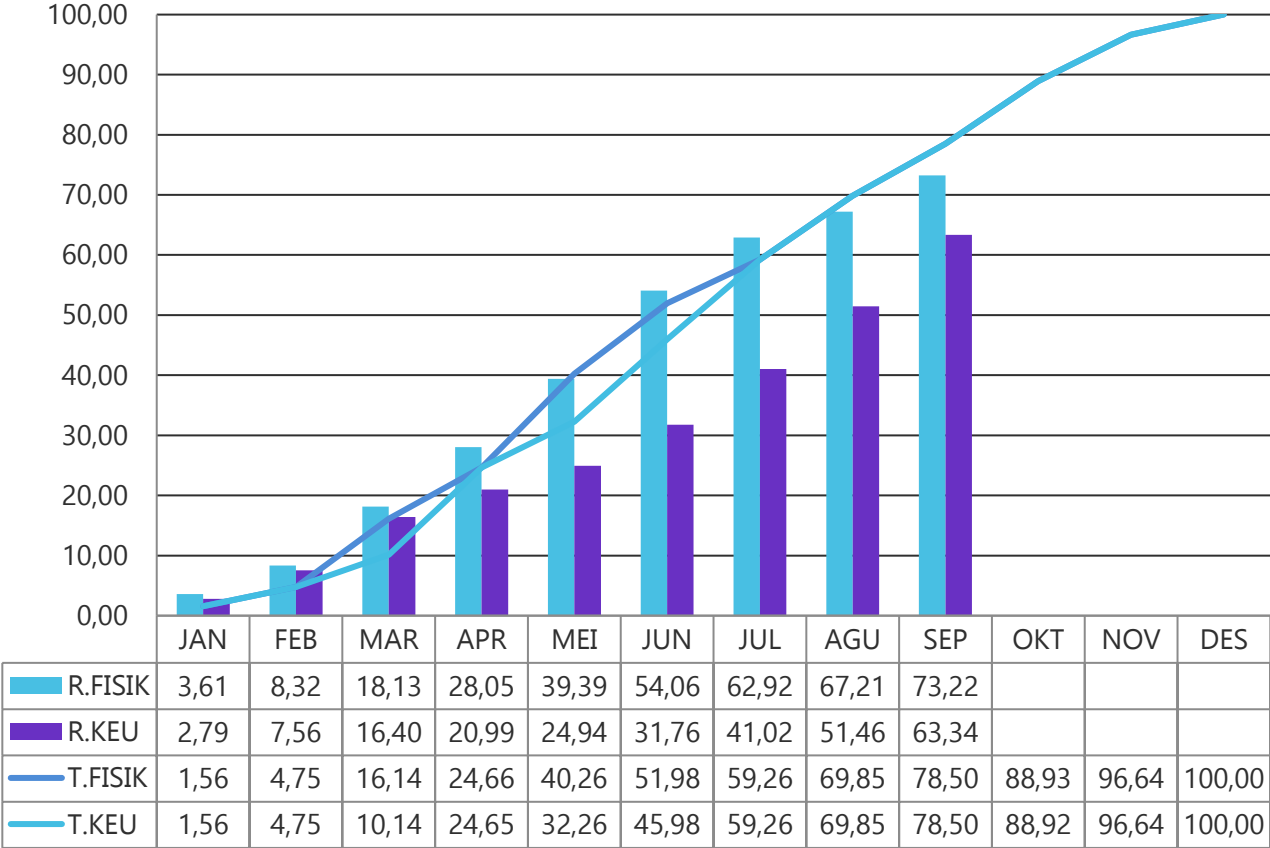

	Septem ber	Oktober (Proгно sis)
Target Fisik	78,50	88,93
Target Keu	78,50	88,92
Real. Fisik	73,22	89,65
Real. Keu	63,34	88,81
Dev. Fisik	-5,28	0,72
Dev. Keu	-15,16	-0,11

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Workshop Implementasi dan Pengembangan Pelayanan Klinik PKP	23.114.000	-86,02	-94,75	- Penundaan workshop implementasi dan pengembangan pelayanan Klinik PKP, karena sedang tahap penyiapan substansi materi	- Workshop akan dijadwalkan kembali pada bulan Oktober
2	Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	166.095.000	2,74	-5,53	- Penundaan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi penyiapan Pokmas pemanfaat RUSPIN - Sisa honor tenaga pendukung bulan Agustus yang tidak terserap karena resign pada akhir Juli	- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penyiapan Pokmas pemanfaat RUSPIN akan dilaksanakan di bulan Oktober - Sudah ada tenaga pendukung pengganti yang mulai bekerja di bulan September
3	Fasilitasi Pelaksanaan KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	135.613.000	-4,15	-4,16	- Sisa alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah untuk monitoring KKN	- Monitoring KKN akan dialokasikan kembali untuk KKN Tematik Periode III pada bulan Oktober – November
4	Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	25.781.000	0,00	-31,88	- Sosialisasi terkait dengan Rumah Layak Huni dilaksanakan sendiri oleh mahasiswa KKN Periode II kepada masyarakat desa, sehingga alokasi narasumber tidak terealisasi	- Optimalisasi alokasi anggaran narasumber untuk KKN Tematik Periode III (Oktober - November)
5	Pengadaan Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	100.000.000	-100,00	-100,00	- Masih dalam tahap koordinasi dan persiapan	- Penyiapan draft KAK dan RAB - Penyiapan petunjuk teknis pinjam pakai alat peraga kepada komunitas masyarakat
6	Penyediaan Honorarium Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	-50,00	-50,00	- Pengadaan alat peraga belum dilaksanakan	- Menyesuaikan penjadwalan ulang pengadaan alat peraga

BIDANG KETERPADUAN PKP

**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,
DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
(Rp. 1.500.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA


% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman

TARGET 2022

100%

REALISASI s.d SEPTEMBER

53,85 %

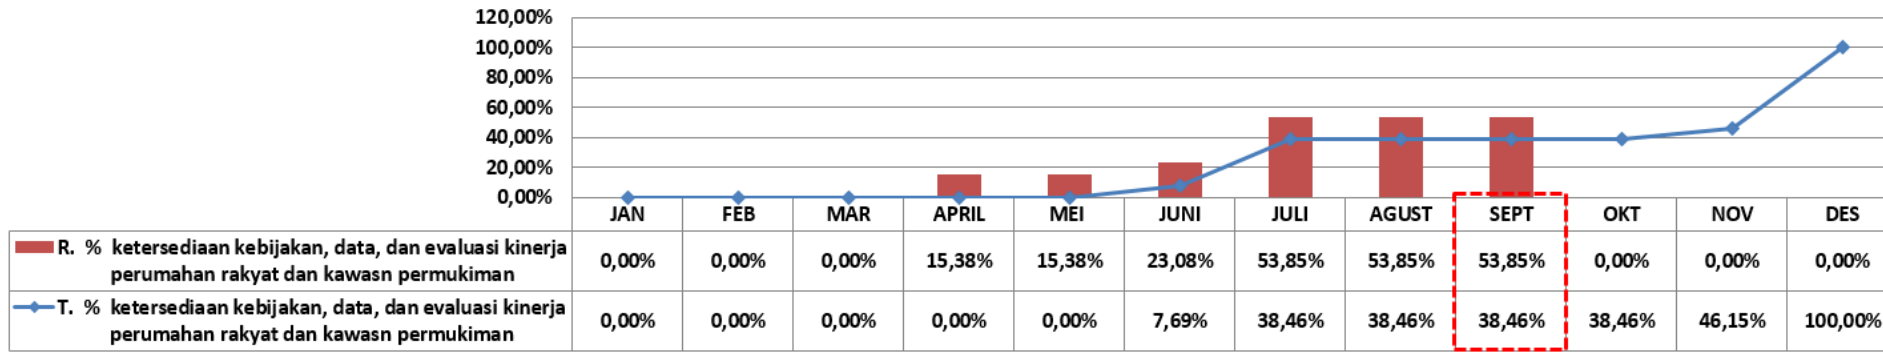

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D SEPTEMBER
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5 Dokumen	3 Dokumen <i>(1 Dokumen Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi, 1 Dokumen Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,1 Dokumen Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)</i> - <i>Monitoring KKN Tematik di Kab. Klaten dan Pemalang</i> - <i>Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah</i>
Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	3 Dokumen	1 Dokumen Evaluasi Lingkup Bidang PKPP Tahun 2021, TA 2022 • Monitoring rusun/rusus di 35 Kab/Kota melalui zoom meeting. • Klarifikasi Data Evaluasi Triwulan 3 Tahun 2022 Lingkup Bidang PKP • Analisis Usulan Lokasi Kegiatan di Bidang PKP
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	5 Dokumen	2 (Dokumen Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data PKP Provinsi Jawa Tengah & <i>Review Keterisian Data PKP Provinsi Jawa Tengah)</i> <i>(Koordinasi Pengumpulan Data, Pengembangan Aplikasi & Pengadaan Jasa Konsultansi Koordinasi Pengumpulan Data, Rapat Internal, Pengembangan Aplikasi, Rapat Tim Teknis Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi PKPP, Persiapan Review Keterisian Data, Review Keterisian Data, Koordinasi Pengumpulan Data, Rapat Internal, Pengembangan Aplikasi)</i>



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir September 2022

Bidang Perumahan

No	Satuan kerja	Penyedia Non-Tender		Tender		Swakelola Tipe IV		Keterangan
		Proses	Terkontrak	Proses	Terkontrak	Proses	Tersalurkan	
1	Perumahan Umum	11	0	1	0	0	13	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran
2	Perumahan Swadaya	0	1	0	0	0	31	Sudah terkontrak seluruhnya
3	Perencanaan Teknis	0	19	0	0	0	0	Sudah terkontrak seluruhnya
Total		11	20	1	0	0	44	

Paket yang Belum Terkontrak:

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
2		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
3		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
4		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
5		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
6		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
7		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
8		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
9		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
10		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
11		Jasa Konsultansi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
12		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi (Terkontrak: 6/6 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana / Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender	Sudah terkontrak tanggal 9 September 2022	70 hari
2		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender	Sudah terkontrak tanggal 24 Agustus 2022	90 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender	Sudah terkontrak tanggal 24 Agustus 2022	90 hari
4		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 30 Juni 2022	120 Hari
5		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 15 Juli 2022	90 hari
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 29 Juni 2022	90 hari

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 8/8 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 8 Maret 2022	60 hari
2		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 15 Maret 2022	60 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari
5		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari
6		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 24 Agustus 2022	90 hari
7		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
8	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 31 Mei 2022	60 Hari

Bidang Keterpaduan PKP

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 10 Maret 2022	Maret s.d. Oktober 2022


Sekretariat

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 23 Agustus 2022	Agustus

Realisasi Belanja Blankon

Catatan:
Data diambil dari sistem Blangkon status 30 September 2022


NILAI TRANSAKSI

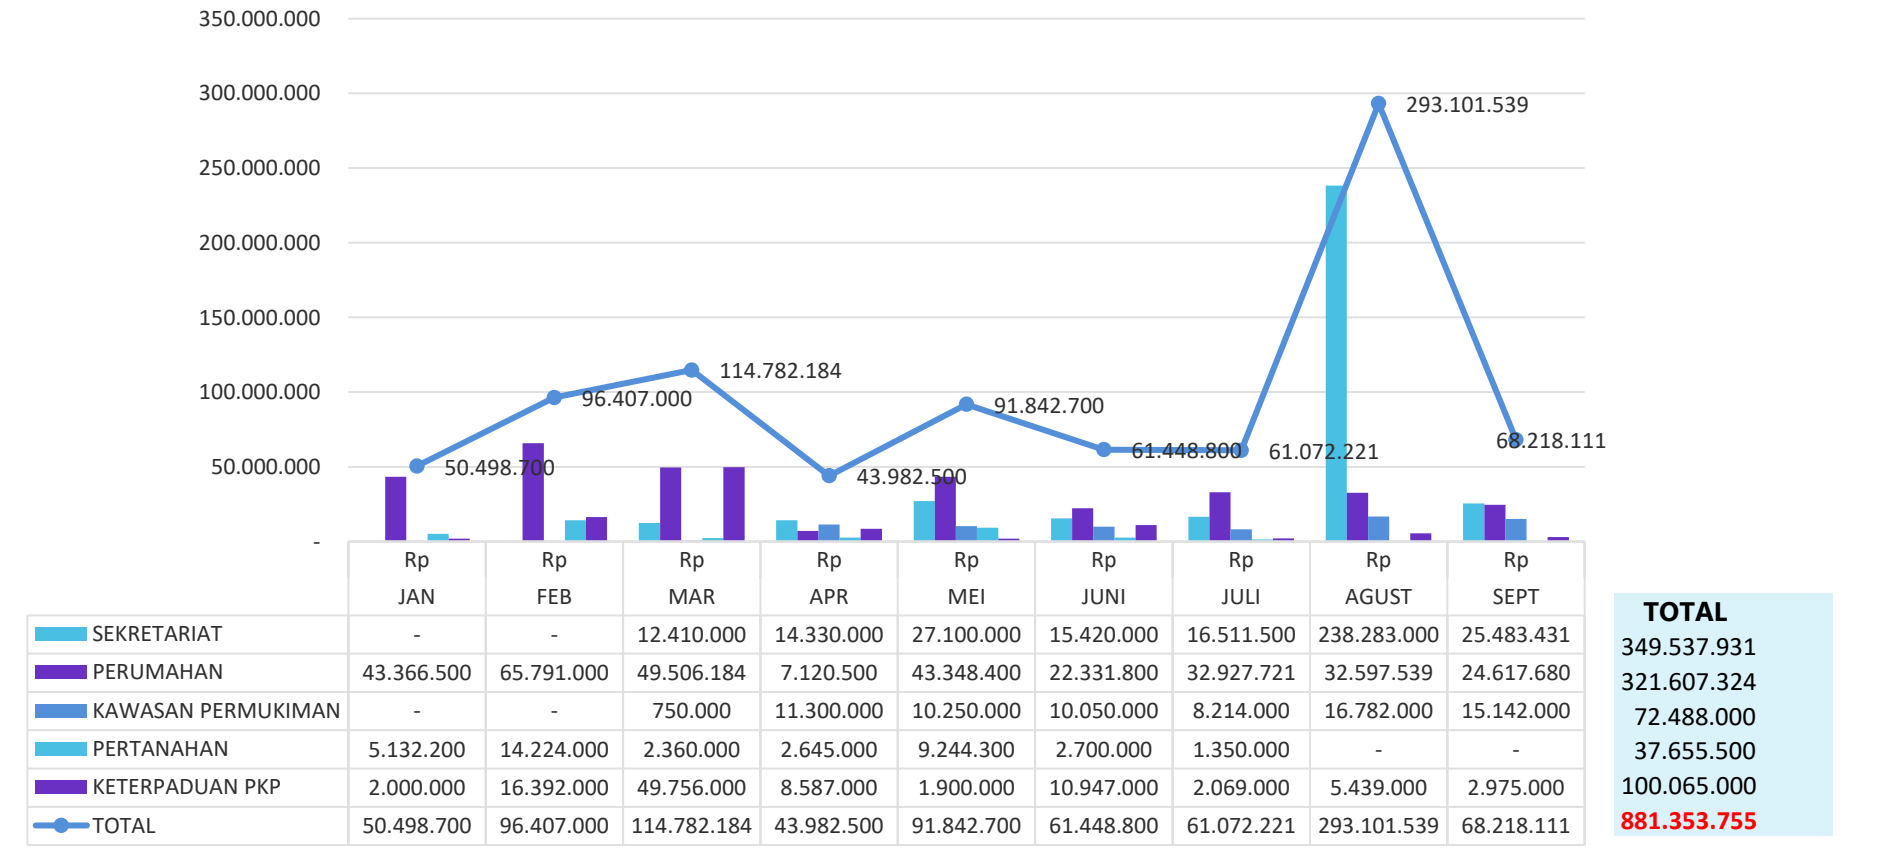

Realisasi Belanja Blankon

Catatan:
Data diambil dari sistem Blangkon status 1 September 2022


JUMLAH TRANSAKSI



SEKRETARIAT	
PERUMAHAN	
KAWASAN PERMUKIMAN	
PERTANAHAN	
KETERPADUAN PKP	
TOTAL	

Transaksi	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT
	-	-	11	14	14	12	17	15	20
	55	67	57	8	51	26	41	40	37
	-	-	1	4	7	10	7	19	11
	2	8	2	3	6	2	1	-	-
	2	15	22	10	4	7	5	3	5
	59	90	93	39	82	57	71	77	73


Transaksi
103
382
59
24
73
641




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir September 2022

Respon LaporGub




Konten Berita Web Dinas




	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
■ Sekretariat	3	4	4	13	8	1	3	26	11	0	0	0
■ Perumahan	37	27	18	20	4	5	11	13	4	0	0	0
■ Kawasan	5	3	4	1	3	1	2	2	4	0	0	0
■ Keterpaduan	2	6	14	2	4	6	1	3	1	0	0	0
■ Pertanian	4	1	3	1	2	2	2	1	1	0	0	0
TOTAL	51	41	43	37	21	15	19	45	21			

Laporan Hasil Survey Kepuasan Website




Laporan Jumlah Kenaikan Pengunjung Website

Minggu IV

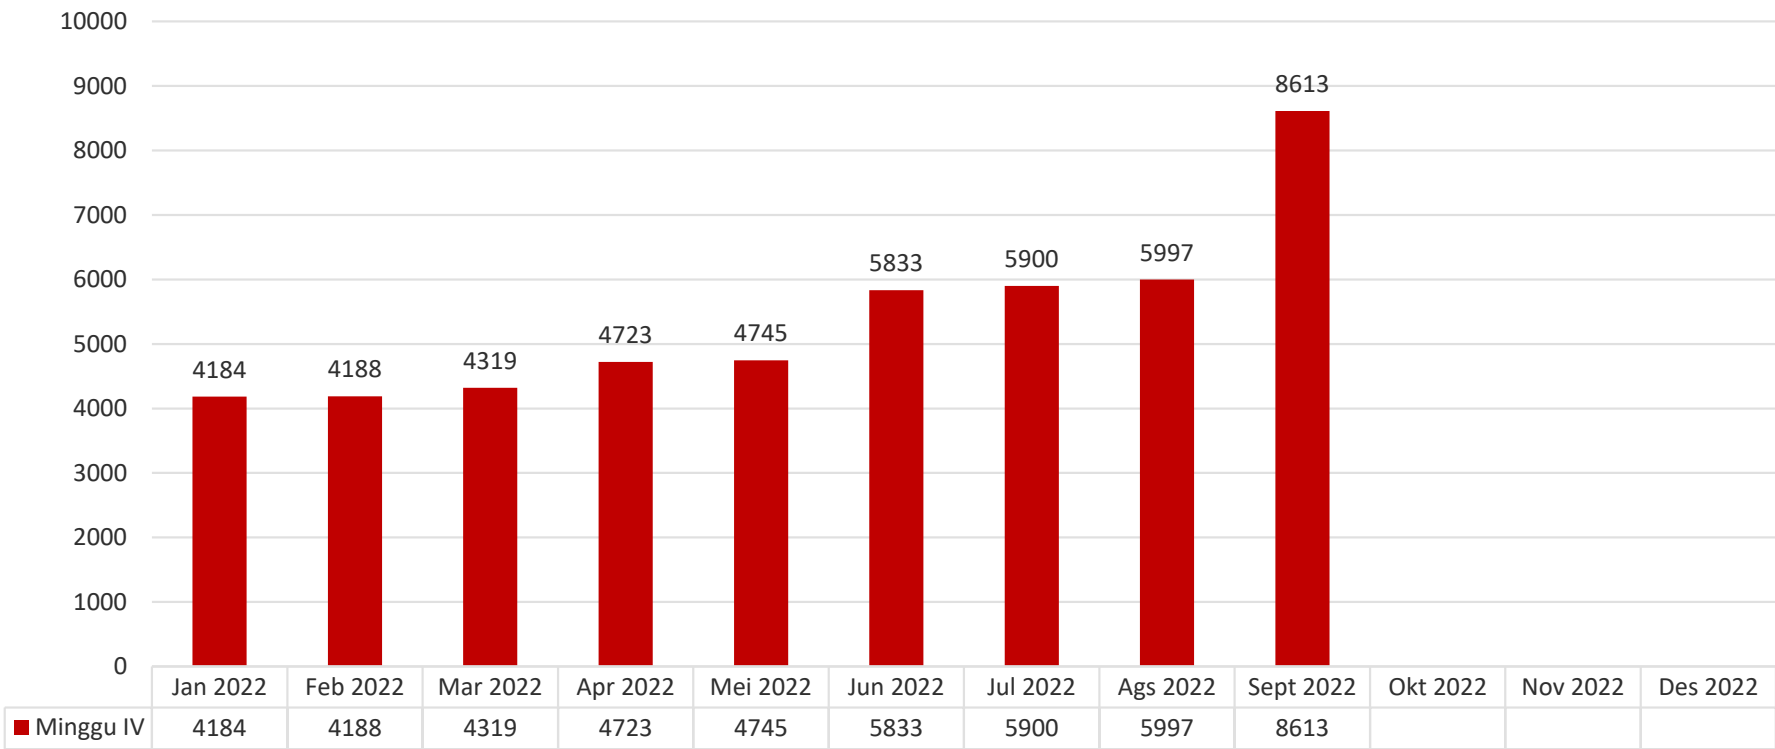


Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website


Minggu IV

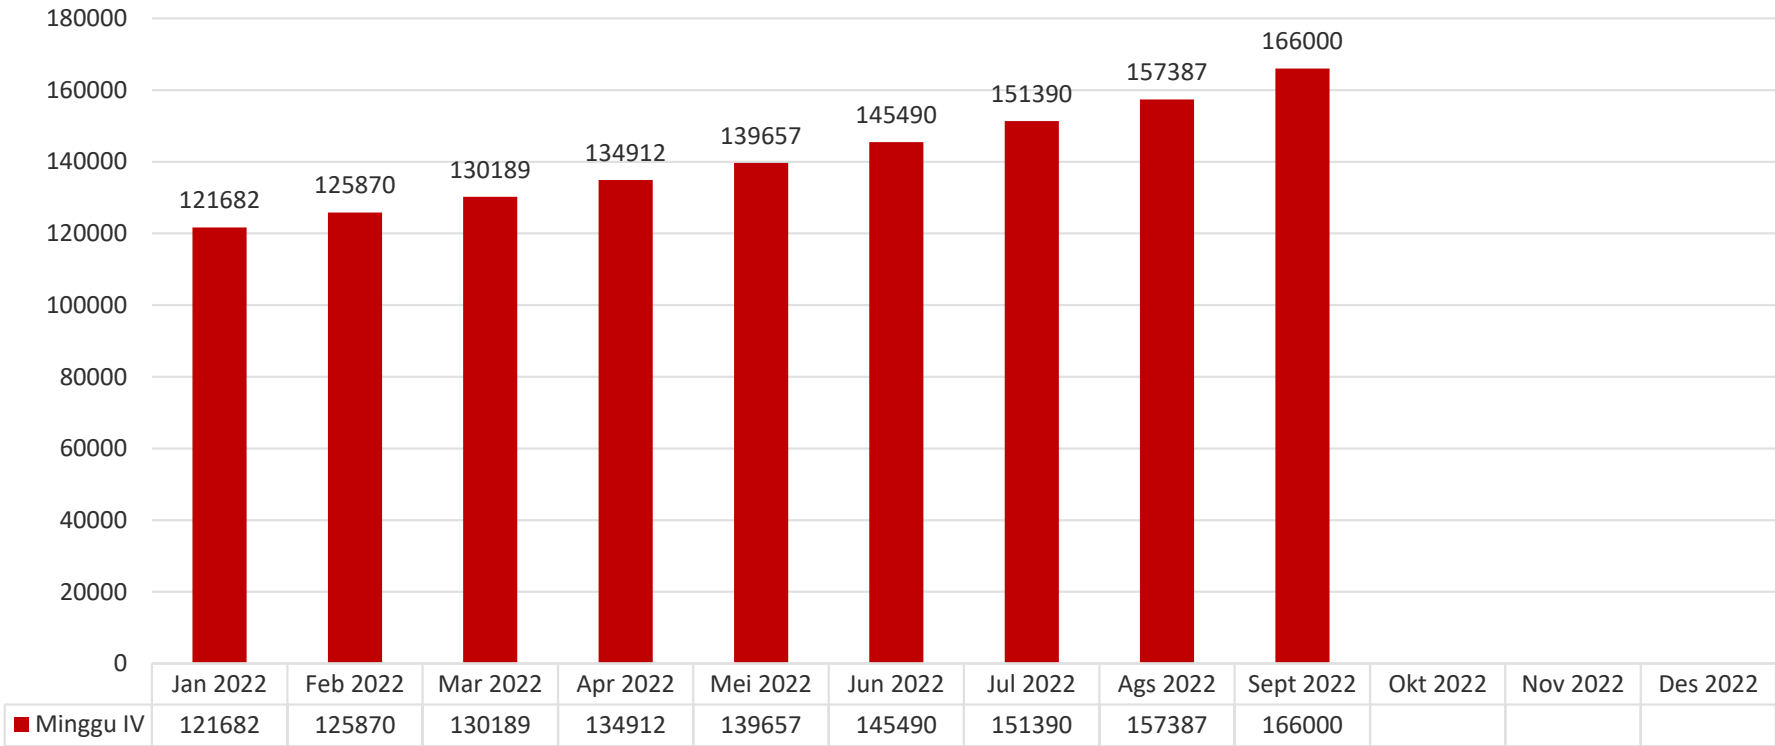

Konten Media Sosial




Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos



ANALITIK MEDIA SOSIAL (TWITTER)

Tweet Anda memperoleh **6.0K tayangan** selama periode **30 hari** ini

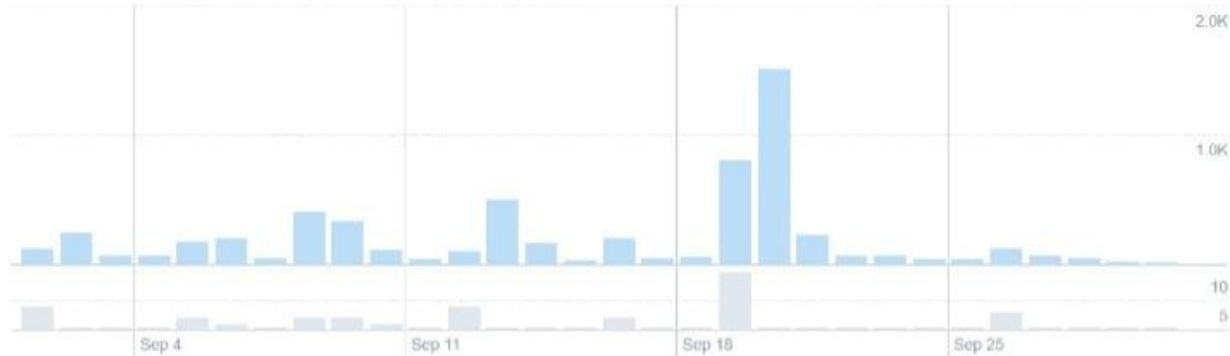

TWEET ANDA

Selama periode 30 hari ini, Anda memperoleh **201 penayangan** per hari.

Tweet Tweet Populer Tweet dan balasan Promosi Tayangan Engagement Tingkat engagement



DisperakimJtg #JatengTangguh @DisperakimJtg · 19 Sep
Ayo, ikuti & ramaikan kompetisi untuk menjadi bagian dari Penataan Kawasan Pesisir Sayung, Kabupaten Demak. Berhadiah total Rp 145 Juta untuk 3 peringkat terbaik hasil penilaian oleh tim penilai dari professional, yg ditutup pada 3 Desember 2022.
[#PenataanKawasan](#)
[#KawasanPesisir](#) pic.twitter.com/XrLcgBJk4o

Lihat aktivitas Tweet

1.504

168

11,2%

Engagement

Menampilkan 30 hari dengan frekuensi harian

Tingkat engagement

2.9%

2.9% tingkat engagement rata-rata



6.816 akun dijangkau dalam 30 hari terakhir
5.874 bukan pengikut



Postingan Anda memiliki kinerja tinggi
296 akun yang berinteraksi dengan postingan ini, lebih dari postingan Anda yang lain.

ANALITIK MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM)

Gambaran Umum

Anda mencapai **+208%** akun lebih banyak dibandingkan dengan 5 Agu - 3 Sep

Akun yang dijangkau	6.816	>
	+208%	
Akun yang berinteraksi	429	>
	+149%	
Total pengikut	2.169	>
	+3,5%	

PENEKANAN

1. Menindaklanjuti arahan Biro APBJ, **agar tidak melakukan transaksi/belanja melalui E-Blankon/M-Biz Market per 1 Oktober 2022** dikarenakan pihak M-Biz tidak mengindahkan komitmen kerjasama. Sehingga untuk sementara belanja dilaksanakan secara manual s.d. waktu yang belum ditentukan;
2. Mempersiapkan **RKO Perubahan TA 2022** sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada PERUBAHAN RENJA DISPERAKIM Prov.Jateng TA 2022;
3. Sesuai dengan Nota Dinas No. 50/VI-KEU/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Laporan Benturan Kepentingan Semester I, **Setiap bidang diharapkan untuk melaporkan benturan kepentingan secara bulanan ke Subbag Keuangan** paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
4. Segera menindaklanjuti saran rekomendasi perbaikan **hasil Evaluasi SAKIP** pada Disperakim Prov.Jateng Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Membuat **pohon kinerja** sesuai dengan Permenpan Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Menyusun **SOP atau mekanisme** yang mengatur proses pengumpulan data kinerja per kegiatan (*on process*);
 - c. Menyusun **juknis reward dan punishment berdasarkan kinerja** untuk seluruh jenjang jabatan;
 - d. Berkoordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah terkait **formulasi pengukuran pada sasaran** "*Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan*" yang terdapat pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

PENEKANAN

5. Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2024 – 2026 dengan terlebih dahulu mengidentifikasi Isu Staregis, **Penyusunan Pohon Masalah, Pohon Kinerja, cascading dan Indikator Kinerja**, dengan tetap memperhatikan hasil **Evaluasi Kinerja s.d akhir tahun 2022** dengan dilengkapi **data – data dukung**.
6. Sehubungan dengan point 5 tersebut, seluruh Pejabat Eselon III, Sub Koordinator, dan Kepala Subbag **wajib mengikuti Penyamaan Persepsi dalam rangka Persiapan Penyusunan RPD - RENSTRA PD Tahun 2024-2026** yang akan dilaksanakan **hari Jumat pukul 13.15 WIB di Ruang Rapat Lt. 3**, dengan asistensi oleh BAPPEDA Prov.Jateng



Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR AGUSTUS 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir Agustus TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

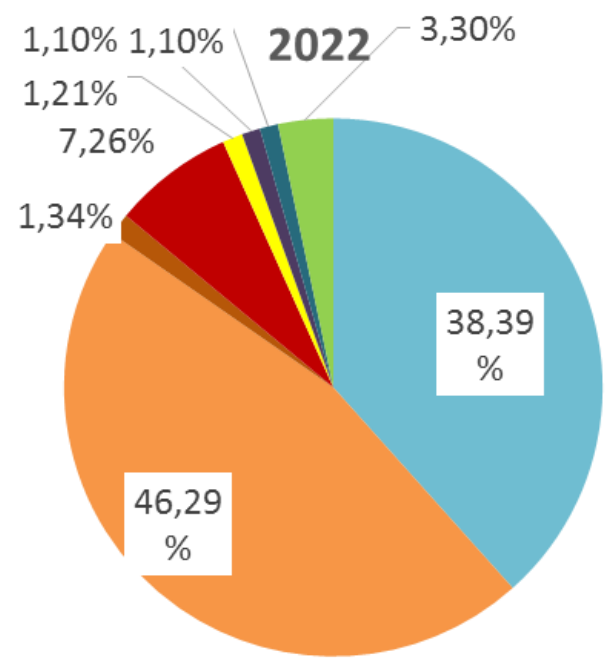

NO.	PROGRAM	2022	
		(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000
	TOTAL	100	45.424.693.000




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir Agustus 2022

^{*)}Realisasi keuangan diambil dari e-controlling status Jumat, 2 September 2022

Disperakim

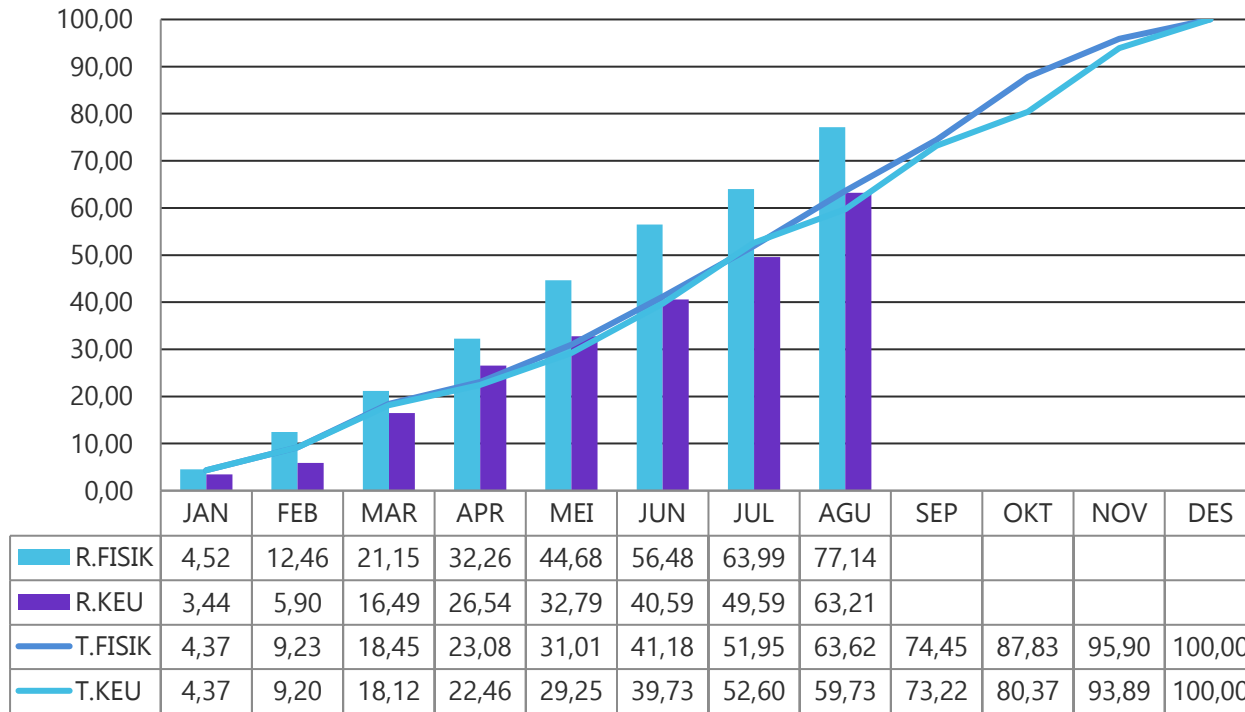

	Agus tus	September (Prognosis)
Target Fisik	63,62	74,45
Target Keu	59,73	73,22
Real. Fisik	77,14	83,09
Real. Keu	63,21	77,10
Dev. Fisik	13,52	8,64
Dev. Keu	3,48	3,88


Progres Fisik dan Keuangan Prov. Jateng

(STATUS 5 SEPT 2022)

Realisasi Fisik: 59,32%

Realisasi Keuangan: 54,99%

Sekretariat

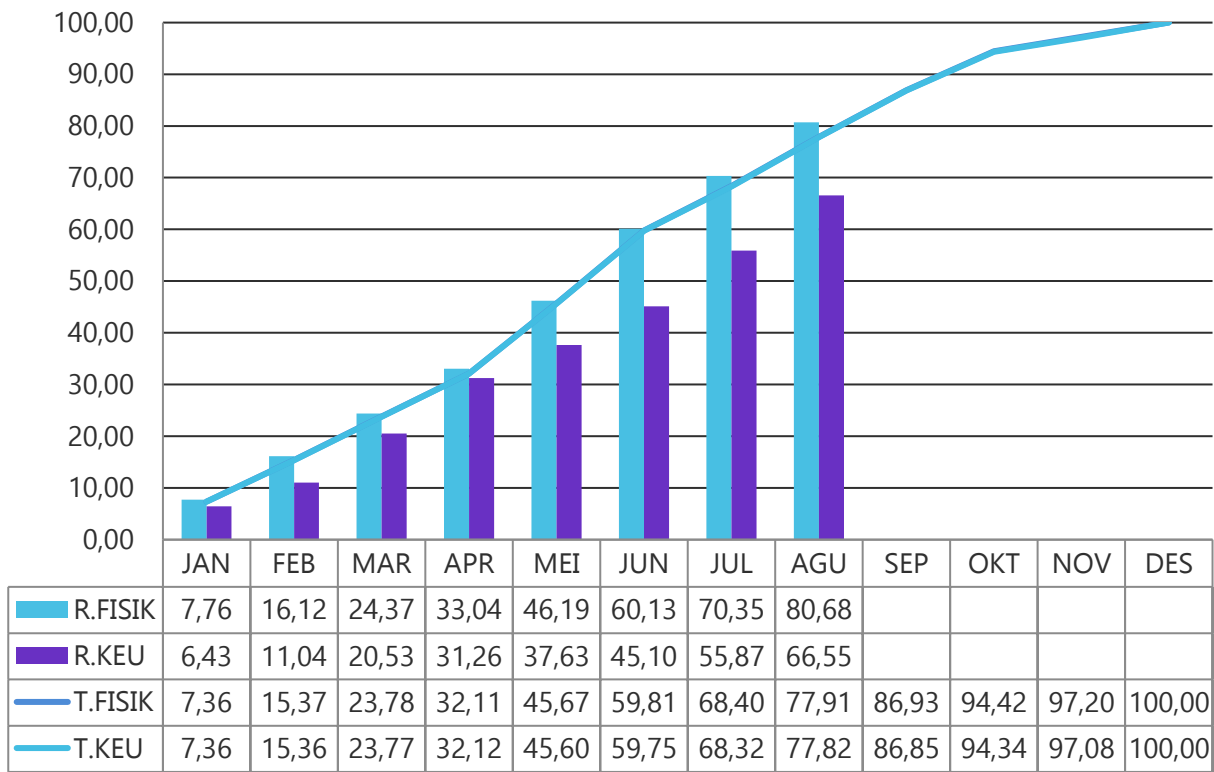


	Agus tus	September (Prognosis)
Target Fisik	77,91	86,93
Target Keu	77,82	86,85
Real. Fisik	80,68	88,04
Real. Keu	66,55	85,39
Dev. Fisik	2,77	1,11
Dev. Keu	-11,27	-1,46

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Keuangan						
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Triwulanan	18.300.000	-4,59	-4,59	Optimalisasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi TW 3 yang akan digabungkan dengan TW 4	Diagendakan kembali bersama TW 4 di bulan Oktober/November

Bidang Perumahan

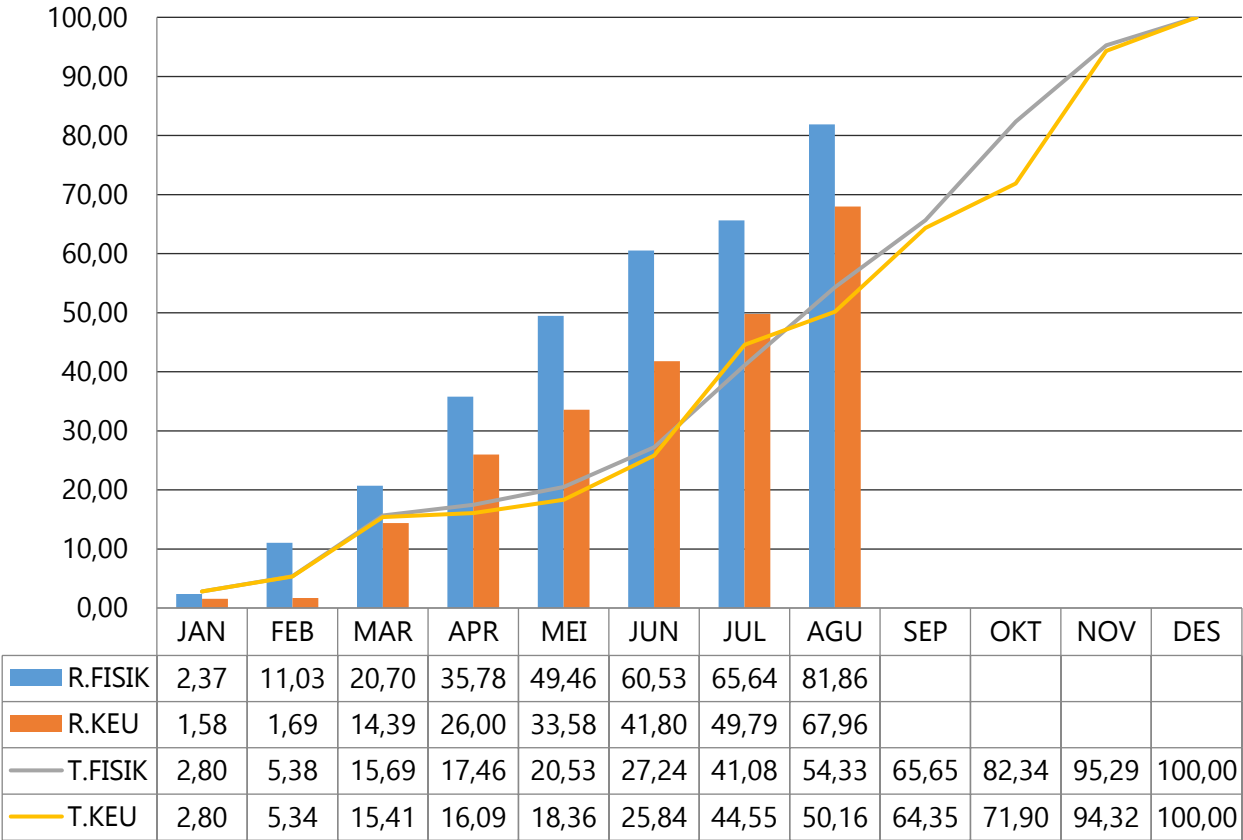

	Agus tus	September (Prognosis)
Target Fisik	54,33	65,65
Target Keu	50,16	64,35
Real. Fisik	81,86	82,81
Real. Keu	67,96	73,54
Dev. Fisik	27,53	17,16
Dev. Keu	17,80	9,19

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.826.000	2,73	-7,15	- Sisa belanja makan minum rapat rakortek pengumpulan data tanggal 2 Juni. - Belanja makan minum rapat internal evaluasi hasil pengumpulan data yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya	realisasi keuangan akan dilaporkan sebagai progres bulan selanjutnya
2	Pelaksanaan Verivali Lapangan Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	96.536.000	4,20	-1,38	Perjalanan dinas dalam rangka verivali Lapangan Calon Penerima bantuan material Rumah Relokasi Program Pemerintah di Banjarnegara belum dibayarkan	Realisasi keuangan masuk sebagai progres bulan September
3	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	0,00	-63,67	Pelaksanaan 19 paket jasa konsultasi sudah selesai, 9 Paket sudah terbayar (Kab. Rembang, Banyumas, Banjarnegara, Boyolali ,Purbalingga, Magelang Demak, Pekalongan, Kebumen), 4 Paket dalam proses pencairan di BPKAD, dan 6 paket masih dalam proses penyelesaian pajak. ^{*)}	Pencairan akan diselesaikan di bulan September
4	Bimtek Validasi Data SIMPERUM	13.519.000	-18,66	-30,47	- Bimtek Validasi Data SIMPERUM ditunda pelaksanaannya karena dialihkan untuk pengumpulan data BNBA calon penerima bantuan relokasi program pemerintah serta penyiapan BNBA untuk RTLH Tahun 2023^{*)} - Efisiensi belanja makan dan minum	- Kegiatan dilaksanakan bulan September - Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

^{*)} Telah diupdate berdasarkan hasil laporan Kabid pada saat rapat POK hari Senin, 5 September 2022

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		

Seksi Perumahan Umum

1	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	612.000.000	-7,84	-7,84	4 penerima Bansos Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana mengundurkan diri karena: - 2 calon penerima akan diusulkan kembali sebagai calon penerima bantuan PB Bencana 2023 - 1 calon penerima sudah pindah domisili ke Kalimantan - 1 calon penerima sudah menerima penanganan melalui BSPS pada Oktober 2021	Akan dilaksanakan penggantian Penerima Bantuan pada Perubahan Anggaran
2	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	15.500.000	28,87	-6,94	Optimalisasi pelaksanaan FGD Hunian Vertikal di Lahan Terbatas yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan di Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
3	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	800.000.000	-12,50	-12,50	Penyaluran Bansos Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana yang semula direncanakan disalurkan pada bulan Maret s.d. Juni sudah tersalurkan seluruhnya s.d. bulan April kecuali 2 penerima yang mengundurkan diri karena: - 1 Penerima sudah memiliki rumah - 1 penerima tidak mampu berswadaya	Bantuan yang tidak dapat tersalurkan telah disiapkan untuk dialokasikan kembali melalui Perubahan Anggaran TA 2022.
4	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	78.170.000	-1,46	-3,23	Terdapat Upah Tenaga Kerja Padat Karya yang belum bisa dibayarkan karena Penerima Bantuan yang mengundurkan diri	Akan dilakukan penggantian Penerima Bantuan pada Anggaran Perubahan

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	800.000.000	-12,50	-12,50	Penyaluran Bansos Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana yang semula direncanakan disalurkan pada bulan Maret s.d. Juni sudah tersalurkan seluruhnya s.d. bulan April kecuali 2 penerima yang mengundurkan diri karena: - 1 Penerima sudah memiliki rumah - 1 penerima tidak mampu berswadaya	Bantuan yang tidak dapat tersalurkan telah disiapkan untuk dialokasikan kembali melalui Perubahan Anggaran TA 2022.
6	Rapat Koordinasi Pembangunan Rusun-Rusun	3.000.000	16,68	-100,00	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta. Saat ini masih dalam Proses untuk mengeluarkan dari target Belanja Modal (sesuai Proses PA 2022) di Biro Adm. Bangda.	Anggaran akan dialokasikan kembali untuk PB Bencana dan PB Relokasi pada perubahan anggaran
7	Pendampingan Pelaksanaan Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	99.206.000	-28,49	-28,10		
8	Rapat Serah Terima Hasil Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	750.000	-75,00	0,00		
9	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	9.000.000	-33,32	-33,33		
10	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah	2.170.000.000	-3,23	-3,23	Sudah tersalurkan seluruhnya kecuali 2 penerima yang mengundurkan diri karena: - 1 Penerima sudah memiliki rumah - 1 penerima tidak mampu berswadaya	Akan dilakukan penggantian Penerima Bantuan pada Anggaran Perubahan TA 2022

*) Telah diupdate berdasarkan hasil laporan Kabid pada saat rapat POK hari Senin, 5 September 2022

BIDANG PERUMAHAN

**PROGRAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN**
(Rp. 21.025.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)

% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)

TARGET 2022

7,39 %

11,84 %

REALISASI S.D AGUSTUS

6,31%

10,43%
(dibawah target bulanan)






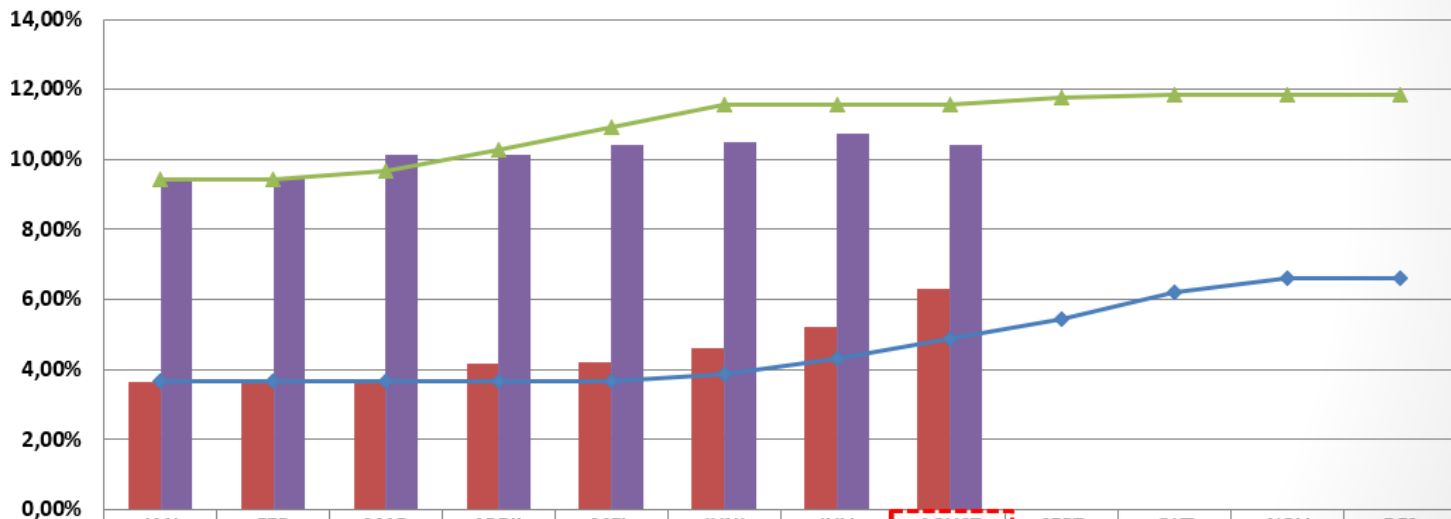


Chart Area


	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
R. % RLH yang disediakan	3,66%	3,66%	3,66%	4,17%	4,22%	4,63%	5,20%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. % RTLH Huni yang tertangani	9,44%	9,44%	10,11%	10,11%	10,43%	10,51%	10,72%	10,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
T. % RLH yang disediakan	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,87%	4,30%	4,89%	5,42%	6,22%	6,61%	6,61%
T. % RTLH yang tertangani	9,44%	9,44%	9,65%	10,28%	10,91%	11,55%	11,55%	11,55%	11,77%	11,86%	11,86%	11,86%

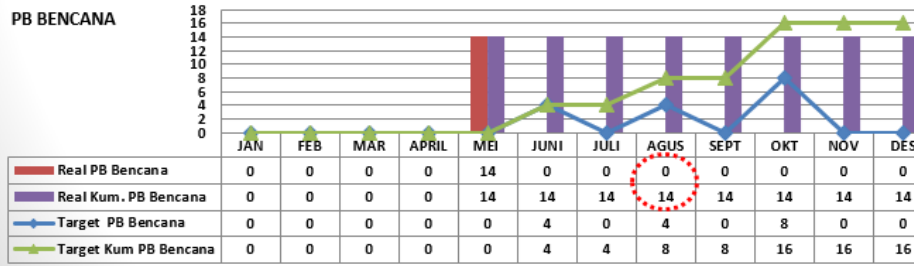

IK SUB KEGIATAN	T. 2022	REALISASI S.D AGUSTUS
Jumlah unit rumah yang dibangun (PB Backlog)	253 unit	223 Unit PB Backlog 13 unit berpotensi mengalami penggantian BNBA melalui PA TA 2022 - Penyelesaian pembangunan 100% di: 11 unit di Kab. Purworejo, 26 unit di Kab. Wonosobo, 27 unit di Kab. Cilacap, 8 unit di Kab. Sragen, 7 unit di Kab. Karanganyar, 13 unit di Kab. Pemalang, 18 unit di Kab. Brebes dan 8 unit di Kab. Sukoharjo
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupemdes RTLH)	11.292 unit	7.846 unit - Proses Rekom 6 - Persiapan Alokasi Kuota Bankeupemdes RTLH Peralihan - Pengajuan Rekom 7
Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (PK dan PB Bencana, PB Relokasi)	51 unit PK	47 Unit PK Bencana 4 Orang gagal menerima bantuan: yang terdiri dari 2 orang Penerima mengundurkan diri karena kondisi rumah yang roboh sehingga akan diusulkan sbg calon penerima bantuan PB Bencana pada tahun 2023, 1 orang pindah domisili Kalimantan & 1 Orang sudah menerima penanganan melalui BPS pada Oktober 2021 - Proses inputing Calon BNBA pengganti yang gagal untuk di proses dalam PA 2022
	16 unit PB-B	14 unit PB-B 2 Orang mengundurkan diri karena sudah membangun rumah secara swadaya - Proses inputing Calon BNBA pengganti yang gagal untuk di proses dalam PA 2022
	62 unit PB-R	60 unit PB-R 2 Penerima mengundurkan diri karena 1 tidak mampu berswadaya, dan 1 orang lainnya sudah mempunyai rumah serta Penyiaian BNBA pengganti untuk perubahan anggaran - Proses inputing Calon BNBA pengganti yang gagal untuk di proses dalam PA 2022
Jumlah dok perencanaan RUSUNAWA & RUSUS (Rencana Induk Rusun)	1 Dok	Pembangunan Rusun dan RC bukan menjadi kewenangan provinsi sehingga anggaran akan di lakukan pengeseran untuk pengoptimalan indikator kinerja yang lain.
Jumlah dokumen yang disusun	5 Dok	- Proses Verifikasi calon Penerima PB dan PK, Sosialisasi Teknis, Bimtek Validasi data simperum - Sosialisasi huntap & huntara kepada penghuni rusun/rusus di Kab. Kendal



Bidang Kawasan Permukiman

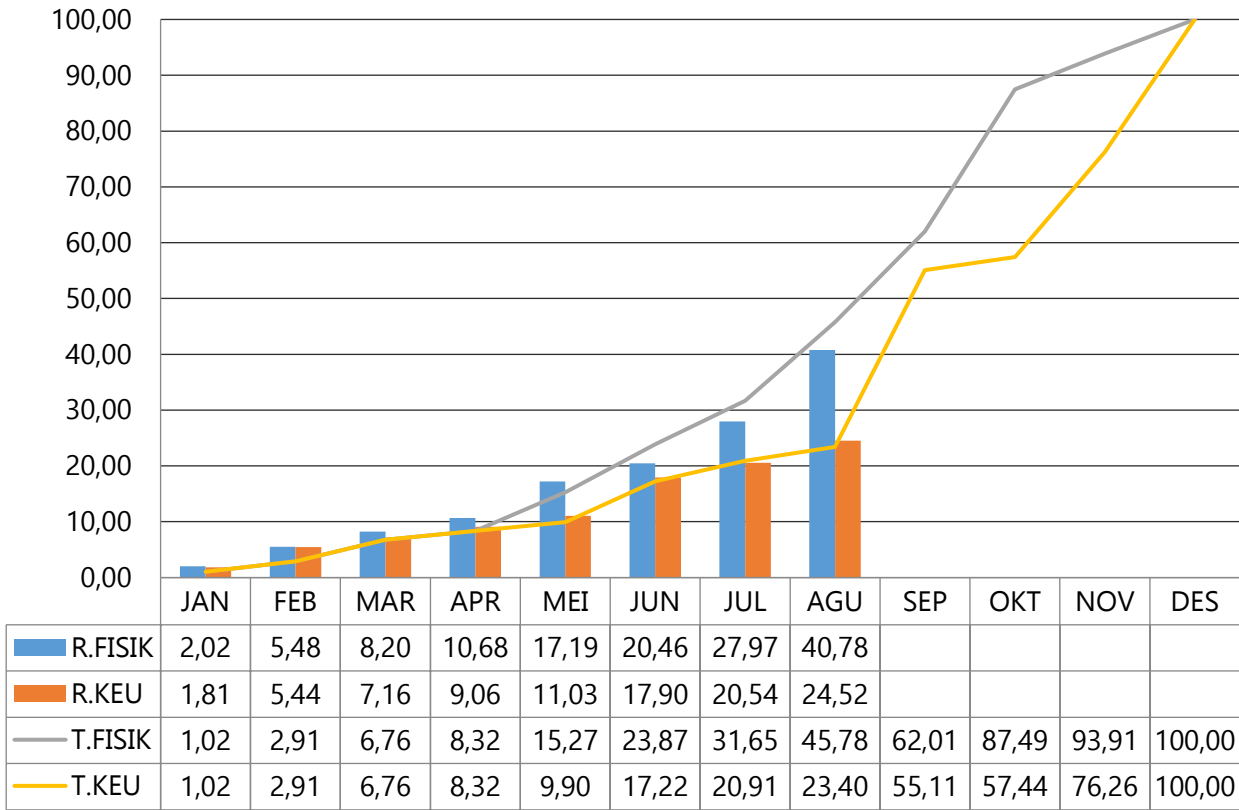

	Agus tus	September (Prognosis)
Target Fisik	45,78	62,01
Target Keu	23,40	55,11
Real. Fisik	40,78	63,97
Real. Keu	24,52	57,06
Dev. Fisik	-5,00	1,96
Dev. Keu	1,12	1,95

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	FGD Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	28.118.000	0,00	-15,49	Belanja ATK belum dilaksanakan karena menyesuaikan kebutuhan	Akan dibelanjakan di bulan September
2	Persiapan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	35.388.000	0,00	-15,77	Perjalanan dinas dalam rangka Studi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022 belum dibayarkan	Masuk sebagai progres keuangan bulan September
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
1	FGD Dalam Rangka Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha	6.500.000	-100,00	-100,00	Data RTLH di Kawasan Kumuh sebagai substansi FGD telah disepakati.	Penjadwalan ulang di bulan September
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	-12,8	-12,79	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh akan dilaksanakan setelah FGD sebagai bentuk tindak lanjut	Penjadwalan ulang setelah pelaksanaan FGD

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman						
1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PSU Permukiman Provinsi Jawa Tengah	34.820.000	0,00	-25,94	sisa belanja honor narasumber dan transportasi	Akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan bulan selanjutnya
2	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2022	180.000.000	0,00	-21,50	Pembayaran Pekerjaan Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2022 sebesar 20 % akan dibayarkan setelah serah terima pertama (PHO)	Serah terima pertama pelaksanaan konstruksi Hadiah Lomba Hari Habitat (direncanakan selesai di bulan Oktober s.d. November)
3	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	-50,00	0,00	Proses pengadaan barang dan jasa Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah mundur sebagai dampak adanya rekomendasi BPKP dan adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022	Melakukan percepatan progres agar pekerjaan sesuai jadwal (masa kontrak s.d. bulan Oktober)
4	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	-40,00	0,00	Proses pengadaan barang dan jasa Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan) sebagai dampak adanya rekomendasi BPKP dan adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022	Melakukan percepatan progres agar pekerjaan sesuai jadwal (masa kontrak s.d. bulan September)
5	Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	-40,00	0,00	Proses pengadaan barang dan jasa Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukimanmundur sebagai dampak adanya rekomendasi BPKP dan adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022	Melakukan percepatan progres agar pekerjaan sesuai jadwal (masa kontrak s.d. bulan Oktober)

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

**PROGRAM
PENINGKATAN PSU
(Rp. 3.300.000.000)**

INDIKATOR KINERJA

% Kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET 2022

17,00%

REALISASI S.D AGUSTUS

0 %

INDIKATOR KINERJA


% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET 2022

23,37 %

REALISASI S.D AGUSTUS

24,21 %

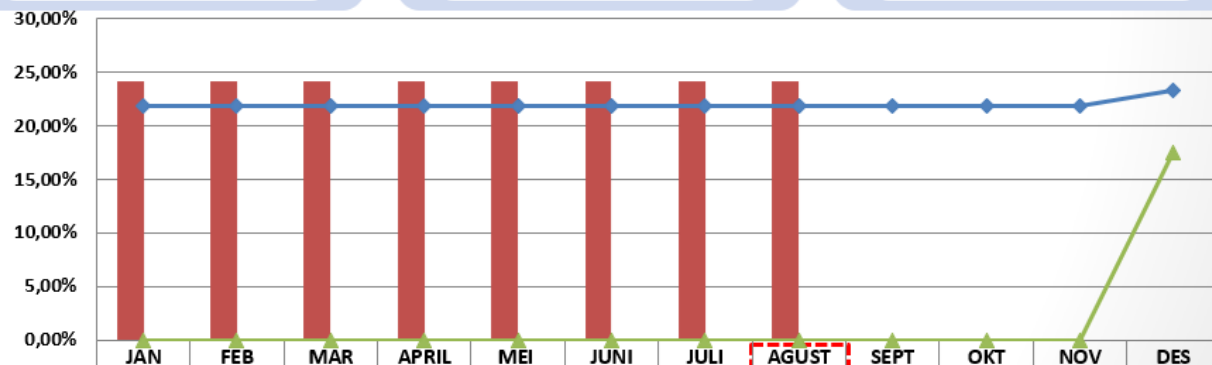[illegible]

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 3.300.000.000)


Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D AGUSTUS
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	0 Lokasi - Pelaksanaan lomba hari habitat 2022, Kontrak Pekerjaan Penyusunan Perencanaan/DED Hadiah Lomba Hari Habitat 2022 - Sosialisasi Penyusunan Perencanaan/DED Hadiah Lomba Hari Habitat 2022 kepada Pemkab/Kota dan masyarakat setempat - Proses pengadaan barang dan jasa di Biro APBJ untuk pekerjaan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana hadiah lomba hari habitat - Proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan Supervisi
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	0 Dokumen - Koordinasi internal inventarisasi serah terima PSU Perumahan Kabupaten/Kota - Pembahasan laporan antara Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Utara Prov. Jateng - Pembahasan laporan pendahuluan studi identifikasi kawasan permukiman tradisional Studi Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman Prov. Jateng - Pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 610.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D AGUSTUS
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	0 Lokasi (koordinasi pelaksanaan integrasi penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan, Surakarta, Tegal, Kab. Purworejo, Kab. Demak Pengelolaan database penanganan RTLH di kawasan kumuh)
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	0 Dokumen (Koordinasi internal inventarisasi usulan bankeu Kab/Kota, Monev pelaksanaan fisik Bankeu Sarpras ke Pati)
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen - Rakor kawasan permukiman liar (Squatter settlement) Provinsi Jawa Tengah - Verifikasi hibah di Kab. Boyolali dan Kab. Jepara
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	0 Dokumen - Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi studi identifikasi kawasan permukiman kumuh skala prioritas provinsi di Kab. Grobogan dan Kota Surakarta - Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kab. Wonosobo, Magelang, Sragen, Demak, Kendal, Kota Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten Kab. Batang, Kab. Rembang, Kab. Brebes dan Kab. Blora - Laporan Antara Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi

Bidang Pertanahan

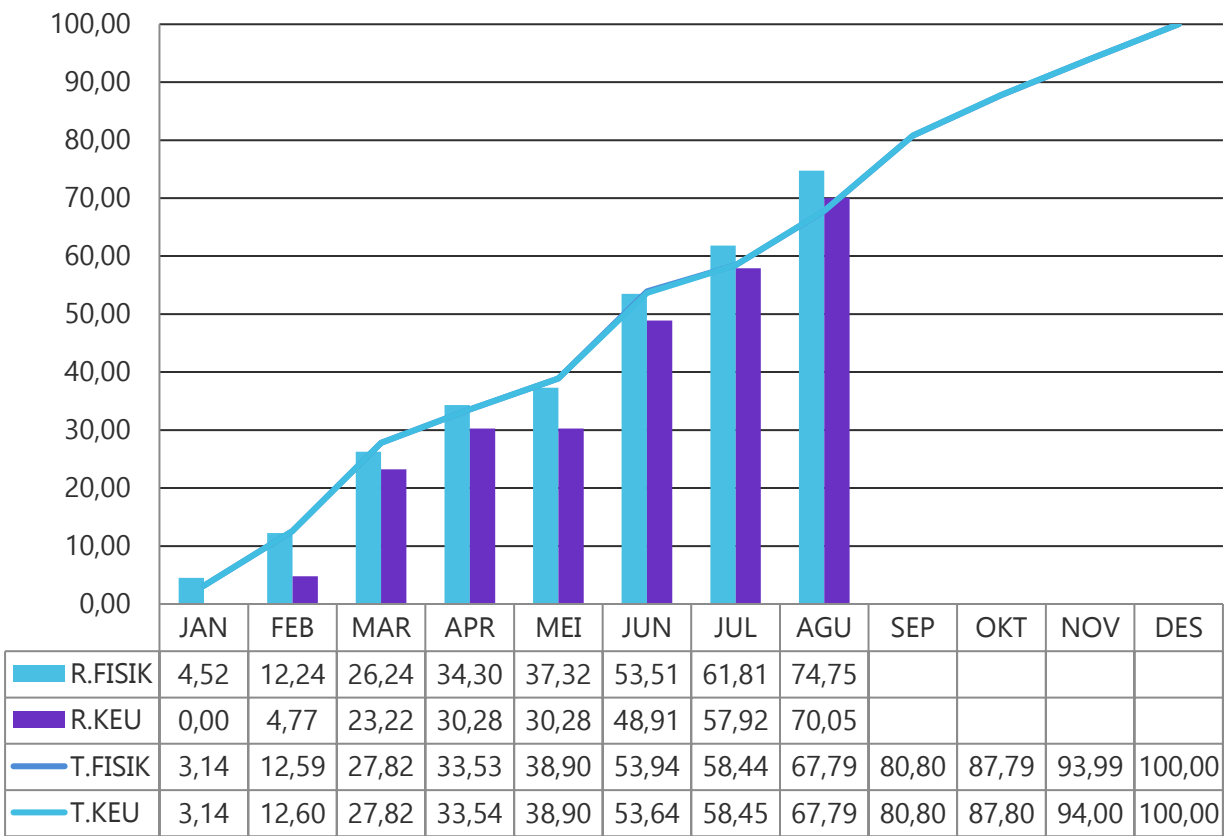


	Agus tus	September (Prognosis)
Target Fisik	67,79	80,80
Target Keu	67,79	80,80
Real. Fisik	74,75	83,18
Real. Keu	70,05	80,51
Dev. Fisik	6,96	2,38
Dev. Keu	2,26	-0,30

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Rapat Verifikasi Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	16.875.000	0,00	-6,67	Kegiatan Rapat verifikasi Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Tambahan Lahan Jalan Tol Semarang-Demak dilaksanakan di akhir bulan Agustus sehingga realisasi keuangan masuk di bulan berikutnya	Progres keuangan masuk bulan September
Seksi Fasilitas Permasalahan Pertanahan						
1	Pelaksanaan Mediasi Permasalahan Pertanahan	78.925.000	-3,21	-3,21	- Penanganan dampak sosial pembangunan Tol Semarang-Demak menunggu dokumen dari instansi yang memerlukan tanah - Penanganan permasalahan tanah makam di Sukoharjo dan Surakarta masih dalam proses penyusunan proposal perdamaian oleh masing-masing Pemda	- Akan dilaksanakan setelah proses pengadaan tanah berjalan - Akan dilaksanakan rapat finalisasi kesepakatan penyelesaian permasalahan bersama kedua Pemda dan instansi terkait di bulan Oktober
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan						
1	Pendampingan Proses Pengadaan Tanah dan Penanganan Dampak	24.350.000	-42,16	-42,16	- Pendampingan proses pengadaan tanah/penanganan dampak yang semula direncanakan akan dilaksanakan 3 kali s.d. bulan Juni (dari total 5 pelaksanaan) baru dilaksanakan 1 kali. - Pendampingan proses penetapan lokasi DI Pidekso Kab. Wonogiri yang dijadwalkan di bulan Agustus tidak dilaksanakan karena proses pengadaan tanah sudah selesai	- Pendampingan proses pengadaan tanah akan dijadwalkan kembali untuk Penambahan Lahan Tol Semarang-Demak/TPST Kab. Magelang di bulan September - Alokasi anggaran 3x pendampingan pada SSK ini akan dialihkan untuk SSK lain yang mendukung capaian target identifikasi HGU dan HP melalui perubahan anggaran

BIDANG PERTANAHAN

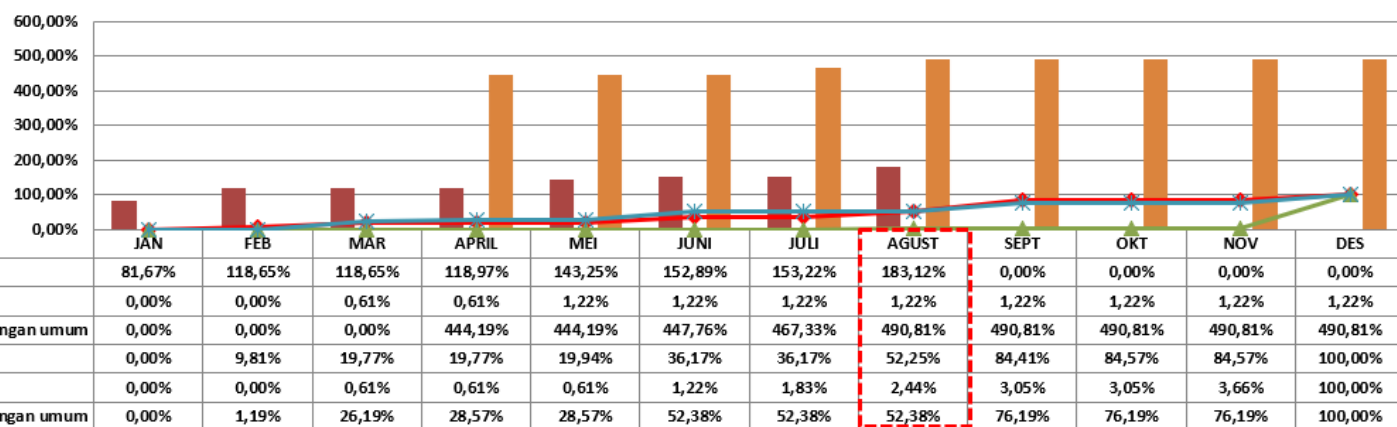

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
(Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Persentase pelaksanaan reforma agraria

TARGET 2022

100%

REALISASI S.D AGUSTUS

183,12%

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2022

REALISASI S.D. AGUSTUS

Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan

20%

36,62%

Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)

420 Bidang:
5 Bidang HGU
15 Bidang HP
400 Bidang Pemantauan Penlok
1 kali Diseminasi/rakor bidang pertanahan

907 Bidang:
1 Bidang HGU
8 Bidang HP
898 Bidang
1 kali

Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)

2 Lokasi

3 Lokasi

Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)

200 bidang Pemantauan Sertifikasi
7 Lokasi Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA
5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA

229 Bidang
6 Lokasi
6 Kabupaten/Kota


Lanjutan ...	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Rp. 550.000.000)	INDIKATOR KINERJA % Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	TARGET 2022 100%	REALISASI S.D AGUSTUS 492,81 %
--------------	--	--	---------------------	-----------------------------------

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D AGUSTUS
Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	20%	93,47%
Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	2.000 Bidang Penlok	9.714 Bidang Penlok (Penerbitan SK Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Cilacap; Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500kV di Kab. Klaten, Boyolali, dan Semarang) ; Pelaksanaan pengadaan tanah (sosialisasi, pendataan, konsultasi publik)
Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	100 Bidang ZNT	100 Bidang ZNT (Perkiraan Nilai Zonasi Nilai Tanah di Daerah)

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Rp. 500.000.000)	INDIKATOR KINERJA % Permasalahan pertanahan yang tertangani	TARGET 2022 100%	REALISASI S.D AGUSTUS 1,22 %
---	--	---------------------	---------------------------------

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. AGUSTUS
Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	20%	0,24%
Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	150 Bidang LP2B 8 Bidang TKD	0 Bidang LP2B 0 Bidang TKD - Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikat LP2B & TKD - Koordinasi Penetapan Lokasi Objek Bidang Tanah yang akan disertifikat - Pelaksanaan pra sertipikasi, Pelaksanaan Verifikasi Berkas Persvaratan , Koordinasi dalam rangka persiapan pendampingan pemasangan tanda batas tanah LP2B di Kab. Semarang, Cilacap, Blora, Kab. Magelang - Pendampingan Pemasangan Tanda Batas Tanah di Kab. Semarang dan Kab. Blora serya Pendampingan pengukuran di Kab. Cilacap
Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	6 Sengketa	2 Sengketa - Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanjung Mas (Pemberian Santunan) & Permasalahan keberatan pemberian santunan bangunan madrasah pada kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan Tanjung Mas - Penanganan Permasalahan Pertanahan TPU Dasiknolooyo dan Pracimoloyo di Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo - Mediasi Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kab. Sukoharjo, Surakarta (TPU), dan Sragen terkait Pemanfaatan ruang (Batas Tanah di Desa Bulungkulon Kec. Jekulo) - Mediasi sengketa pengelolaan Umbul Jetak di Kab. Semarang dan Boyolali

Bidang Keterpaduan PKP

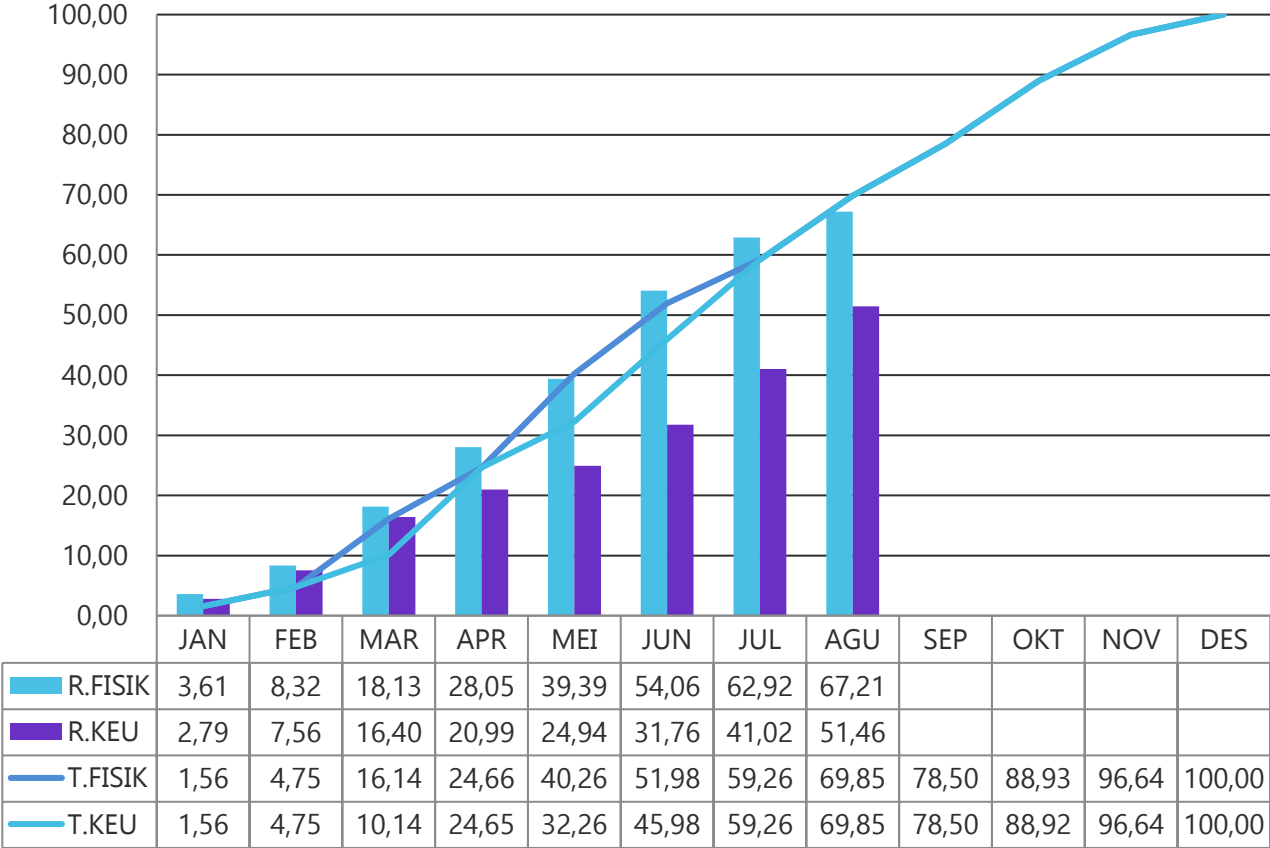

	Agus tus	September (Prognosis)
Target Fisik	69,85	78,50
Target Keu	69,85	78,50
Real. Fisik	67,21	79,46
Real. Keu	51,46	79,46
Dev. Fisik	-2,64	0,96
Dev. Keu	-18,39	0,96

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Fasilitasi Pokja/ Forum PKP dan Pengembangan Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	88.571.000	4,05	-6,09	Rakor Forum Kemitraan sudah dilaksanakan dengan jumlah peserta lebih sedikit dari yang direncanakan.	Akan dilaksanakan Rakor Forum Kemitraan Periode 2 di bulan September
2	Workshop Implementasi dan Pengembangan Pelayanan Klinik PKP	23.114.000	0,00	-6,49	Pembayaran Rapat persiapan Workshop implementasi dan pengembangan pelayanan klinik PKP belum dilaksanakan karena acara diselenggarakan pada 26 Agustus 2022	Realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan September
	Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	166.095.000	-3,48	-3,87	Penundaan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penyiapan Pokmas Pemanfaat RUSPIN di Kab. Pekalongan, Brebes, Cilacap, Magelang karena menunggu kesiapan Kabupaten serta Pokmas	Akan dilaksanakan di bulan September
3	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	360.000.000	0,00	-58,48	Keterlambatan pembayaran Termin 2 karena adanya persyaratan dokumen yang perlu dilengkapi oleh Konsultan BU	- Mendorong Konsultan BU untuk melengkapi dokumen - Rencana pembayaran termin 2 dan 3 di bulan September

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
3	Fasilitasi Pelaksanaan KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	135.613.000	-7,15	-7,16	Monitoring KKN Tematik di Kab. Klaten dan Pemalang karena menyesuaikan jadwal Expo KKN	Akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 September 2022
4	Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	25.781.000	-29,83	-33,32	Sosialisasi KKN Tematik akan dilaksanakan di Periode KKN Tematik Tahap 3 yang dilaksanakan di bulan September-Oktober	dijadwalkan kembali di bulan September
5	Pengadaan Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	100.000.000	-50,00	-50,00	-Penyiapan KAK dan RAB - Penyiapan petunjuk teknis pinjam pakai alat peraga kepada komunitas masyarakat	
6	Penyediaan Honorarium Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	-37,50	-37,50	Pengadaan alat peraga belum dilaksanakan	Menyesuaikan penjadwalan ulang pengadaan alat peraga.


BIDANG KETERPADUAN PKP

**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,
DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
(Rp. 1.500.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA
% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman

TARGET 2022
100%

REALISASI s.d AGUSTUS
53,85 %

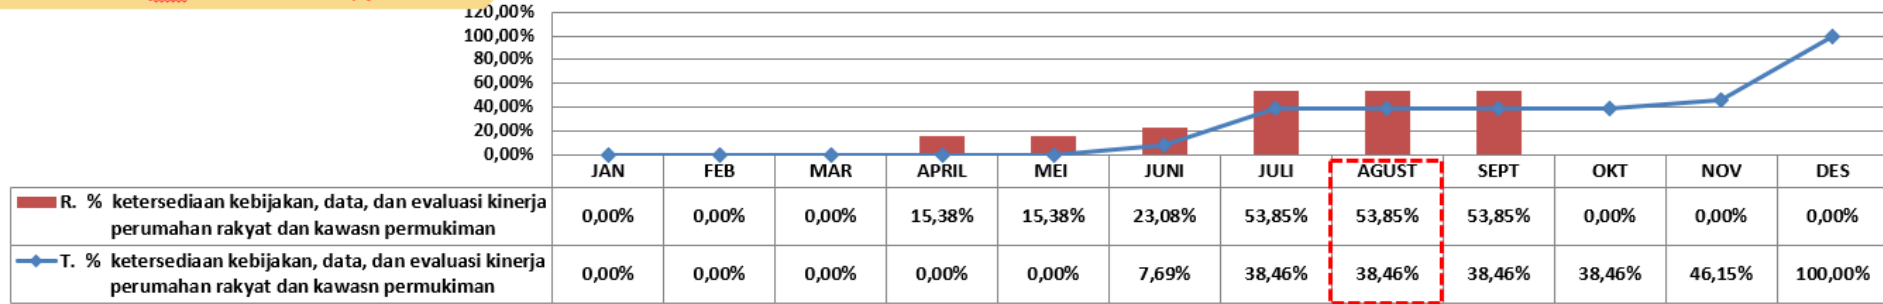

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D AGUSTUS
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5 Dokumen	3 Dokumen (1 Dokumen Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi, 1 Dokumen Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 1 Dokumen Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) - KKN Tematik Kemitraan Periode II di Kab. Klaten dan Pemalang - FGD Penyusunan Proposal KP SPAMS kepada Lembaga Keuangan - FGD Penanganan Kedaruratan Bencana Alam
Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	3 Dokumen	1 Dokumen Evaluasi Lingkup Bidang PKPP Tahun 2021, TA 2022 • Rapat evaluasi lingkup PKP Semester I • Penyerahan Penghargaan Hapernas kategori Penanganan Kawasan Permukiman :Juara 1 Kota Semarang, Juara 2 Kab. Banyumas, Juara 3 Kota Tegal • Penyerahan Penghargaan Hapernas kategori dukungan terhadap program penanganan RTLH : Juara 1 Kab. Semarang, Juara 2 Kab. Boyolali, Juara 3 Kab. Sukoharjo • Penyerahan Penghargaan Hapernas kategori pelaksanaan penyelenggaraan Pokja PKP : Juara 1 Kab. Sukoharjo, Juara 2 Kab. Demak, Juara 3 Kab. Tegal
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	5 Dokumen	2 (Dokumen Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data PKP Provinsi Jawa Tengah & Review Keterisian Data PKP Provinsi Jawa Tengah) (Koordinasi Pengumpulan Data, Pengembangan Aplikasi & Pengadaan Jasa Konsultansi Koordinasi Pengumpulan Data, Rapat Internal, Pengembangan Aplikasi, Rapat Tim Teknis Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi PKPP, Persiapan Review Keterisian Data, Review Keterisian Data, Koordinasi Pengumpulan Data, Rapat Internal, Pengembangan Aplikasi)



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Agustus 2022

Bidang Perumahan

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 20/31 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
6		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
7		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
8		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
9		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
10		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
11		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
20	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
21		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
22		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
23		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
24		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
25		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
26		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
27		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
28		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
29		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
30		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
31	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - SIMPERUM	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 7 April 2022	April - Desember

Tender

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi (Terkontrak: 5/6 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana / Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender	surat penunjukan penyedia barang dan jasa	Juli
2		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender	Sudah terkontrak tanggal 24 Agustus 2022	90 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender	Sudah terkontrak tanggal 24 Agustus 2022	90 hari
4		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 30 Juni 2022	120 Hari
5		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 15 Juli 2022	90 hari
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 29 Juni 2022	90 hari

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 8/8 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 8 Maret 2022	60 hari
2		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 15 Maret 2022	60 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari
5		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari
6		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 24 Agustus 2022	90 hari
7		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 28 Juli 2022	75 hari
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
8	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 31 Mei 2022	60 Hari

Bidang Keterpaduan PKP


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 10 Maret 2022	Maret s.d. Oktober 2022

Sekretariat

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 23 Agustus 2022	Agustus

Realisasi Belanja Blankon

Catatan:
Data diambil dari sistem Blangkon status 28 Agustus 2022

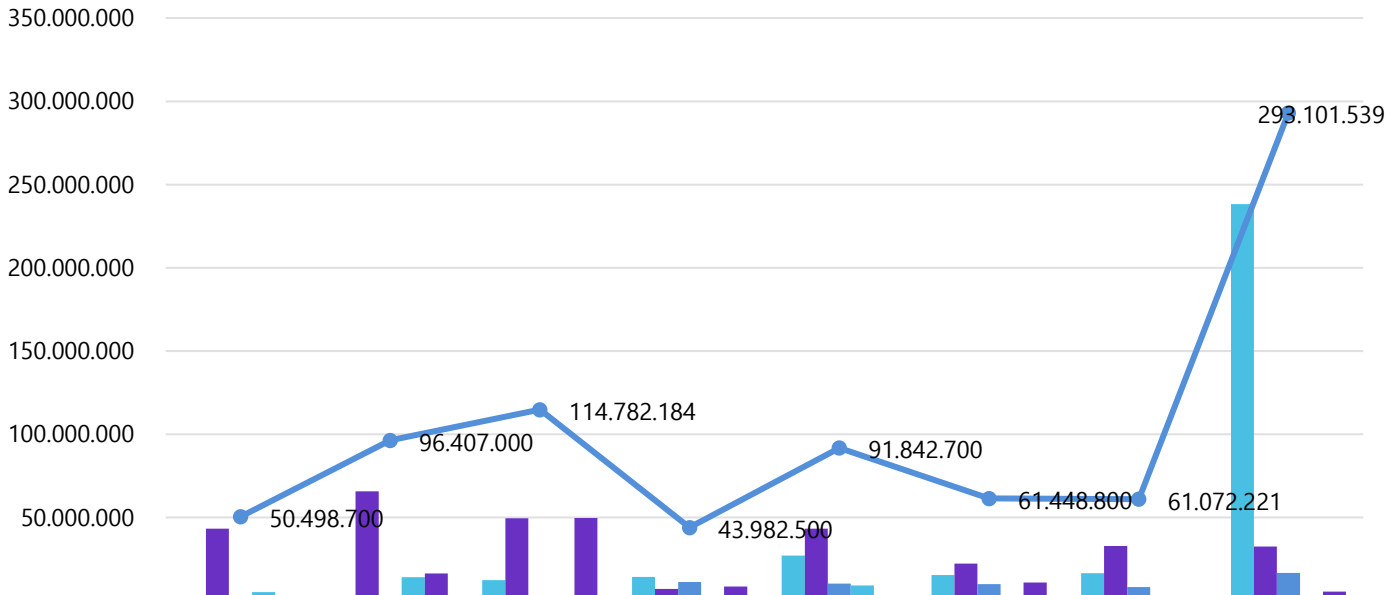


	Rp JAN	Rp FEB	Rp MAR	Rp APR	Rp MEI	Rp JUNI	Rp JULI	Rp AGUST
SEKRETARIAT	-	-	12.410.000	14.330.000	27.100.000	15.420.000	16.511.500	238.283.000
PERUMAHAN	43.366.500	65.791.000	49.506.184	7.120.500	43.348.400	22.331.800	32.927.721	32.597.539
KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	750.000	11.300.000	10.250.000	10.050.000	8.214.000	16.782.000
PERTANAHAN	5.132.200	14.224.000	2.360.000	2.645.000	9.244.300	2.700.000	1.350.000	-
KETERPADUAN PKP	2.000.000	16.392.000	49.756.000	8.587.000	1.900.000	10.947.000	2.069.000	5.439.000
TOTAL	50.498.700	96.407.000	114.782.184	43.982.500	91.842.700	61.448.800	61.072.221	293.101.539

TOTAL
324.054.500
296.989.644
57.346.000
37.655.500
97.090.000
813.135.644

Realisasi Belanja Blankon


Catatan:
Data diambil dari sistem Blangkon status 1 September 2022

Jumlah Transaksi melalui Mbizmarket (Blankon)

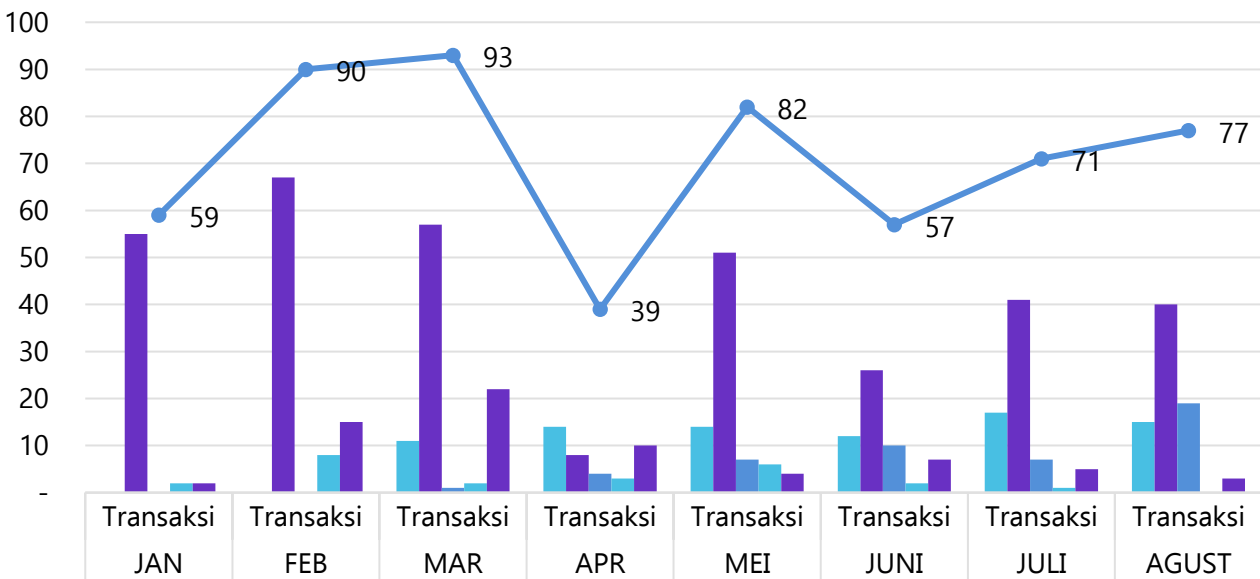

SEKRETARIAT	-	-	11	14	14	12	17	15
PERUMAHAN	55	67	57	8	51	26	41	40
KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1	4	7	10	7	19
PERTANAHAN	2	8	2	3	6	2	1	-
KETERPADUAN PKP	2	15	22	10	4	7	5	3
TOTAL	59	90	93	39	82	57	71	77

Transaksi
83
345
48
24
68
568




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Agustus 2022

Respon LapoGub


Pada bulan Agustus 2022, terdapat 9 laporan permintaan informasi melalui web LAPORGUB dan SUDAH TERJAWAB TUNTAS.
Adapun rincian laporan tersebut terdiri dari :
a. 7 laporan terkait PB Backlog
b. 1 laporan terkait BPS
c. 1 laporan pengadaan tanah untuk kepentingan umum




WEB	JAN	5	FEB	1	MAR	4	APR	1	MAY	6	JUN	8	JUL	2	AUG	4	SEP		OCT		NOV		DEC	
IG	JAN	1	FEB	0	MAR	0	APR	3	MAY	3	JUN	0	JUL	0	AUG	2	SEP		OCT		NOV		DEC	
WHATSAPP	JAN	5	FEB	1	MAR	3	APR	0	MAY	14	JUN	0	JUL	4	AUG	1	SEP		OCT		NOV		DEC	
FACEBOOK	JAN	0	FEB	0	MAR	1	APR	2	MAY	0	JUN	0	JUL	0	AUG	0	SEP		OCT		NOV		DEC	
SMS LAPORGUB	JAN	1	FEB	1	MAR	0	APR	2	MAY	1	JUN	9	JUL	0	AUG	2	SEP		OCT		NOV		DEC	

TOTAL	JAN	12	FEB	3	MAR	8	APR	8	MAY	24	JUN	17	JUL	6	AUG	9	SEP		OCT		NOV		DEC	
-------	-----	----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----	-----	----	-----	---	-----	---	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Konten Media Sosial




Konten Berita Web Dinas

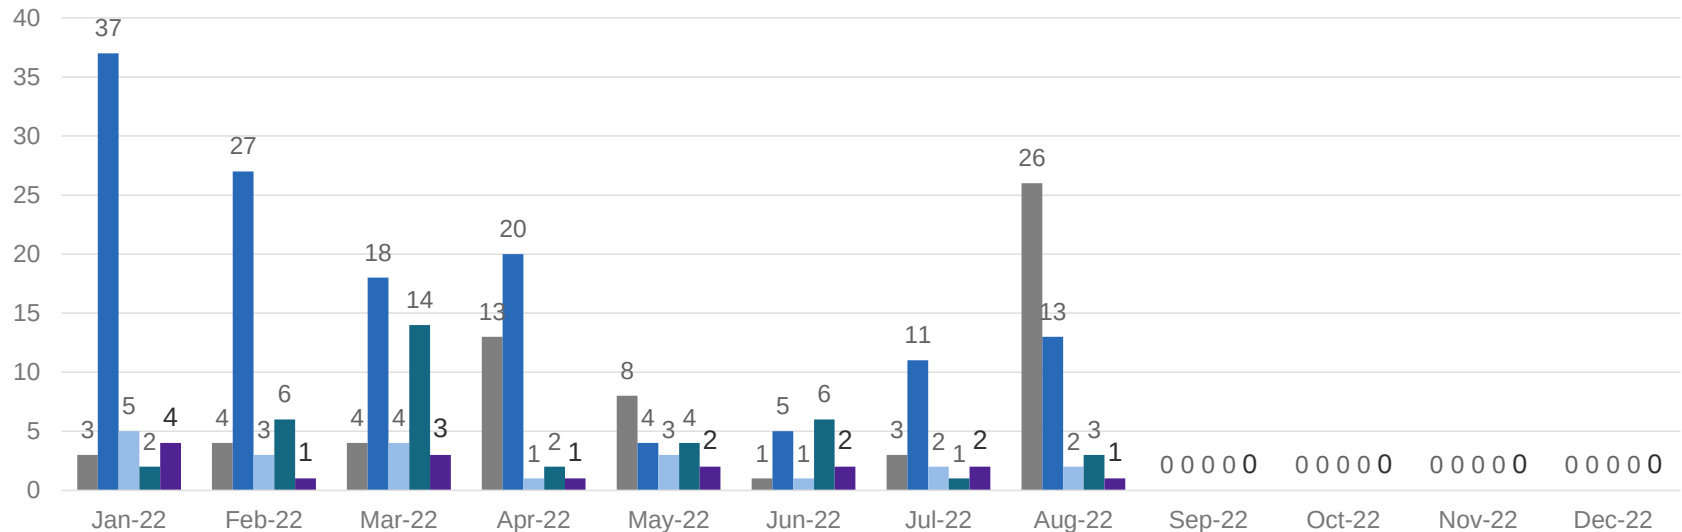


	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
■ Sekretariat	3	4	4	13	8	1	3	26	0	0	0	0
■ Perumahan	37	27	18	20	4	5	11	13	0	0	0	0
■ Kawasan	5	3	4	1	3	1	2	2	0	0	0	0
■ Keterpaduan	2	6	14	2	4	6	1	3	0	0	0	0
■ Pertanian	4	1	3	1	2	2	2	1	0	0	0	0

TOTAL	51	41	43	37	21	15	19	45				
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos




Laporan Hasil Survey Kepuasan Website



	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ags 2022	Sept 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022
Sangat Informatif	126	131	136	142	145	148	153	158				
Cukup Informatif	34	35	36	40	44	46	51	53				
Kurang Informatif	31	31	31	32	33	33	33	33				


Laporan Jumlah Kenaikan Pengunjung Website

Minggu IV



Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website

Minggu IV





Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JULI 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir Juli TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

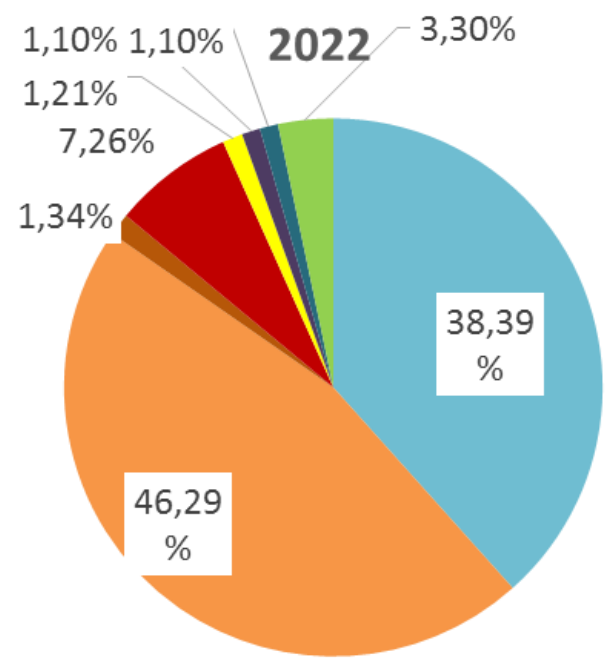

NO.	PROGRAM	2022	
		(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000
TOTAL		100	45.424.693.000




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir Juli 2022

^{*)}Realisasi keuangan diambil dari e-controlling status Rabu, 3 Agustus 2022

Disperakim

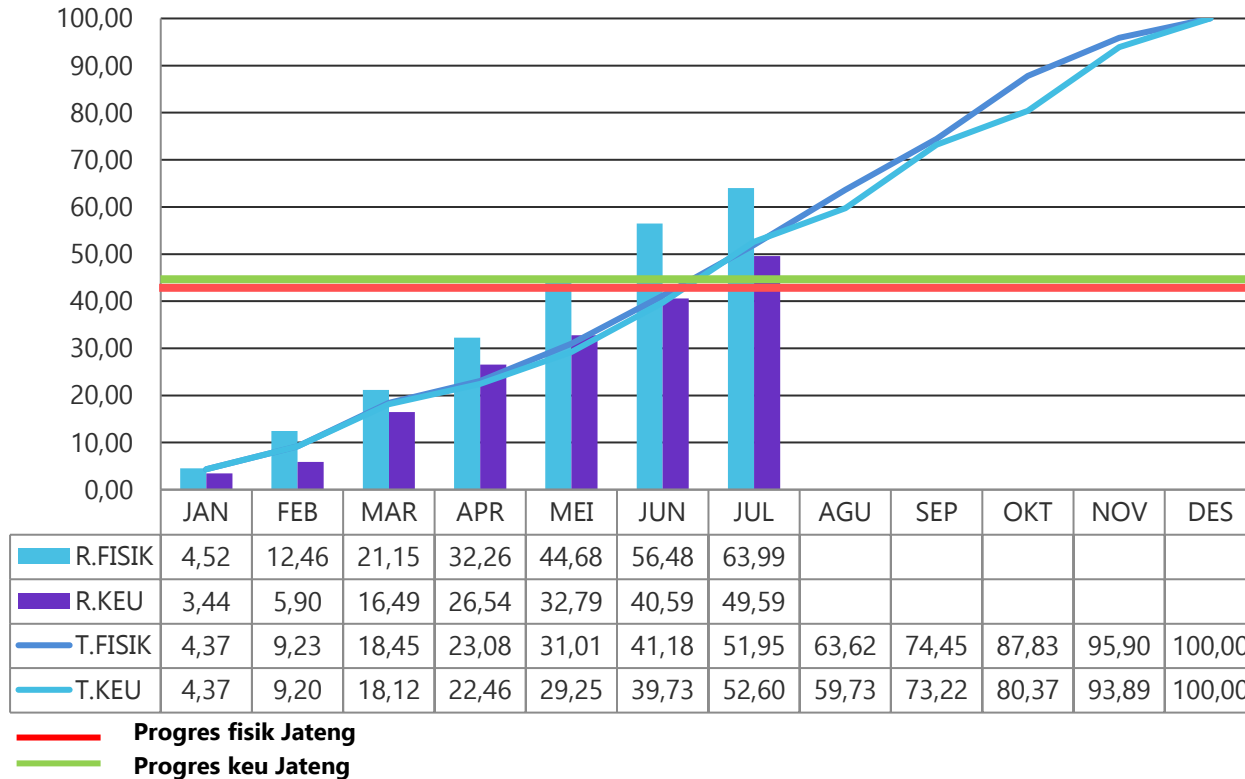


	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	51,95	63,62
Target Keu	52,60	59,73
Real. Fisik	63,99	68,55
Real. Keu	49,59	62,99
Dev. Fisik	12,04	4,93
Dev. Keu	-3,01	3,26

PROVINSI JAWA TENGAH (Status 5 Agustus 2022)

Target Fisik	35,44
Target Keu	35,44
Real. Fisik	46,15
Real. Keu	46,91
Dev. Fisik	10,71
Dev. Keu	11,47

Sekretariat

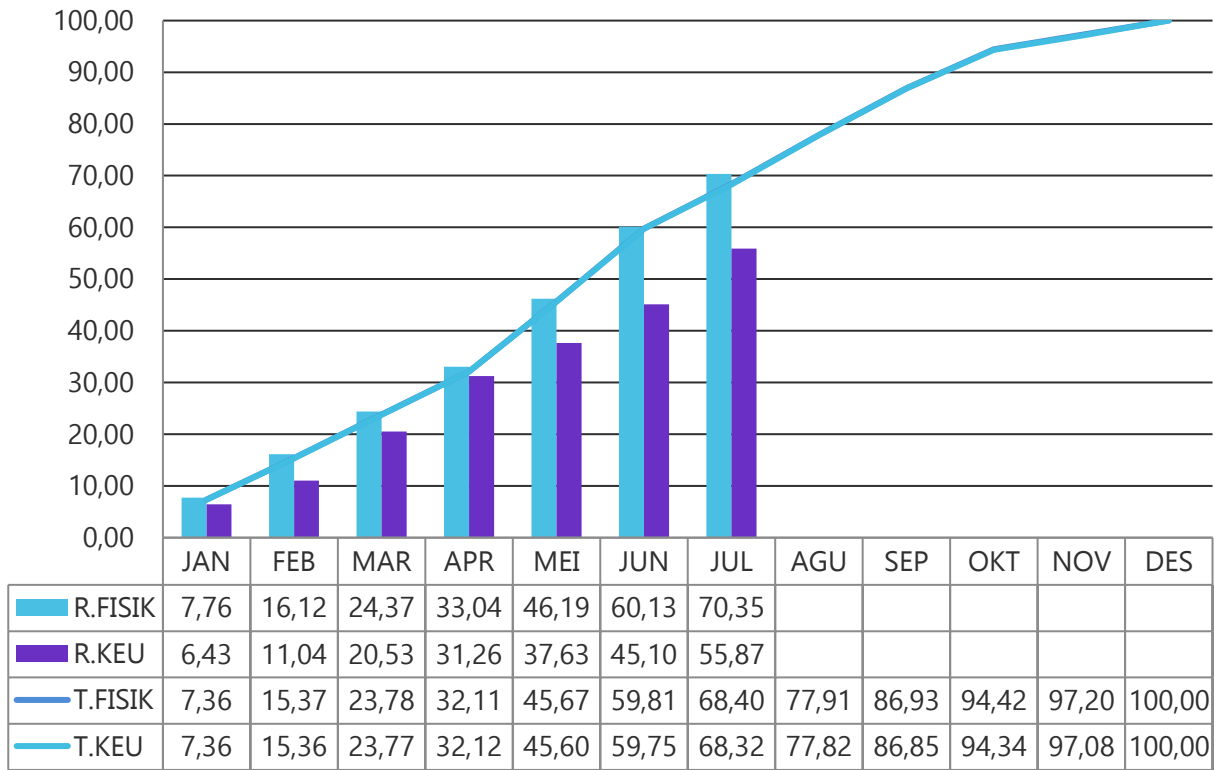


	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	68,40	77,91
Target Keu	68,32	77,82
Real. Fisik	70,35	78,36
Real. Keu	55,87	77,63
Dev. Fisik	1,95	0,45
Dev. Keu	-12,45	-0,20

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Umum dan Kepegawaian						
1	Pengadaan Alat Studio	196.750.000	-39,98	-47,77	- Sisa kontrak - Belanja CCTV dan LCD belum dilaksanakan karena masih dalam proses negosiasi dengan penyedia	- Potensi SILPA - Akan dibelanjakan di bulan Agustus
2	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	159.600.000	0,00	-69,42	Sisa kontrak	Potensi SILPA
3	Pemeliharaan Meubelair	10.000.000	-50,00	-50,00	Masih dalam proses inventarisasi mebel yang memerlukan perbaikan	Akan dilaksanakan di bulan berikutnya

Bidang Perumahan

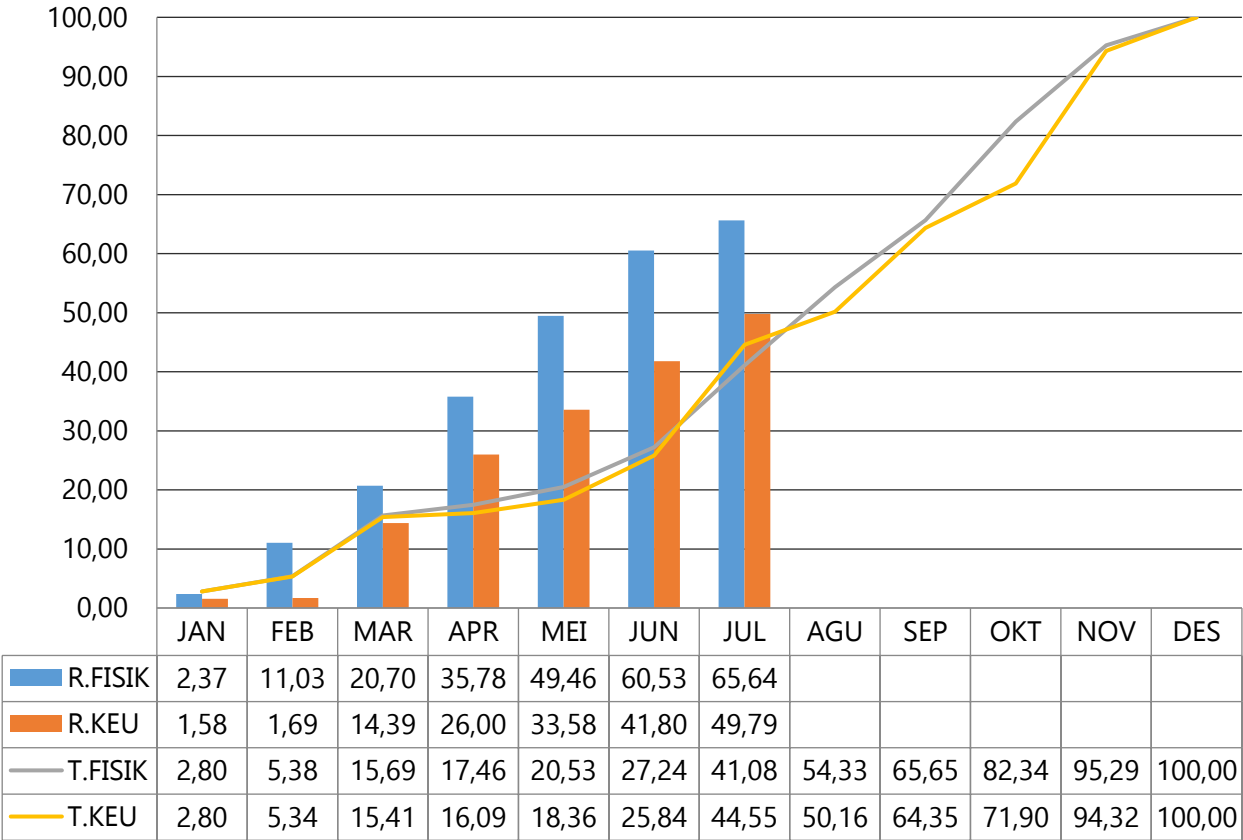

	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	41,08	54,33
Target Keu	44,55	50,16
Real. Fisik	65,64	65,98
Real. Keu	49,79	56,79
Dev. Fisik	24,56	11,65
Dev. Keu	5,24	6,63

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Koordinasi Lapangan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	178.512.000	-9,95	-9,95	- Koordinasi pengumpulan data rumah korban bencana belum dilaksanakan karena adanya percepatan Sosialisasi dan Pengumpulan data penghuni Rusun yang sudah mendekati batas waktu sewa. - Belanja perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 Juli 2022	- Koordinasi pengumpulan data rumah korban bencana akan dijadwalkan kembali di bulan Agustus - Realisasi keuangan akan masuk dalam progres bulan Agustus
2	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	0,00	-68,60	Pelaksanaan 19 paket jasa konsultansi sudah selesai, 5 Paket sudah terbayar (Kab. Rembang, Banyumas, Banjarnegara, Boyolali dan Purbalingga), 14 Paket dalam proses pembayaran	Keuangan diselesaikan di bulan Agustus
3	Sosialisasi Hunian Tetap (HUNTAP), Hunian Sementara (HUNTARA), dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat / Komunitas Rusus/Rusun di Jawa Tengah	11.100.000	13,24	-14,25	Belanja makan minum rapat Sosialisasi Huntap/Huntara yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 26 Juli 2022 belum terbayarkan	Keuangan diselesaikan di bulan Agustus
4	Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	5.723.000	-13,92	13,92	Rapat koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan belum dilaksanakan karena belum ada kesesuaian jadwal dengan Jamkrida dan BPR BKK Jateng.	- Koordinasi dilaksanakan dengan mengunjungi langsung kantor Jamkrida dan BPR BKK Jateng - Rapat Koordinasi Stakeholder akan dijadwalkan kembali di bulan Agustus

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		

Seksi Perumahan Umum

1	Penyaluran Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	800.000.000	-12,50	-12,50	Penyaluran Bansos Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana yang semula direncanakan disalurkan pada bulan Maret s.d. Juni sudah tersalurkan seluruhnya s.d. bulan April kecuali 2 penerima yang mengundurkan diri karena: - 1 Penerima sudah memiliki rumah - 1 penerima tidak mampu berswadaya	Bantuan yang tidak dapat tersalurkan telah disiapkan untuk dialokasikan kembali melalui Perubahan Anggaran TA 2022.
2	Pendampingan Pelaksanaan Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	99.206.000	-28,49	-28,10	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran
3	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	9.000.000	-33,32	-33,33	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
(Rp. 21.025.000.000)

INDIKATOR KINERJA


- % Rumah layak huni yang disediakan (RLH)
- % Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)

TARGET 2022


- 7,39 %
- 11,84 %

REALISASI S.D JULI


- 5,20 %
- 10,72%
(dibawah target bulanan)

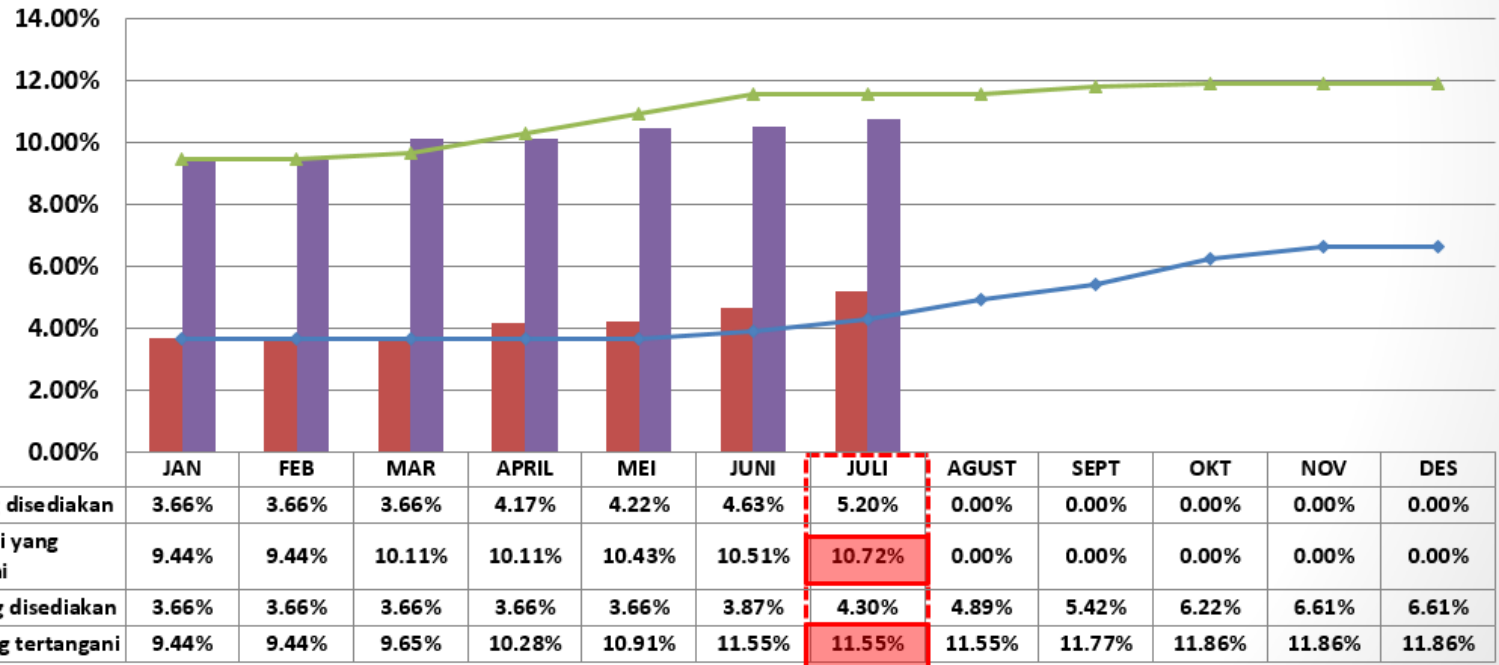


RTLH

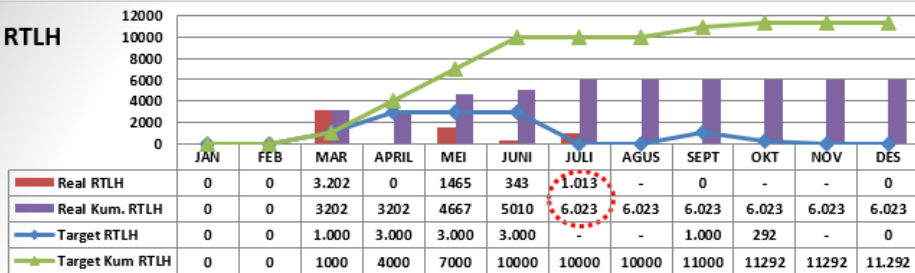


PB BACKLOG



PK BENCANA

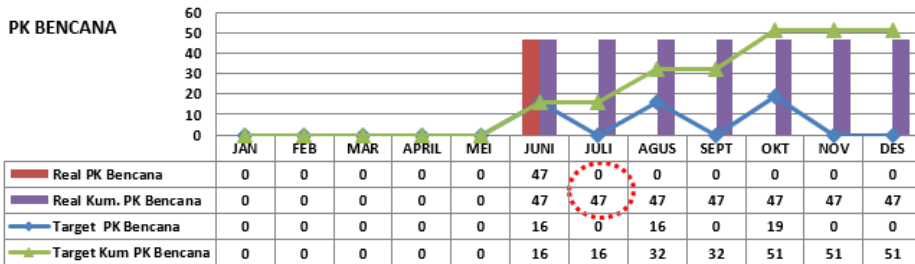

PB BENCANA




IK SUB KEGIATAN

T. 2022


REALISASI S.D JULI

Jumlah unit rumah yang dibangun (PB Backlog)	253 unit	105 Unit PB Backlog 13 unit berpotensi mengalami penggantian BNBA melalui PA TA 2022 - Penyelesaian pembangunan 100% di: Kab. Semarang 16 unit, Kab. Karanganyar 8, Kab. Pemalang 17, Kab. Brebes 10, Kab. Sukoharjo 10
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupemdes RTLH)	11.292 unit	1.013 unit (Pencairan rekam 5 Bankeupemdes dan pelaksanaan Bimtek Percepatan Penyaluran Bankeupemdes SK Tahap 2)
Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (PK dan PB Bencana, PB Relokasi)	51 unit PK	47 Unit PB Bencana 4 Orang gagal menerima bantuan: yang terdiri dari 2 orang Penerima mengundurkan diri karena kondisi rumah yang roboh sehingga akan diusulkan sbg calon penerima bantuan PB Bencana pada tahun 2023, 1 orang pindah domisili Kalimantan & 1 Orang sudah menerima penanganan melalui BSPS pada Oktober 2021 - Rapat progres pengajuan termin ketiga - Pelaksanaan perbaikan rumah PK Bencana di Kab. Demak 22 unit, Purbalingga 10 unit, Pemalang 4 unit, Pekalongan 11 unit (total 47 unit fisik sudah 100%)
	16 unit PB-B	14 unit PB-B 2 Orang mengundurkan diri karena sudah membangun rumah secara swadaya - Pelaksanaan pembangunan rumah PB Bencana di Kab. Purbalingga 3 unit, Kab. Boyolali 4 Unit, Kab. Kebumen 4 unit, Purworejo 3 unit. - Rapat progres pembangunan rumah PB Bencana.
	62 unit PB-R	60 unit PB-R - Pelaksanaan pembangunan rumah PB relokasi di Kab. Wonogiri 27 unit, Kota Pekalongan 28 unit, Kota Tegal 5 unit (Fisik 100%) - Rapat progres pembangunan rumah PB relokasi 2 Penerima mengundurkan diri karena 1 tidak mampu berswadaya, dan 1 orang lainnya sudah mempunyai rumah serta Penyiapan BNBA pengganti untuk perubahan anggaran
Jumlah dok perencanaan RUSUNAWA & RUSUS (Rencana Induk Rusun)	1 Dok	Pembangunan Rusun dan RC bukan menjadi kewenangan provinsi sehingga anggaran akan di lakukan pergeseran untuk pengoptimalan indikator kinerja yang lain.
Jumlah dokumen yang disusun	5 Dok	Dalam Proses Verivali calon Penerima PB dan PK, Sosialisasi Teknis

PB RELOKASI



Bidang Kawasan Permukiman

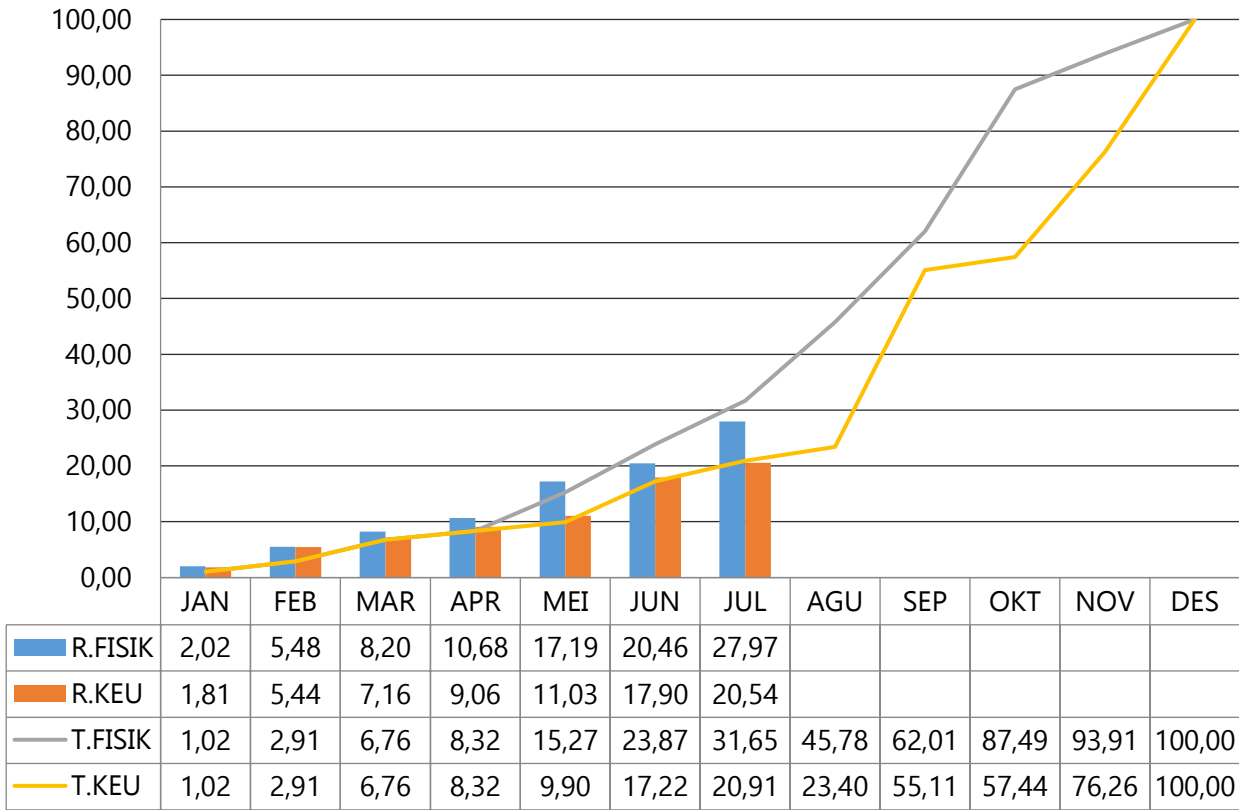

	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	31,65	45,78
Target Keu	20,91	23,40
Real. Fisik	27,97	36,03
Real. Keu	20,54	25,03
Dev. Fisik	-3,68	-9,75
Dev. Keu	-0,37	1,63

Keterangan Deviasi Negatif

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	Koordinasi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	24.925.000	-41,31	-41,31	Update data BKM di Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan Rapat baru didapatkan pada akhir bulan Juli	Rapat dijadwalkan kembali pada bulan Agustus minggu kedua
2	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	0,00	-100,00	Sudah terkontrak tanggal 31 Mei 2022 (semula direncanakan terkontrak bulan April). Saat ini sudah sampai dengan pemaparan Laporan Antara (6 Juli 2022)	Paparan Laporan Akhir akan dilaksanakan pada Bulan Agustus, minggu I
3	Persiapan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	35.388.000	0,00	-20,74	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan Kab/Kota terkait studi identifikasi disesuaikan dengan hasil kajian penyedia jasa di mana laporan akhir akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan agustus	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan Kab/Kota terkait studi identifikasi dijadwalkan kembali setelah pemaparan laporan akhir pada minggu kedua bulan Agustus
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
1	FGD Dalam Rangka Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha	6.500.000	-100,00	-100,00	Adanya pencermatan ulang dan penyesuaian data RTLH kumuh dari berbagai sumber yang digunakan sebagai strategi dalam pendampingan penanganan RTLH kumuh	Penjadwalan ulang di bulan berikutnya, saat ini bidang sedang melakukan proses pengolahan dan penyesuaian data sebagai strategi dalam pendampingan penanganan RTLH kumuh

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	-10,21	-10,21	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan penanganan RTLH di Kawasan Kumuh belum dilaksanakan karena adanya pencermatan ulang dan penyesuaian data RTLH kumuh dari berbagai sumber yang digunakan sebagai strategi dalam pendampingan penanganan RTLH kumuh	Penjadwalan ulang di bulan berikutnya, saat ini bidang sedang melakukan proses pengolahan dan penyesuaian data sebagai strategi dalam pendampingan penanganan RTLH kumuh
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kawasan Permukiman	126.851.000	6,23	-2,05	perjalanan dinas dalam rangka koordinasi peningkatan kawasan permukiman dengan pusat dilaksanakan di 26 Juli 2022	Progres keuangan dilaporkan di bulan selanjutnya
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman						
1	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2022	180.000.000	0,00	-21,50	Devisiasi keuangan disebabkan karena Pembayaran Pekerjaan Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2022 sebesar 20 % akan dibayarkan setelah serah terima pertama (PHO)	Serah terima pertama pelaksanaan konstruksi Hadiah Lomba Hari Habitat (Oktober s.d. November)
2	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	-45,00	0,00	Kontrak Studi Identifikasi mundur sebagai dampak adanya rekomendasi BPKP dan adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022 (terkontrak tanggal 15 Juli 2022 dari rencana bulan Mei)	Mendorong penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
3	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	-30,00	0,00	Kontrak Studi Identifikasi mundur sebagai dampak adanya rekomendasi BPKP dan adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022 (terkontrak tanggal 29 Juni 2022 dari rencana bulan Mei)	Mendorong penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal
4	Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	-30,00	0,00	Kontrak Penyusunan Sistem Informasi mundur sebagai dampak adanya rekomendasi BPKP dan adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022 (terkontrak tanggal 30 Juni 2022 dari rencana bulan Mei)	Mendorong penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

**PROGRAM
PENINGKATAN PSU
(Rp. 3.300.000.000)**

INDIKATOR KINERJA

% Kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET 2022

17,00%

REALISASI S.D JULI

0 %

INDIKATOR KINERJA


% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET 2022

23,37 %

REALISASI S.D JULI

24,21 %

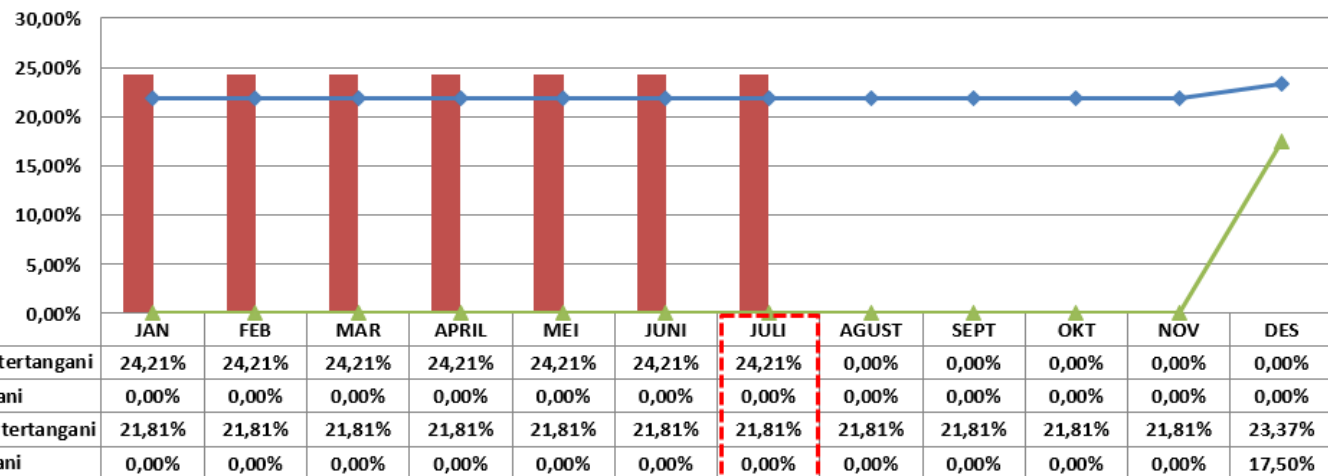

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 3.300.000.000)


Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D JULI
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	0 Lokasi - Pelaksanaan lomba hari habitat 2022, Kontrak Pekerjaan Penyusunan Perencanaan/DED Hadiah Lomba Hari Habitat 2022 - Sosialisasi Penyusunan Perencanaan/DED Hadiah Lomba Hari Habitat 2022 kepada Pemkab/Kota dan masyarakat setempat - Pembahasan laporan pendahuluan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Utara Prov. Jateng dan Studi Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman Prov. Jateng - Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Juara Harapan 1,2,3) - Proses tender di Biro APBJ Setda Prov. Jateng untuk Pekerjaan Perbaikan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Juara 1,2,3)
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	0 Dokumen • Monev serah terima PSU Perumahan di Kab. Pemalang, Brebes, Tegal, Blora, Rembang, Pati, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta • Rakor Penyelenggaraan Penyerahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/Kota Se-Jawa Tengah

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 610.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D JULI
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	0 Lokasi (koordinasi pelaksanaan integrasi penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan, Surakarta, Tegal, Kab. Purworejo, Pengelolaan database penanganan RTLH di kawasan kumuh)
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	0 Dokumen (Koordinasi internal inventarisasi usulan bankeu Kab/Kota, Monev pelaksanaan fisik Bankeu Sarpras ke Jepara)
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen - Rapat pembahasan juknis hibah kawasan permukiman dan Pembahasan TPS 3R bersama dengan Bintari dan KPP Pedalangan
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	0 Dokumen - Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi studi identifikasi kawasan permukiman kumuh skala prioritas provinsi di Kab. Grobogan dan Kota Surakarta - Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi kawasan permukiman kumuh di Kab. Wonosobo, Magelang, Sragen, Demak, Kendal, dan Kota Tegal - Laporan Antara Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi

Bidang Pertanahan

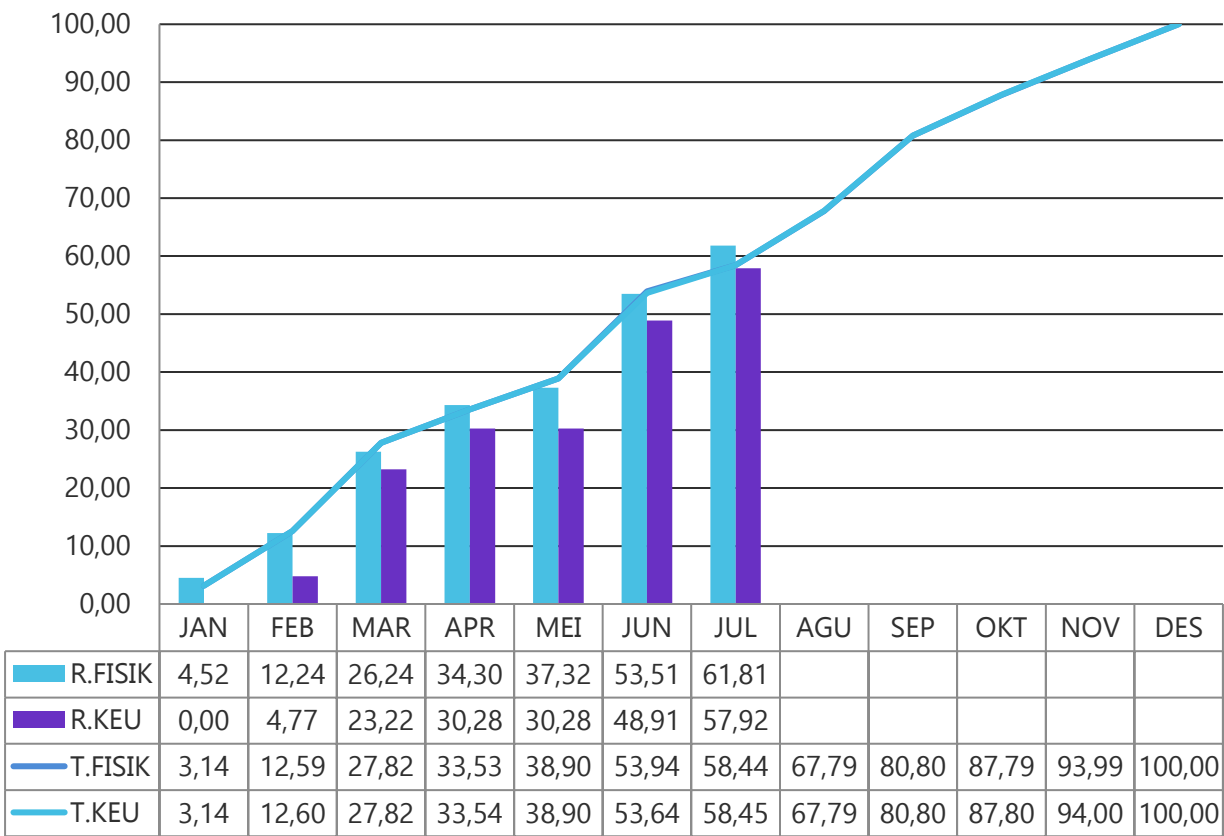


	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	58,44	67,79
Target Keu	58,45	67,79
Real. Fisik	61,81	74,04
Real. Keu	57,92	72,64
Dev. Fisik	3,37	6,25
Dev. Keu	-0,53	4,85

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Penyampaian Penjelasan Rencana Pembangunan secara langsung kepada masyarakat di Lokasi Rencana Pembangunan	103.600.000	0,00	-8,79	- Efisiensi perjalanan dinas pengadaan tanah SUTET 150 kV Ungaran - Pedan di Kab.Klaten, Kab. Boyolali dan Kab. Semarang - pelaksanaan Sosialisasi Pengadaan DI Pidekso dilaksanakan di akhir bulan Juli	- Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya - Realisasi keuangan dilaporkan sebagai progres bulan Agustus
2	Identifikasi Kepemilikan Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan	74.830.000	-6,33	-6,33	Pelaksanaan persiapan tahapan pengadaan tanah SUTET 150 kV Ungaran - Pedan di Kab.Klaten, Kab. Boyolali dan Kab. Semarang menyesuaikan dengan jadwal PLN selaku instansi yang membutuhkan tanah	Pada bulan Agustus akan dilaksanakan persiapan tahapan pengadaan tanah DI Pidekso di Kab. Wonogiri
3	Pelaksanaan Komunikasi Dialogis Kepada Warga Terdampak di Lokasi Rencana Pembangunan	100.300.000	-8,27	-8,28	Pelaksanaan persiapan tahapan pengadaan tanah SUTET 150 kV Ungaran - Pedan di Kab.Klaten, Kab. Boyolali dan Kab. Semarang menyesuaikan dengan jadwal PLN selaku instansi yang membutuhkan tanah	Pada bulan Agustus akan dilaksanakan persiapan tahapan pengadaan tanah DI Pidekso di Kab. Wonogiri
4	Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pada Trase atau Basic Design di Lokasi Rencana Pembangunan	74.844.000	-9,16	-9,16	kegiatan verifikasi lapangan perpanjangan penetapan lokasi menyesuaikan dengan permohonan perpanjangan oleh instansi yang membutuhkan tanah.	berkoordinasi dengan instansi terkait penetapan lokasi yang berpotensi mengajukan/membutuhkan perpanjangan

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	127.201.000	-1,88	-1,88	Penundaan jadwal Koordinasi pengadaan tanah karena bersamaan dengan pelaksanaan tahap persiapan pembangunan saluran irigasi DI Pidekso di Kab. Wonogiri	dijadwalkan kembali di bulan berikutnya
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan						
1	Pendampingan Proses Pengadaan Tanah dan Penanganan Dampak	24.350.000	-42,16	-42,16	- Pendampingan proses pengadaan tanah/penanganan dampak yang semula direncanakan akan dilaksanakan 3 kali s.d. bulan Juni (dari total 5 pelaksanaan) baru dilaksanakan 1 kali.	- Pendampingan proses penetapan lokasi DI Pidekso Kab. Wonogiri akan dilaksanakan di bulan Agustus - Alokasi anggaran 3x pendampingan pada SSK ini akan dialihkan untuk SSK lain yang mendukung capaian target identifikasi HGU dan HP melalui perubahan anggaran

BIDANG PERTANAHAN

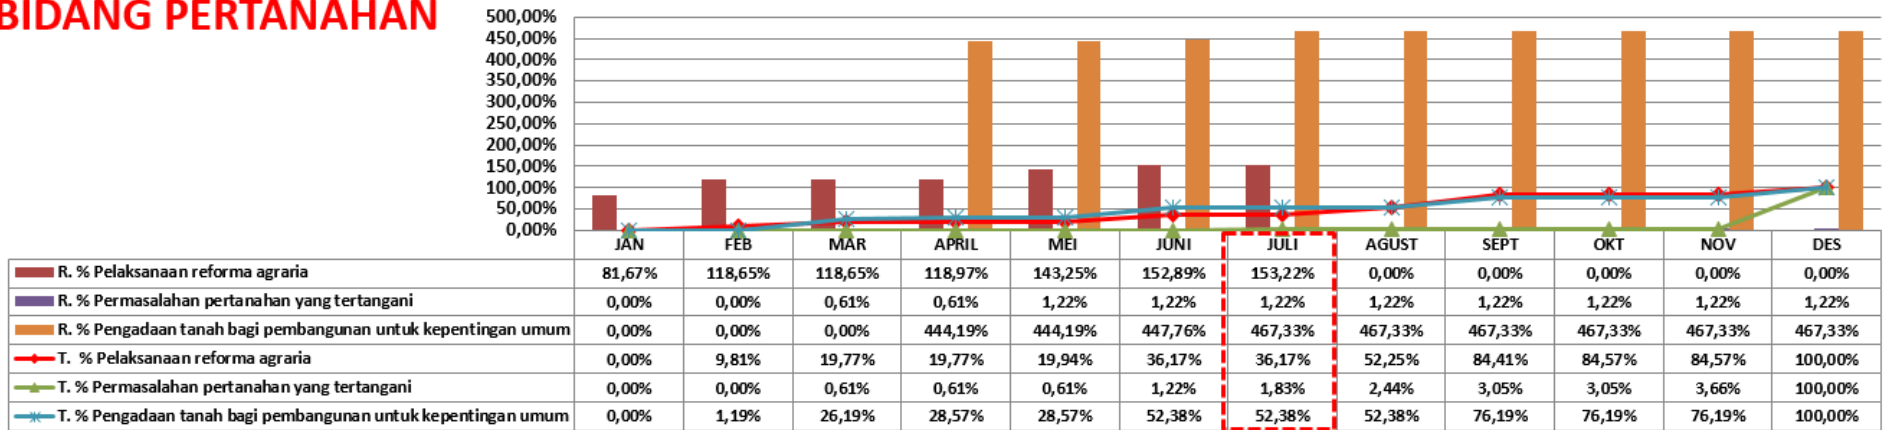

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Persentase pelaksanaan reforma agraria

TARGET 2022

100%

REALISASI S.D JULI

153,22 %

INDIKATOR KINERJA

Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan

20%

Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)

420 Bidang:
5 Bidang HGU
15 Bidang HP
400 Bidang Pemantauan Penlok
1 kali Diseminasi/rakor bidang pertanahan

30,64%

721 Bidang:
1 Bidang HGU
8 Bidang HP
712 Bidang
1 kali

Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)

2 Lokasi

3 Lokasi

Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)

200 bidang Pemantauan Sertifikasi
7 Lokasi Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA
5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA

229 Bidang
3 Lokasi
6 Kabupaten/Kota

Lanjutan ...

**PROGRAM PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**
(Rp. 550.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum

TARGET 2022

100%

REALISASI S.D JULI

447,76 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D MEI
Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	20%	93,47%
Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	2.000 Bidang Penlok	9.714 Bidang Penlok (Penerbitan SK Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Cilacap; Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500kV di Kab. Klaten, Boyolali, dan Semarang.
Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	100 Bidang ZNT	100 Bidang ZNT (Perkiraan Nilai Zonasi Nilai Tanah di Daerah)

**PROGRAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN**
(Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Permasalahan pertanahan
yang tertangani

TARGET 2022


100%

REALISASI S.D JULI

1,22 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. JUNI
Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	20%	0,24%
Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	150 Bidang LP2B 8 Bidang TKD	0 Bidang LP2B 0 Bidang TKD • Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikat LP2B & TKD • Koordinasi Penetapan Lokasi Objek Bidang Tanah yang akan disertifikat • Pelaksanaan pra sertifikasi, Pelaksanaan Verifikasi Berkas Persyaratan , Koordinasi dalam rangka persiapan pendampingan pemasangan tanda batas tanah LP2B di Kab. Semarang, Cilacap, Blora • Pendampingan Pemasangan Tanda Batas Tanah di Kab. Semarang dan Kab. Blora serya Pendampingan pengukuran di Kab. Cilacap
Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	6 Sengketa	2 Sengketa • Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanjung Mas (Pemberian Santunan) & Permasalahan keberatan pemberian santunan bangunan madrasah pada kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan Tanjung Mas • Penanganan Permasalahan Pertanahan TPU Dasiknoloyo dan Pracimoloyo di Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo • Mediasi Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kab. Sukoharjo, Surakarta (TPU), dan Sragen terkait Pemanfaatan ruang (Batas Tanah di Desa Bulungkulon Kec. Jekulo)

Bidang Keterpaduan PKP

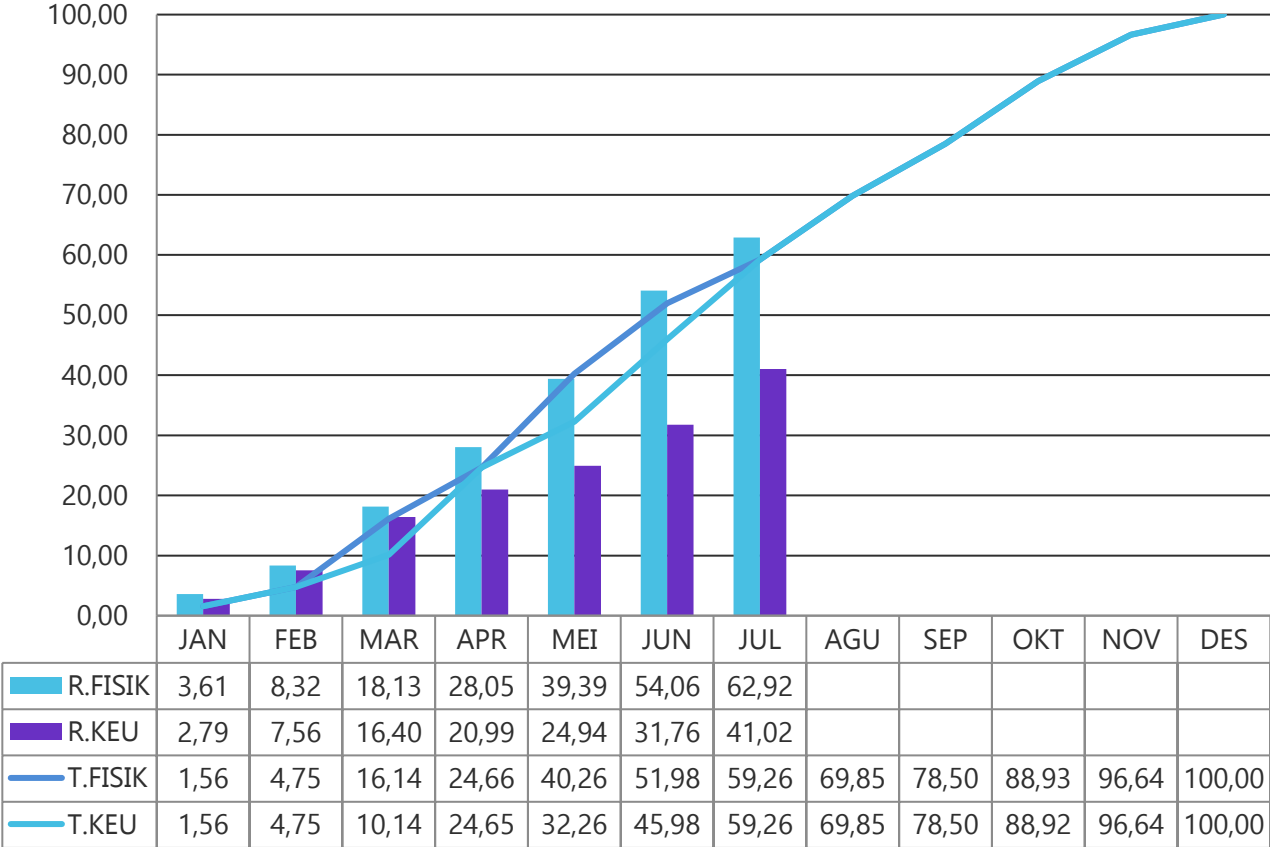

	Juli	Agustus (Prognosis)
Target Fisik	59,26	69,85
Target Keu	59,26	69,85
Real. Fisik	62,92	69,69
Real. Keu	41,02	68,62
Dev. Fisik	3,66	-0,16
Dev. Keu	-18,24	-1,23

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Fasilitasi Pokja/ Forum PKP dan Pengembangan Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	88.571.000	4,05	-6,09	Rakor Forum Kemitraan sudah dilaksanakan dengan jumlah peserta lebih sedikit dari yang direncanakan.	Akan dilaksanakan Rakor Forum Kemitraan Periode 2 di bulan September
2	FGD Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	20.386.000	0,00	-65,66	- Efisiensi Pelaksanaan kegiatan (Transportasi)	Akan dilakukan pergeseran ke SSK lain melalui Perubahan Anggaran TA 2022
3	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	360.000.000	0,00	-83,33	Masih ada berkas yang perlu dilengkapi oleh konsultan	Mendorong konsultan untuk segera memenuhi kelengkapan berkas
4	Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	25.781.000	-2,13	-5,63	- Pelaksanaan sosialisasi KKN Tematik di lapangan yang semula dijadwalkan di bulan Maret baru dimulai di bulan Mei dan telah dilaksanakan 2 kali dari rencana 3 kali - Pelaksanaan KKN Tahap 2 akan dimulai pada bulan Agustus	Akan dilaksanakan pada Periode KKN bulan Agustus
5	Pengadaan Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	100.000.000	-50,00	-50,00	- Masih dalam tahap koordinasi dan persiapan	- Penyiapan draft KAK untuk menyesuaikan dengan usulan Perubahan Anggaran TA 2022 - Penyiapan proses pinjam pakai alat peraga kepada komunitas masyarakat
6	Penyediaan Honorarium Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	-37,50	-37,50	Pengadaan alat peraga belum dilaksanakan	Menyesuaikan penjadwalan ulang pengadaan alat peraga.

BIDANG KETERPADUAN PKP

**PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
(Rp. 1.500.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA


% Ketersediaan kebijakan, data, dan
evaluasi kinerja perumahan rakyat
dan kawasn permukiman

TARGET 2022

100%

REALISASI s.d JULI

53,85 %

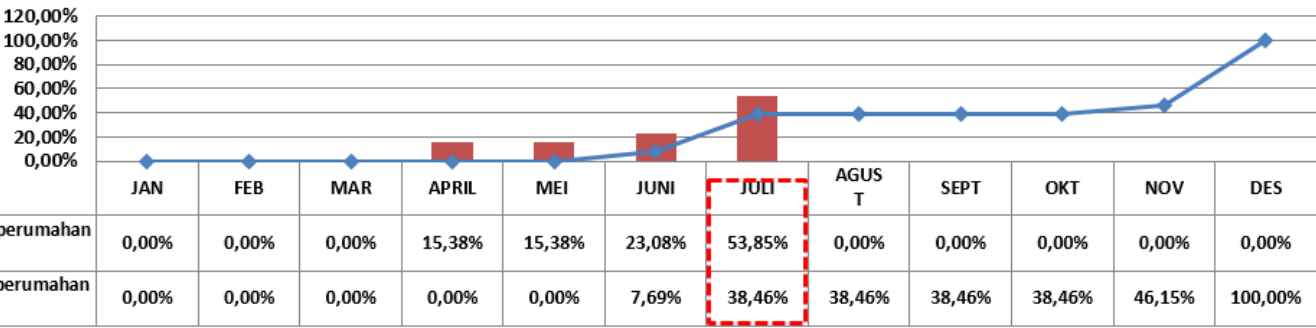

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

TARGET 2022

REALISASI S.D JULI

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5 Dokumen	3 Dokumen <i>(1 Dokumen Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi, 1 Dokumen Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 1 Dokumen Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) - Rapat Koordinasi Forum PKP & Rapat Koordinasi Forum Kemitraan</i>
Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	3 Dokumen	1 Dokumen Evaluasi Lingkup Bidang PKPP Tahun 2021, TA 2022 <i>(Rapat pembinaan rusun di Kota Salatiga, Monitoring DAK, Rapat evaluasi lingkup PKP Semester I)</i>
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	5 Dokumen	2 (Dokumen Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data PKP Provinsi Jawa Tengah & Review Keterisian Data PKP Provinsi Jawa Tengah) <i>(Koordinasi Pengumpulan Data, Pengembangan Aplikasi & Pengadaan Jasa Konsultansi Koordinasi Pengumpulan Data, Rapat Internal, Pengembangan Aplikasi, Rapat Tim Teknis Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi PKPP, Persiapan Review Keterisian Data, Review Keterisian Data, Koordinasi Pengumpulan Data, Rapat Internal, Pengembangan Aplikasi)</i>



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Juli 2022

Bidang Perumahan

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 20/31 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
6		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
7		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
8		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
9		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
10		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
11		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
20	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
21		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
22		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
23		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
24		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
25		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
26		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
27		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
28		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
29		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
30		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
31	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - SIMPERUM	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 7 April 2022	April - Desember

Tender

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi (Terkontrak: 3/6 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana / Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender	Masa sanggah	Juli
2		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender	Evaluasi administrasi, Kualifikasi teknis, harga	Juli
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender	Evaluasi administrasi, Kualifikasi teknis, harga	Juli
4		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 30 Juni 2022	120 Hari
5		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 15 Juli 2022	90 hari
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi	Sudah terkontrak tanggal 29 Juni 2022	90 hari

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 2/8 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 8 Maret 2022	60 hari
2		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 15 Maret 2022	60 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung	surat penunjukan penyedia barang dan jasa	Juli

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung	surat penunjukan penyedia barang dan jasa	Juli
5		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung	surat penunjukan penyedia barang dan jasa	Juli
6		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	surat penunjukan penyedia barang dan jasa	Juli
7		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
8	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 31 Mei 2022	60 Hari

Bidang Keterpaduan PKP

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 10 Maret 2022	Maret s.d. Oktober 2022


Sekretariat

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK dan kelengkapan dokumen	Juli

Realisasi Belanja Blankon

Catatan:
Data diambil dari sistem Blangkon status 31 Juli 2022

NILAI TRANSAKSI

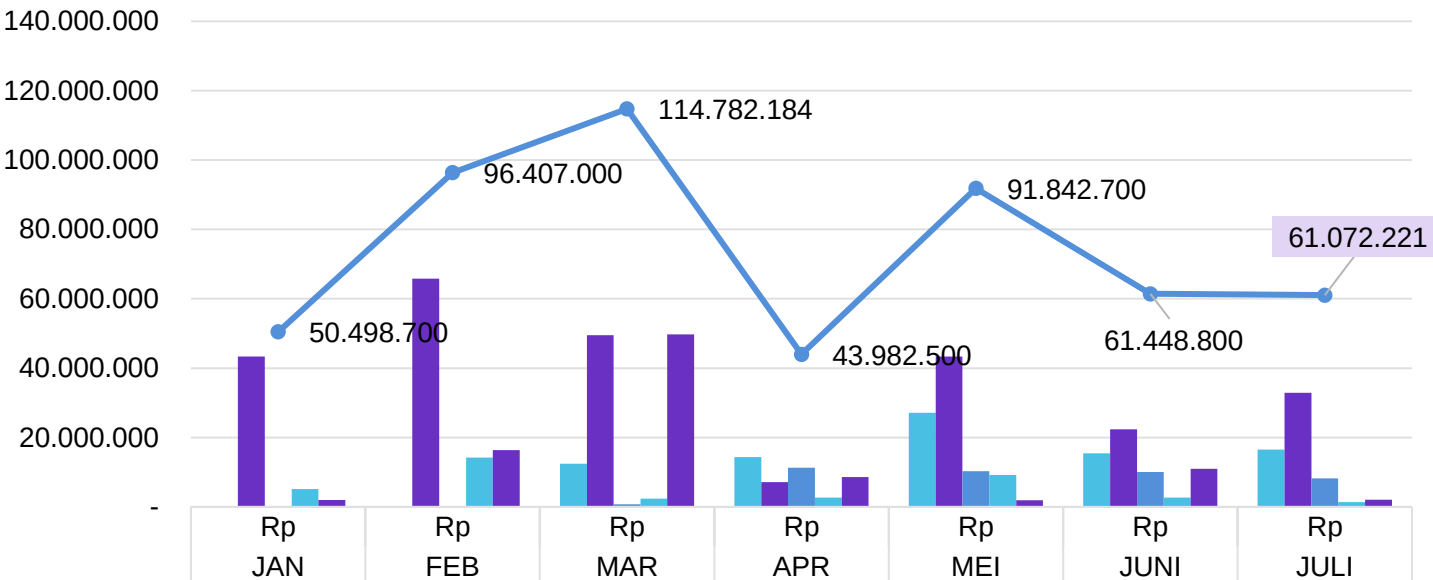


SEKRETARIAT	-	-	12.410.000	14.330.000	27.100.000	15.420.000	16.511.500
PERUMAHAN	43.366.500	65.791.000	49.506.184	7.120.500	43.348.400	22.331.800	32.927.721
KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	750.000	11.300.000	10.250.000	10.050.000	8.214.000
PERTANAHAN	5.132.200	14.224.000	2.360.000	2.645.000	9.244.300	2.700.000	1.350.000
KETERPADUAN PKP	2.000.000	16.392.000	49.756.000	8.587.000	1.900.000	10.947.000	2.069.000
TOTAL	50.498.700	96.407.000	114.782.184	43.982.500	91.842.700	61.448.800	61.072.221

TOTAL
85.771.500
264.392.105
40.564.000
37.655.500
91.651.000
520.034.105


Realisasi Belanja Blankon

Catatan:
Data diambil dari sistem Blangkon status 31 Juli 2022

JUMLAH TRANSAKSI

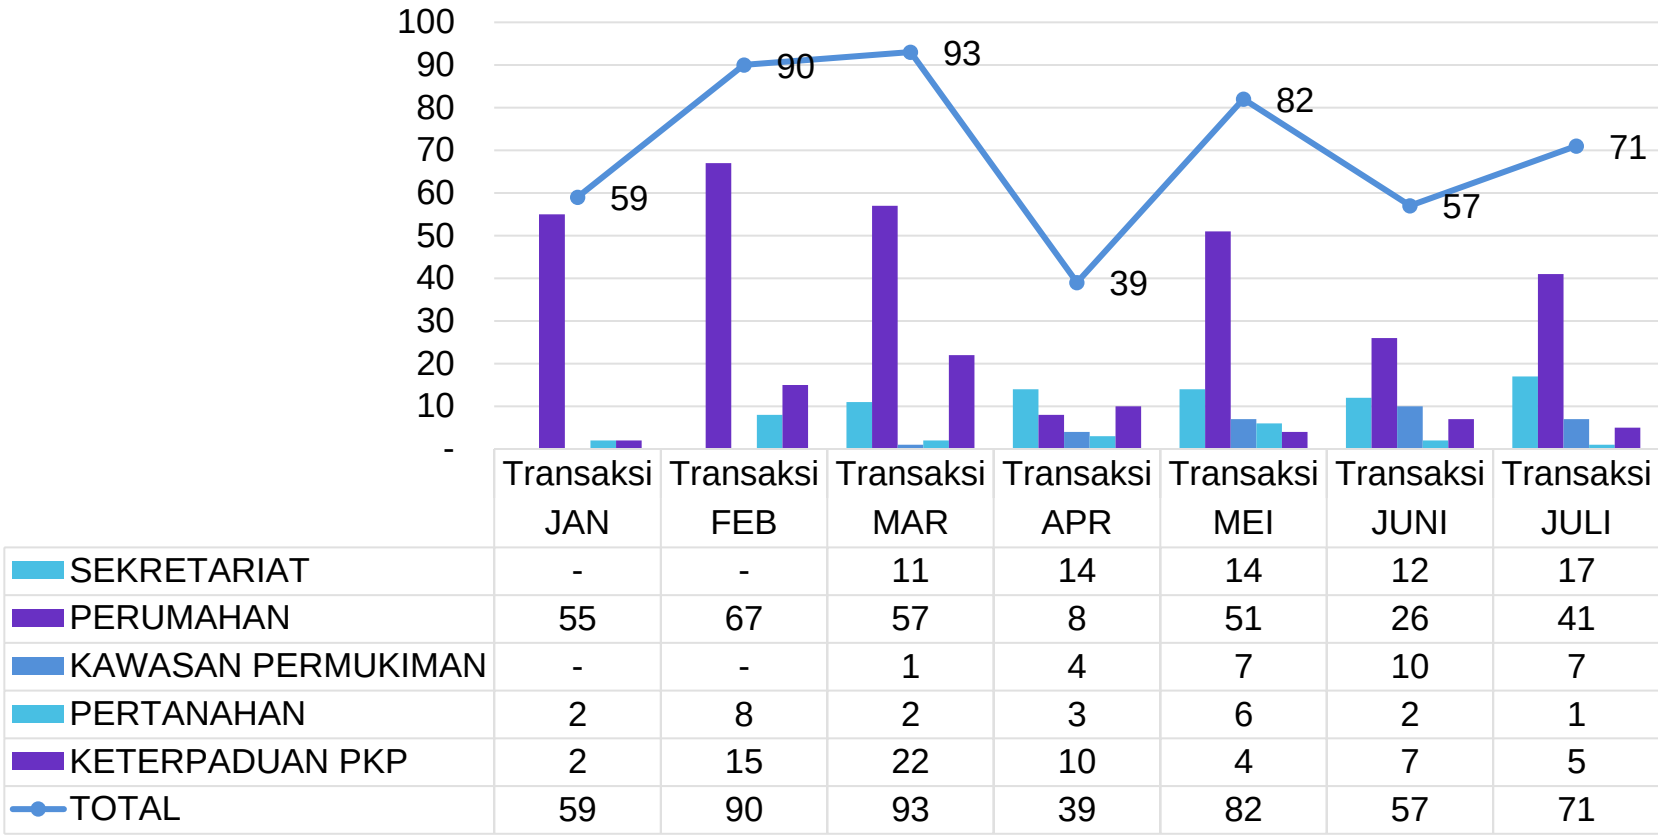

Transaksi
68
305
29
24
65
491

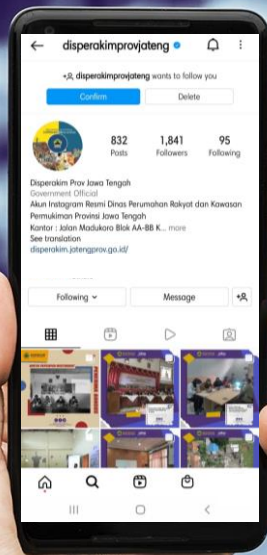

PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Juli 2022


Respon LaporGub

Pada bulan JULI 2022, terdapat 6 laporan permintaan informasi melalui web LAPORGUB dan SUDAH TERJAWAB TUNTAS.


Adapun rincian laporan tersebut terdiri dari :

a. 2 laporan terkait PB Backlog


b. 4 laporan terkait RTLH



Konten Media Sosial




Konten Berita Web Dinas

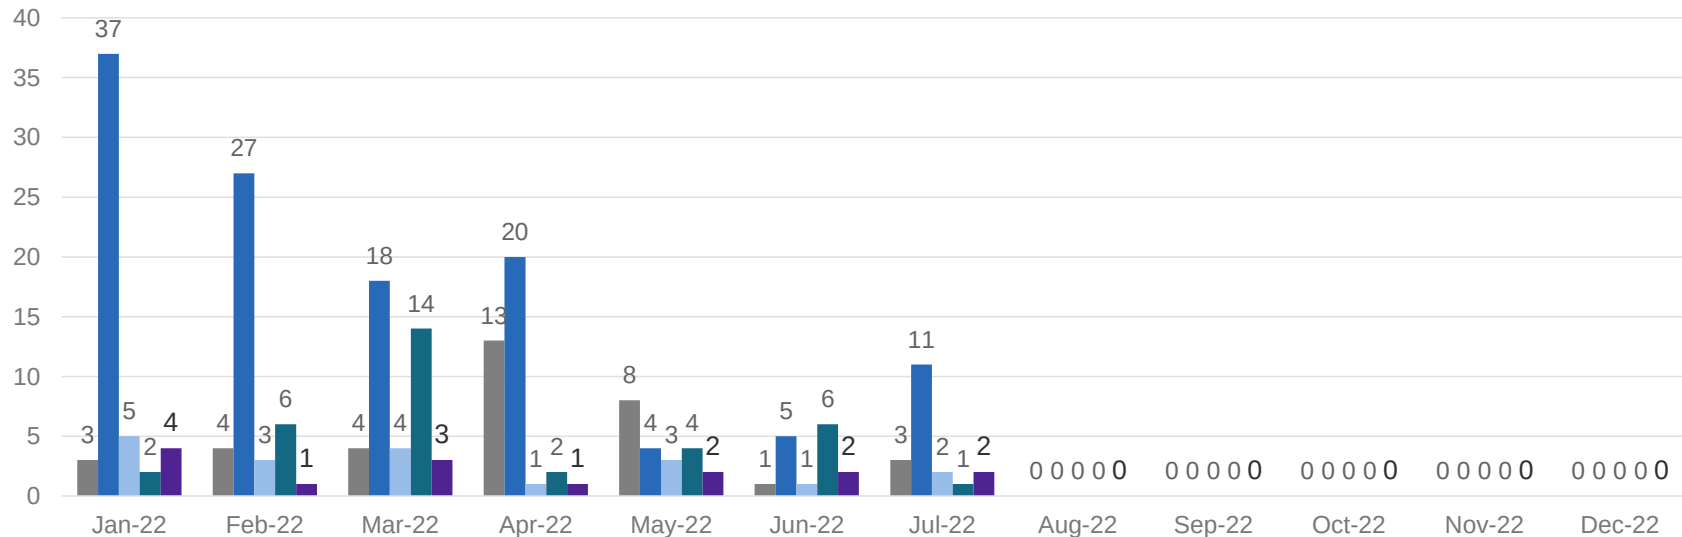


	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
■ Sekretariat	3	4	4	13	8	1	3	0	0	0	0	0
■ Perumahan	37	27	18	20	4	5	11	0	0	0	0	0
■ Kawasan	5	3	4	1	3	1	2	0	0	0	0	0
■ Keterpaduan	2	6	14	2	4	6	1	0	0	0	0	0
■ Pertanian	4	1	3	1	2	2	2	0	0	0	0	0
TOTAL	51	41	43	37	21	15	19					

Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos




Laporan Hasil Survey Kepuasan Website




■ Sangat Informatif	126	131	136	142	145	148	153					
■ Cukup Informatif	34	35	36	40	44	46	51					
■ Kurang Informatif	31	31	31	32	33	33	33					

Laporan Jumlah Kenaikan Pengunjung Website

Minggu IV



Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website



PENEKANAN

1. Bagi semua bidang agar menyampaikan updating progress pelaksanaan program/kegiatan secara rutin;
2. Setiap pengadaan barang/jasa non-transaksional baik melalui mekanisme swakelola maupun pengadaan langsung harus dicatatkan dalam SPSE, serta memastikan kesesuaian metode dan nama paket antara SIRUP dengan realisasi;
3. Menindaklanjuti arahan Biro APBJ yang disampaikan pada saat Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 28 Juli 2022;
4. Mengingat kembali kepada seluruh ASN di lingkungan Disperakim agar memperhatikan kesesuaian Pakaian Dinas Harian (PDH) termasuk atribut yang digunakan sebagaimana pergub yang berlaku;

PERUBAHAN ANGGARAN TA 2022

1. Memastikan target indikator kinerja pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan capaian akhir tahun 2021 dan TW 2 Tahun 2022, dan argumentasi peranakan anggaran.
2. Memastikan kembali pagu perubahan tidak melampaui realisasi anggaran s.d. TW 2 Tahun 2022.
3. Memastikan sisa kontrak/tender dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan,
4. Memastikan pergeseran belanja antar kode rekening pada sub kegiatan/antar sub kegiatan tidak menambah alokasi perjalanan dinas pada satu dinas.
5. Melakukan input RAB sesuai usulan pergeseran dan Perubahan Anggaran tahun 2022 pada e-budgeting jika jadwal yang ditentukan.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TA. 2023

1. Mempersiapkan Rencana Program, Kegiatan, dan RAB TA. 2023 sesuai dengan ketentuan;
2. **PERHATIAN UNTUK BIDANG PERUMAHAN:**
 - Menindaklanjuti hasil koordinasi yang telah dilaksanakan terhadap usulan penyesuaian dan/atau perubahan by name by address (BNBA) bansos TA. 2023 pada e-rembugan dengan mempersiapkan ceklist Readiness Criteria;
 - Menindaklanjuti hasil pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan auditor Inspektorat.
3. **PERHATIAN UNTUK BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**
 - Mempersiapkan Juknis pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
 - Memastikan kembali penerima hibah baik PSU maupun Penanganan Kawasan Kumuh
 - Melaporkan dan membuat kajian hasil benchmarking yang telah dilaksanakan

RANGKAIAN KEGIATAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE-77 KEMERDEKAAN RI

29 JULI 2022

VOLLEY

TENIS MEJA

5 AGUSTUS
2022

ESTAFET MAKAN
KERUPUK

BAKIAK

ESTAFET SARUNG

MEMASUKKAN PENSIL
DALAM BOTOL

12 AGUSTUS
2022

LOMBA MASAK
NASI GORENG

DONOR DARAH

13 AGUSTUS
2022

BAKTI SOSIAL
PENYALURAN PAKET
SEMPAKO DI DESA
DAMPINGAN
DESA BANYUSIDI,
KEC. PAKIS KAB.
MAGELANG



Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JUNI 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir Juni TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

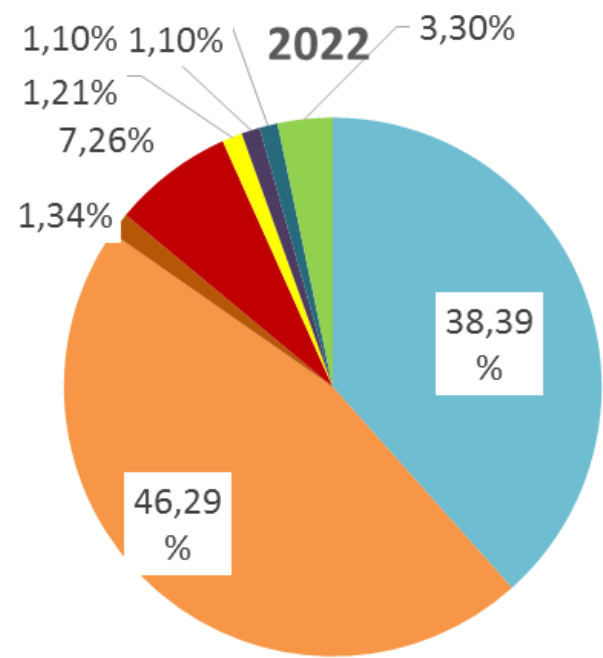

NO.	PROGRAM	2022	
		(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000
	TOTAL	100	45.424.693.000




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir Juni 2022

^{*)}Realisasi keuangan diambil dari e-controlling status Kamis, 30 Juni 2022

Disperakim

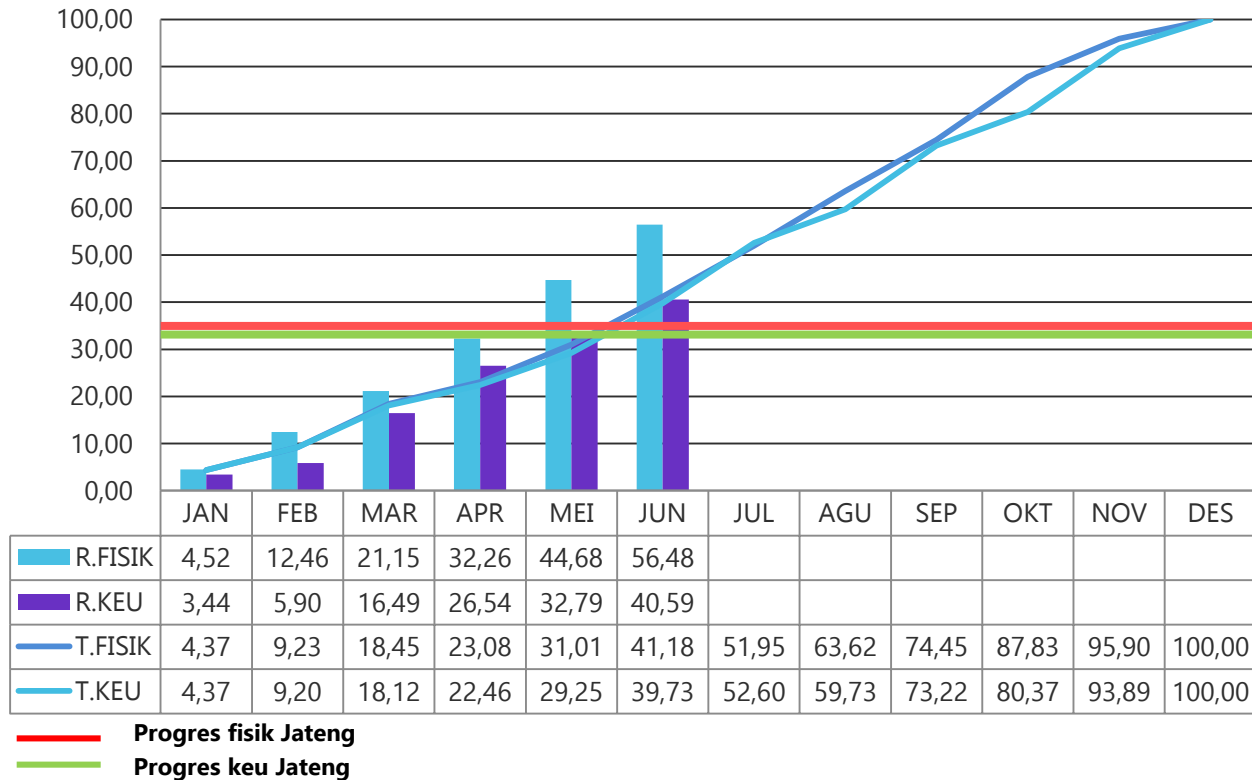


	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	41,18	51,95
Target Keu	39,73	52,60
Real. Fisik	56,48	61,33
Real. Keu	40,59	56,22
Dev. Fisik	15,30	9,38
Dev. Keu	0,86	3,62

PROVINSI JAWA TENGAH (Status 28 Juni 2022)

Target Fisik	29,80
Target Keu	27,64
Real. Fisik	33,28
Real. Keu	34,62
Dev. Fisik	3,48
Dev. Keu	6,98

Sekretariat

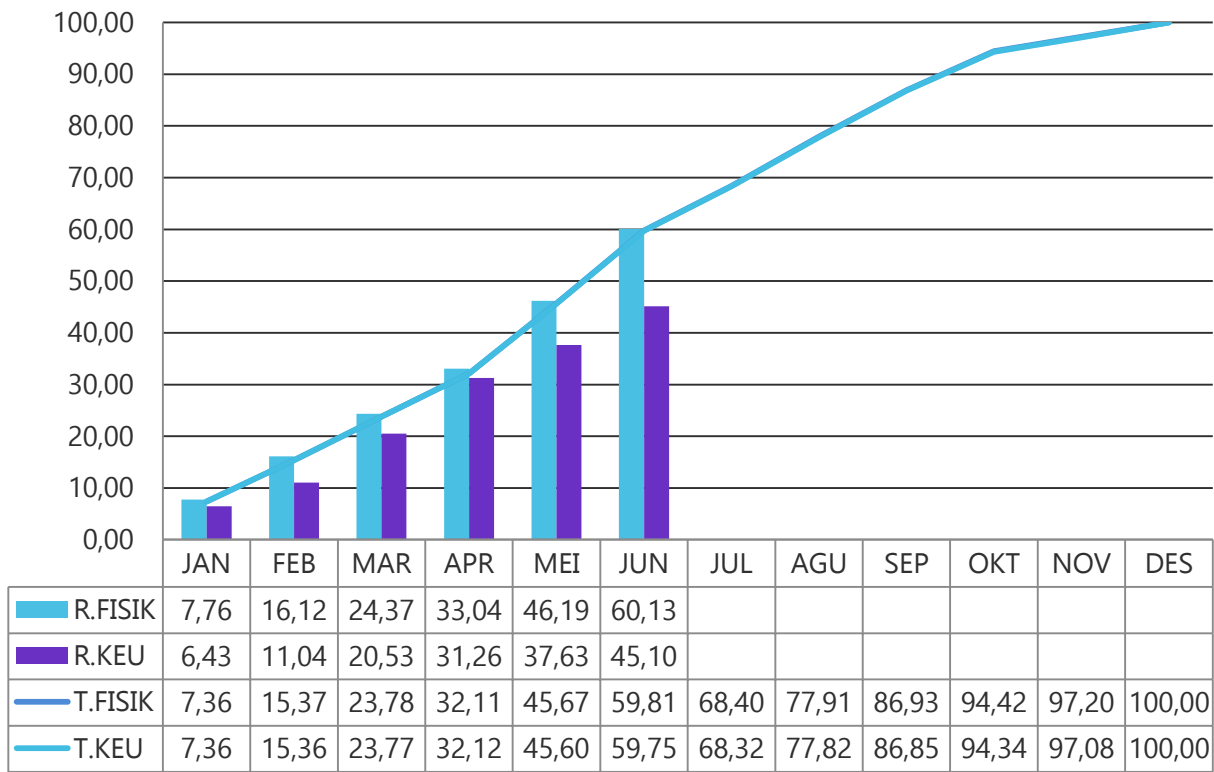

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	59,81	68,40
Target Keu	59,75	68,32
Real. Fisik	60,13	68,49
Real. Keu	45,10	68,47
Dev. Fisik	0,32	0,09
Dev. Keu	-14,65	0,15

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Program						
1	Forum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023	49.952.000	0,40	-44,04	Efisiensi Honorarium Narasumber dibayarkan sesuai kebutuhan, dan efisiensi anggaran lainnya karena pelaksanaan forum secara daring.	akan dioptimalkan utk mendukung capaian indikator kinerja program, melalui perubahan anggaran 2022
2	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	39.599.000	6,00	-38,01	Efisiensi Honorarium Narasumber ditanggung oleh Dinas Perhubungan (pelaksanaan sosialisasi Infrastruktur di Banyumas)	akan dioptimalkan utk mendukung capaian indikator kinerja program, melalui perubahan anggaran 2022
3	Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP)	29.864.000	1,43	-58,86	Kegiatan Penyusunan Dokumen SPIP telah selesai dilaksanakan di Bulan Maret 2022, dengan mekanisme pelaksanaan yang semula 1 kali FGD di luar Kota Semarang menjadi 3 kali Rakor. Di Kota Semarang. Sehingga terdapat efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas.	akan dioptimalkan utk mendukung capaian indikator kinerja program, melalui perubahan anggaran 2022
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.780.000	0,00	-73,60	- Efisiensi Perjalanan dinas pelaksanaan musrenbangwil hanya di 4 lokasi sedangkan alokasi 6 lokasi - Efisiensi Biaya Perjalanan dinas kegiatan koordinasi usulan dengan pusat (Konreg Kementerian PUPR , Kortekrenbang Kemendagri dilaksanakan secara daring)	akan diusulkan utk mendukung capaian indikator kinerja program, melalui perubahan anggaran 2022

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	71.825.000	0,31	-9,42	aktivitas kegiatan telah dilaksanakan, tetapi proses SPJ keuangan di akhir bulan juni sehingga akan tercatat dalam sistem pada awal Juli 2022	Masuk dalam progres keuangan bulan Juli

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Keuangan						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.524.693.000	0,00	-19,41	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
2	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	441.840.000	0,00	-4,11	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	- Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya - Potensi pergeseran di Perubahan Anggaran TA 2022
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	4.000.000	18,75	-4,96	Fisik sudah selesai, terdapat sisa pelaksanaan kegiatan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
4	Pelaksanaan Rapat Persiapan Sosialisasi Semesteran dan Sosialisasi Semesteran	21.700.000	0,00	-3,82	Efisiensi belanja makan-minum rapat	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Umum dan Kepegawaian						
1	Pembayaran Langganan Surat Kabar dan Majalah	20.000.000	0,00	-13,33	Belanja buku belum dilaksanakan karena menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
2	Penyediaan Media Informasi Cetak dan Elektronik	80.000.000	0,00	4,54	Pembayaran honor tenaga pendukung dilaksanakan di akhir bulan dan akan dilaporkan di awal bulan Juli	Akan masuk sebagai progres bulan selanjutnya
3	Pengadaan Alat Studio	196.750.000	0,00	-5,33	Sisa pelaksanaan kegiatan	Berpotensi untuk pergeseran melalui Perubahan Anggaran TA 2022
4	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	159.600.000	-50,00	-69,42	Proses pengadaan alat elektronik direncanakan selesai lelang di akhir Juni, dan pengadaan dilakukan di awal Juli	Akan masuk sebagai progres bulan selanjutnya

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
8	Penyediaan Pelayanan Surat Menyurat	95.000.000	0,00	-1,94	Pembayaran honor tenaga pendukung dilaksanakan di akhir bulan dan akan dilaporkan di awal bulan Juli	Akan masuk sebagai progres bulan selanjutnya
9	Pembayaran Listrik	600.000.000	0,00	-23,21	Dibayarkan sesuai dengan tagihan	- Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya - Berpotensi untuk pergeseran melalui Perubahan Anggaran TA 2022
10	Pengadaan Jasa Keamanan	825.000.000	0,00	-2,04	Pembayaran honor tenaga keamanan dilaksanakan di akhir bulan dan akan dilaporkan di awal bulan Juli	Akan masuk sebagai progres bulan selanjutnya
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.000.000	0,01	-6,01	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

Bidang Perumahan

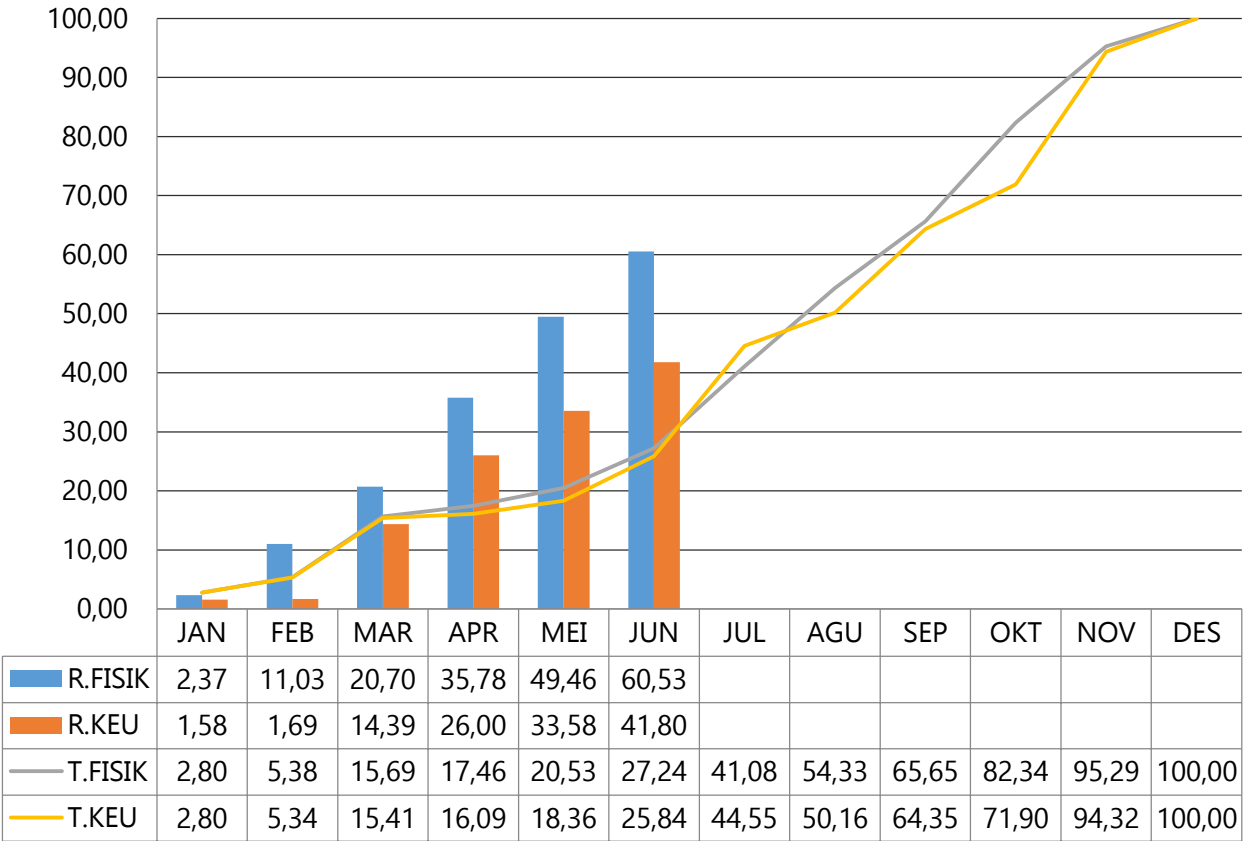

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	27,24	41,08
Target Keu	25,84	44,55
Real. Fisik	60,53	61,36
Real. Keu	41,80	51,51
Dev. Fisik	33,30	20,28
Dev. Keu	15,96	6,96

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.826.000	0,00	-2,03	- Sisa pelaksanaan Rakortek 1 Pengumpulan data - Belanja makan minum Rapat persiapan Rakortek 2 belum dibayarkan karena pelaksanaan pada tanggal 24 Juni 2022	- Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya - Masuk sebagai progres keuangan bulan Juli
2	Koordinasi Lapangan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	178.512.000	-13,06	-13,06	- Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan SPM dengan Kementerian PUPR ditunda pelaksanaannya karena adanya agenda verifikasi tambahan jumlah calon penerima bansos RSS dan relokasi TA 2023 - Perjalanan dinas koordinasi lapangan pengumpulan data bidang perumahan di Kab. Kudus dan Tegal belum dibayarkan	- Akan dijadwalkan kembali di bulan Juli - Realisasi keuangan akan masuk dalam progres bulan Juli
3	Rapat Persiapan dan Rapat Pendukung Kegiatan Pendataan dan Verivali Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	1.500.000	0,00	-20,33	Sisa pelaksanaan kegiatan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
4	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	-0,71	-87,75	Pelaksanaan 19 paket jasa konsultansi sudah selesai, namun proses pembayaran baru diajukan di akhir Juni	Diselesaikan di bulan Juli

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Bimtek Validasi Data SIMPERUM	13.519.000	0,00	-6,57	Sisa belanja makan dan minum	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
6	Sosialisasi Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Sederhana Sehat atau Relokasi Program Pemerintah	7.703.000	2,96	-17,78	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
7	Workshop Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	57.830.000	0,22	-11,24	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
8	Sosialisasi Hunian Tetap (HUNTAP), Hunian Sementara (HUNTARA), dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat / Komunitas Rusus/Rusun di Jawa Tengah	11.100.000	0,00	-3,51	Efisiensi belanja makan-minum Sosialisasi Huntap/Huntara di Kota Surakarta	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
9	Sosialisasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Terdampak Bencana	8.857.000	5,07	-3,20	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
10	Pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah, HUNTAP, HUNTARA, Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat	83.787.000	0,01	-0,68	Perjalanan dinas Sosialisasi Huntap/Huntara di Kota Surakarta belum terbayarkan karena dilaksanakan pada 24 Juni 2022	Realisasi Keuangan masuk sebagai progres bulan Juli
11	Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	5.723.000	0,00	-9,55	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan dilaksanakan pada 30 Mei 2022, sehingga realisasi keuangan masuk sebagai progres bulan berikutnya	Realisasi Keuangan masuk sebagai progres bulan Juni

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		

Seksi Perumahan Umum

1	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	2.925.000	0,00	-4,62	Fisik sudah selesai, terdapat efisiensi belanja makan/minum rapat	Akan dialokasikan kembali untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
2	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	40.266.000	0,00	-0,67	Efisiensi belanja transportasi dan peninapan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	13.750.000	-5,44	-21,09	Rapat progres pembangunan PB Bencana belum dilaksanakan karena fokus pada pelaksanaan pekerjaan pendampingan penyaluran bansos rehabilitasi rumah korban bencana	Dilaksanakan di bulan Juli untuk persiapan rencana perubahan anggaran
4	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	58.140.000	18,42	-10,53	Efisiensi belanja transportasi dan peninapan	Akan dialokasikan kembali untuk mendukung pencapaian target kinerja melalui perubahan anggaran
5	Rapat Koordinasi Pembangunan Rusus-Rusun	3.000.000	16,68	-100,00	- Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta. - Efisiensi belanja makan minum Rapat persiapan internal pembangunan Rusus-Rusun	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Pendampingan Pelaksanaan Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	99.206.000	-28,57	-28,15	- Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta. - Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi pembangunan rumah dengan konstruksi Ruspun 2 lantai dan penggunaan material FABA pada ruspun dengan Dirjen Bina Teknik belum dilaksanakan karena masih dalam proses pematangan materi/substansi	- Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran - Perjalanan dinas luar daerah akan dilaksanakan di bulan Agustus.
7	Rapat Serah Terima Hasil Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	750.000	-75,00	0,00	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran
8	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	9.000.000	-33,32	-33,33	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perumahan Swadaya						
1	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	3.300.000	0,00	-0,15	Sisa pelaksanaan kegiatan (ATK)	
2	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	994.350.000	-0,55	-0,55	Bimtek yang bekerjasama dengan pihak legislatif belum semuanya dilaksanakan karena diperlukan penyesuaian jadwal.	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Juli
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	7.500.000	0,00	-16,52	Sisa pelaksanaan kegiatan karena kegiatan dilakukan secara daring	Akan digeser untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
4	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	2.525.000	0,00	-12,44	Sisa pelaksanaan kegiatan karena kegiatan dilakukan secara daring	Akan digeser untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
5	Persiapan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	44.875.000	0,00	-7,87	Sisa kegiatan	Akan digeser untuk mendukung ssk lain pada anggaran perubahan
6	Persiapan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM	1.325.000	0,00	-58,87	- Sisa pelaksanaan kegiatan (efisiensi)	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
(Rp. 21.025.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Rumah layak huni yang disediakan (RLH)

% Rumah tidak layak huni yang tertangani (RTLH)

TARGET TH. 2022


7,39 %


11,84 %

REALISASI S.D JUNI


4,63 %

10,51%

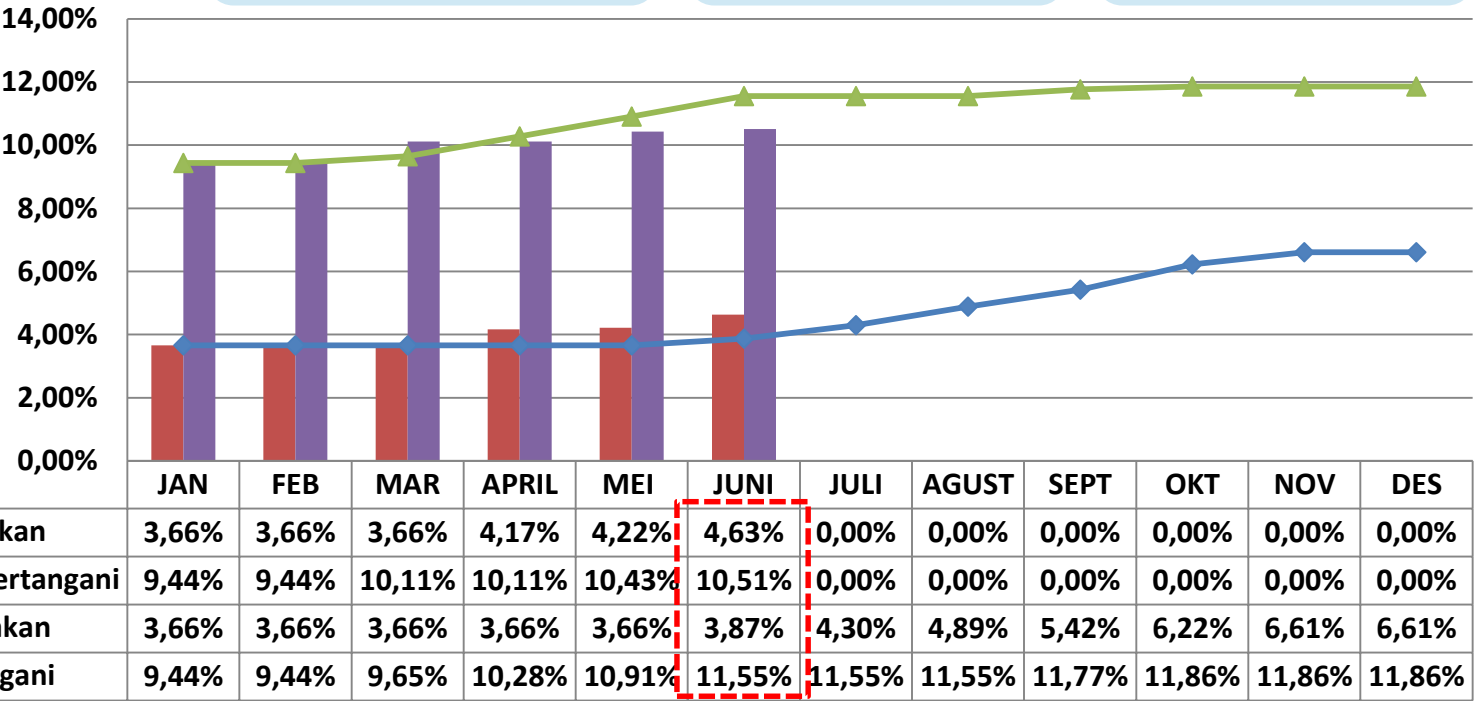


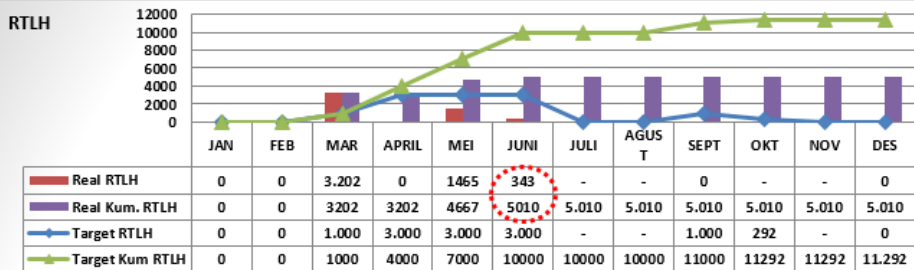


PB BACKLOG




PK BENCANA

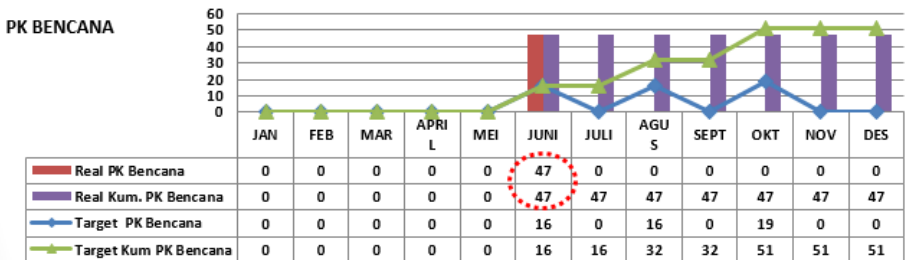


PB BENCANA

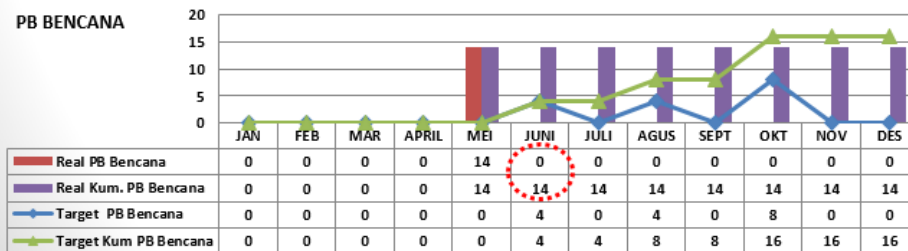

IK SUB KEGIATAN	T. 2022	REALISASI S.D JUNI
Jumlah unit rumah yang dibangun (PB Backlog)	253 unit	• Pelaksanaan pendampingan pengadaan barang, pembangunan pondasi & pembangunan, perakitan RUSPIN & Pelaksanaan seleksi perekrutan TFL • Pencairan termin 2 • Rencana Penyelesaian Pembangunan: 25 unit di Kab. Semarang, 11 unit di Kab. Sragen, 8 unit di Kab. Karanganya • 13 unit berpontong mengalami penggantian BNBA melalui PA TA 2022
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupmedes RTLH)	11.292 unit	5.010 unit (Proses pencairan alokasi SK Gub Tahap 2 (rencana melalui rekam 5 tanggal 30 Juni 2022 & Proses pencairan alokasi SK Gub Tahap 1 s.d. Rekam 4)
Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (PK dan PB Bencana, PB Relokasi)	51 unit PK 16 unit PB-B 62 unit PB-R	• Penandatanganan kontrak dengan penyedia material bansos PK Bencana & Penyaluran dan serah terima bantuan material kepada 47 penerima • 4 Orang gagal menerima bantuan: yang terdiri dari 2 orang Penerima mengundurkan diri karena kondisi rumah yang roboh sehingga akan diusulkan sbg calon penerima bantuan PB Bencana pada tahun 2023, 1 orang pindah domisili Kalimantan & 1 Orang sudah menerima penanganan melalui BPS pada Oktober 2021 14 unit PB-B • Fisik 100% dengan Rincian 7 Unit sudah Termin 3, 7 Unit Termin 2 dan Termin 3 Rencana Pencairan di Juni • 2 Orang mengundurkan diri karena sudah membangun rumah secara swadaya • Bimtek Pelaksanaan Bansos PK Bencana secara Swakelola, SK Pembentukan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan, Pelaksanaan pembangunan rumah korban bencana, Penyiapan BNBA pengganti untuk perubahan anggaran. 60 unit PB-R • 60 Unit Fisik 100% & sdh termin 3 • Rapat Progress Pekerjaan Triwulan Kedua • 2 Penerima mengundurkan diri karena tidak mampu berswadaya, dan 1 orang lainnya sudah mempunyai rumah serta Penyiapan BNBA pengganti untuk perubahan anggaran
Jumlah dok perencanaan RUSUNAWA & RUSUS (Rencana Induk Rusun)	1 Dok	Dalam proses Penyusunan Siteplan, Gambar Teknik, RAB Rusus Optimis
Jumlah dokumen yang disusun	5 Dok	Dalam Proses Verivali calon Penerima PB dan PK, Sosialisasi Teknis



Bidang Kawasan Permukiman

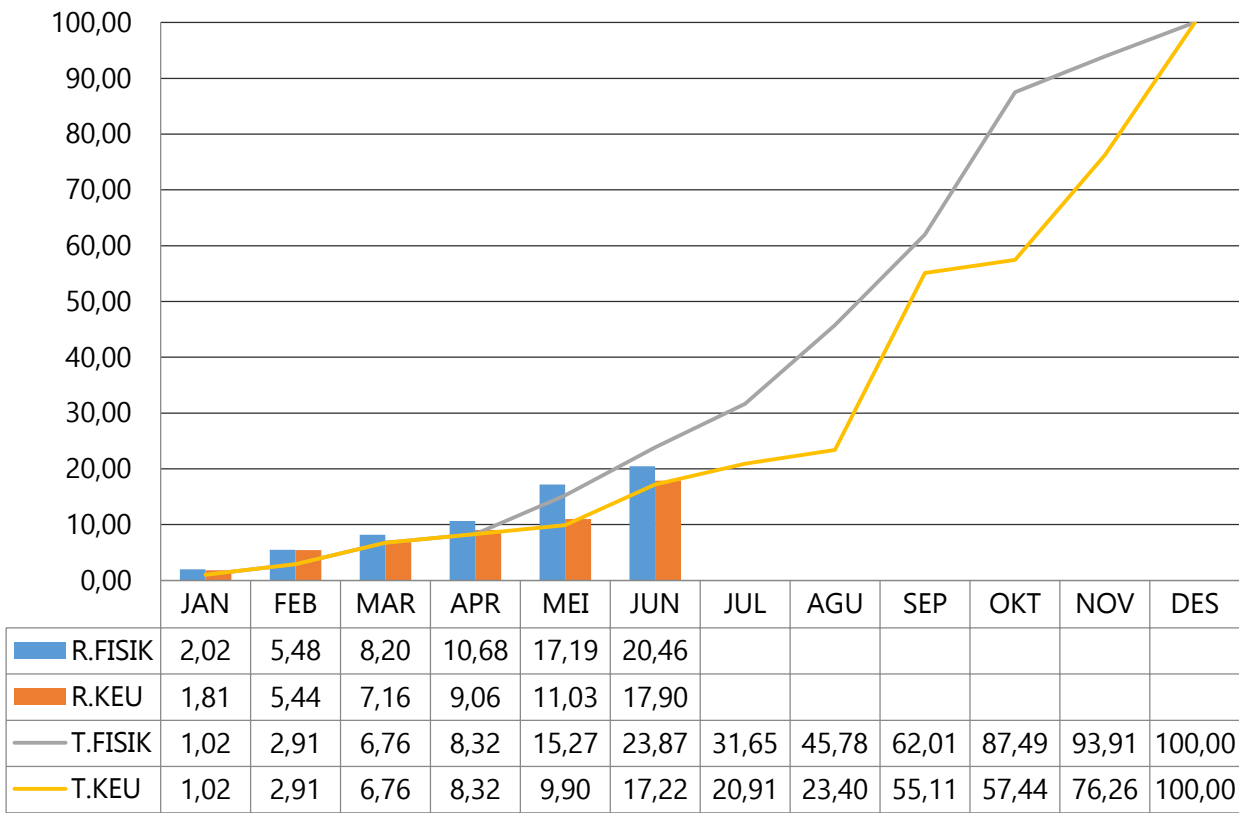

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	23,87	31,65
Target Keu	17,22	20,91
Real. Fisik	20,46	27,89
Real. Keu	17,90	22,52
Dev. Fisik	-3,41	-3,76
Dev. Keu	0,68	1,61

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	FGD Pendataan Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	18.050.000	0,00	-51,25	FGD BKM yang semula direncanakan pada 3 (tiga) kab/kota, berubah di Kantor Disperakim	Anggaran dialihkan untuk mendukung sub-sub kegiatan yang lain pada bulan berikutnya
2	Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	56.907.000	0,00	-2,11	Sisa perjalanan dinas luar daerah	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
3	Koordinasi Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	106.112.000	-2,70	-2,70	- Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil - Pembelanjaan ATK belum dilaksanakan	- Sisa JKK JKM Menjadi Potensi SILPA - ATK akan dibelanjakan di bulan Juli
4	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	-70,00	0,00	Sudah terkontrak tanggal 31 Mei 2022 (semula direncanakan terkontrak bulan April)	Paparan Laporan Antara 6 Juli 2022, dan pembayaran jasa konsultansi direncanakan 29 Juli 2022
5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	58.500.000	-2,81	-2,81	Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi lapangan SK kumuh belum dilaksanakan karena belum ada kabupaten/kota yang mengajukan pembaruan SK kumuh.	dijadwalkan kembali di bulan berikutnya, menyesuaikan dengan pengajuan pembaruan SK Kumuh dari Kab/Kota
6	Persiapan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	35.388.000	-16,63	-16,63	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan Kab/Kota terkait studi identifikasi disesuaikan dengan hasil kajian penyedia jasa di mana laporan antara akan dilaksanakan pada 6 Juli	Koordinasi dengan penyedia jasa & Kab/Kota hasil kajian penyedia jasa

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
1	Rakor Dalam Rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	12.600.000	0,00	-1,59	Sisa belanja Moderator, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	-5,45	-7,77	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan penanganan RTLH di Kawasan Kumuh belum dilaksanakan karena belum adanya database lokasi yang memenuhi syarat	- Akan dilaksanakan Desk Pendataan RTLH di Kawasan Kumuh pada bulan Juli bersama 35 Kab/Kota untuk menginventarisasi data RTLH di kawasan kumuh
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kawasan Permukiman	126.851.000	-4,51	-4,74	- Monitoring usulan Bankeu dari Kab/Kota belum dapat dilaksanakan karena berkaitan dengan jadwal pelaksanaan Bankeu di masing-masing Kab/Kota yang masih dalam proses	- Penjadwalan kembali di bulan berikutnya dengan tetap menyesuaikan jadwal pelaksanaan Bankeu di Kab/Kota
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman						
1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PSU Permukiman Provinsi Jawa Tengah	34.820.000	0,00	-0,24	Sisa belanja transportasi	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
2	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2022	180.000.000	100,00	-21,50	Pembayaran termin pertama 80%	pembayaran termin kedua dilakukan di bulan Juli

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
3	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	-30,00	0,00	- Menunggu rekomendasi BPKP - Perubahan metode & addendum KAK pekerjaan pada saat pendalaman materi - Adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022 - Dalam proses seleksi pengadaan barang dan jasa di Biro APBJ (Pembukaan dan Evaluasi Penawaran)	koordinasi dengan Biro APBJ Setda Prov. Jateng
4	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	-25,00	0,00	- Menunggu rekomendasi BPKP - Perubahan metode & addendum KAK pekerjaan pada saat pendalaman materi - Adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022 - Dalam proses seleksi pengadaan barang dan jasa di Biro APBJ (SPPBJ)	koordinasi dengan Biro APBJ Setda Prov. Jateng
5	Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	-25,00	0,00	- Menunggu rekomendasi BPKP - Perubahan metode & addendum KAK pekerjaan pada saat pendalaman materi - Adanya migrasi server & upgrade SPSE 4.5 CA pada tanggal 18 Mei 2022 - Dalam proses seleksi pengadaan barang dan jasa di Biro APBJ (SPPBJ)	koordinasi dengan Biro APBJ Setda Prov. Jateng

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

**PROGRAM
PENINGKATAN PSU
(Rp. 3.300.000.000)**

INDIKATOR KINERJA

% Kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET TH. 2022

17,00%

REALISASI S.D JUNI

0 %

INDIKATOR KINERJA


% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET TH. 2022

23, 37 %

REALISASI S.D JUNI

24,21 %

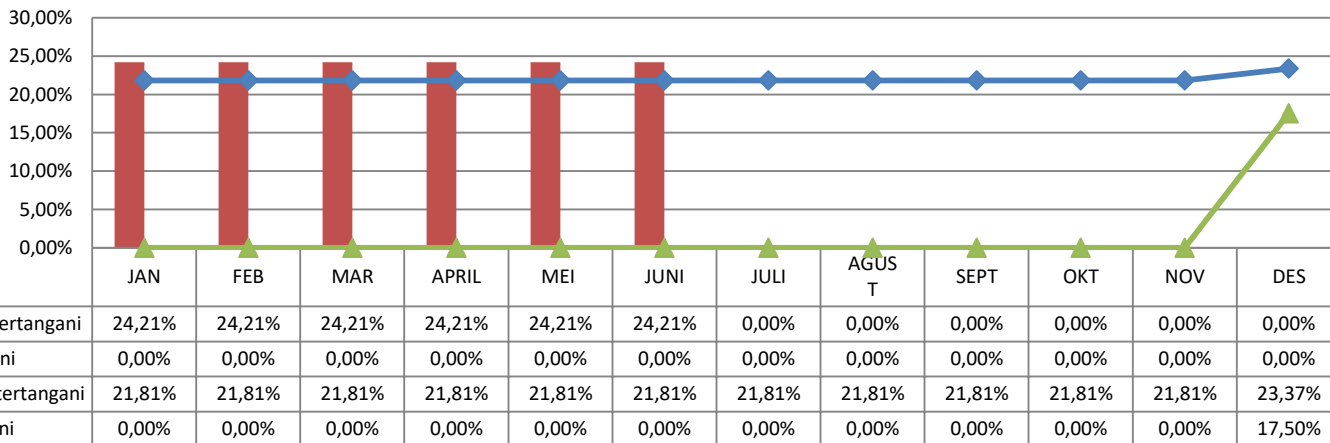

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 3.300.000.000)


Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D JUNI
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	0 Lokasi - Pelaksanaan lomba hari habitat 2022, Pelaksanaan pekerjaan penyusunan DED - Kontrak Pekerjaan Penyusunan Perencanaan/DED Hadiah Lomba Hari Habitat 2022 - Pelaksanaan pekerjaan penyusunan DED - Sosialisasi Penyusunan Perencanaan/DED Hadiah Lomba Hari Habitat 2022 kepada Pemkab/Kota dan masyarakat setempat
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	0 Dokumen ➤ Koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota terkait data serah terima PSU di Kab. Karanganyar dan Boyolali ➤ Monev serah terima PSU Perumahan (Output: Profil serah terima PSU → Lokasi yang dianggap berhasil: Kab. Boyolali, Demak, Karanganyar, Kendal. Lokasi serah terimanya relatif rendah: Kota Magelang, Kab. Magelang ➤ Rapat Persiapan Penyelenggaraan Rakor PSU Kawasan Permukiman

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 610.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D JUNI
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	0 Lokasi (koordinasi pelaksanaan integrasi penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh di Kota Pekalongan, Surakarta, Tegal, Kab. Purworejo)
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	0 Dokumen (Koordinasi internal inventarisasi usulan bankeu Kab/Kota)
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen - Koordinasi inventarisasi BKM di kawasan kumuh pada Kab. Jepara, Kudus, Wonogiri - FGD BKM/Pokmas di Kawasan Permukiman - Verifikasi SK Kawasan Kumuh - FGD Pemberdayaan Pokmas Terhadap Aspek Kawasan Permukiman Kumuh Prov. Jateng - Studi komparasi hibah kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Timur
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	0 Dokumen - Koordinasi verifikasi usulan SK kawasan kumuh di Kab. Jepara, Kudus, Wonogiri, Kota Salatiga, Kab. Wonosobo & Kab. Semarang - Koordinasi verifikasi usulan hibah kawasan permukiman di Kab. Pati, Boyolali, Kab. Kebumen, Kab. Temanggung, Kab. Purworejo, Kota Magelang & Kab. Karanganyar - Rapat internal Koordinasi Perencanaan - Monev kawasan permukiman kumuh di Kab. Banjarnegara dan Wonosobo

Bidang Pertanahan

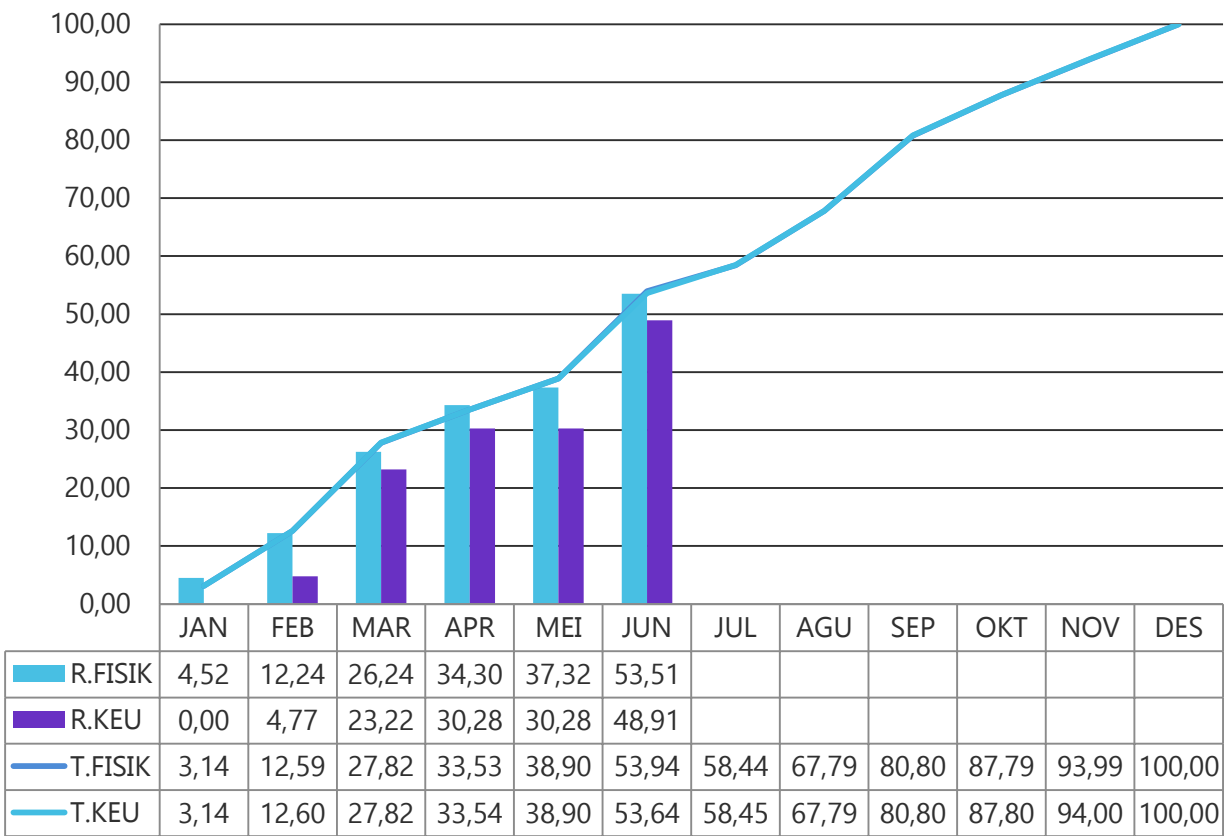

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	53,94	58,44
Target Keu	53,64	58,45
Real. Fisik	53,51	66,19
Real. Keu	48,91	64,83
Dev. Fisik	-0,43	7,75
Dev. Keu	-4,73	6,38

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Rapat Verifikasi Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	16.875.000	-12,00	-12,00	- pada bulan juni telah melaksanakan kegiatan rapat pencermatan DPPT pengadaan tanah SUTET 150 kV Ungaran -Pedan sehingga realisasi menyesuaikan dengan kegiatan pengadaan tanah pada bulan juni - Masih ada proses/tahapan pengadaan tanah yang masih belum dilaksanakan	Melakukan koordinasi teknis dengan instansi yang memerlukan tanah untuk mendorong pengajuan DPPT sesuai dengan regulasi/hasil verifikasi pada bulan berikutnya. (DPPT yang sudah masuk antara lain Pengadaan Tanah Pembangunan Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai di Kab. Purworejo, Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Tingal Kab. Temanggung, Pembangunan Jaringan Irigasi DI Pidekso di Kab. Wonogiri)
2	Identifikasi Kepemilikan Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan	74.830.000	-10,80	-10,80	- pada bulan juni telah melaksanakan kegiatan rapat pencermatan DPPT pengadaan tanah SUTET 150 kV Ungaran -Pedan sehingga realisasi menyesuaikan dengan kegiatan pengadaan tanah pada bulan juni - Masih ada proses/tahapan pengadaan tanah yang masih belum dilaksanakan	direncanakan kembali pada bulan berikutnya


No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
3	Pelaksanaan Komunikasi Dialogis Kepada Warga Terdampak di Lokasi Rencana Pembangunan	100.300.000	-3,90	-3,91	- pada bulan juni telah melaksanakan kegiatan rapat pencermatan DPPT pengadaan tanah SUTET 150 kV Ungaran - Pedan sehingga realisasi menyesuaikan dengan kegiatan pengadaan tanah pada bulan juni - Masih ada proses/tahapan pengadaan tanah yang masih belum dilaksanakan	direncanakan kembali guna mendukung kegiatan tahapan pengadaan tanah pada bulan berikutnya
4	Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pada Trase atau Basic Design di Lokasi Rencana Pembangunan	74.844.000	-21,38	-21,38	- pada bulan juni telah melaksanakan kegiatan rapat pencermatan DPPT pengadaan tanah SUTET 150 kV Ungaran - Pedan sehingga realisasi menyesuaikan dengan kegiatan pengadaan tanah pada bulan juni - Masih ada proses/tahapan pengadaan tanah yang masih belum dilaksanakan	dijadwalkan dan direncanakan kembali guna mendukung kegiatan tahapan pengadaan tanah pada bulan berikutnya
5	Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	127.201.000	-2,09	-2,09	- Belanja Perjalan Dinas Koordinasi pengadaan tanah dan belanja mengalami perubahan jadwal dikarenakan menyesuaikan kegiatan lapangan tahapan pengadaan tanah SUTET 150 kV Ungaran Pedan di Kab Klaten, Kab Semarang dan Kab Boyolali - sisa belanja menyesuaikan pembayaran JKK dan JKM	dijadwalkan dan direncanakan kembali guna mendukung kegiatan tahapan pengadaan tanah pada bulan berikutnya

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Permasalahan Pertanahan						
1	Sosialisasi tentang Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Tanah Kas Desa	50.900.000	0,00	-5,36	Pelaksanaan fisik sudah selesai, adapun untuk progres keuangan akan dilaporkan dalam progres bulan Juli	Realisasi keuangan akan terlaporkan sebagai progres bulan Juli
2	Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Sertipikasi Tanah Kas Desa	190.720.000	0,00	-0,16	- Efisiensi belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
3	Pelaksanaan Pra Sertipikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Pra Sertipikasi Tanah Kas Desa	72.780.000	0,00	-1,71	- Efisiensi belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
4	Konsolidasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	54.200.000	0,00	-18,29	- Efisiensi belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
5	Pelaksanaan Mediasi Permasalahan Pertanahan	78.925.000	6,81	-3,19	- Efisiensi belanja transportasi	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan						
1	Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah Status Hak Pakai (HP) dan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)	25.955.000	4,92	-18,55	- Efisiensi pelaksanaan kegiatan	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
2	Rapat Koordinasi Kendala Implementasi Peraturan Pertanahan di Jawa Tengah, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal	16.751.000	3,83	-0,42	- Efisiensi pelaksanaan kegiatan	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
3	Pendampingan Proses Pengadaan Tanah dan Penanganan Dampak	24.350.000	-42,16	-42,16	- Pendampingan proses pengadaan tanah/penanganan dampak yang semula direncanakan akan dilaksanakan 3 kali s.d. bulan Juni (dari total 5 pelaksanaan) baru dilaksanakan 1 kali. - Alokasi anggaran 3x pendampingan pada SSK ini akan dialihkan untuk SSK lain yang mendukung capaian target Renstra melalui perubahan anggaran	- Pendampingan akan dijadwalkan kembali menyesuaikan proses pengadaan tanah/penanganan dampak yang sedang berjalan - Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
4	Konsultasi Pembinaan Pertanahan	30.467.000	47,43	-7,08	- Efisiensi pelaksanaan kegiatan (siswa belanja penginapan dan transportasi) - Terdapat anggaran 1x Perjalanan dinas luar daerah yang akan dialihkan melalui perubahan anggaran.	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja melalui perubahan anggaran

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Rapat Koordinasi Rencana Program Reforma Agraria, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	20.030.000	7,50	-10,14	- Progres Fisik telah selesai - Pengambilan di sesuaikan dengan harga pasar dan blangkon (Cetak dan ATK) - Narasumber Kemendagri tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara Rakortek Pertanahan	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja melalui perubahan anggaran
6	Pemantauan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (LP2B)	24.350.000	0,00	-5,66	Efisiensi pelaksanaan kegiatan (siswa belanja penginapan)	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
7	Penataan Akses Reforma Agraria Peningkatan Taraf Hidup dengan Program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pemanfaatan lahan	263.012.000	0,00	-4,52	- Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (siswa belanja penginapan dan transportasi)	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja

BIDANG PERTANAHAN

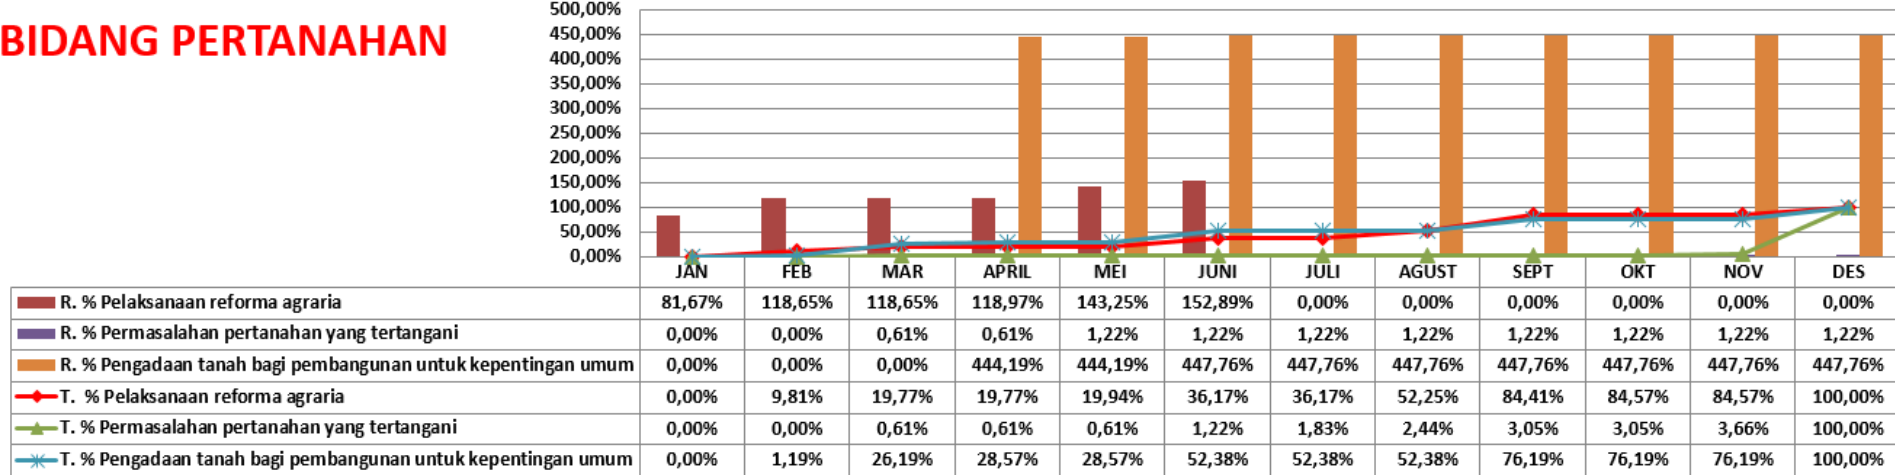

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Persentase pelaksanaan reforma agraria

TARGET TH. 2022

100%

REALISASI

152,89 %

INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	REALISASI S.D. JUNI
Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan	20%		30,58%
Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)	420 Bidang: 5 Bidang HGU 15 Bidang HP 400 Bidang Pemantauan Penlok 1 kali Diseminasi/rakor bidang pertanahan		721 Bidang: 1 Bidang HGU 8 Bidang HP 712 Bidang 1 kali
Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)	2 Lokasi		1 Lokasi
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)	200 bidang Pemantauan Sertifikasi 7 Lokasi Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA 5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA		229 Bidang 3 Lokasi 6 Kabupaten/Kota

Lanjutan ...

**PROGRAM PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**
(Rp. 550.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum

TARGET T.A. 2022

100%

REALISASI S.D MEI

447,76 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D MEI
Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	20%	89,55%
Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	2.000 Bidang Penlok	9.303 Bidang Penlok (Penerbitan SK Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Cilacap; Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500kV di Kab. Klaten, Boyolali, dan Semarang.
Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	100 Bidang ZNT	100 Bidang ZNT (Perkiraan Nilai Zonasi Nilai Tanah di Daerah)

**PROGRAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN**
(Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Permasalahan pertanahan
yang tertangani

TARGET T.A. 2022


100%

REALISASI S.D MEI

1,22 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. JUNI
Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	20%	0,12%
Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	150 Bidang LP2B 8 Bidang TKD	0 Bidang LP2B 0 Bidang TKD • Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikat LP2B & TKD • Koordinasi Penetapan Lokasi Objek Bidang Tanah yang akan disertifikat • Pelaksanaan pra sertifikasi, pelaksanaan Verifikasi Berkas Persyaratan , Koordinasi dalam rangka persiapan pendampingan pemasangan tanda batas tanah LP2B di Kab. Semarang, Cilacap, Blora • Koordinasi penyediaan tanda batas tanah & Pemasangan Tanda Batas Tanah
Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	6 Sengketa	2 Sengketa • Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanjung Mas (Pemberian Santunan) & Permasalahan keberatan pemberian santunan bangunan madrasah pada kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan Tanjung Mas • Penanganan Permasalahan Pertanahan TPU Dasiknoloyo dan Pracimoloyo di Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo • Mediasi Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kab. Sukoharjo, Surakarta (TPU), dan Sragen (Batas Tanah di Desa Bulungkulon Kec. Jekulo) • Konsolidasi penanganan dampak sosial tanah musnah (tambahan)

Bidang Keterpaduan PKP

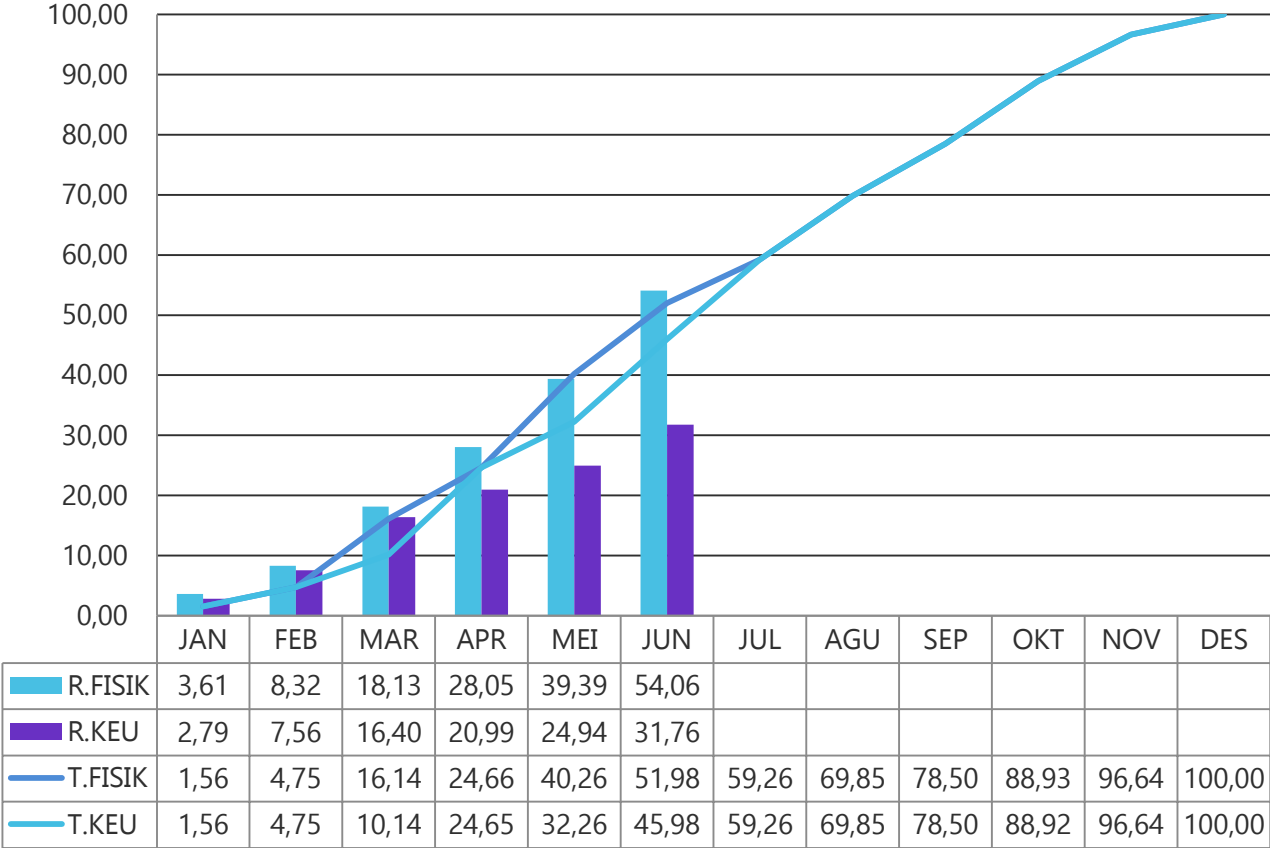

	Juni	Juli (Prognosis)
Target Fisik	51,98	59,26
Target Keu	45,98	59,26
Real. Fisik	54,06	59,90
Real. Keu	31,76	58,69
Dev. Fisik	2,08	0,64
Dev. Keu	-14,22	-0,56

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Fasilitasi Pokja/ Forum PKP dan Pengembangan Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	88.571.000	-0,88	-9,02	- Efisiensi Narasumber - Rakor Forum Kemitraan ditunda pelaksanaannya	- Penyiapan materi Rakor Forum Kemitraan
2	Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	36.335.000	0,00	-0,14	Sisa BBM	
3	Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	166.095.000	0,00	-1,97	Perjalanan dinas koordinasi penyusunan kebijakan dan strategi PKP dilaksanakan pada akhir Juni	Masuk sebagai Progres keuangan bulan Juli
4	FGD Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	20.386.000	52,42	-13,24	Efisiensi Pelaksanaan (Narasumber, ATK)	Akan dilakukan pergeseran ke SSK lain melalui Perubahan Anggaran TA 2022
5	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	360.000.000	0,00	-58,33	- Pelaksanaan kontrak tertunda 1 bulan - Pembayaran Termin terkendala error pada sistem e-delivery	Percepatan proses pembayaran Termin
6	Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	25.781.000	-2,37	-5,86	- Pelaksanaan sosialisasi KKN Tematik di lapangan yang semula dijadwalkan di bulan Maret baru dimulai di bulan Mei dan telah dilaksanakan 2 kali dari rencana 3 kali - Narasumber dari internal dinas sehingga honorarium narasumber belum terserap	Akan dialokasikan untuk Periode KKN Tematik selanjutnya (Juli-Agustus)

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
7	Pengadaan Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	100.000.000	-50,00	-50,00	- Penyiapan KAK dan RAB - Penyiapan persyaratan proses pinjam pakai alat peraga kepada komunitas masyarakat	Penjadwalan ulang pengadaan alat peraga
8	Penyediaan Honorarium Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	-25,00	-25,00	Pengadaan alat peraga belum dilaksanakan	Menyesuaikan penjadwalan ulang pengadaan alat peraga.
Seksi Pengelolaan data PKPP						
9	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	44.744.000	0,00	-0,17	- Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil	- Sisa JKK & JKM akan menjadi Silpa

BIDANG KETERPADUAN PKP

**PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
(Rp. 1.500.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA


**% Ketersediaan kebijakan, data, dan
evaluasi kinerja perumahan rakyat
dan kawasn permukiman**

**TARGET
TH. 2022**

100%

REALISASI s.d MEI

15,38 %

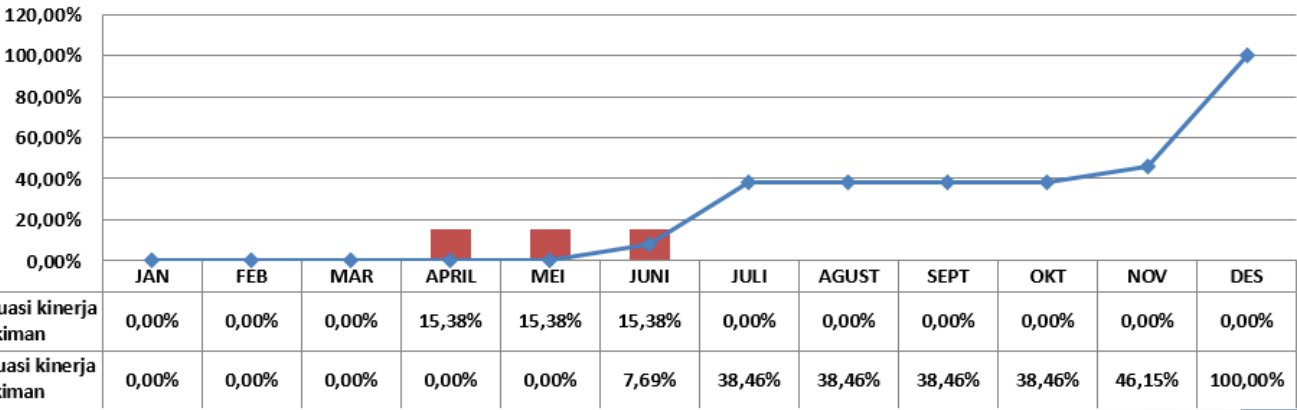

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

TARGET 2022

REALISASI S.D JUNI

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5 Dokumen	0 Dokumen <i>(Pembahasan Laporan Antara Jasa Konsultansi, Rapat Koordinasi Pokja & Forum PKP Provinsi Jawa Tengah, Monitoring dan Sosialisas KKN di Kab. Semarang)</i>
Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	3 Dokumen	1 Dokumen Evaluasi Lingkup Bidang PKPP Tahun 2021, TA 2022 <i>(Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP (BSPS dan DAK), Pencermatan locus usulan 2022 dan 2023, Persiapan pembinaan ke Rusun Kab. Pekalongan, Rapat pembinaan rusun MBR cabean Kota Salatiga Technical Meeting Penilaian Penyelenggaraan PKP, Koordinas lapangan terkait perijinan perumahan ke Kab. Semarang dan Batang)</i>
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	5 Dokumen	1 Dokumen Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data PKP Provinsi Jawa Tengah <i>(Koordinasi Pengumpulan Data, Pengembangan Aplikasi & Pengadaan Jasa Konsultansi Koordinasi Pengumpulan Data, Rapat Internal, Pengembangan Aplikasi, Rapat Tim Teknis Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi PKPP, Persiapan Review Keterisian Data)</i>



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Juni 2022

Bidang Perumahan

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 20/31 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
6		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
7		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
8		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
9		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
10		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
11		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
20	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
21		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
22		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
23		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
24		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
25		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
26		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
27		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
28		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
29		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
30		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	Oktober - Desember
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
31	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - SIMPERUM	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 7 April 2022	April - Desember

Tender

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender	Akan dialihkan melalui perubahan anggaran	

Swakelola Tipe IV oleh Kelompok Masyarakat

Jumlah SK Telah Ditandatangani: 45/45

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Tumanggal Kabupaten Purbalingga	120.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 23 Februari 2022	23 Februari 2022 - 22 Juli 2022 (150 hari)
2		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan	144.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
3		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bongas Kabupaten Pemalang	48.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 2 Maret 2022	2 Maret 2022 - 29 Juli 2022 (150 hari)
4		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sriwulan Kabupaten Demak	144.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
5		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Blerong Kabupaten Demak	72.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 4 Maret 2022	4 Maret 2022 - 31 Juli 2022 (150 hari)
6		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bedono Kabupaten Demak	84.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga	200.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (1 orang penerima bantuan mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
8		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Kebumen	250.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
9		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purworejo	150.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
10		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali	200.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
11	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Pekalongan	1.015.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
12		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Wonogiri	945.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
13		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Tegal	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
14	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan, Desa Sumogawe	280.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 21 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
15		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan, Desa Polobogo	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 21 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
16		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan, Desa Ketapang	420.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 20 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
17		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan, Desa Timpik	455.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 20 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
18		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Brondong	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
19		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Kaliwungu	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
20		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Gowong	140.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
21		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Tegalsari	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
22		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Brunorejo	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
23	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Sapuran, Desa Glagah	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
24		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Leksono, Desa Kalimendong	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
25		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Kertek, Desa Bejiarum	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
26		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Cilacap, Kec. Dayeuhluhur, Desa Bingkeng	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 8 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
27		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Cilacap, Kec. Dayeuhluhur, Desa Dayeuhluhur	770.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 8 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
28		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Gondang, Desa Wonotolo	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
29		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Mondokan, Desa Kedawung	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
30		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Sambungmacan, Desa Banaran	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
31		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Sidoharjo, Desa Taraman	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
32		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Kalijambe, Desa Wonorejo	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
33		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Selokaton	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
34		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Dayu	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
35		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Tuban	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
36		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Dayu	140.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
37		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Pemalang, Kec. Watukumpul, Desa Tambi	630.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
38		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Pemalang, Kec. Watukumpul, Desa Majakerta	525.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
39	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Paguyangan, Desa Paguyangan	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 11 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
40		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Jatibarang, Desa Kebogadung	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
41		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Songgom, Desa Dukuhmaja	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 19 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
42		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Pengkol	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
43		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Baran	280.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
44		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Pondok	70.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
45		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Bendosari, Mojorejo	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi (Terkontrak: 0/6 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana / Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender	Proses inputting ke dalam Silalapbaja	Juli
2		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender	Proses inputting ke dalam Silalapbaja	Juli
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender	Proses inputting ke dalam Silalapbaja	Juli
4		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi	pembukaan dan evaluasi penawaran	Mei
5		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi	surat penunjukan penyedia barang dan jasa	Mei
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi	surat penunjukan penyedia barang dan jasa	Mei

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 2/8 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 8 Maret 2022	60 hari
2		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 15 Maret 2022	60 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
5		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
6		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
7		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
8	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung	menunggu proses seleksi (server LPSE dalam perbaikan)	Juni

Bidang Keterpaduan PKP


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 10 Maret 2022	Maret s.d. Oktober 2022

Sekretariat

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Rencana/ Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

Realisasi Belanja Blangkon


Catatan:
Data diambil dari sistem Blangkon status 28 Juni 2022



SEKRETARIAT	-	-	12.410.000	14.330.000	27.100.000	15.420.000
PERUMAHAN	43.366.500	65.791.000	49.506.184	7.120.500	43.348.400	22.331.800
KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	750.000	11.300.000	10.250.000	10.050.000
PERTANAHAN	5.132.200	14.224.000	2.360.000	2.645.000	9.244.300	2.700.000
KETERPADUAN PKP	2.000.000	16.392.000	49.756.000	8.587.000	1.900.000	10.947.000

50.498.700	96.407.000	114.782.184	43.982.500	91.842.700	61.448.800
------------	------------	-------------	------------	------------	------------


TOTAL (Rp)	% terhadap pagu
69.260.000	0,40%
231.464.384	1,10%
32.350.000	0,83%
36.305.500	2,34%
89.582.000	5,97%
458.961.884	1,01%

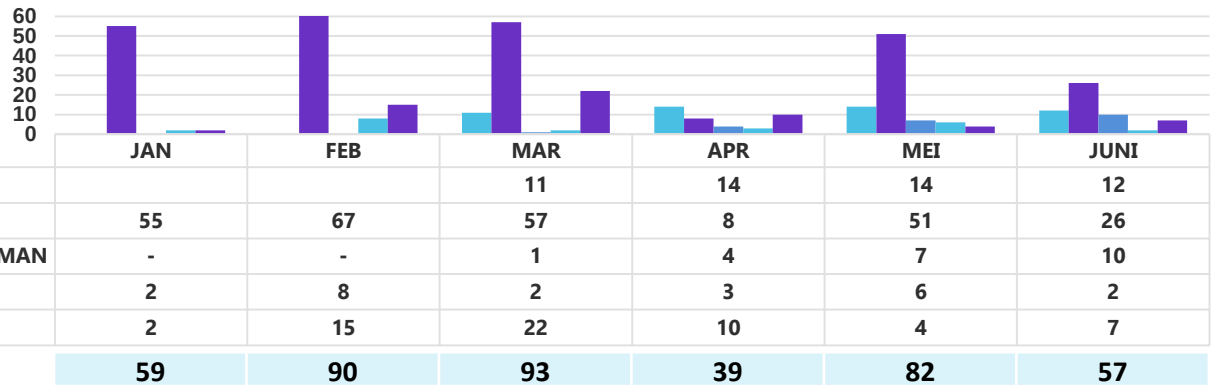

SEKRETARIAT	-	-	11	14	14	12
PERUMAHAN	55	67	57	8	51	26
KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1	4	7	10
PERTANAHAN	2	8	2	3	6	2
KETERPADUAN PKP	2	15	22	10	4	7

59	90	93	39	82	57
----	----	----	----	----	----

TOTAL (Transaksi)
51
264
22
23
60
420




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Juni 2022

Respon LapoGub

Status 28 JUNI 2022, terdapat 17 laporan permintaan informasi melalui web LAPORGUB dan SUDAH TERJAWAB TUNTAS.

Adapun rincian laporan tersebut terdiri dari :
17 laporan terkait RTLH

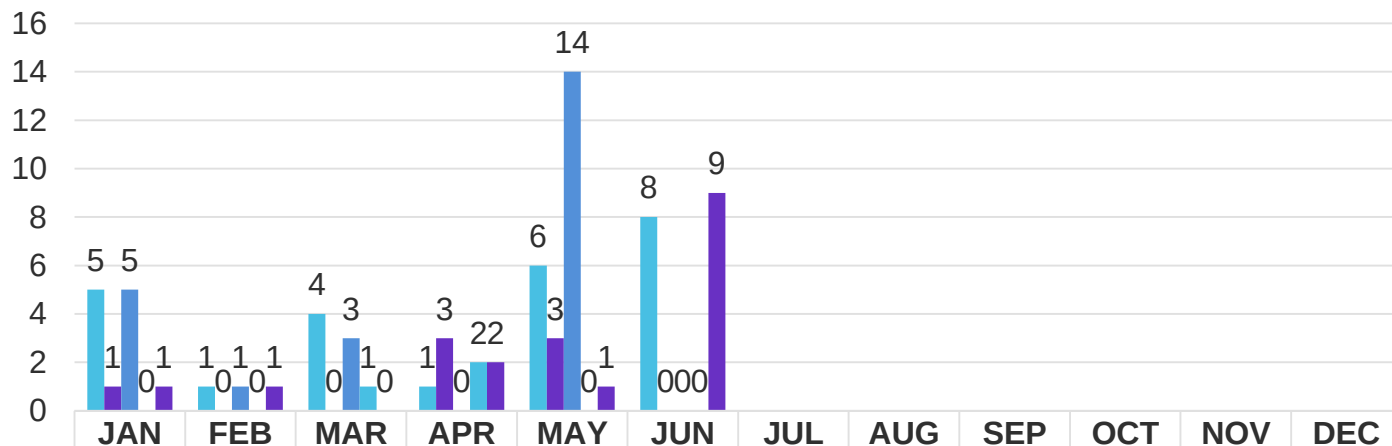

■ WEB

■ IG

■ WHATSAPP

■ FACEBOOK

■ SMS LAPORGUB

TOTAL

12

3


8

8


24

17

Konten Media Sosial




Konten Berita Web Dinas




	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
■ Sekretariat	3	4	4	13	8	1	0	0	0	0	0	0
■ Perumahan	37	27	18	20	4	5	0	0	0	0	0	0
■ Kawasan	5	3	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0
■ Keterpaduan	2	6	14	2	4	6	0	0	0	0	0	0
■ Pertanian	4	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0
TOTAL	51	41	43	37	21	15						

Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos




Laporan Hasil Survey Kepuasan Website



	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ags 2022	Sept 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022
Sangat Informatif	126	131	136	142	145	148						
Cukup Informatif	34	35	36	40	44	46						
Kurang Informatif	31	31	31	32	33	33						

Laporan Jumlah Kenaikan Pengunjung Website

Minggu IV



PENEKANAN

1. Bagi semua bidang agar menyampaikan updating progress pelaksanaan program/kegiatan secara rutin;
2. Bidang yang belum mengirimkan matrik potensi **BENTURAN KEPENTINGAN**, dimohon untuk segera dikirimkan ke subbag keuangan selambat-lambatnya Senin, 4 Juli 2022;
3. Setiap pengadaan barang/jasa non-transaksional baik melalui mekanisme swakelola maupun pengadaan langsung harus dicatatkan dalam SPSE, serta memastikan kesesuaian metode dan nama paket antara SIRUP dengan realisasi;
4. Menindaklanjuti arahan Biro APBJ yang disampaikan melalui Sosialisasi Aplikasi Monitoring PBJ Tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022, setiap pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan melalui e-purchasing (blangkon dan e-catalog);
5. Mengingatkan kembali kepada seluruh ASN di lingkungan Disperakim agar memperhatikan kesesuaian Pakaian Dinas Harian (PDH) termasuk atribut yang digunakan sebagaimana pergub yang berlaku;

PENEKANAN (TA. 2023)

1. Bidang harap menindaklanjuti hal – hal yang harus segera dipenuhi sebagaimana Nota Dinas 204/PROG/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 perihal Laporan Hasil Desk Pencermatan Usulan Tahun Anggaran 2023, Nomor. 230/PROG/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Laporan Hasil Desk Verifikasi Rencana Program, Kegiatan, dan RAB TA. 2023 dan ceklist hasil pencermatan Renja TA.2023, sesuai dengan ketentuan;
2. Bidang harap berkoordinasi dan ditindaklanjuti dengan nota dinas kepada Kepala Dinas dengan tembusan Sub Bagian Program atas hasil penyesuaian dan/atau perubahan terhadap substansi usulan TA. 2023 pada aplikasi e-planning;
3. **PERHATIAN UNTUK BIDANG PERUMAHAN:**
 - Melaksanakan Input pelaporan secara bulanan realisasi fisik, keuangan dan kinerja pekerjaan bansos pada aplikasi e-Controlling Hibah Bansos (SOHIB), dan pelaporan realisasi fisik, keuangan dan kinerja pekerjaan pelaksanaan Bankeu Pemdes Peningkatan Kualitas RTLH;
 - Menindaklanjuti hasil koordinasi yang telah dilaksanakan terhadap usulan penyesuaian dan/atau perubahan by name by address (BNBA) bansos TA. 2023 pada e-rembugan, melalui nota dinas kepada Kepala Dinas dengan tembusan Sub Bagian Program, dengan dilampiri ceklist Readiness Criteria dan penyesuaian BNBA;
4. **PERHATIAN UNTUK BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**
 - Segera berkoordinasi dengan Sub Bagian Program terhadap perubahan lokasi hibah TA. 2023 pada e-rembugan,
 - Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut melalui nota dinas kepada Kepala Dinas dengan tembusan Sub Bagian Program, dengan dilampiri Readiness Criteria;
 - Memastikan kembali penyusunan Juknis pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan dan membuat kajian hasil benchmarking yang telah dilaksanakan



Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR MEI 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir Mei TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

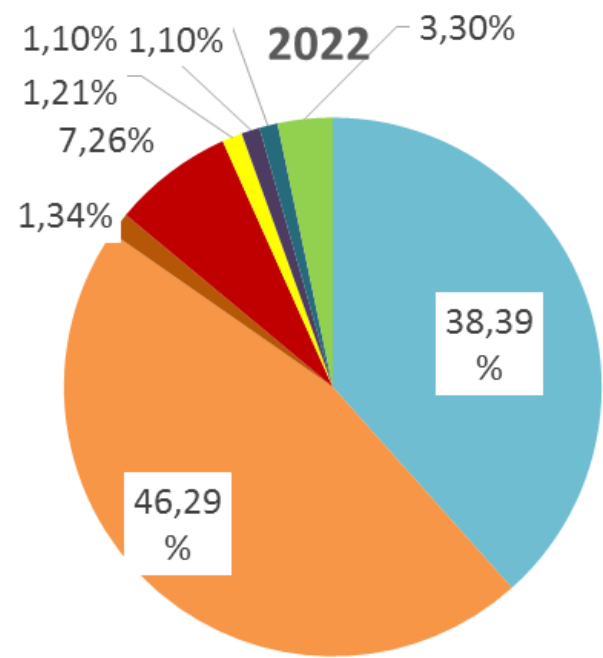

NO.	PROGRAM	2022	
		(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000
	TOTAL	100	45.424.693.000




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir Mei 2022

^{*)}Realisasi keuangan diambil dari e-controlling status Jumat, 3 Juni 2022

Disperakim

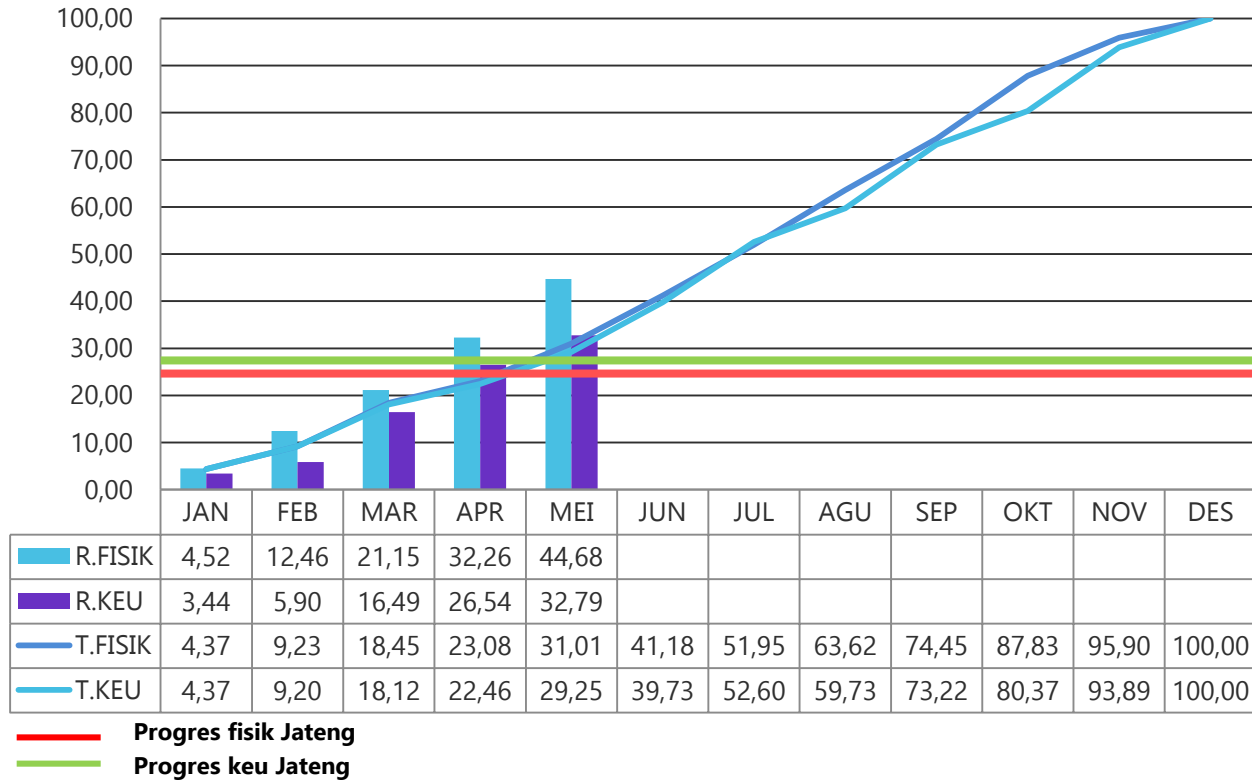


	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	31,01	41,18
Target Keu	29,25	39,79
Real. Fisik	44,68	53,36
Real. Keu	32,79	48,92
Dev. Fisik	13,67	12,18
Dev. Keu	3,55	9,19

PROVINSI JAWA TENGAH (Status 3 Juni 2022)

Target Fisik	22,86
Target Keu	21,60
Real. Fisik	26,55
Real. Keu	28,33
Dev. Fisik	3,69
Dev. Keu	6,73

Sekretariat

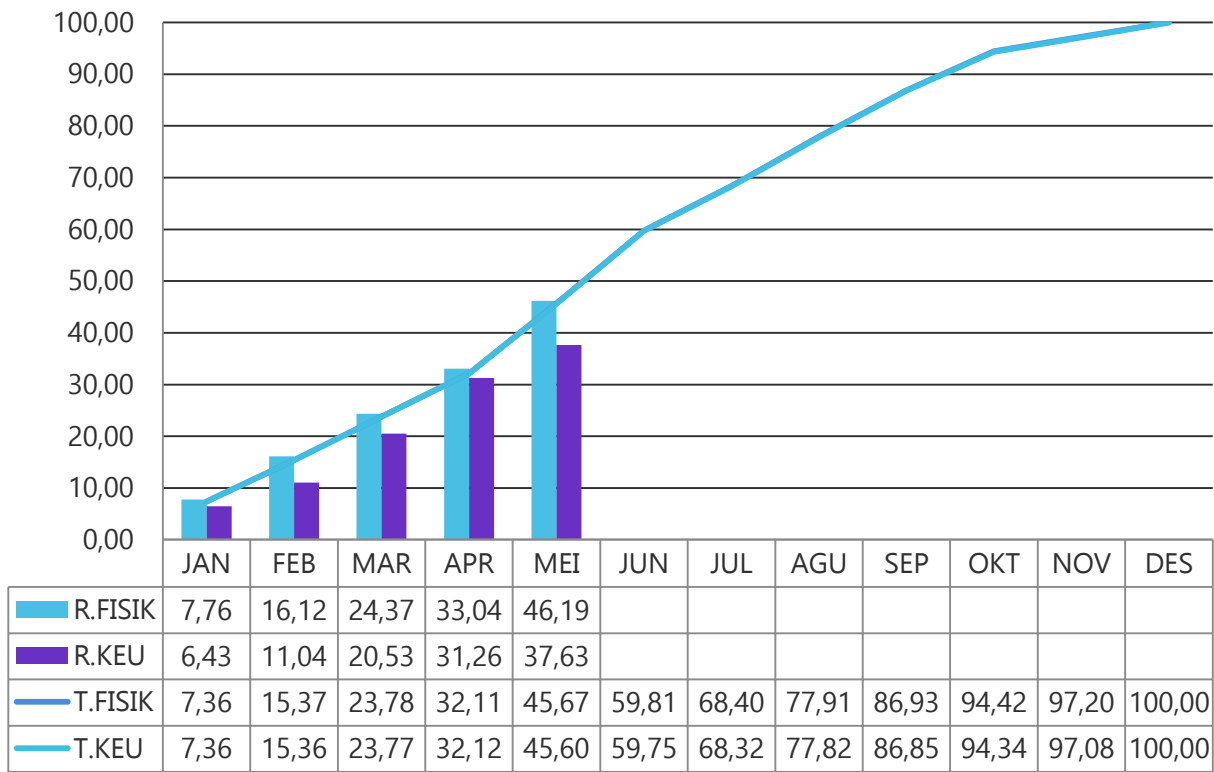

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	45,67	59,81
Target Keu	45,60	59,75
Real. Fisik	46,19	59,97
Real. Keu	37,63	59,99
Dev. Fisik	0,52	0,16
Dev. Keu	-7,97	0,24

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Program						
1	Forum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023	49.952.000	1,40	-39,89	Efisiensi Honorarium Narasumber dibayarkan sesuai kebutuhan, dan efisiensi anggaran lainnya karena pelaksanaan forum secara daring.	akan diusulkan utk mendukung capaian indikator kinerja program, melalui perubahan anggaran 2022
2	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	39.599.000	6,00	-40,91	Efisiensi Honorarium Narasumber ditanggung oleh Dinas Perhubungan (pelaksanaan sosialisasi Infrastruktur di Banyumas)	akan diusulkan utk mendukung capaian indikator kinerja program, melalui perubahan anggaran 2022
3	Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP)	29.864.000	0,43	-65,55	SPJ Rakor Review KK MR SPIP telah dilaksanakan pd tgl 27 Mei 2022, SPJ akan masuk pada bulan Juni 2022	akan diusulkan utk mendukung capaian indikator kinerja program, melalui perubahan anggaran 2022
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.780.000	0,79	-76,88	- Efisiensi Perjalanan dinas pelaksanaan musrenbangwil hanya di 4 lokasi sedangkan alokasi 6 lokasi - Efisiensi Biaya Perjalanan dinas kegiatan koordinasi usulan dengan pusat (Konreg Kementerian PUPR , Kortekrenbang Kemendagri dilaksanakan secara daring)	akan diusulkan utk mendukung capaian indikator kinerja program, melalui perubahan anggaran 2022


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	71.825.000	3,17	-4,74	Proses administrasi SPJ, dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan, sehingga SPJ pada e-penatausahaan akan dilaporkan paling cepat pada minggu pertama bulan Juni	Masuk dalam progres keuangan bulan Juni
Subbag Keuangan						
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.524.693.000	0,00	-10,25	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
7	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	441.840.000	0,00	-3,52	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
8	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	4.000.000	18,75	-4,96	Fisik sudah selesai, terdapat sisa pelaksanaan kegiatan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
9	Pelaksanaan Rapat Persiapan Sosialisasi Semesteran dan Sosialisasi Semesteran	21.700.000	0,00	-3,82	Efisiensi belanja makan-minum rapat	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Umum dan Kepegawaian						
10	Pengadaan Alat Studio	196.750.000	-39,47	-39,33	Pelaksanaan menunggu penyelesaian pengerjaan ruang studio podcast	Akan dibelanjakan setelah pengerjaan ruang studio podcast selesai
11	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	159.600.000	0,00	-0,75	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
12	Penyediaan Pelayanan Surat Menyurat	95.000.000	0,00	-0,73	Efisiensi belanja	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
13	Pembayaran Listrik	600.000.000	0,00	-17,92	Dibayarkan sesuai dengan tagihan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
14	Pengadaan Jasa Keamanan	825.000.000	0,00	-1,80	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.000.000	5,39	-2,76	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

Bidang Perumahan

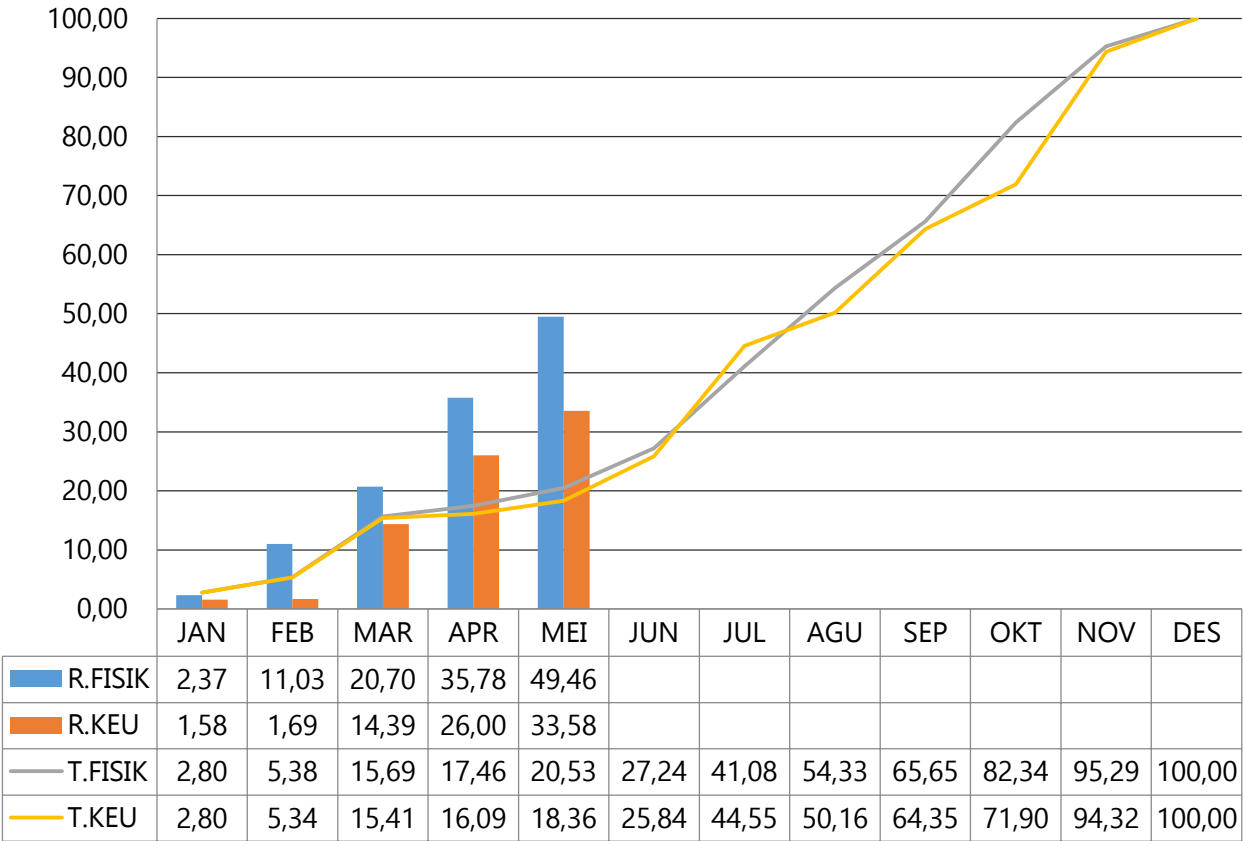

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	20,53	27,24
Target Keu	18,36	25,84
Real. Fisik	49,46	53,06
Real. Keu	33,58	45,77
Dev. Fisik	28,93	25,82
Dev. Keu	15,22	19,94

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.826.000	-18,48	-22,49	Acara Rakortek 1 Pengumpulan data ditunda karena pendampingan Bimtek RTLH dan Kunjungan Kerja Gubernur	Akan dilaksanakan tanggal 2 Juni 2022
2	Koordinasi Lapangan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	178.512.000	-3,06	-3,94	- Pelaksanaan koordinasi lapangan untuk pengumpulan data yang semula direncanakan dilaksanakan di 6 Kab/kota pada bulan Mei, baru bisa terlaksana di 4 Kab/Kota, dialihkan untuk verivali lokasi penerima PB bencana dan backlog di Kab. Purbalingga dan Kota Tegal - Realisasi keuangan koordinasi lapangan pengumpulan data di Kab. Boyolali belum terbayarkan	- Akan dilaksanakan di bulan Juni di Kabupaten Kudus dan Kota Tegal - Realisasi keuangan akan masuk dalam progres bulan Juni
3	Rapat Persiapan dan Rapat Pendukung Kegiatan Pendataan dan Verivali Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	1.500.000	0,00	-52,00	Kegiatan sudah dilaksanakan di akhir bulan April, namun masih ada kelengkapan SPJ yang perlu diperbaiki	Akan diselesaikan dan dilaporkan sebagai progres keuangan bulan Juni
4	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	-24,11	-92,51	Pengadaan 19 paket jasa konsultansi yang semula direncanakan terkontrak bulan Januari, baru bisa terkontrak 14 paket di bulan Februari, dan 5 paket di bulan Maret.	Paket sudah terkontrak, pelaksanaan yang semula direncanakan selesai di bulan Maret tertunda hingga bulan Mei.

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Bimtek Validasi Data SIMPERUM	13.519.000	0,00	-25,68	Kegiatan sudah dilaksanakan di akhir bulan April, namun masih ada kelengkapan SPJ yang perlu diperbaiki	Akan diselesaikan dan dilaporkan sebagai progres keuangan bulan Juni
6	Sosialisasi Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Sederhana Sehat atau Relokasi Program Pemerintah	7.703.000	3,43	-17,31	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
7	Workshop Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	57.830.000	0,27	-11,18	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
8	Sosialisasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Terdampak Bencana	8.857.000	5,92	-2,35	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
9	Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	5.723.000	1,44	-16,04	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan dilaksanakan pada 30 Mei 2022, sehingga realisasi keuangan masuk sebagai progres bulan berikutnya	Realisasi Keuangan masuk sebagai progres bulan Juni

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perumahan Umum						
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	15.500.000	0,00	-10,48	Rapat Koordinasi Pencermatan RC Calon BNBA 2023 dilaksanakan tanggal 30-31 Mei 2022 dan 2 Juni 2022 sehingga progres keuangan akan masuk ke dalam progres bulan berikutnya	Realisasi Keuangan masuk sebagai progres bulan Juni
2	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	2.925.000	0,00	-4,62	Fisik sudah selesai, terdapat efisiensi belanja makan/minum rapat	Akan dialokasikan kembali untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	13.750.000	-5,44	-23,82	Rapat internal belum dilaksanakan karena Percepatan Sub Kegiatan Relokasi	Akan dialokasikan kembali untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
4	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	58.140.000	18,42	-10,53	Efisiensi pelaksanaan kegiatan	Akan dialokasikan kembali untuk mendukung pencapaian target kinerja melalui perubahan anggaran
5	Rapat Koordinasi Pembangunan Rusus-Rusun	3.000.000	25,01	-100,00	- Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta. - Efisiensi belanja makan minum Rapat persiapan internal pembangunan Rusus-Rusun	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Pendampingan Pelaksanaan Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	99.206.000	-11,28	-11,05	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran
7	Rapat Serah Terima Hasil Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	750.000	-75,00	0,00	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran
8	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	9.000.000	-25,00	-25,00	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perumahan Swadaya						
1	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	3.300.000	0,00	-0,15	Sisa pelaksanaan kegiatan (ATK)	
2	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	994.350.000	-4,04	-4,04	Bimtek yang bekerjasama dengan pihak legislatif belum semuanya dilaksanakan karena diperlukan penyesuaian jadwal.	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Juni
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	7.500.000	0,00	-16,52	Sisa pelaksanaan kegiatan karena kegiatan dilakukan secara daring	Akan digeser untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
4	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	2.525.000	0,00	-12,44	Sisa pelaksanaan kegiatan karena kegiatan dilakukan secara daring	Akan digeser untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
5	Persiapan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM	1.325.000	0,00	-58,87	- Belanja ATK dilaksanakan di akhir bulan, sehingga realisasi keuangannya masuk sebagai progres bulan berikutnya. - Sisa pelaksanaan kegiatan (efisiensi)	- Masuk dalam progres keuangan bulan Mei - Akan digeser untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran

BIDANG PERUMAHAN

PROGRAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
(Rp. 21.025.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Rumah layak huni yang
disediakan (RLH)

% Rumah tidak layak huni
yang tertangani (RTLH)

TARGET


7,39 %


11,84 %

REALISASI S.D MEI


4,22 %

10,43%

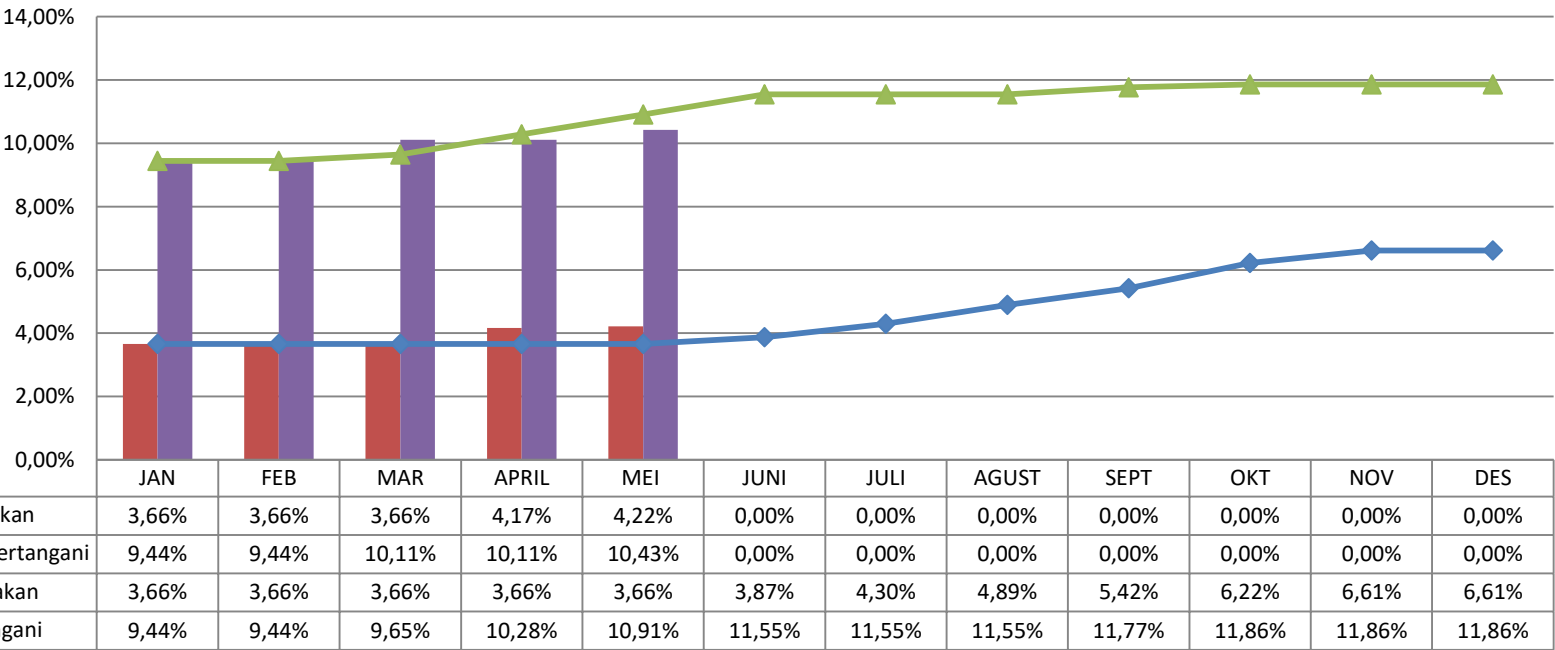


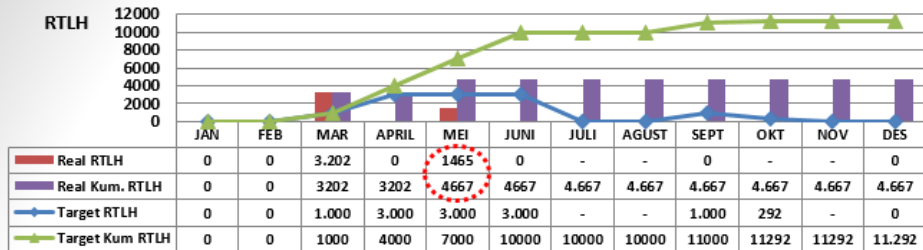


PB BACKLOG



PK BENCANA




PB BENCANA




IK SUB KEGIATAN	T. 2022	REALISASI S.D MEI
Jumlah unit rumah yang dibangun (PB Backlog)	253 unit	- Pelaksanaan pendampingan pengadaan barang, pembangunan pondasi & pembangunan, perakitan RUSPIN & Pelaksanaan seleksi perekrutan TFL - Pencairan termin 1 & 2 swakelola (baru 19 dari 32 pokmas yang sudah melakukan pencairan termin 1) - Pengiriman material untuk 84 unit rumah di Kab. Semarang, Purworejo, Wonosobo, Cilacap, Sragen, Karanganyar, Pemalang, Brebes, dan Sukoharjo 13 unit berpotensi mengalami pergantian BNBA melalui PA TA 2022
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupmedes RTLH)	11.292 unit	4.667 unit (Proses pencairan alokasi SK Gub Tahap 1 s.d. Rekom 3, Pengajuan SK Gub Tahap 2 Bankeupmedes RTLH)
Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (PK dan PB Bencana, PB Relokasi)	51 unit PK 16 unit PB-B 62 unit PB-R	- Penandatanganan kontrak dengan penyedia material bansos PK Bencana & Penyaluran dan serah terima bantuan material kepada 49 penerima 2 Penerima mengundurkan diri karena kondisi rumah yang roboh sehingga akan diusulkan sbg calon penerima bantuan PB Bencana pada tahun 2023. 14 unit PB-B - Fisik 100% dengan Rincian 7 Unit sudah Termin 3, 7 Unit Termin 2 dan Termin 3 Rencana Pencairan di Juni - Bimtek Pelaksanaan Bansos PK Bencana secara Swakelola, SK Pembentukan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan, Pelaksanaan pembangunan rumah korban bencana, Penyiapan BNBA pengganti untuk perubahan anggaran. 60 unit PB-R 60 Unit Fisik 100%, 27 Unit = Termin 3, 23 Unit pengajuan termin 3 di bulan Juni) 2 Penerima mengundurkan diri karena tidak mampu berswadaya, dan 1 orang lainnya sudah mempunyai rumah serta Penyiapan BNBA pengganti untuk perubahan anggaran
Jumlah dok perencanaan RUSUNAWA & RUSUS (Rencana Induk Rusun)	1 Dok	Dalam proses Penyusunan Siteplan, Gambar Teknik, RAB Rusus Optimis
Jumlah dokumen yang disusun	5 Dok	Dalam Proses Verivali calon Penerima PB dan PK, Sosialisasi Teknis)

PB RELOKASI



Bidang Kawasan Permukiman

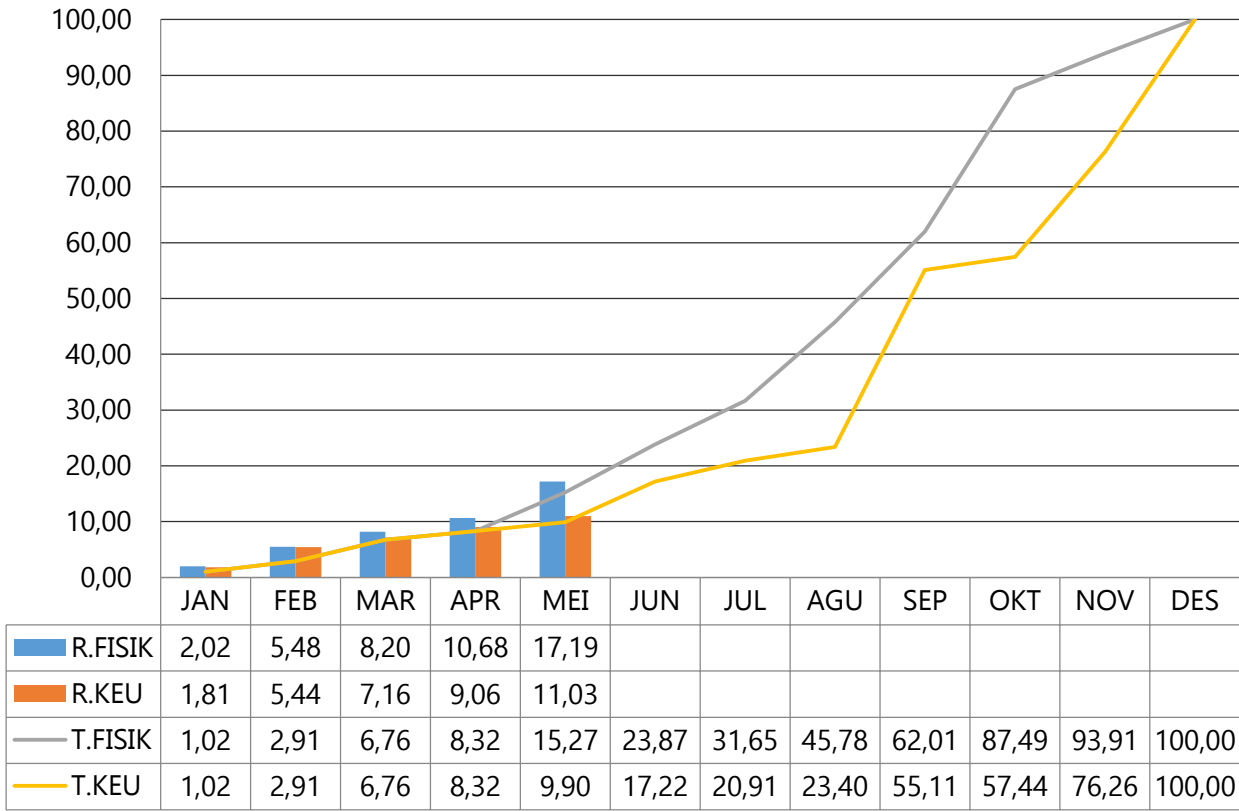

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	15,27	23,87
Target Keu	9,90	17,22
Real. Fisik	17,19	25,60
Real. Keu	11,03	18,95
Dev. Fisik	1,92	1,73
Dev. Keu	1,13	1,73

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	FGD Pendataan Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	18.050.000	0,00	-51,25	FGD BKM yang semula direncanakan pada 3 (tiga) kab/kota, berubah di Kantor Disperakim	Anggaran dialihkan untuk mendukung sub-sub kegiatan yang lain pada bulan berikutnya
2	Koordinasi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	24.925.000	0,00	-13,63	Sisa belanja ATK, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
3	Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	56.907.000	4,06	-23,79	Direncanakan untuk koordinasi pemantauan kaw. permukiman kumuh ke Kementerian PUPR, namun realisasi ke Disperakim dan ESDM Prov. DIY dalam rangka studi komparatif sebagai referensi penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah.	Dialihkan untuk mendukung pelaksanaan SSK lain melalui mekanisme perubahan anggaran.
4	Koordinasi Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	106.112.000	0,00	-2,69	- Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil - Sisa belanja ATK, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	- Sisa JKK JKM Menjadi Potensi SILPA - Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	58.500.000	0,00	-2,33	target OH sudah terpenuhi, besaran tersebut merupakan sisa transport	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Persiapan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	35.388.000	-8,72	-21,97	- Pekerjaan Konsultansi Studi Identifikasi yang semula direncanakan terkontrak di bulan Mei, tertunda karena ada error pada sistem LPSE. Pada saat ini masih menunggu perbaikan sistem. - perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan Kab/Kota terkait studi identifikasi akan dilaksanakan setelah pekerjaan konsultansi dimulai.	- Koordinasi dengan Biro APBJ terkait percepatan proses pengadaan.
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
7	Rakor Dalam Rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	12.600.000	0,00	-1,59	Sisa belanja Moderator, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	1,54	-8,26	Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pendampingan Kementerian PUPR di KSPN Dieng dan Gubernur di Kab. Cilacap dilaksanakan pada akhir bulan sehingga progres keuangan dilaporkan di bulan berikutnya	Realisasi Keuangan masuk sebagai progres bulan Juni

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Pengembangan PSU Kawasan Permukiman						
9	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	-30,00	0	Dalam proses seleksi pengadaan barang dan jasa di Biro APBJ	koordinasi dengan Biro APBJ Setda Prov. Jateng
10	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	-30,00	0	Dalam proses seleksi pengadaan barang dan jasa di Biro APBJ	koordinasi dengan Biro APBJ Setda Prov. Jateng
11	Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	-30,00	0	Dalam proses seleksi pengadaan barang dan jasa di Biro APBJ	koordinasi dengan Biro APBJ Setda Prov. Jateng

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

**PROGRAM
PENINGKATAN PSU
(Rp. 3.300.000.000)**

INDIKATOR KINERJA

% Kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET

17,00%

REALISASI S.D MEI

0 %

**PROGRAM
KAWASAN
PERMUKIMAN
(Rp. 610.000.000,-)**

INDIKATOR KINERJA


% Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani

TARGET

23, 37 %

REALISASI S.D MEI

24,21 %

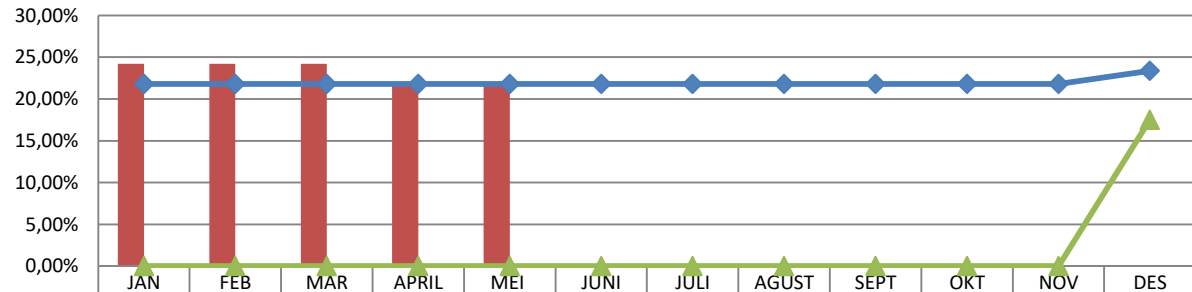[illegible]

PROGRAM PENINGKATAN PSU (Rp. 3.300.000.000)


Lanjutan ...

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D MEI
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	0 Lokasi - Pelaksanaan lomba hari habitat 2022, Pelaksanaan pekerjaan penyusunan DED - Kontrak Pekerjaan Penyusunan Perencanaan/DED Hadiah Lomba Hari Habitat 2022 - Pelaksanaan pekerjaan penyusunan DED - Sosialisasi Penyusunan Perencanaan/DED Hadiah Lomba Hari Habitat 2022 kepada Pemkab/Kota dan masyarakat setempat
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	0 Dokumen ➤ Koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota terkait data serah terima PSU di Kab. Karanganyar dan Boyolali ➤ Monev serah terima PSU Perumahan (Output: Profil serah terima PSU → Lokasi yang dianggap berhasil: Kab. Boyolali, Demak, Karanganyar, Kendal. Lokasi serah terimanya relatif rendah: Kota Magelang, Kab. Magelang ➤ Rapat Persiapan Penyelenggaraan Rakor PSU Kawasan Permukiman

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Rp. 610.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D MEI
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	0 Lokasi
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	0 Dokumen (Koordinasi internal inventarisasi usulan bankeu Kab/Kota)
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen - Koordinasi inventarisasi BKM di kawasan kumuh pada Kab. Jepara, Kudus, Wonogiri - FGD BKM/Pokmas di Kawasan Permukiman - Verifikasi SK Kawasan Kumuh - FGD Pemberdayaan Pokmas Terhadap Aspek Kawasan Permukiman Kumuh Prov. Jateng
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	0 Dokumen - Koordinasi verifikasi usulan SK kawasan kumuh di Kab. Jepara, Kudus, Wonogiri, Kota Salatiga, Kab. Wonosobo & Kab. Semarang - Koordinasi verifikasi usulan hibah kawasan permukiman di Kab. Pati, Boyolali, Kab. Kebumen, Kab. Temanggung, Kab. Purworejo, Kota Magelang & Kab. Karanganyar

Bidang Pertanahan

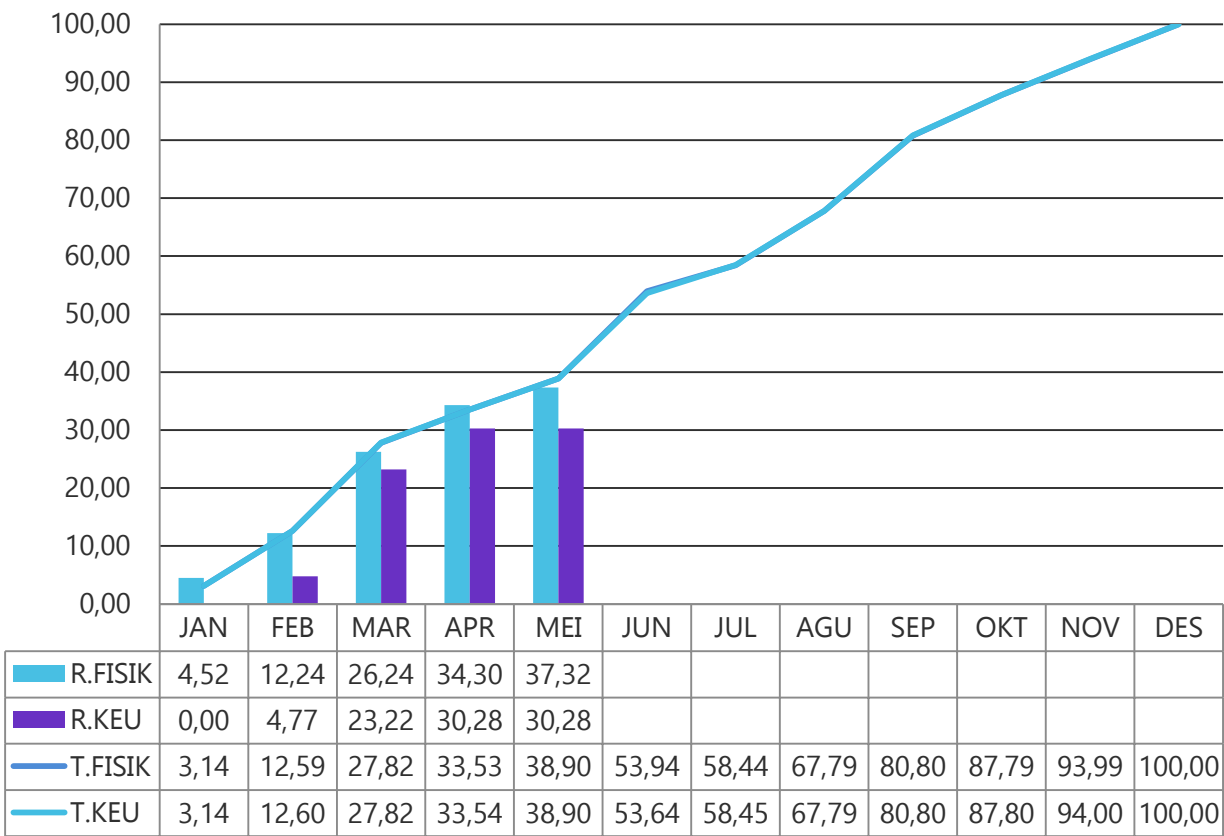

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	38,90	53,94
Target Keu	38,90	53,64
Real. Fisik	37,32	51,76
Real. Keu	30,28	50,17
Dev. Fisik	-1,58	-2,18
Dev. Keu	-8,62	-3,47

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Koordinasi Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah	10.000.000	-28,30	-100,00	Penetapan regulasi baru di mana sample yang divalidasi nilai tanahnya semula dalam lingkup zona/wilayah menjadi bidang tanah	
2	Survei Pendahuluan Guna Penentuan Koordinat Lokasi Sampel Bidang Tanah	9.000.000	-22,22	-22,22	Survey Koordinat Sample bidang tanah belum bisa dilaksanakan karena ada menunggu hasil validasi BPN yang menyesuaikan dengan penetapan regulasi baru di mana sample yang divalidasi nilai tanahnya semula dalam lingkup zona/wilayah menjadi bidang tanah	- Koordinasi dengan Kanwil BPN terkait percepatan pelaksanaan validasi sample bidang tanah. - Rencana akan dilaksanakan bulan Juni
3	Penyusunan Dokumen Zonasi Nilai Tanah	3.270.000	-100,00	-100,00	Penyusunan Dokumen Zonasi Nilai Tanah dilaksanakan setelah validasi sample bidang tanah selesai dilaksanakan	penyusunan dokumen dilakukan di bulan Juli
4	Rapat Verifikasi Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	16.875.000	-10,76	-10,67	Belum ada pengajuan dokumen perencanaan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah, sehingga anggaran yang dialokasikan menyesuaikan dengan ajuan DPPT yang masuk	Melakukan koordinasi teknis dengan instansi yang memerlukan tanah untuk mendorong pengajuan DPPT sesuai dengan regulasi
5	Penyampaian Penjelasan Rencana Pembangunan secara langsung kepada masyarakat di Lokasi Rencana Pembangunan	103.600.000	-4,38	-4,38	Belum ada pengajuan dokumen perencanaan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah, sehingga anggaran yang dialokasikan menyesuaikan dengan ajuan DPPT yang masuk	Melakukan koordinasi teknis dengan instansi yang memerlukan tanah untuk mendorong pengajuan DPPT sesuai dengan regulasi

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Identifikasi Kepemilikan Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan	74.830.000	-1,72	-1,71	Belum ada pengajuan dokumen perencanaan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah, sehingga anggaran yang dialokasikan menyesuaikan dengan ajuan DPPT yang masuk	Melakukan koordinasi teknis dengan instansi yang memerlukan tanah untuk mendorong pengajuan DPPT sesuai dengan regulasi
7	Pelaksanaan Komunikasi Dialogis Kepada Warga Terdampak di Lokasi Rencana Pembangunan	100.300.000	-1,17	-1,18	Belum ada pengajuan dokumen perencanaan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah, sehingga anggaran yang dialokasikan menyesuaikan dengan ajuan DPPT yang masuk	Melakukan koordinasi teknis dengan instansi yang memerlukan tanah untuk mendorong pengajuan DPPT sesuai dengan regulasi
8	Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pada Trase atau Basic Design di Lokasi Rencana Pembangunan	74.844.000	-33,12	-42,76	- Belum ada kelengkapan dokumen pengajuan dari instansi yang membutuhkan tanah - hanya ada 1 kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan di bulan Mei, menyesuaikan dengan ajuan DPPT yang sudah masuk	Dijadwalkan kembali sesuai dengan pengajuan dari instansi yang membutuhkan tanah
9	Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	127.201.000	1,20	-10,18	Progres fisik telah dilaksanakan sesuai target, namun dikarenakan TU nihil baru dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga progres keuangan bulan Mei akan dilaporkan sebagai progres bulan Juni	Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni


No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Permasalahan Pertanahan						
1	Sosialisasi tentang Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Tanah Kas Desa	50.900.000	0,00	-5,36	Progres fisik telah selesai, namun dikarenakan TU nihil baru dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga progres keuangan bulan Mei akan dilaporkan sebagai progres bulan Juni	Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni
2	Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Sertipikasi Tanah Kas Desa	190.720.000	-3,91	-14,98	1. Pembayaran Patok belum terpenuhi dikarenakan Penyedia Barang yang ditunjuk Pemdes masih dalam proses pengurusan Faktur Pajak 2. Pembayaran Honor Pendampingan di Kabupaten Blora & Semarang belum terbayarkan karena masih proses penunjukan personil 3. Progres Keuangan terlapor sebagai progres bulan Juni karena TU Nihil dilakukan pada tanggal 2 Juni	Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni
3	Pelaksanaan Pra Sertipikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Pra Sertipikasi Tanah Kas Desa	72.780.000	0,00	-0,55	Progres fisik telah dilaksanakan sesuai target, namun dikarenakan TU nihil baru dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga progres keuangan bulan Mei akan dilaporkan sebagai progres bulan Juni	- Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
4	Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	6.750.000	0,00	-33,33	Progres fisik telah dilaksanakan sesuai target, namun dikarenakan TU nihil baru dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga progres keuangan bulan Mei akan dilaporkan sebagai progres bulan Juni	- Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni
5	Konsolidasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	54.200.000	-36,66	-55,79	- Pelaksanaan konsolidasi Penanganan Dampak Sosial Tanah Musnah masih menunggu koordinasi internal dari Kementerian ATR/BPN karena adanya Putusan MA terkait Judicial Review Permen ATR 17/2021 - Progres Keuangan terlapor sebagai progres bulan Juni karena TU Nihil dilakukan pada tanggal 2 Juni	- Dijadwalkan kembali di Bulan Juni - Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni
6	Pelaksanaan Mediasi Permasalahan Pertanahan	78.925.000	-10,00	-11,50	- Dari 5 permasalahan, baru 2 permasalahan yang sudah diproses (TPU Dasiknoloyo dan TPU Pracimaloyo di Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo, serta penanganan dampak sosial kemasyarakatan Tanjung Mas di Kota Semarang). - Efisiensi belanja transportasi - Progres Keuangan terlapor sebagai progres bulan Juni karena TU Nihil dilakukan pada tanggal 2 Juni	- Penanganan permasalahan akan dilaksanakan di bulan Juni - Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja - Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan						
1	Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah Status Hak Pakai (HP) dan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)	25.955.000	-18,76	-25,16	- Efisiensi pelaksanaan kegiatan - Progres fisik telah dilaksanakan sesuai target, namun dikarenakan TU nihil baru dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga progres keuangan bulan Mei akan dilaporkan sebagai progres bulan Juni	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja - Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni
2	Pendampingan Proses Pengadaan Tanah dan Penanganan Dampak	24.350.000	-20,00	-20,00	Sebagian alokasi anggaran pada SSK ini akan dialihkan untuk SSK yang mendukung capaian target Renstra melalui perubahan anggaran	
3	Konsultasi Pembinaan Pertanahan	30.467.000	47,43	-7,08	- Efisiensi pelaksanaan kegiatan - Progres fisik telah selesai, namun dikarenakan TU nihil baru dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga progres keuangan bulan Mei akan dilaporkan sebagai progres bulan Juni	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja - Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni
4	Rapat Koordinasi Rencana Program Reforma Agraria, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	20.030.000	7,50	-12,64	- Progres Fisik Telah direalisasikan, namun dikarenakan TU nihil baru dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga progres keuangan bulan Mei akan dilaporkan sebagai progres bulan Juni - Pengambilan di sesuaikan dengan harga pasar dan blangkon (Cetak dan ATK) - Narasumber Kemendagri tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara Rakortek Pertanahan	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja melalui perubahan anggaran - Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Pemantauan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (LP2B)	24.350.000	0,00	-5,66	Efisiensi pelaksanaan kegiatan (sisa belanja penginapan)	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
6	Penataan Akses Reforma Agraria Peningkatan Taraf Hidup dengan Program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pemanfaatan lahan	263.012.000	4,88	-0,31	- Progres Fisik Telah direalisasikan sesuai target, namun dikarenakan TU nihil baru dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga progres keuangan bulan Mei akan dilaporkan sebagai progres bulan Juni	- Realisasi keuangan masuk dalam progres keuangan bulan Juni

BIDANG PERTANAHAN

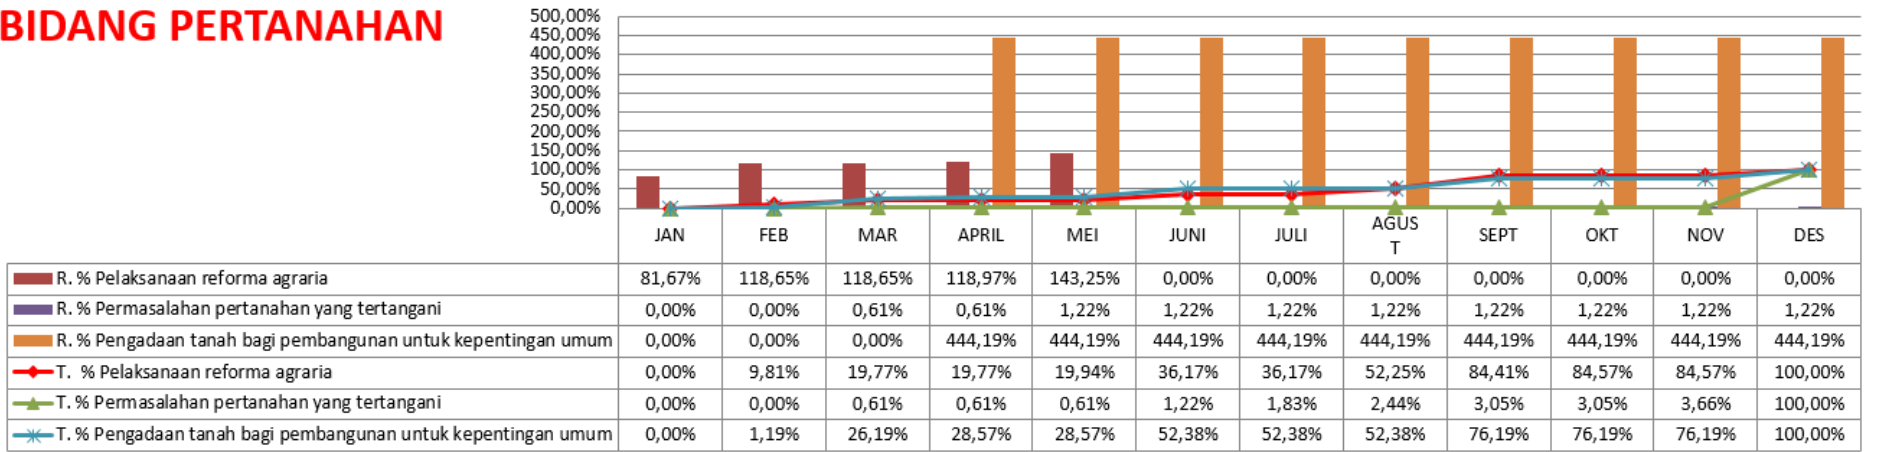

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA
% Persentase pelaksanaan reforma agraria

TARGET
100%

REALISASI
143,25 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. MEI
Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan	20%	28,65%
Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)	420 Bidang: 5 Bidang HGU 15 Bidang HP 400 Bidang Pemantauan Penlok 1 kali Diseminasi/rakor bidang pertanahan	661 Bidang: 0 Bidang HGU 8 Bidang HP 653 Bidang 1 kali
Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)	2 Lokasi	1 Lokasi
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)	200 bidang Pemantauan Sertifikasi 7 Lokasi Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA 5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA	229 Bidang 1 Lokasi 6 Kabupaten/Kota

Lanjutan ...

**PROGRAM PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**
(Rp. 550.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk
kepentingan umum

TARGET

100%

REALISASI S.D MEI

444,19 %

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2022

REALISASI S.D MEI

Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum

20%

88,84%

Jumlah bidang tanah penetapan lokasi

2.000 Bidang Penlok

9.303 Bidang Penlok
Rapat persiapan pengadaan tanah dan pelaksanaan pengadaan tanah (sosialisasi, pendataan,
konsultasi publik) di Kab. Demak

Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah

100 Bidang ZNT

25 Bidang ZNT (Perkiraan Nilai Zonasi Nilai Tanah di Daerah)

**PROGRAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN**
(Rp. 500.000.000)

INDIKATOR KINERJA

% Permasalahan pertanahan
yang tertangani

TARGET

100%

REALISASI S.D MEI

1,22 %

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2022

REALISASI S.D. MEI

Persentase fasilitasi penanganan
permasalahan pertanahan

20%

0,12%

Jumlah bidang tanah yang
tersertifikasi

150 Bidang LP2B
8 Bidang TKD


0 Bidang LP2B
0 Bidang TKD
• Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikat LP2B & TKD
• Koordinasi Penetapan Lokasi Objek Bidang Tanah yang akan disertifikat
• Pelaksanaan pra sertifikasi, pelaksanaan Verifikasi Berkas Persyaratan , Koordinasi dalam rangka persiapan pendampingan pemasangan tanda batas tanah LP2B di Kab. Semarang, Cilacap, Blora

Jumlah mediasi penyelesaian
sengketa

6 Sengketa

2 Sengketa
• Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanjung Mas (Pemberian Santunan) & Permasalahan keberatan pemberian santunan bangunan madrasah pada kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan Tanjung Mas
• Penanganan Permasalahan Pertanahan TPU Dasiknoloyo dan Pracimoloyo di Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo

Bidang Keterpaduan PKP

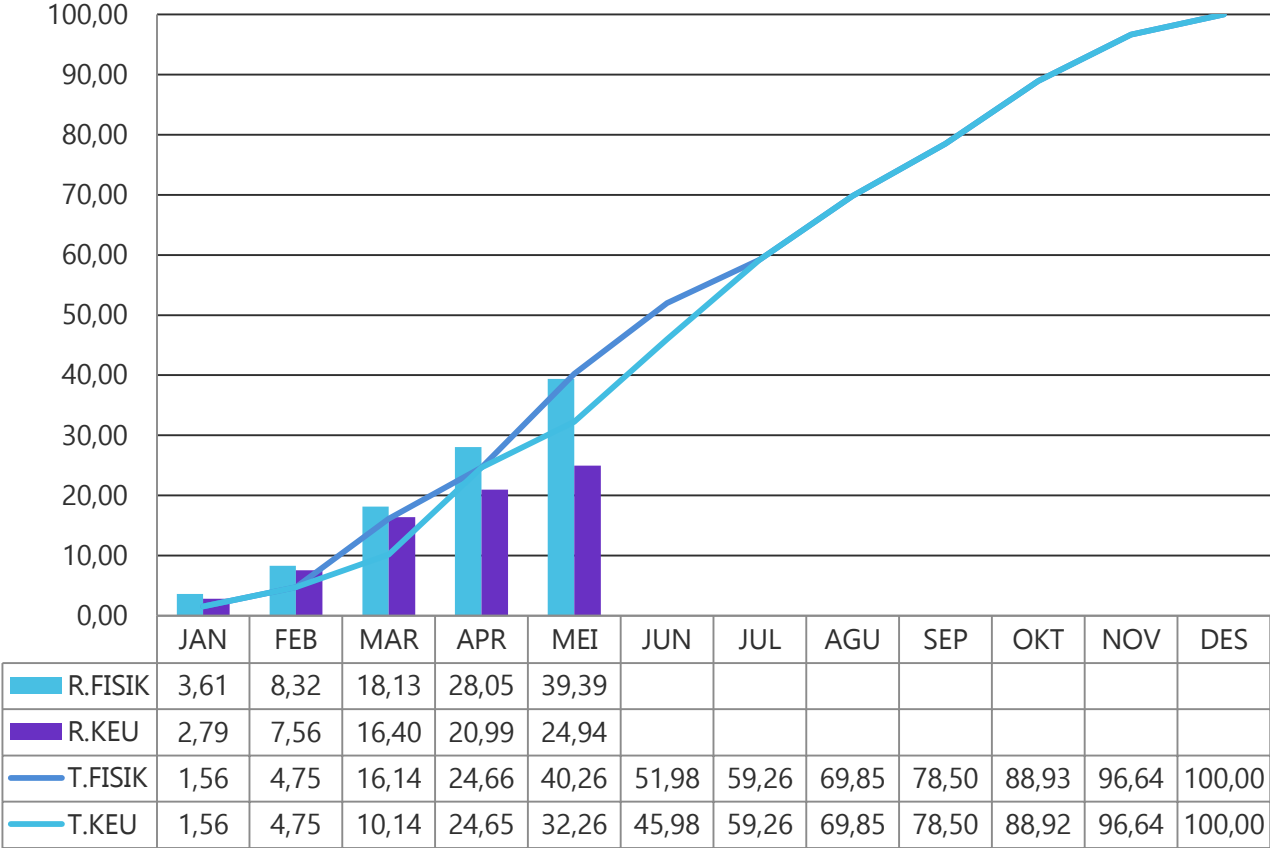

	Mei	Juni (Prognosis)
Target Fisik	40,26	51,98
Target Keu	32,26	45,98
Real. Fisik	39,39	54,63
Real. Keu	24,94	41,16
Dev. Fisik	-0,87	2,65
Dev. Keu	-7,32	-4,82

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Fasilitasi Pokja/ Forum PKP dan Pengembangan Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	88.571.000	-14,75	-14,81	- Substansi materi Rapat Koordinasi Forum PKP masih dalam proses pembahasan - Penyesuaian dengan agenda penugasan lain	Rapat Koordinasi Forum PKP di Bulan Juni
2	Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	36.335.000	0,00	-0,14	Sisa BBM	
	FGD Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	20.386.000	-13,24	-13,24	Efisiensi honor narasumber yang semula direncanakan 2 OJ menjadi 1 OJ	Akan dialokasikan kembali untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
3	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	360.000.000	0,00	-25,00	Pembayaran Termin-1 Konsultan Badan Usaha belum cair karena masih ada dokumen pencairan yang masih perlu dilengkapi oleh konsultan badan usaha	Mendorong konsultan badan usaha untuk segera melengkapi dokumen pencairan s.d. pertengahan bulan Juni
4	Fasilitasi Pelaksanaan KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	135.613.000	0,79	-3,26	Monitoring KKN Tematik dilaksanakan di akhir bulan	Pembayaran perjalanan dinas Monitoring KKN Tematik akan dilakukan pada Bulan Mei

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	25.781.000	-5,86	-12,84	- Pelaksanaan Sosialisasi KKN Tematik di lapangan yang semula dijadwalkan dimulai bulan Maret baru dimulai di bulan Mei, dan telah dilaksanakan 2 kali dari rencana 3 kali s.d. bulan Mei - Narasumber dari internal dinas sehingga honorarium narasumber belum terserap (baru belanja ATK yang terserap).	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan di periode KKN selanjutnya
6	Pengadaan Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	100.000.000	-50,00	-50,00	- Pengadaan alat peraga masih dalam proses koordinasi teknis pelaksanaan pelatihan dengan BPBD dan Disperakim Kab. Pekalongan, Magelang, Cilacap, dan Brebes. - Dokumen pengadaan masih dalam tahap persiapan (KAK, RAB, dst)	Koordinasi direncanakan selesai di bulan Juni, dan pelaksanaan pelatihan di bulan Juli-Agustus.
6	Penyediaan Honorarium Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	-25,00	-25,00	Honorarium Pejabat PBJ untuk paket pengadaan alat peraga belum dibayarkan karena proses pengadaan belum dimulai.	Menyesuaikan penjadwalan ulang pengadaan alat peraga.

Seksi Pengelolaan data PKPP

7	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	44.744.000	-2,36	-2,38	- Penundaan rapat tim teknis pengelolaan data & pengembangan aplikasi karena Kab/Kota belum menginput data ke dalam aplikasi Alosista - Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil	- Mendorong kabupaten/kota untuk input data ke dalam aplikasi Alosista & rapat dilaksanakan pada bulan Juni - Sisa JKK & JKM akan menjadi Silpa
---	--	------------	-------	-------	--	--

BIDANG KETERPADUAN PKP

**PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
(Rp. 1.500.000.000,-)

INDIKATOR KINERJA


% Ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman

TARGET

100%

REALISASI s.d MEI

15,38 %

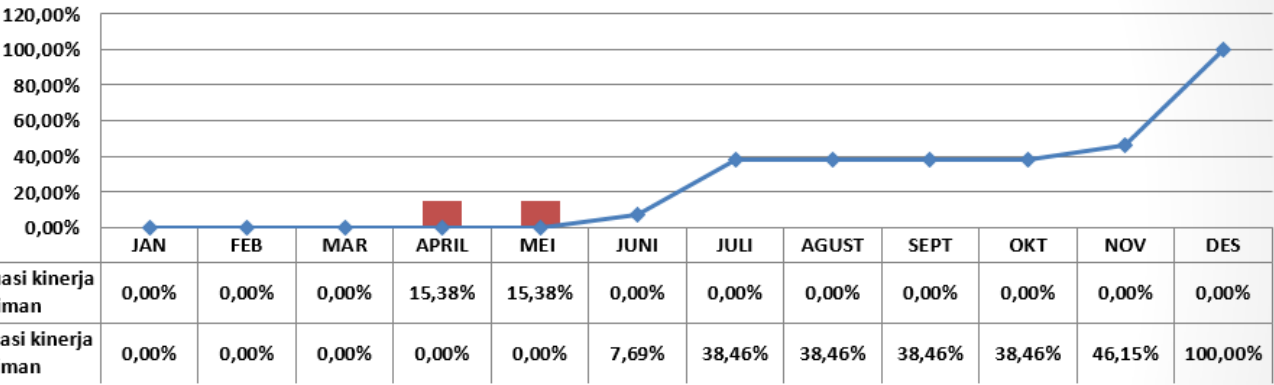

INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D MEI
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5 Dokumen	0 Dokumen <i>(Pembahasan Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi, Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, Monitoring dan Sosialis KKN di Kab. Semarang)</i>
Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian	3 Dokumen	1 Dokumen Evaluasi Lingkup Bidang PKPP Tahun 2021, TA 2022 <i>(Kegiatan monitoring lingkup bidang PKP (BSPS dan DAK), Pencermatan locus usulan 2022 dan 2023, Persiapan pembinaan ke Rusun Kab. Pekalongan, Persiapan pemberian penghargaan lingkup PKP kepada Kab/Kota, Persiapan Pemberian Penghargaan (Koordinasi dengan DPMPSTP dan Pengembang terkait kriteria penilaian) - Koordinas lapangan terkait perijinan perumahan ke Kab. Semarang dan Batang</i>
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian	5 Dokumen	1 Dokumen Pelaksanaan FGD Pengelolaan Data PKP Provinsi Jawa Tengah <i>(Koordinasi Pengumpulan Data, Pengembangan Aplikasi & Pengadaan Jasa Konsultansi Koordinasi Pengumpulan Data, Rapat Internal, Pengembangan Aplikasi)</i>



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Mei 2022

Bidang Perumahan

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 20/31 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
6		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
7		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
8		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
9		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
10		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
11		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
20	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
21		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
22		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
23		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
24		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
25		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
26		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
27		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
28		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
29		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
30		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
31	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - SIMPERUM	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal	Jan-Des

Tender

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender		

Swakelola Tipe IV oleh Kelompok Masyarakat

Jumlah SK Telah Ditandatangani: 45/45

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Tumanggal Kabupaten Purbalingga	120.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 23 Februari 2022	23 Februari 2022 - 22 Juli 2022 (150 hari)
2		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan	144.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
3		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bongas Kabupaten Pemalang	48.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 2 Maret 2022	2 Maret 2022 - 29 Juli 2022 (150 hari)
4		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sriwulan Kabupaten Demak	144.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
5		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Blerong Kabupaten Demak	72.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 4 Maret 2022	4 Maret 2022 - 31 Juli 2022 (150 hari)
6		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bedono Kabupaten Demak	84.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga	200.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (1 orang penerima bantuan mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
8		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Kebumen	250.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
9		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purworejo	150.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
10		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali	200.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
11	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Pekalongan	1.015.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
12		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Wonogiri	945.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
13		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Tegal	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
14	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan, Desa Sumogawe	280.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 21 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
15		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan, Desa Polobogo	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 21 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
16		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan, Desa Ketapang	420.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 20 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
17		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan, Desa Timpik	455.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 20 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
18		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Brondong	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
19		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Kaliwungu	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
20		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Gowong	140.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
21		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Tegalsari	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
22		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Brunorejo	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
23	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Sapuran, Desa Glagah	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
24		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Leksono, Desa Kalimendong	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
25		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Kertek, Desa Bejiarum	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
26		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Cilacap, Kec. Dayeuhluhur, Desa Bingkeng	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 8 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
27		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Cilacap, Kec. Dayeuhluhur, Desa Dayeuhluhur	770.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 8 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
28		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Gondang, Desa Wonotolo	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
29		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Mondokan, Desa Kedawung	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
30		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Sambungmacan, Desa Banaran	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
31		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Sidoharjo, Desa Taraman	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
32		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Kalijambe, Desa Wonorejo	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
33		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Selokaton	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
34		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Dayu	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
35		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Tuban	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
36		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Dayu	140.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
37		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Pemalang, Kec. Watukumpul, Desa Tambi	630.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
38		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Pemalang, Kec. Watukumpul, Desa Majakerta	525.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
39	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Paguyangan, Desa Paguyangan	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 11 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
40		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Jatibarang, Desa Kebogadung	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
41		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Songgom, Desa Dukuhmaja	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 19 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
42		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Pengkol	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
43		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Baran	280.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
44		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Pondok	70.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
45		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Bendosari, Mojorejo	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi (Terkontrak: 0/6 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender	Proses inputting ke dalam Silalapbaja	Juli
2		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender	Proses inputting ke dalam Silalapbaja	Juli
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender	Proses inputting ke dalam Silalapbaja	Juli
4		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi	Masa Sanggah Pra-Kualifikasi	Mei
5		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi	Pembuktian Pra-Kualifikasi	Mei
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi	Masa Sanggah Pra-Kualifikasi	Mei

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 2/8 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 8 Maret 2022	60 hari
2		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 15 Maret 2022	60 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
5		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
6		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
7		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, HPS dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
8	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung	menunggu proses seleksi (server LPSE dalam perbaikan)	Juni

Bidang Keterpaduan PKP


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 12 April 2022	April-Juli
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK, RAB, dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya	Juli
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 10 Maret 2022	Maret s.d. Oktober 2022

Sekretariat


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

Realisasi Belanja Blangkon

Catatan:
Data diambil dari sistem Blangkon status 31 Mei 2022

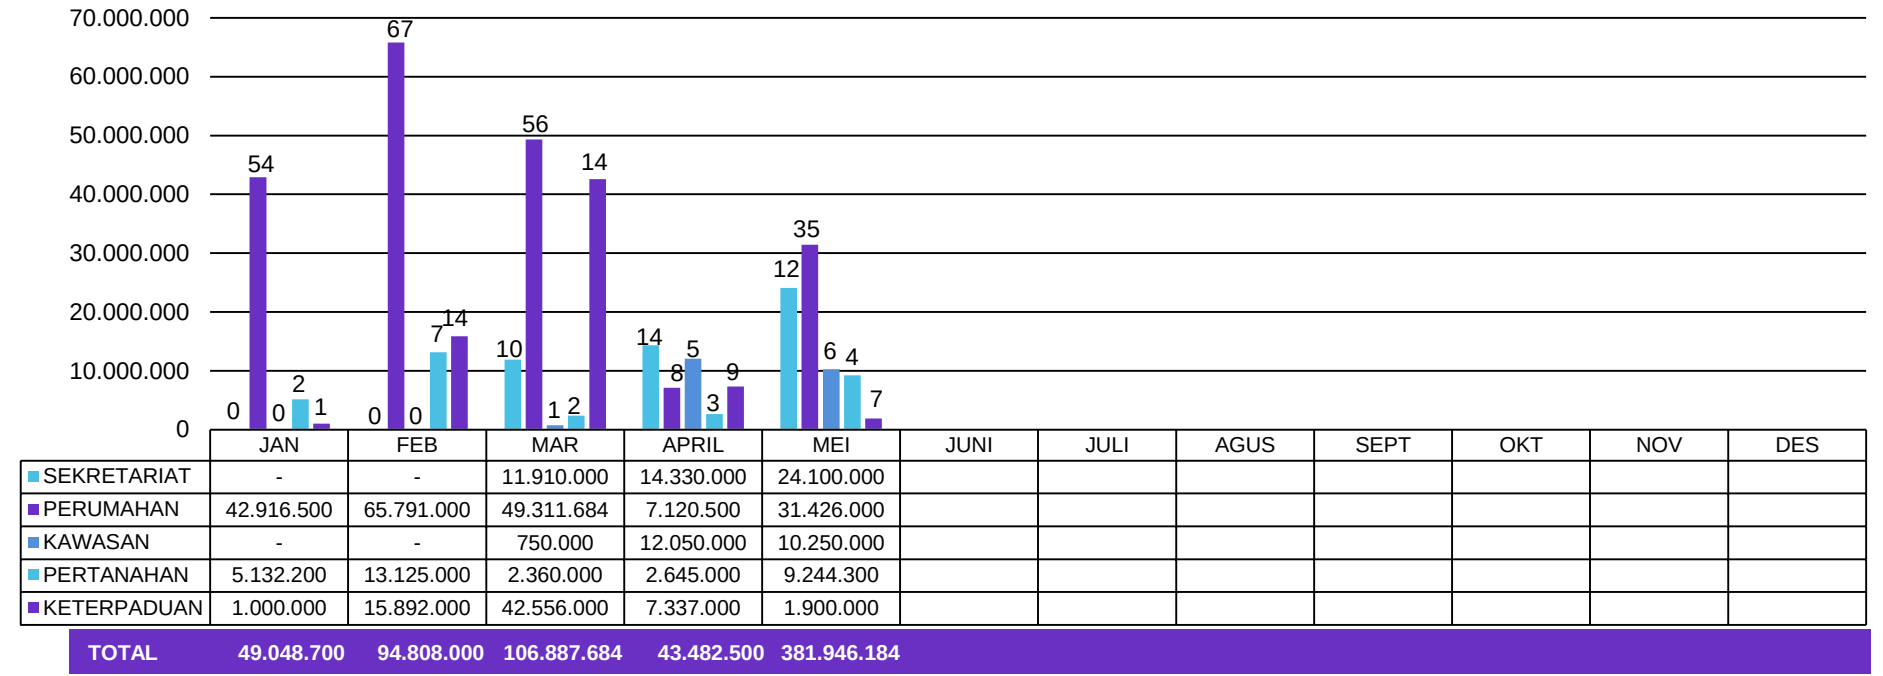


NO	BIDANG/SEKRETARIAT	TOTAL	
		ANGGARAN	FREKUENSI
1	SEKRETARIAT	50.840.000	36
2	PERUMAHAN	196.565.684	220
3	KAWASAN PERMUKIMAN	22.300.000	13
4	PERTANAHAN	33.605.500	20
5	KETERPADUAN PKP	78.635.000	42
	TOTAL	381.946.184	331



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Mei 2022

Respon LapoGub



Pada bulan MEI 2022, terdapat 24 laporan permintaan informasi melalui web LAPORGUB dan SUDAH TERJAWAB TUNTAS.

Adapun rincian laporan tersebut terdiri dari :

- 1 laporan tentang Bantuan Rumah Korban Bencana
- 23 laporan tentang RTLH

■ WEB
■ IG
■ WHATSAPP
■ FACEBOOK
■ SMS LAPORGUB

TOTAL

12


3

8

8


24

Konten Berita Web Dinas




	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
■ Sekretariat	3	4	4	13	8	0	0	0	0	0	0	0
■ Perumahan	37	27	18	20	4	0	0	0	0	0	0	0
■ Kawasan	5	3	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0
■ Keterpaduan	2	6	14	2	4	0	0	0	0	0	0	0
■ Pertanian	4	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	51	41	43	37	21							

Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos




Laporan Hasil Survey Kepuasan Website



Sangat Informatif	126	131	136	142	145							
Cukup Informatif	34	35	36	40	44							
Kurang Informatif	31	31	31	32	33							

TOTAL	191	197	203	214	222							
-------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website



PENEKANAN

1. Sesuai dengan yang disampaikan melalui Nota Dinas No. 204/PROG/VI/2022 tentang Laporan Hasil Desk Pencermatan Usulan Tahun Anggaran (TA) 2023, adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagaimana berikut:
 - Rekomendasi dari Bappeda Prov.Jateng agar Disperakim membuat **kajian terkait Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana (Bansos PK Bencana)** agar dapat memenuhi rumah sederhana sehat.
 - Desk pencermatan Rincian Anggaran belanja (RAB) Tahun 2023 akan dijadwalkan kemudian.
 - Memastikan **Validitas BNBA** Bansos yang diinput pada aplikasi e-rembugan **termasuk kesiapan readiness criteria**.
 - Pemenuhan target Renstra bagi indikator Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan **(HP & HGU)** sesuai dengan yang ada dalam e-planning yaitu **34 bidang**.
 - **Update Readiness Criteria (RC) sesuai dengan hasil input e-planning tanggal 2 Juni 2022.**
2. Bidang yang belum mengirimkan usulan **RAB dan RC perubahan maupun pergeseran anggaran TA 2022** harap segera mengirimkan ke email programdisperakim@gmail.com
3. Pada PRAPOK bulan depan (Juni), bidang diharapkan untuk **membawa sample data dukung pelaksanaan upaya penyelesaian permasalahan SSK berdeviasi negatif di bulan sebelumnya** dalam rangka pelaksanaan SPIP Disperakim. Data dukung dapat berupa nota dinas, notulen rapat, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, SK/Pergub, MoU, dsb.
4. Untuk menjadi perhatian, realisasi perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah sebagaimana berikut.



Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD



STATUS AKHIR APRIL 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir April TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

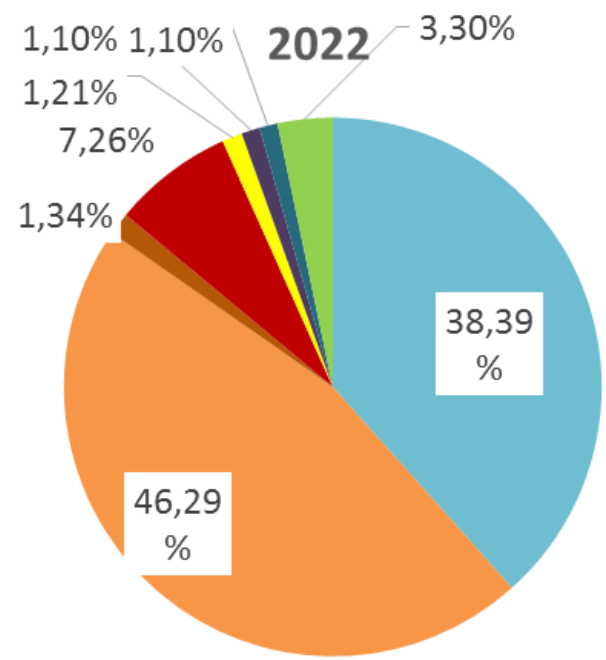

NO.	PROGRAM	2022	
		(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000
TOTAL		100	45.424.693.000




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir April 2022

^{*)}Realisasi keuangan diambil dari e-controlling status Senin, 9 Mei 2022


Disperakim

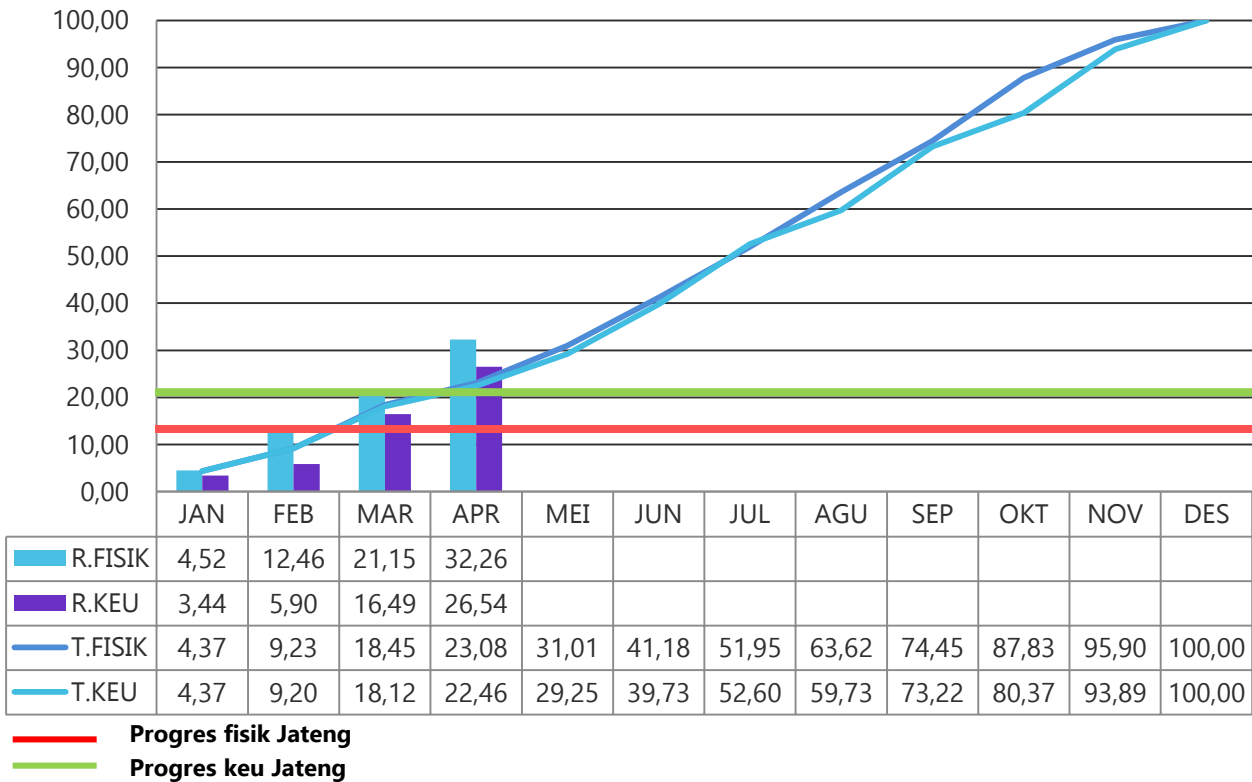

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	23,08	31,01
Target Keu	22,46	29,25
Real. Fisik	32,26	44,19
Real. Keu	26,54	41,59
Dev. Fisik	9,18	13,18
Dev. Keu	4,08	12,34

PROVINSI JAWA TENGAH (Status 10 Mei 2022)	Target Fisik	17,46
	Target Keu	15,46
	Real. Fisik	13,77
	Real. Keu	20,62
	Dev. Fisik	-3,68
	Dev. Keu	5,16

Sekretariat

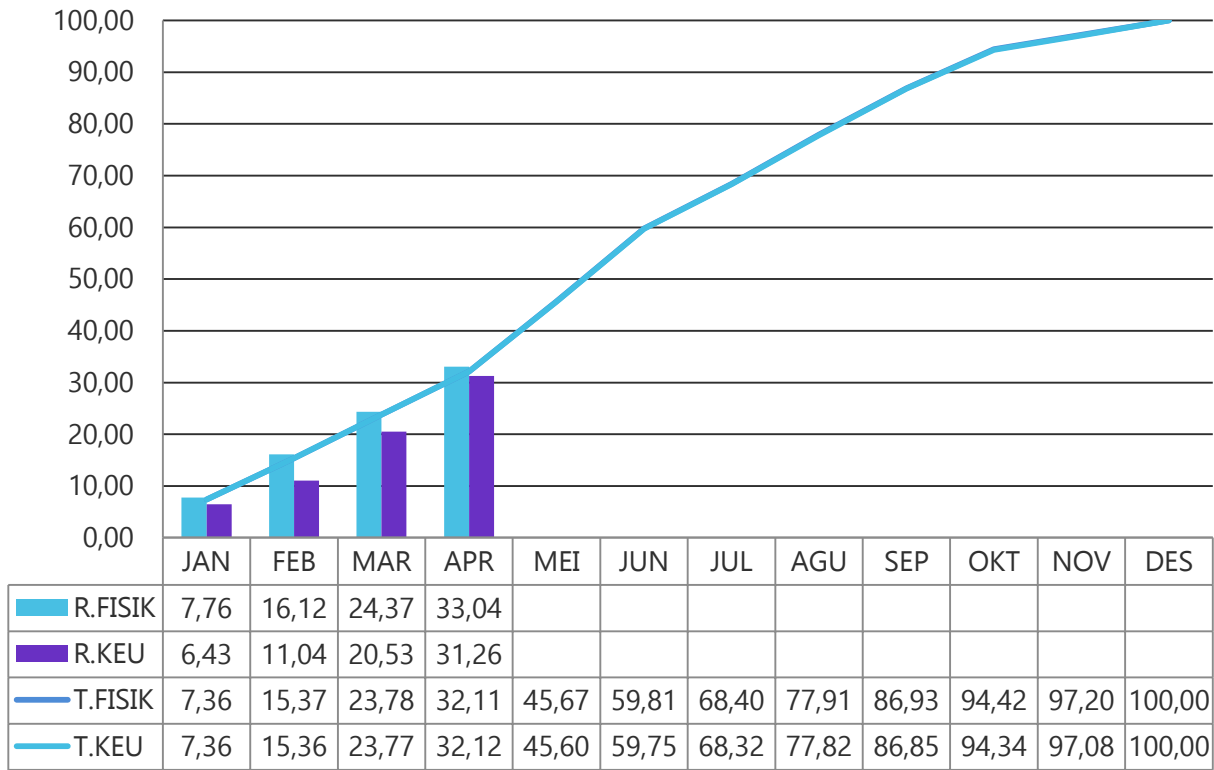

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	32,11	45,67
Target Keu	32,12	45,60
Real. Fisik	33,04	46,23
Real. Keu	31,26	46,23
Dev. Fisik	0,93	0,56
Dev. Keu	-0,86	0,63

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Program						
1	Forum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023	49.952.000	1,00	-39,29	Efisiensi Honorarium Narasumber, dikarenakan Narasumber dari unsur DPRD hanya 3 orang saja selama 2 jam sesion. Sedangkan alokasi anggaran 4 org selama 3 jam sesion.	akan dioptimalkan untuk mendukung capaian indikator kinerja.
2	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	39.599.000	6,00	-40,91	Efisiensi Honorarium Narasumber Sosialisasi Rumpun Infrastruktur TA 2022 dikarenakan sebagian honor narasumber dibayarkan oleh Dishub selaku partner koordinator di Bakorwil III	akan dioptimalkan untuk mendukung capaian indikator kinerja.
3	Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP)	29.864.000	56,43	-72,25	Kegiatan Penyusunan Dokumen RTP SPIP dilaksanakan melalui rakor. Sehingga terdapat efisiensi honorarium narasumber, perjalanan dinas, dan belanja makan minum.	akan dioptimalkan untuk mendukung capaian indikator kinerja.
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.780.000	0,79	-75,74	Efisiensi perjalanan dinas pada kegiatan Sosialisasi Infrastruktur, dikarenakan pembatasan jumlah peserta yang offline. Sehingga bidang-bidang hadir secara On Line.	akan dioptimalkan untuk mendukung capaian indikator kinerja.
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	71.825.000	3,95	-1,95	Proses administrasi SPJ, dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan, sehingga SPJ pada e-penatausahaan akan dilaporkan paling cepat pada minggu pertama bulan Mei.	Masuk dalam progres keuangan bulan Mei


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Keuangan						
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.524.693.000	0,00	-0,24	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
7	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	441.840.000	0,00	-2,94	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
8	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	4.000.000	18,75	-4,96	Fisik sudah selesai, terdapat sisa pelaksanaan kegiatan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
9	Pelaksanaan Rapat Persiapan Sosialisasi Semesteran dan Sosialisasi Semesteran	21.700.000	0,00	-3,82	Progres fisik sudah terealisasi, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Mei

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Umum dan Kepegawaian						
11	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Dinas	250.000.000	0,00	-0,35	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
12	Pengadaan Alat Studio	196.750.000	-25,27	-25,20	Pelaksanaan menunggu penyelesaian pengerjaan ruang studio podcast	Akan dibelanjakan setelah pengerjaan ruang studio podcast selesai
13	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	159.600.000	0,00	-0,75	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
14	Pembayaran Listrik	600.000.000	0,00	-14,35	Dibayarkan sesuai dengan tagihan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
15	Pengadaan Jasa Keamanan	825.000.000	0,00	-1,55	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.000.000	4,99	-0,16	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

Bidang Perumahan

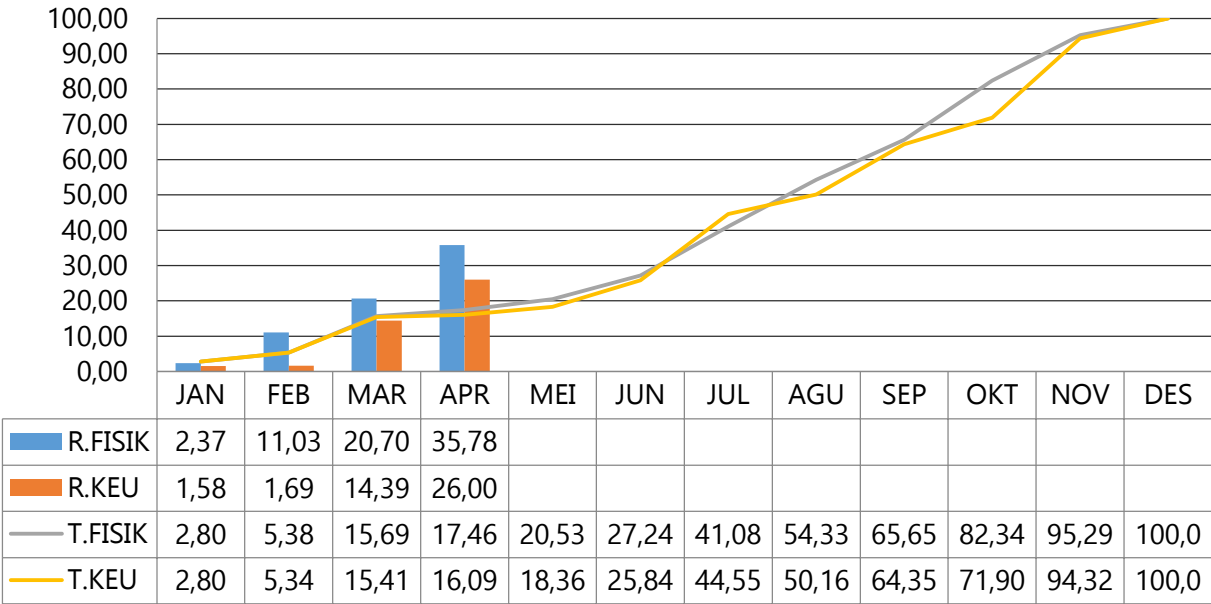

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	17,46	20,53
Target Keu	16,09	18,36
Real. Fisik	35,78	47,75
Real. Keu	26,00	43,84
Dev. Fisik	18,32	27,22
Dev. Keu	9,91	25,48

INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	REALISASI S.D. APRIL
Jumlah unit rumah yang dibangun (PB Backlog)		253 unit	0 unit
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupemdes RTLH)		11.292 unit	3.202 unit
Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (PK dan PB Bencana, PB Relokasi)		51 unit PK 16 unit PB-B 62 unit PB-R	0 unit 0 unit PB-B 55 unit PB-R
Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus (Rencana Induk Rusun)		1 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah dokumen yang disusun (Keg. Pendataan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Provinsi dan Sosialisasi & Persiapan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Prog. Prov.)		5 Dokumen	0 Dokumen

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.826.000	0,00	-3,24	Belanja makan minum rapat belum dibayarkan karena pelaksanaan rapat di akhir bulan	Masuk dalam progres keuangan bulan Mei
2	Koordinasi Lapangan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	178.512.000	-1,84	-2,71	- Pelaksanaan koordinasi lapangan untuk pengumpulan data yang semula direncanakan dilaksanakan di 8 Kab/kota baru bisa terlaksana di 6 Kab/Kota, dialihkan untuk verivali lokasi penerima PB bencana dan backlog - Realisasi keuangan koordinasi lapangan pengumpulan data di Kota Pekalongan dan Kab. Demak belum terbayarkan	- Akan dilaksanakan di bulan Mei di Kabupaten Semarang dan Kendal - Realisasi keuangan akan masuk dalam progres bulan Mei
3	Rapat Persiapan dan Rapat Pendukung Kegiatan Pendataan dan Verivali Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	1.500.000	0,00	-52,00	Rapat pendukung kegiatan sudah dilaksanakan di akhir bulan, sehingga proses SPJ masih belum final	Masuk dalam progres keuangan bulan Mei
4	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	-92,15	-92,15	Pengadaan 19 paket jasa konsultansi yang semula direncanakan terkontrak bulan Januari, baru bisa terkontrak 14 paket di bulan Februari, dan 5 paket di bulan Maret.	Paket sudah terkontrak, pelaksanaan yang semula direncanakan selesai di bulan Maret tertunda hingga bulan Mei.


No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Bimtek Validasi Data SIMPERUM	13.519.000	0,00	-24,01	Kegiatan sudah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022, sehingga proses SPJ masih belum final	Masuk dalam progres keuangan bulan Mei
6	Sosialisasi Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Sederhana Sehat atau Relokasi Program Pemerintah	7.703.000	0,00	-16,84	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
7	Workshop Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	57.830.000	0,32	-11,13	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
8	Sosialisasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Terdampak Bencana	8.857.000	0,00	-6,16	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perumahan Umum						
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	15.500.000	0,00	-0,81	Efisiensi belanja makan minum rapat	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
2	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	2.925.000	0,00	-4,62	Fisik sudah selesai, terdapat efisiensi belanja makan/minum rapat	Akan dialokasikan kembali untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	13.750.000	0,01	-24,36	Fisik sudah dilaksanakan, terdapat efisiensi belanja makan/minum rapat	Akan dialokasikan kembali untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
4	Rapat Koordinasi Pembangunan Rusus-Rusun	3.000.000	33,34	-100,00	- Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta. - Efisiensi belanja makan minum Rapat persiapan internal pembangunan Rusus-Rusun	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Pendampingan Pelaksanaan Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	99.206.000	-11,10	-11,10	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran
6	Rapat Serah Terima Hasil Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	750.000	-75,00	0,00	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran
7	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	9.000.000	-16,66	-16,67	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, pengelolaan Rusun hanya diperuntukkan bagi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta.	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perumahan Swadaya						
1	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	994.350.000	-13,61	-13,61	Bimtek yang bekerjasama dengan pihak legislatif belum semuanya dilaksanakan karena diperlukan penyesuaian jadwal.	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Mei
2	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	7.500.000	0,00	-16,52	Sisa pelaksanaan kegiatan karena kegiatan dilakukan secara daring	Akan digeser untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	2.525.000	0,00	-12,44	Sisa pelaksanaan kegiatan karena kegiatan dilakukan secara daring	Akan digeser untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
4	Persiapan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM	1.325.000	0,00	-77,36	- Belanja ATK dilaksanakan di akhir bulan, sehingga realisasi keuangannya masuk sebagai progres bulan berikutnya. - Sisa pelaksanaan kegiatan (efisiensi)	- Masuk dalam progres keuangan bulan Mei - Akan digeser untuk mendukung SSK lain melalui perubahan anggaran
5	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	915.129.000	-2,13	-2,14	Bimtek yang bekerjasama dengan pihak legislatif belum semuanya dilaksanakan karena diperlukan penyesuaian jadwal.	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Mei

Bidang Kawasan Permukiman

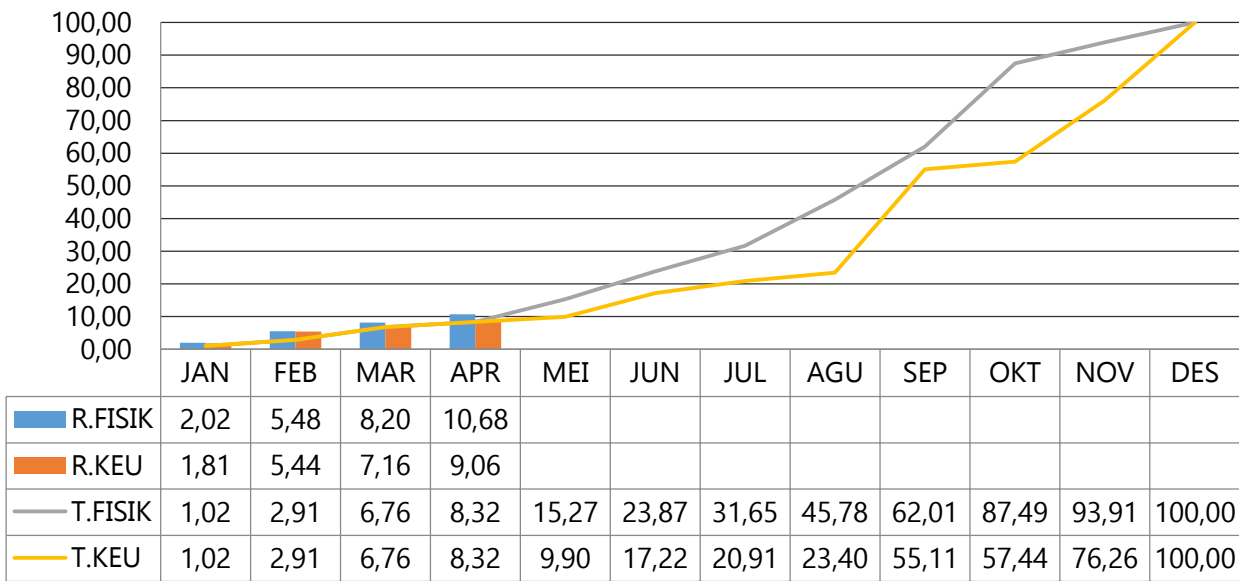

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	8,32	15,27
Target Keu	8,32	9,90
Real. Fisik	10,68	17,09
Real. Keu	9,06	11,75
Dev. Fisik	2,36	1,82
Dev. Keu	0,74	1,84

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. MARET
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	0 Lokasi
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	0 Lokasi
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	0 Dokumen


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	FGD Pendataan Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	18.050.000	0,00	-94,46	FGD BKM telah dilaksanakan pada tanggal 21 April di Kantor Disperakim Jateng	SPJ dilaksanakan bulan selanjutnya
2	Koordinasi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	24.925.000	3,32	-1,69	Sisa belanja ATK, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
3	FGD Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	28.118.000	0,00	-0,22	Sisa belanja ATK, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
4	Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	56.907.000	4,06	-23,79	Efisiensi perjalanan dinas luar daerah	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
5	Koordinasi Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	106.112.000	0,00	-2,22	- Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil - Sisa belanja ATK, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	- Sisa JKK JKM Menjadi Potensi SILPA - Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
6	Persiapan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	35.388.000	-17,32	-17,32	Perubahan rencana jadwal perjalan dinas	Perjalanan dinas dijadwalkan ulang pada bulan Mei

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
7	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	58.500.000	0,00	-7,93	Fisik sudah dilaksanakan, progres keuangan masuk ke bulan berikutnya	Realisasi keuangan masuk dalam progres bulan Mei
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
8	Rakor Dalam Rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	12.600.000	0,00	-1,59	Sisa belanja Moderator, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	-4,56	-12,57	Masih dalam proses sinkronisasi antara data deliniasi kawasan kumuh dengan data RTLH dari Simperum.	Koordinasi pelaksanaan integrasi penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh

Bidang Pertanahan

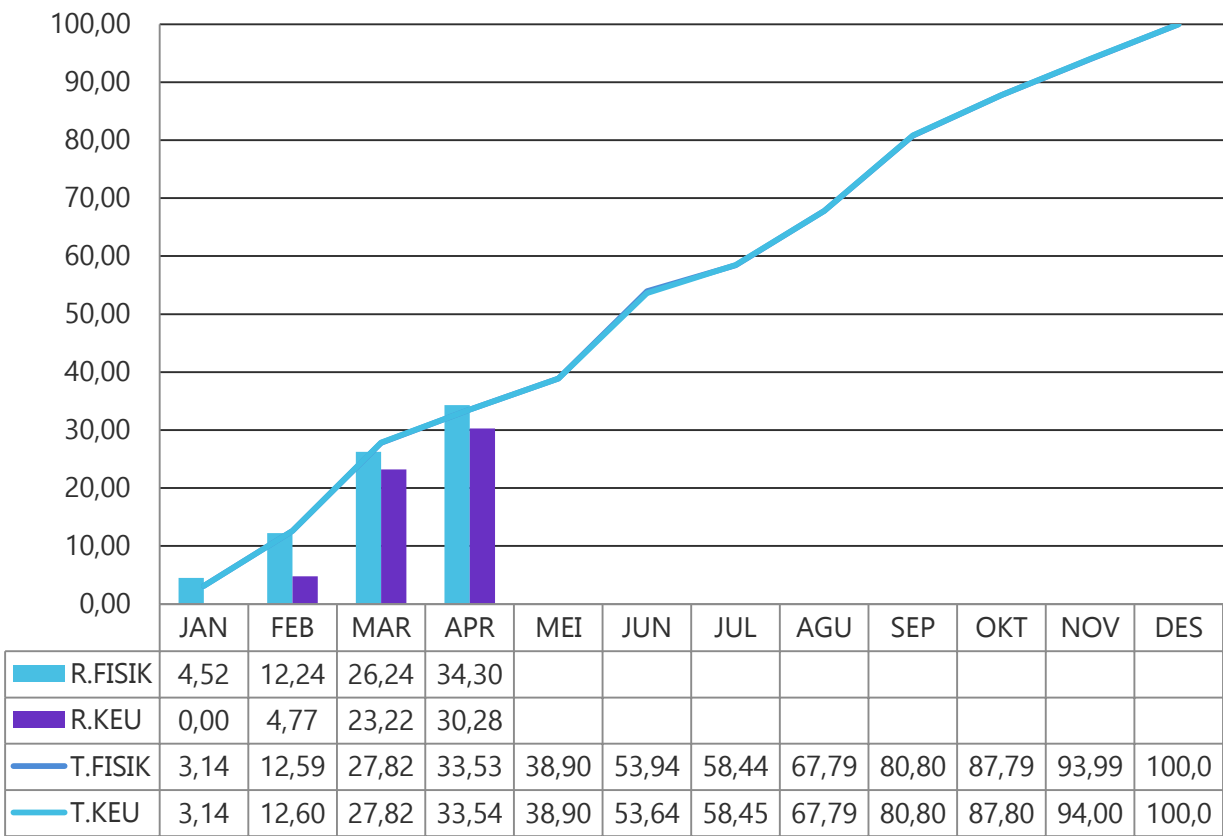

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	33,53	38,90
Target Keu	33,54	38,90
Real. Fisik	34,30	41,84
Real. Keu	30,28	40,10
Dev. Fisik	0,77	2,94
Dev. Keu	-3,26	1,19

Bidang Pertanahan

INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	REALISASI S.D. MARET
Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	20%		0%
Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	2.000 Bidang Penlok		9.303 Bidang Penlok
Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	100 Bidang ZNT		0 Bidang ZNT
Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	20%		0,12%
Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	150 Bidang LP2B 8 Bidang TKD		0 Bidang LP2B 0 Bidang TKD
Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	6 Sengketa		1 Sengketa
Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan	20%		23,73% (Tingkat Ketercapaian 1209,84%)
Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)	420 Bidang: 5 Bidang HGU 15 Bidang HP 400 Bidang Pemantauan Penlok 1 kali Diseminasi/rakor bidang pertanahan		508 Bidang: 0 Bidang HGU 4 Bidang HP 506 Bidang 1 kali
Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)	2 Lokasi		1 Lokasi
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)	200 bidang Pemantauan Sertifikasi 7 Lokasi Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA 5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA		229 Bidang 1 Lokasi 6 Kabupaten/Kota


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Koordinasi Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah	10.000.000	-28,30	-100,00	menyesuaikan schedule petugas lapangan dari Kanwil BPN	direncanakan dilaksanakan pada bulan berikutnya
2	Survei Pendahuluan Guna Penentuan Koordinat Lokasi Sampel Bidang Tanah	9.000.000	-22,22	-22,22	menyesuaikan schedule petugas lapangan dari Kanwil BPN	direncanakan dilaksanakan pada bulan berikutnya
3	Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pada Trase atau Basic Design di Lokasi Rencana Pembangunan	74.844.000	-33,76	-33,76	Belum ada kelengkapan dokumen pengajuan dari instansi yang membutuhkan tanah	Dijadwalkan kembali sesuai dengan pengajuan dari instansi yang membutuhkan tanah
4	Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	127.201.000	-1,91	-1,91	koordinasi pengadaan tanah disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan	disesuaikan dan dijadwalkan kembali dengan menyesuaikan jadwal kegiatan

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Permasalahan Pertanahan						
5	Sosialisasi tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Tanah Kas Desa	50.900.000	0,00	-5,36	realisasi fisik telah dilaksanakan semua namun terdapat sisa lebih anggaran	Sisa anggaran akan dioptimalkan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya
6	Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Sertifikasi Tanah Kas Desa	190.720.000	0,00	-11,06	Pembayaran honor pendamping proses sertifikasi hak atas tanah LP2B dilaksanakan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Mei
7	Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	6.750.000	0,00	-33,33	Efisiensi Rapat koordinasi penanganan dampak sosial tanah musnah Tol Semarang-Demak yang pelaksanaannya difasilitasi oleh As. Ekbang.	Dioptimalkan untuk tindak lanjut rakor tsb. Dan permasalahan pertanahan lainnya di Kab. Sukharjo dan Kota Surakarta (Makam Pracimaloyo dan Daksinoloyo)
8	Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Sertifikasi Tanah Kas Desa	190.720.000	0,00	-1,50	pelaksanaan mediasi permasalahan pertanahan baru dilaksanakan koordinasi tahap awal melalui media daring (belum secara luring)	Diagendakan penyelesaian secara intensif melalui tatap muka pada bulan Mei
9	Pelaksanaan Mediasi Permasalahan Pertanahan	78.925.000	-55,79	-55,79	Koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan permasalahan pertanahan sebagai antisipasi penyelesaian jalur hukum berkenaan dengan aset PT. KAI (Persero) dilaksanakan menyesuaikan dengan putusan pengadilan yang baru terbit di akhir April.	Dijadwalkan kembali di tanggal 18 s.d 20 Mei 2022

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan						
10	Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah Status Hak Pakai (HP) dan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)	25.955.000	0,00	-6,39	Efisiensi pelaksanaan kegiatan	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
11	Pendampingan Proses Pengadaan Tanah dan Penanganan Dampak	24.350.000	-20,00	-20,00	Sebagian alokasi anggaran pada SSK ini akan dialihkan untuk SSK yang mendukung capaian target Renstra melalui perubahan anggaran	
12	Konsultasi Pembinaan Pertanahan	30.467.000	47,43	-7,08	Efisiensi pelaksanaan kegiatan	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
13	Rapat Koordinasi Rencana Program Reforma Agraria, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	20.030.000	9,99	-10,14	- Progres Fisik Telah direalisasikan - Pengambilan di sesuaikan dengan harga pasar dan blangkon (Cetak dan ATK) - Narasumber Kemendagri tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara Rakortek Pertanahan	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja melalui perubahan anggaran
14	Pemantauan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (LP2B)	24.350.000	1,10	-5,66	Efisiensi pelaksanaan kegiatan (siswa belanja penginapan)	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja

Bidang Keterpaduan PKP

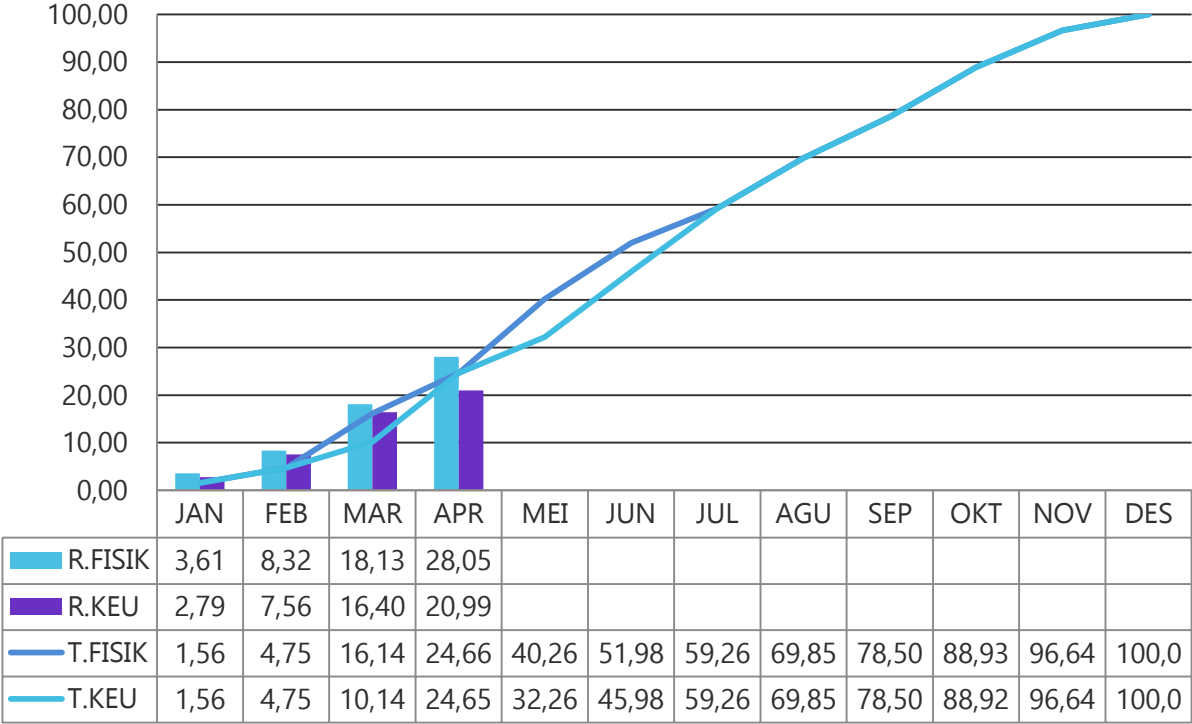

	April	Mei (Prognosis)
Target Fisik	24,66	40,26
Target Keu	24,65	32,26
Real. Fisik	28,05	43,76
Real. Keu	20,99	35,39
Dev. Fisik	3,39	3,50
Dev. Keu	-3,66	3,13

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. MARET
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian	3 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian	5 Dokumen	1 Dokumen

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Fasilitasi Pokja/ Forum PKP dan Pengembangan Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	88.571.000	-8,40	-10,66	Substansi materi Rapat Koordinasi Forum PKP masih dalam proses pembahasan	Rapat Koordinasi Forum PKP di Bulan Mei
2	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	360.000.000	0,00	-25,00	Pembayaran Termin-1 Konsultan Badan Usaha tertunda karena pelaksanaan kontrak tertunda 1 bulan dari RKO.	Pembayaran Termin-1 Konsultan Badan Usaha akan dilakukan pada Bulan Mei
3	Fasilitasi Pelaksanaan KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	135.613.000	0,79	-3,26	Monitoring KKN Tematik dilaksanakan di akhir bulan	Pembayaran perjalanan dinas Monitoring KKN Tematik akan dilakukan pada Bulan Mei
4	Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	25.781.000	-3,49	-13,96	Penundaan kegiatan Sosialisasi KKN Tematik di lapangan karena menyesuaikan dengan kesiapan masyarakat di lokasi KKN	Penjadwalan ulang kegiatan Sosialisasi KKN Tematik di lapangan di akhir Mei
5	Pengadaan Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	100.000.000	-25,00	-25,00	Pengadaan alat peraga ditunda menyesuaikan dengan pembentukan komunitas di desa. Saat ini masih dalam proses pendataan masyarakat yang membutuhkan rumah.	Penjadwalan ulang pengadaan alat peraga.

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Penyediaan Honorarium Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	-25,00	-25,00	Honorarium Pejabat PBJ untuk paket pengadaan alat peraga belum dibayarkan karena proses pengadaan belum dimulai. Pengadaan alat peraga ditunda menyesuaikan dengan pembentukan komunitas di desa. Saat ini masih dalam proses pendataan masyarakat yang membutuhkan rumah.	Menyesuaikan penjadwalan ulang pengadaan alat peraga.
Seksi Pengelolaan data PKPP						
7	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	44.744.000	0,00	-0,02	Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil	Menjadi Potensi SILPA



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir April 2022

Bidang Perumahan

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 20/31 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
6		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
7		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
8		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
9		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
10		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
11		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 14 Maret 2022	14 Maret – 12 Juni 2022 (90 Hari Klaender)
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
20	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
21		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
22		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
23		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
24		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
25		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
26		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
27		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
28		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
29		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
30		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
31	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - SIMPERUM	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal	

Tender

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender		

Swakelola Tipe IV oleh Kelompok Masyarakat

Jumlah SK Telah Ditandatangani: 45/45

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Tumanggal Kabupaten Purbalingga	120.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 23 Februari 2022	23 Februari 2022 - 22 Juli 2022 (150 hari)
2		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan	144.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
3		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bongas Kabupaten Pemalang	48.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 2 Maret 2022	2 Maret 2022 - 29 Juli 2022 (150 hari)
4		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sriwulan Kabupaten Demak	144.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
5		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Blerong Kabupaten Demak	72.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 4 Maret 2022	4 Maret 2022 - 31 Juli 2022 (150 hari)
6		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bedono Kabupaten Demak	84.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga	200.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (1 orang penerima bantuan mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
8		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Kebumen	250.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
9		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purworejo	150.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
10		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali	200.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
11	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Pekalongan	1.015.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
12		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Wonogiri	945.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
13		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Tegal	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
14	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan, Desa Sumogawe	280.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 21 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
15		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan, Desa Polobogo	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 21 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
16		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan, Desa Ketapang	420.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 20 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
17		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan, Desa Timpik	455.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 20 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
18		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Brondong	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
19		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Kaliwungu	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
20		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Gowong	140.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
21		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Tegalsari	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
22		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Brunorejo	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
23	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Sapuran, Desa Glagah	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
24		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Leksono, Desa Kalimendong	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
25		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Kertek, Desa Bejiarum	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
26		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Cilacap, Kec. Dayeuhluhur, Desa Bingkeng	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 8 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
27		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Cilacap, Kec. Dayeuhluhur, Desa Dayeuhluhur	770.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 8 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
28		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Gondang, Desa Wonotolo	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
29		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Mondokan, Desa Kedawung	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
30		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Sambungmacan, Desa Banaran	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
31		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Sidoharjo, Desa Taraman	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
32		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Kalijambe, Desa Wonorejo	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
33		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Selokaton	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
34		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Dayu	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
35		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Tuban	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
36		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Dayu	140.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
37		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Pemalang, Kec. Watukumpul, Desa Tambi	630.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
38		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Pemalang, Kec. Watukumpul, Desa Majakerta	525.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
39	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Paguyangan, Desa Paguyangan	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 11 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
40		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Jatibarang, Desa Kebogadung	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
41		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Songgom, Desa Dukuhmaja	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 19 Januari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
42		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Pengkol	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
43		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Baran	280.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
44		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Pondok	70.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022
45		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Bendosari, Mojorejo	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	s.d. 31 Desember 2022

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi (Terkontrak: 0/6 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender		Juli
2		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender		Juli
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender		Juli
4		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi	Menunggu Proses tayang di LPSE (sudah dikoordinasikan dengan Biro APBJ)	Mei
5		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi	Menunggu Proses tayang di LPSE (sudah dikoordinasikan dengan Biro APBJ)	Mei
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi	Menunggu Proses tayang di LPSE (sudah dikoordinasikan dengan Biro APBJ)	Mei

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 2/8 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 8 Maret 2022	60 hari
2		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 15 Maret 2022	60 hari
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
5		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
6		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
7		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
8	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung	Proses review KAK	April


Bidang Keterpaduan PKP

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Upload dokumen penawaran	Maret
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Upload dokumen penawaran	Maret
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Upload dokumen penawaran	Maret
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyiapan komunitas peserta pelatihan	April
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 10 Maret 2022	Maret s.d. Oktober 2022


Sekretariat

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung		

Realisasi Belanja Blangkon

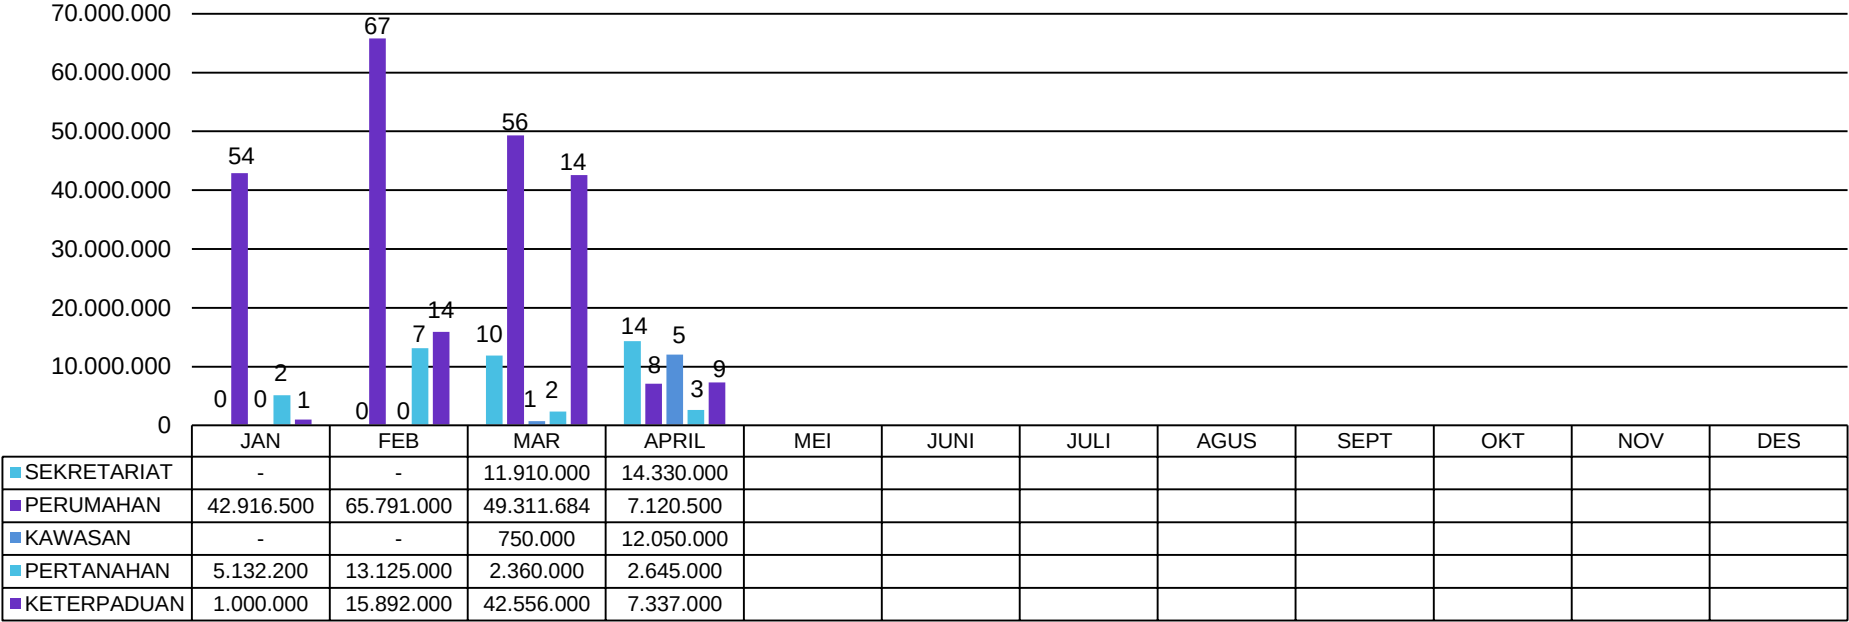


Catatan:
Data diambil dari sistem Blangkon status 28 April 2022



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA


Status Akhir April 2022

Respon Laporgub




	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
WEB	5	1	4	1								
IG	1	0	0	3								
WHATSAPP	5	1	3	0								
FACEBOOK	0	0	1	2								
SMS LAPORGUB	1	1	0	2								
TOTAL	12	3	8	8								

Konten Berita Web Dinas




	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
■ Sekretariat	3	4	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Perumahan	37	27	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Kawasan	5	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Keterpaduan	2	6	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Pertanian	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos




Laporan Hasil Survey Kepuasan Website



	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Ags 2022	Sept 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022
Sangat Informatif	126	131	136	142								
Cukup Informatif	34	35	36	40								
Kurang Informatif	31	31	31	32								

Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website

Minggu IV



PENEKANAN

1. Bidang yang **BELUM MENGUMPULKAN:**

- **Usulan Perubahan Anggaran TA 2022 (RKA-P dan RAB-P beserta rekap)**
- **Readiness Criteria Perubahan Anggaran 2022 (Bidang Perumahan)**
- **Readiness Criteria Usulan TA 2023 (Bidang Perumahan)**

harap segera mengumpulkan dengan pengantar NOTA DINAS Kepala Bidang kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Subbag Program paling lambat hari **Rabu, 11 Mei 2022 jam 15.00.**

2. Dimohon untuk segera menindaklanjuti hasil desk pra-POK tanggal 27 April 2022, yaitu menyampaikan **Rincian Data Dukung Realiasi Capaian Kinerja s.d. April 2022** ke Subbag Program paling lambat **Rabu, 11 Mei 2022 jam 15.00**



Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR MARET 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir Maret TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

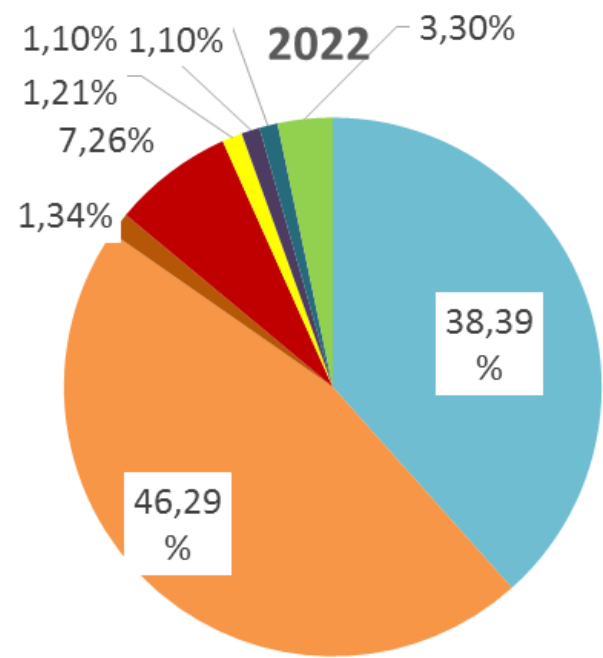

NO.	PROGRAM	2022	
		(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000
	TOTAL	100	45.424.693.000




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir Maret 2022

^{*)}Realiasi keuangan diambil dari e-controlling Status Senin, 4 April 2022

^{*)} Data Masuk dari Bidang status Senin, 4 April 2022

Disperakim

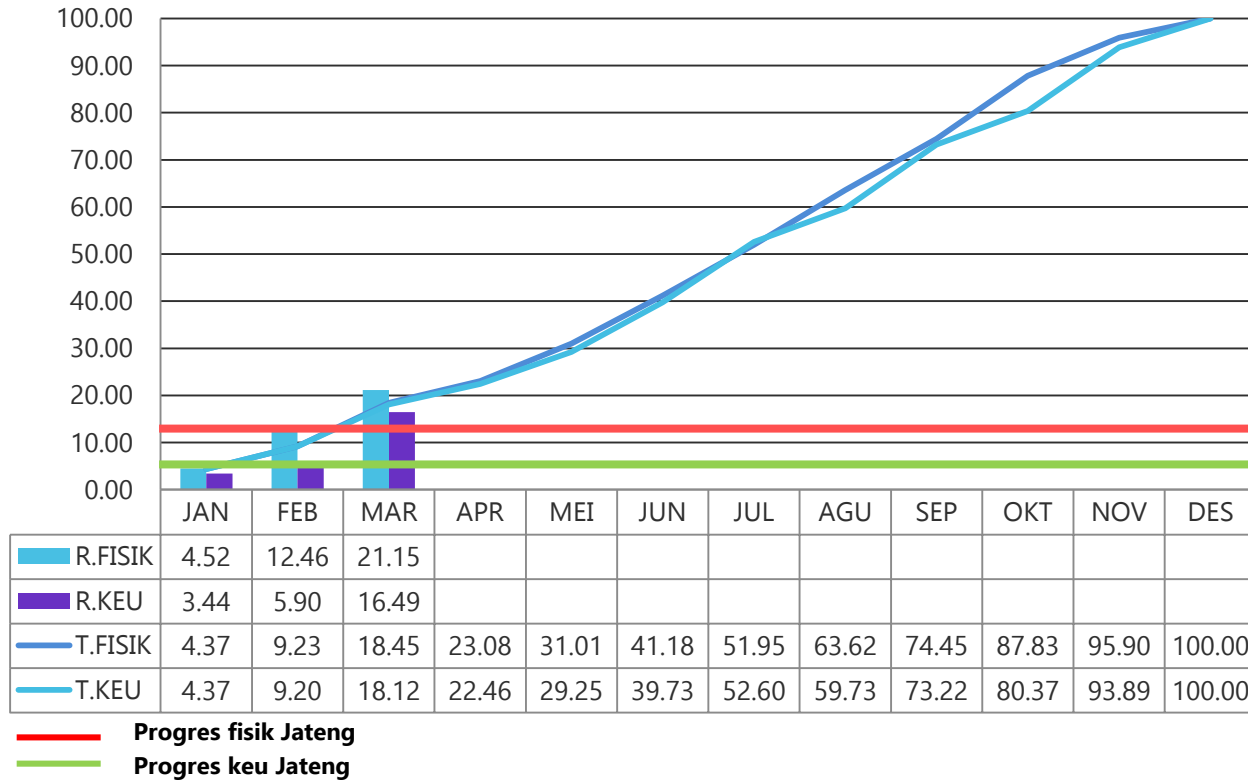


	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	18,45	23,08
Target Keu	18,12	22,46
Real. Fisik	21,15	30,71
Real. Keu	16,49	29,95
Dev. Fisik	2,70	7,63
Dev. Keu	-1,63	6,15

**PROVINSI
JAWA
TENGAH**
(Status 5
April 2022)

Target Fisik	12,79
Target Keu	11,46
Real. Fisik	11,98
Real. Keu	7,41
Dev. Fisik	-0,81
Dev. Keu	-4,05

Sekretariat

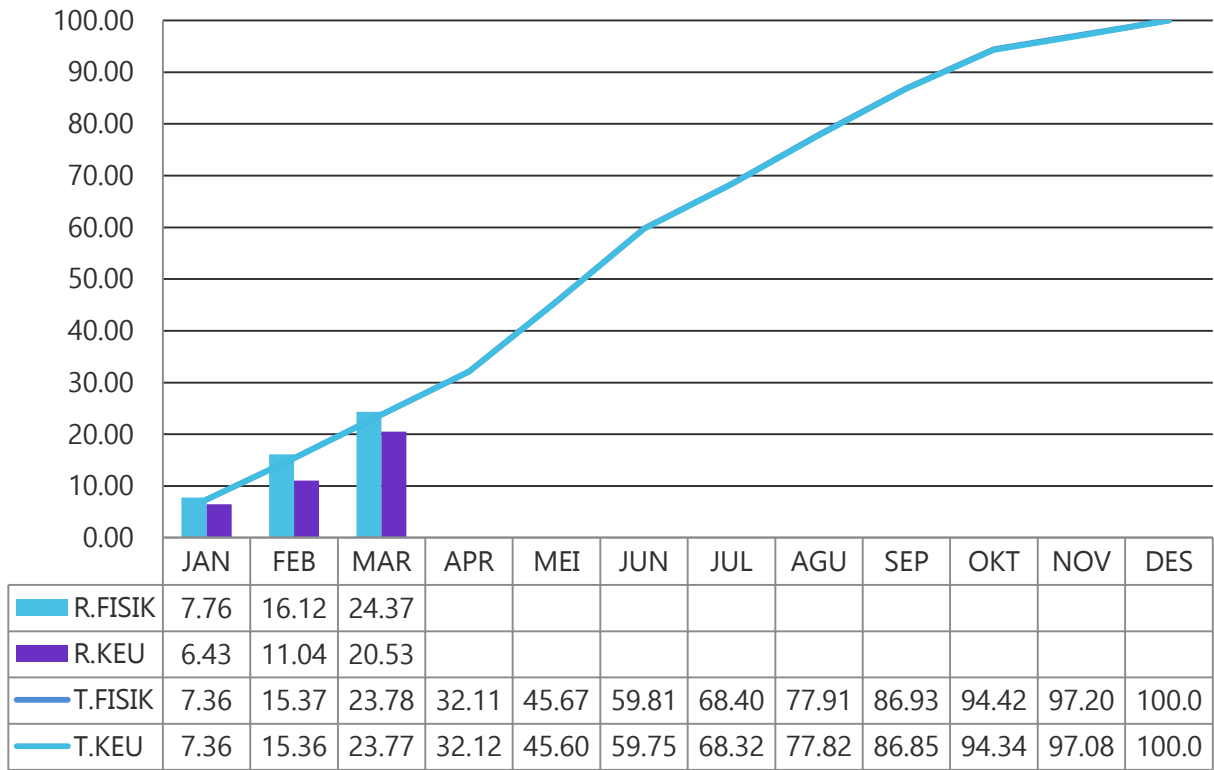

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	23,78	32,11
Target Keu	23,77	32,12
Real. Fisik	24,37	32,25
Real. Keu	20,53	32,06
Dev. Fisik	0,59	0,14
Dev. Keu	-3,24	-0,07

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Program						
1	Forum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023	49.952.000	0,00	-39,29	Efisiensi Honorarium Narasumber, dikarenakan Narasumber dari unsur DPRD hanya 3 orang saja selama 2 jam sesion. Sedangkan alokasi anggaran 4 org selama 3 jam sesion.	akan dioptimalkan untuk mendukung capaian indikator kinerja.
2	Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur	39.599.000	6,00	-40.91	Honorarium Narasumber yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan; dikarenakan sebagian dibayarkan oleh DISHUB selaku partner koordinator di Bakorwil III	akan dioptimalkan untuk mendukung capaian indikator kinerja.
3	Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP)	29.864.000	56,43	-13,67	Kegiatan Penyusunan Dokumen RTP SPIP dilaksanakan melalui rakor. Sehingga terdapat efisiensi honorarium narasumber, perjalanan dinas, dan belanja makan minum.	akan dioptimalkan untuk mendukung capaian indikator kinerja.
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	157.428.000	1,00	-2,22	Proses administrasi SPJ, dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan, sehingga SPJ pada e-penatausahaan akan dilaporkan paling cepat pada minggu pertama bulan April.	Masuk dalam progres keuangan bulan April
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.780.000	0,79	-29,47	Efisiensi perjalanan dinas pada kegiatan Sosialisasi Infrastruktur, dikarenakan pembatasan jumlah peserta yang offline. Sehingga bidang-bidang hadir secara On Line.	akan dioptimalkan untuk mendukung capaian indikator kinerja.


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	71.825.000	1,73	-4,05	Proses administrasi SPJ, dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan, sehingga SPJ pada e-penatausahaan akan dilaporkan paling cepat pada minggu pertama bulan April.	Masuk dalam progres keuangan bulan April
Subbag Keuangan						
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.524.693.000	0,00	-3,87	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
9	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	441.840.000	0,00	-2,35	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
10	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	4.000.000	0,00	-4,96	Progres fisik sudah terealisasi, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan April
11	Pelaksanaan Rapat Persiapan Sosialisasi Semesteran dan Sosialisasi Semesteran	21.700.000	0,00	-3,82	Progres fisik sudah terealisasi, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan April

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Umum dan Kepegawaian						
12	Pembayaran Kursus dan Pelatihan Singkat	50.000.000	0,00	-1,00	Pendidikan pelatihan telah dilaksanakan secara daring	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
13	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Dinas	250.000.000	0,00	-0,35	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
14	Pengadaan Alat Studio	196.750.000	-25,27	-43,43	Pelaksanaan menunggu penyelesaian pengerjaan ruang studio	Akan dilaksanakan di bulan April
15	Pembayaran Listrik	600.000.000	0,00	-10,78	Dibayarkan sesuai dengan tagihan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
16	Pengadaan Jasa Keamanan	825.000.000	0,00	-1,50	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

Bidang Perumahan

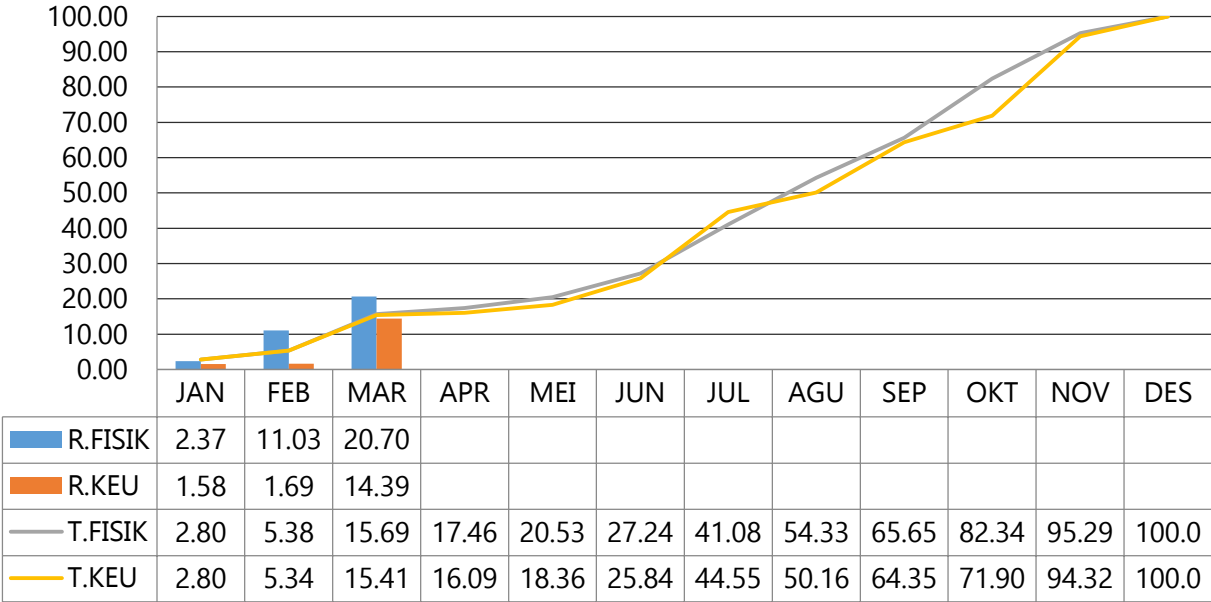

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	15,69	17,46
Target Keu	15,41	16,09
Real. Fisik	20,71	33,90
Real. Keu	14,39	32,65
Dev. Fisik	5,01	16,44
Dev. Keu	-1,02	13,65

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. MARET
Jumlah unit rumah yang dibangun (PB Backlog)	253 unit	0 unit
Jumlah rumah yang ditangani (Bankeupemdes RTLH)	11.292 unit	3.202 unit
Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (PK dan PB Bencana, PB Relokasi)	51 unit PK 16 unit PB-B 62 unit PB-R	49 unit 14 unit PB-B 0 unit PB-R
Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus (Rencana Induk Rusun)	1 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah dokumen yang disusun (Keg. Pendataan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Provinsi dan Sosialisasi & Persiapan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Prog. Prov.)	5 Dokumen	0 Dokumen

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.826.000	0,00	-1,03	Belanja makan minum rapat belum dibayarkan karena pelaksanaan rapat di akhir bulan	Masuk dalam progres keuangan bulan April
2	Koordinasi Lapangan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	178.512.000	-3,60	-7,89	Pelaksanaan koordinasi lapangan untuk pengumpulan data yang semula direncanakan dilaksanakan di 8 Kab/kota baru bisa terlaksana di 4 Kab/Kota, dialihkan untuk verivali lokasi penerima PB bencana dan backlog	Akan dilaksanakan di bulan April
3	Rapat Persiapan dan Rapat Pendukung Kegiatan Pendataan dan Verivali Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	1.500.000	-50,00	-52,00	- Acara rapat persiapan yang seharusnya dilaksanakan 2x baru dapat dilaksanakan 1x- karena untuk mendukung acara bimtek RTLH di 29 Kabupaten. - Realisasi keuangan belum terbayarkan	- Dijadwalkan kembali di bulan April - Masuk sebagai progres bulan April
4	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	-92,79	-92,79	Pengadaan 19 paket jasa konsultansi yang semula direncanakan terkontrak bulan Januari, baru bisa terkontrak 14 paket di bulan Februari, dan 5 paket di bulan Maret.	Paket sudah terkontrak, pelaksanaan yang semula direncanakan selesai di bulan Maret tertunda hingga bulan Mei.

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
5	Bimtek Validasi Data SIMPERUM	13.519.000	-2,21	-6,63	- MMT bimtek validasi data Simperum belum dicetak menyesuaikan dengan pelaksanaan Bimtek di bulan April - Belanja ATK belum dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan	- Akan dibelanjakan di bulan April
6	Sosialisasi Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Sederhana Sehat atau Relokasi Program Pemerintah	7.703.000	0,00	-16,38	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
7	Workshop Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	57.830.000	0,37	-11,08	Sisa pelaksanaan kegiatan	akan dioptimalkan untuk kegiatan lain yang mendukung capaian indikator kinerja.
8	Sosialisasi Hunian Tetap (HUNTAP), Hunian Sementara (HUNTARA), dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat / Komunitas Rusus/Rusun di Jawa Tengah	11.100.000	1,86	-0,14	Progres fisik sudah terealisasi, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan April
9	Sosialisasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Terdampak Bencana	8.857.000	0,00	-74,11	Sosialisasi dilaksanakan tanggal 31 Maret 2022 sehingga progres keuangan masuk ke bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan April
10	Pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah, HUNTAP, HUNTARA, Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masy.	83.787.000	0,00	-0,10	Progres fisik sudah terealisasi, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan April

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		

Seksi Perumahan Umum						
1	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	2.925.000	0,00	-4,62	Progres fisik sudah terealisasi, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan April
2	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	40.266.000	36,94	-2,20	Progres fisik sudah terealisasi, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan April
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	13.750.000	0,01	-17,09	Rapat Internal dilaksanakan di akhir bulan Maret, belum dibayarkan untuk belanja makan minum	Masuk dalam progres keuangan bulan April
4	Rapat Koordinasi Pembangunan Rusus-Rusun	3.000.000	-16,66	-75,00	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kepmendagri no. 50 tahun 2020, Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan rusun	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran
5	Pendampingan Pelaksanaan Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	99.206.000	-11,00	-11,01	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kepmendagri no. 50 tahun 2020, Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan rusun	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran

--	--	--	--	--	--	--


No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Rapat Serah Terima Hasil Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	750.000	-50,00	0,00	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kepmendagri no. 50 tahun 2020, Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan rusun	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran
7	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	9.000.000	-16,66	-16,67	Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun tidak dapat dilaksanakan karena sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kepmendagri no. 50 tahun 2020, Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan rusun	Penganggaran Sub-Sub Kegiatan terkait penyediaan Rusun akan dialokasikan untuk Pembangunan Baru pada perubahan anggaran

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		

Seksi Perumahan Swadaya

1	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	994.350.000	-15,82	-15,82	Bimtek kerjasama dengan pihak ketiga belum semuanya dilakukan karena harus menyesuaikan jadwal pihak ketiga	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan April
2	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	7.500.000	0,00	-16,52	Rekening honorarium narasumber yang semula dianggarkan untuk 4 OJ, hanya terealisasi 3 OJ	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
3	Persiapan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM	1.325.000	0,00	-77,36	Progres fisik sudah terealisasi, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan April
4	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	915.129.000	-4,11	-4,12	Bimtek kerjasama dengan pihak ketiga belum semuanya dilakukan karena harus menyesuaikan jadwal pihak ketiga	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan April
5	Koordinasi Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	277.010.000	-5,62	-5,62	Bimtek kerjasama dengan pihak ketiga belum semuanya dilakukan karena harus menyesuaikan jadwal pihak ketiga	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan April

Bidang Kawasan Permukiman

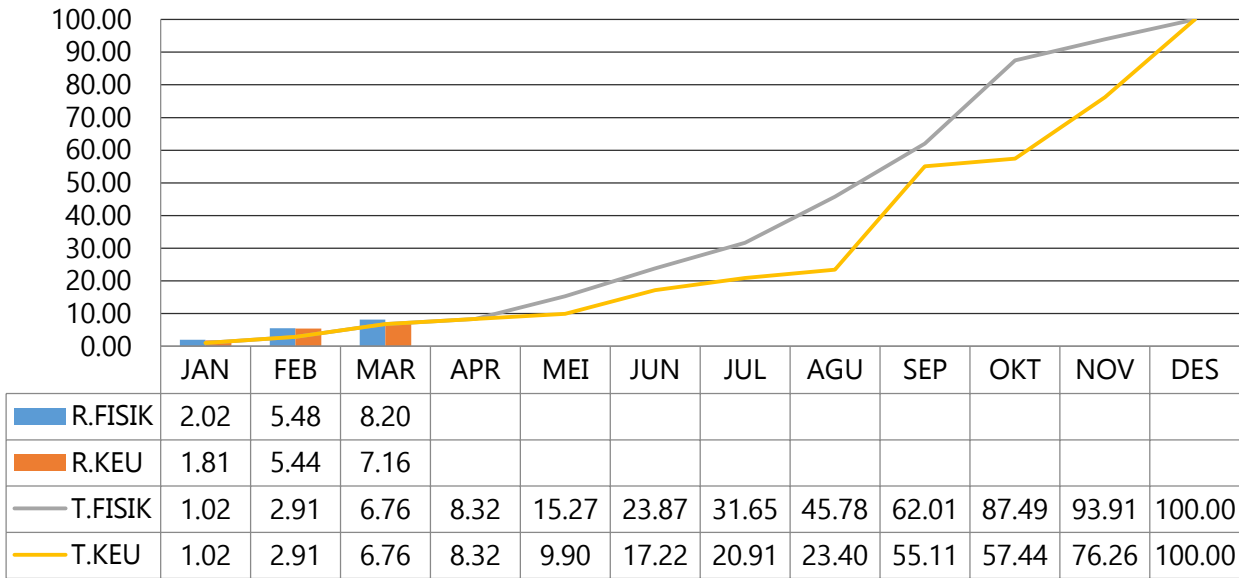

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	6,76	8,32
Target Keu	6,76	8,32
Real. Fisik	8,20	10,36
Real. Keu	7,16	10,36
Dev. Fisik	1,44	2,04
Dev. Keu	0,40	2,04

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. MARET
Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan (Hadiah Lomba Hari Habitat)	6 Lokasi	0 Lokasi
Jumlah dokumen penyediaan PSU	1 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	7 Lokasi	0 Lokasi
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	1 Dokumen	0 Dokumen


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	FGD Pendataan Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	18.050.000	-94,46	-94,46	Perubahan jadwal pelaksanaan FGD Belanja Hibah untuk Badan Keswadayaan Masyarakat untuk Penanganan Kawasan Kumuh karena masih dalam proses pematangan prioritasisasi Kabupaten/Kota yang akan menerima hibah PSU	FGD dijadwalkan ulang di bulan Mei yang semula direncanakan dilaksanakan di 3 lokasi digabung di kantor Disperakim Prov. Jateng
2	Koordinasi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	24.925.000	3,32	-1,69	Progres fisik sudah terealisasi, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan April
3	FGD Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	28.118.000	0,00	-0,22	Sisa belanja ATK, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
4	Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh	56.907.000	4,06	-23,79	Perjalanan dinas verifikasi SK kumuh dilaksanakan di akhir bulan Maret	SPJ dilaksanakan bulan selanjutnya
5	Koordinasi Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	106.112.000	0,00	-0,96	- Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil - Kegiatan sudah dilaksanakan, SPJ dilaporkan bulan berikutnya	- Sisa JKK JKM Menjadi Potensi SILPA - SPJ dilaporkan bulan berikutnya
6	Persiapan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	35.388.000	-20,23	-20,23	Perjalanan dinas persiapan studi di Kab. Blora dan Rembang ditunda karena ada perubahan pada KAK dokumen studi	Perjalanan dinas dijadwalkan kembali bulan April

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
7	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	-8,37	-10,13	Adanya perubahan rencana perjalanan dinas terkait koordinasi pelaksanaan integrasi penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh karena fokus pada persiapan usulan hibah TA 2023	Penjadwalan ulang perjalanan dinas bulan April
8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kawasan Permukiman	126.851.000	-1,20	-3,27	Adanya perubahan rencana perjalanan dinas terkait koordinasi pelaksanaan Bankeu Sarpras Kab/Kota karena fokus pada persiapan usulan hibah TA 2023	Penjadwalan ulang perjalanan dinas bulan April
Seksi Pengembangan PSU						
9	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PSU Permukiman Provinsi Jawa Tengah	133.262.000	0,00	-1,19	-Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil -Penyesuaian honorarium tenaga pendukung yang semula dianggarkan S1 menjadi D4	Menjadi Potensi SILPA

Bidang Pertanahan

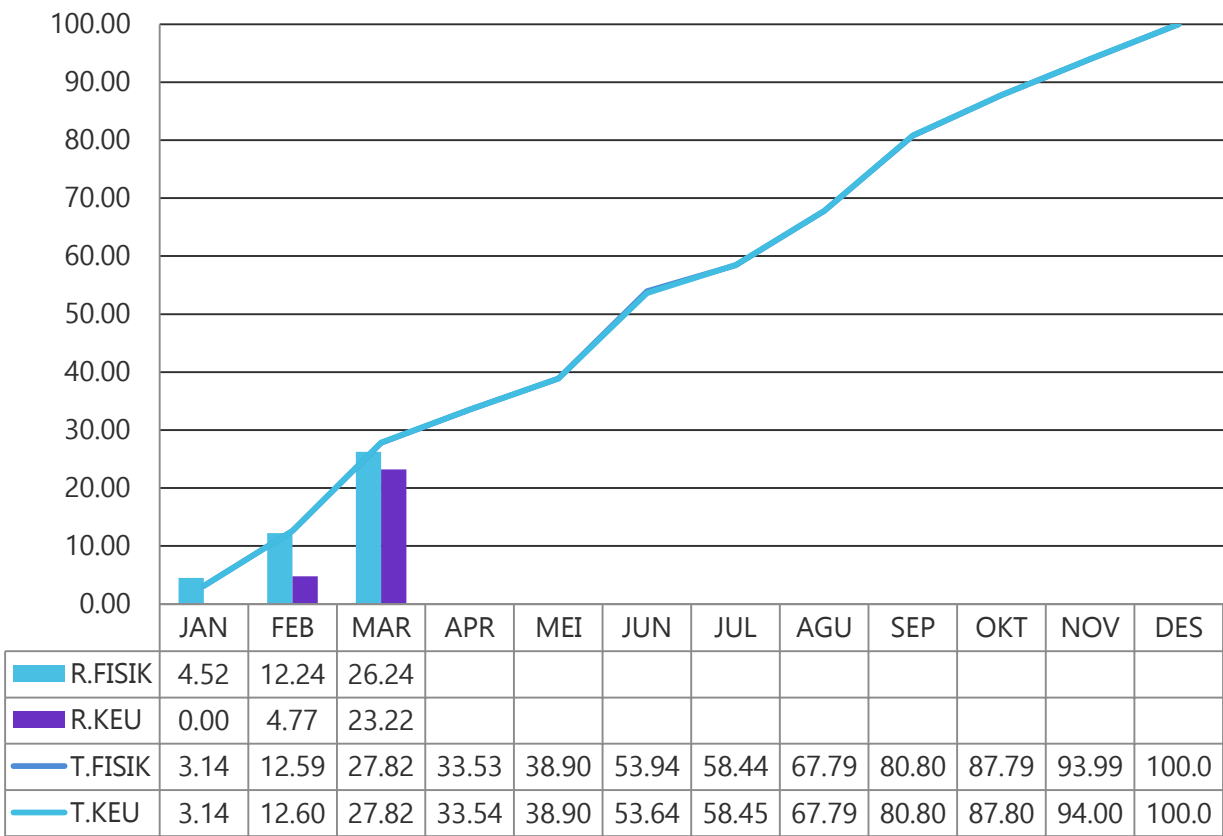

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	27,82	33,53
Target Keu	27,82	33,54
Real. Fisik	26,21	28,74
Real. Keu	23,22	25,99
Dev. Fisik	-1,58	-4,79
Dev. Keu	-4,60	-7,54

Bidang Pertanahan

INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	REALISASI S.D. MARET
Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	20%		0%
Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	2.000 Bidang Penlok		0 Bidang Penlok
Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	100 Bidang ZNT		0 Bidang ZNT
Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	20%		0,12%
Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	150 Bidang LP2B 8 Bidang TKD		0 Bidang LP2B 0 Bidang TKD
Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	6 Sengketa		1 Sengketa
Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan	20%		23,73% (Tingkat Ketercapaian 1209,84%)
Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan (HGU/HP, Pemantauan Penlok, diseminasi/rakor bidang pertanahan)	420 Bidang: 5 Bidang HGU 15 Bidang HP 400 Bidang Pemantauan Penlok 1 kali Diseminasi/rakor bidang pertanahan		508 Bidang: 0 Bidang HGU 2 Bidang HP 506 Bidang 1 kali
Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria (Jumlah sosialisasi/ diseminasi/rakor bidang pertanahan)	2 Lokasi		1 Lokasi
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria (Pemantauan Sertifikasi, Sosialisasi/Identifikasi Kebutuhan Akses RA, Pemantauan Pelaksanaan GTRA)	200 bidang Pemantauan Sertifikasi 7 Lokasi Sosialisasi/ Identifikasi Kebutuhan Akses RA 5 Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan atas Pelaksanaan GTRA		229 Bidang 1 Lokasi 3 Kabupaten/Kota


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Koordinasi Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah	10.000.000	0,01	-71,70	menyesuaikan schedule petugas lapangan dari Kanwil BPN	direncanakan dilaksanakan pada bulan berikutnya
2	Survei Pendahuluan Guna Penentuan Koordinat Lokasi Sampel Bidang Tanah	9.000.000	-18,77	-18,78	Baru 2 dari 4 kabupaten yang telah dilaksanakan kegiatan pengambilan data lapangan yaitu Kab. Sragen dan Kab. Karanganyar dikarenakan penyesuaian jadwal dengan petugas BPN	dijadwalkan kembali di bulan berikutnya
3	Pengambilan Data Lapang atau Koordinat Titik Sampel Lokasi Bidang Tanah	9.000.000	-7,22	-7,22	Baru 2 dari 4 kabupaten yang telah dilaksanakan kegiatan pengambilan data lapangan yaitu Kab. Sragen dan Kab. Karanganyar dikarenakan penyesuaian jadwal dengan petugas BPN	dijadwalkan kembali di bulan berikutnya
4	Identifikasi Kepemilikan Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan	74.830.000	-11,92	-11,92	disesuaikan dengan pengajuan penlok perpanjangan/pembaruan penetapan lokasi dari instansi yang membutuhkan tanah	dijadwalkan kembali bulan berikutnya sesuai pengajuan dari instansi yang membutuhkan tanah
5	Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pada Trase atau Basic Design di Lokasi Rencana Pembangunan	74.844.000	-25,48	-25,48	Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi pengadaan tanah mengalami perubahan jadwal dikarenakan menyesuaikan jadwal kegiatan perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang membutuhkan tanah serta bersamaan dengan jadwal sosialisasi dan konsultasi publik	Direncanakan kembali pada bulan berikutnya dan disesuaikan kembali dengan prencanaan pengadaan tanah

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	127.201.000	-7,56	-7,56	Belanja Perjalan Dinas Koordinasi pengadaan tanah mengalami perubahan jadwal dikarenakan menyesuaikan jadwal kegiatan perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang membutuhkan tanah serta bersamaan dengan jadwal sosialisasi dan konsultasi publik	disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pendukung kegiatan pada bulan berikutnya
7	Diseminasi Fungsi Zonasi Nilai Tanah Sebagai Acuan Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	9.000.000	-68,55	-68,56	menyesuaikan schedule petugas lapangan dari Kanwil BPN	direncanakan dilaksanakan pada bulan berikutnya
Seksi Fasilitas Permasalahan Pertanahan						
8	Sosialisasi tentang Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Tanah Kas Desa	50.900.000	0,00	-25,38	Fisik sudah direalisasikan, namun pembayaran belanja makan minum rapat, honorarium narasumber serta perjalanan dinas pada pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Klaten dilaksanakan bulan depan.	Masuk dalam progres keuangan bulan April
9	Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Sertipikasi Tanah Kas Desa	190.720.000	0,00	-7,81	Fisik sudah direalisasikan bersamaan dengan perjalanan dinas pelaksanaan Sosialisasi Sertipikasi LP2B dan TKD	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lain di bulan berikutnya
10	Pelaksanaan Mediasi Permasalahan Pertanahan	78.925.000	-0,81	-0,81	Belum ada permintaan mediasi permasalahan pertanahan lintas kabupaten/kota, sehingga proses mediasi belum dapat dilaksanakan	Telah dilakukan pendataan permasalahan pertanahan lintas kabupaten/kota dan dalam wilayah kabupaten/kota

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
11	Konsolidasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	54.200.000	-55,79	-55,79	Koordinasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan tanah musnah dengan pusat yang semula diagendakan bulan Maret ditunda karena personil ybs terpapar covid	Dijadwalkan kembali di bulan Mei
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan						
12	Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah Status Hak Pakai (HP) dan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)	25.955.000	0,00	-20,91	Menyesuaikan Jadwal Kanwil BPN Prov.Jateng dan BPKAD Prov. Jateng	koordinasi dengan Kanwil BPN dan BPKAD terkait waktu pelaksanaan
13	Pendampingan Proses Pengadaan Tanah dan Penanganan Dampak	24.350.000	-20,00	-20,00	Pendampingan belum dapat dilaksanakan karena belum adanya kesesuaian jadwal dengan Pengampu Kegiatan	berkoordinasi dengan Sub Koordinator Pengampu kegiatan
14	Konsultasi Pembinaan Pertanahan	30.467.000	0,00	-7,08	Efisiensi pelaksanaan kegiatan	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
15	Rapat Koordinasi Rencana Program Reforma Agraria, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	20.030.000	9,99	-10,14	- Progres Fisik Telah direalisasikan - Pengambilan di sesuaikan dengan harga pasar dan blangkon (Cetak dan ATK) - Narasumber Kemendagri tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara Rakortek Pertanahan	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
16	Pemantauan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (LP2B)	24.350.000	0,00	-5,66	Efisiensi pelaksanaan kegiatan	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
17	Penataan Akses Reforma Agraria Peningkatan Taraf Hidup dengan Program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pemanfaatan lahan	263.012.000	0,00	-1,17	Efisiensi pelaksanaan kegiatan	Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja

Bidang Keterpaduan PKP

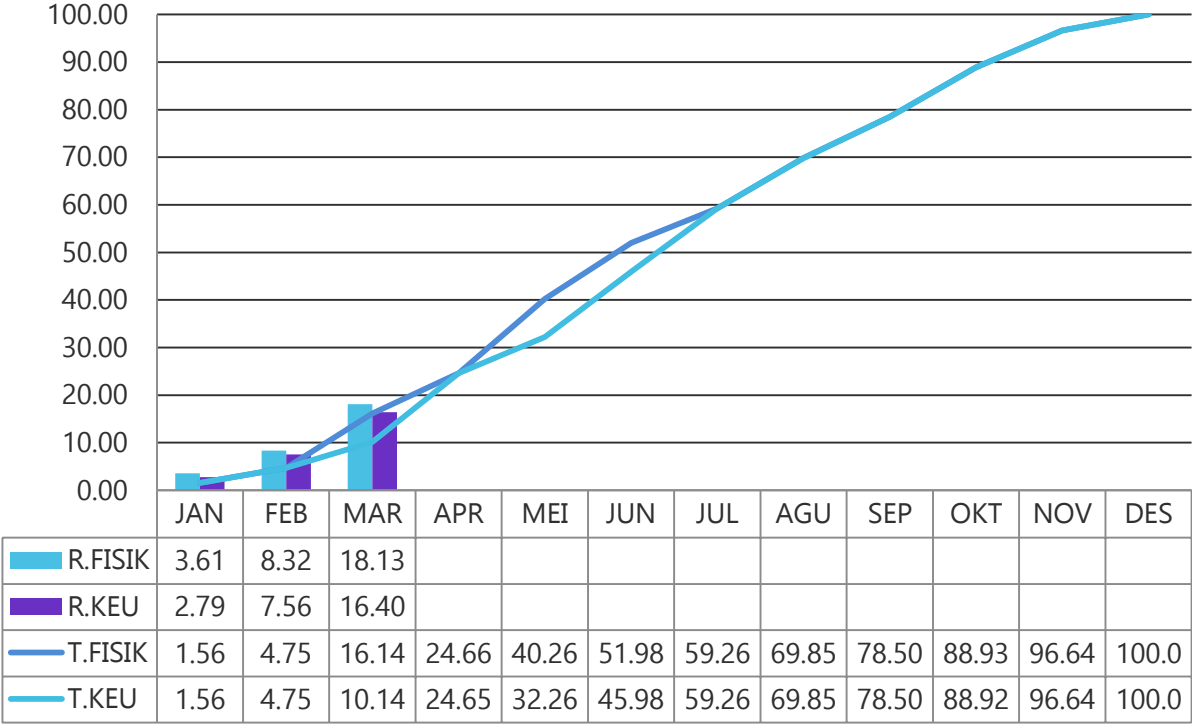

	Mar	April (Prognosis)
Target Fisik	16,14	24,66
Target Keu	10,14	24,65
Real. Fisik	18,13	23,12
Real. Keu	16,40	22,85
Dev. Fisik	1,99	-1,54
Dev. Keu	6,25	-1,81

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI S.D. MARET
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian	3 Dokumen	0 Dokumen
Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanian	5 Dokumen	0 Dokumen

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	360.000.000	-25,00	0,00	Proses pengadaan tertunda karena adanya pencermatan ulang KAK (Rencana terkontrak semula 1 April 2022)	Penandatanganan kontrak diperkirakan 12 April 2022
2	Penyediaan Honorarium Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	-50,00	-50,00	Honorarium Pejabat PBJ belum dibayarkan karena proses pengadaan masih berlangsung	Honorarium pengadaan barang/jasa akan dibayarkan setelah proses pengadaan selesai
Seksi Pengelolaan data PKPP						
3	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	44.744.000	0,00	-0,02	Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil	Menjadi Potensi SILPA



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Maret 2022

*) Data Masuk dari Bidang status Senin 4 April 2022

Bidang Perumahan

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 14/31 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
6		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
7		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
8		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
9		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
10		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
11		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI

20	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
21		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulsejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
22		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
23		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
24		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulsejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
25		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
26		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
27		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
28		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
29		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
30		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
31	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - SIMPERUM	100.000.000	Pengadaan Langsung	Batal lelang, sedang proses lelang ulang karena ada perubahan nilai ppn	

Tender

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender		

Swakelola Tipe IV oleh Kelompok Masyarakat

Jumlah SK Telah Ditandatangani: 47/47

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Tumanggal Kabupaten Purbalingga	120.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 23 Februari 2022	23 Februari 2022 - 22 Juli 2022 (150 hari)
2		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan	144.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
3		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bongas Kabupaten Pemalang	48.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 2 Maret 2022	2 Maret 2022 - 29 Juli 2022 (150 hari)
4		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sriwulan Kabupaten Demak	144.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
5		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Blerong Kabupaten Demak	72.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 4 Maret 2022	4 Maret 2022 - 31 Juli 2022 (150 hari)
6		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bedono Kabupaten Demak	84.000.000	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga	200.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (1 orang penerima bantuan mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
8		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Kebumen	250.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
9		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purworejo	150.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
10		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali	200.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
13	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Pekalongan	1.015.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
14		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Wonogiri	945.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
15		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Tegal	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI					
16	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan, Desa Sumogawe	280.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 21 Januari 2022.	
17		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan, Desa Polobogo	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 21 Januari 2022.	
18		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan, Desa Ketapang	420.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 20 Januari 2022.	
19		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan, Desa Timpik	455.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 20 Januari 2022.	
20		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Brondong	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	
21		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Kaliwungu	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	
22		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Gowong	140.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	
23		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Tegalsari	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	
24		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Purworejo, Kec. Bruno, Desa Brunorejo	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 16 Februari 2022.	

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
25	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Sapuran, Desa Glagah	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	
26		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Leksono, Desa Kalimendong	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	
27		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Wonosobo, Kec. Kertek, Desa Bejiarum	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	
28		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Cilacap, Kec. Dayeuhluhur, Desa Bingkeng	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 8 Februari 2022.	
29		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Cilacap, Kec. Dayeuhluhur, Desa Dayeuhluhur	770.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 8 Februari 2022.	
30		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Gondang, Desa Wonotolo	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	
31		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Mondokan, Desa Kedawung	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	
32		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Sambungmacan, Desa Banaran	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	
33		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Sidoharjo, Desa Taraman	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	
34		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sragen, Kec. Kalijambe, Desa Wonorejo	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 13 Januari 2022.	
35		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Selokaton	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	
36		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Dayu	245.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	
37		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Tuban	175.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	
38		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Karanganyar, Kec. Gondangrejo, Desa Dayu	140.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 18 Januari 2022.	
39		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Pemalang, Kec. Watukumpul, Desa Tambi	630.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	
40		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Pemalang, Kec. Watukumpul, Desa Majakerta	525.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Paguyangan, Desa Paguyangan	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 11 Januari 2022.	
42		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Jatibarang, Desa Kebogadung	350.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 17 Januari 2022.	
43		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Brebes, Kec. Songgom, Desa Dukuhmaja	315.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 19 Januari 2022.	
44		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Pengkol	210.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	
45		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Baran	280.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari2022.	
46		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Nguter, Desa Pondok	70.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	
47		Belanja Bantuan Stimulan Material Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Kabupaten Sukoharjo, Kec. Bendosari, Mojorejo	105.000.000	SK Penerima Bantuan ditandatangani 10 Februari 2022.	

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender		Juli
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender		Juli
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender		Juli
5		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi	Proses review KAK	Mei
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi	Proses review KAK	Mei
7		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi	Proses review KAK	Mei

Pengadaan Langsung

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
8	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 8 Maret 2022	60 hari
9		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak tanggal 15 Maret 2022	60 hari
10		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
11		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
12		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
13		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
14		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung	Proses review KAK	April


Bidang Keterpaduan PKP

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Upload dokumen penawaran	Maret
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Upload dokumen penawaran	Maret
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Upload dokumen penawaran	Maret
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung		April
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 10 Maret 2022	Maret s.d. Oktober 2022


Sekretariat

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung		

Realisasi Belanja Blangkon

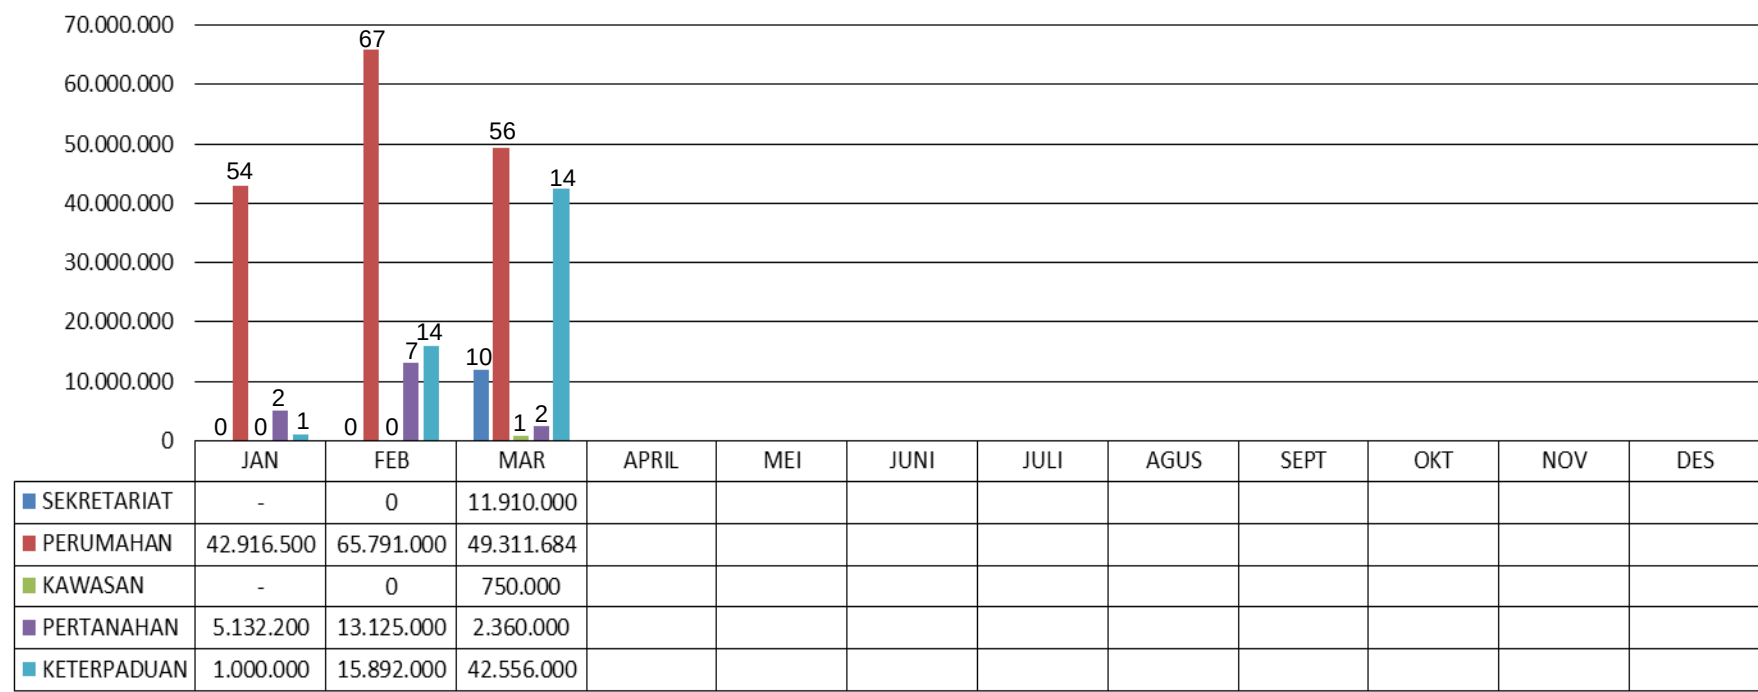


Catatan:
- Sumber data: <https://blangkonjateng.jatengprov.go.id/report/transaksi-skpd> status 5 April 2022




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Maret 2022


Konten Media Sosial



Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos




Laporan Hasil Survey Kepuasan Website



■ Sangat Informatif	126	131	136								
■ Cukup Informatif	34	35	36								
■ Kurang Informatif	31	31	31								

Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website

Minggu IV



PENEKANAN

1. Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang **BELUM MENGUMPULKAN Perjanjian Kinerja (PK) TA 2022 dan Laporan Kinerja (LKj) TA 2021** ke Subbag Program status **Senin, 4 April 2022** adalah sebagai berikut:
 - **PK 2022:** Bid. Pertanahan (Kabid & 2 SubKoor), Bid. Perumahan (Kabid & 2 SubKoor) baik soft maupun hard file.
 - **LKj 2021:** Kabid Pertanahan (soft + hard copy)
2. Seluruh ASN harap menaati ketentuan presensi dengan **segera mengumpulkan SPT** selambat-lambatnya **1 minggu dari tanggal perjalanan dinas** yang tertera.
3. Menindaklanjuti Surat Sekda Jateng No. 800/1741 tanggal 5 April 2022 hal Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemprov Jateng Selama PPKM pada Masa Pandemi Covid-19, bahwa **pada tanggal 5 s.d. 18 April 2022 diberlakukan WFO 100% (tidak ada WFH).**
4. Perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022.
5. Untuk penyampaian SPJ mohon untuk tetap memperhatikan kesepakatan setiap tanggal 25 setiap bulannya.



Terima
Kasih



RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR FEBRUARI 2022




**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Realisasi Fisik & Anggaran Status Akhir Februari TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA 2022

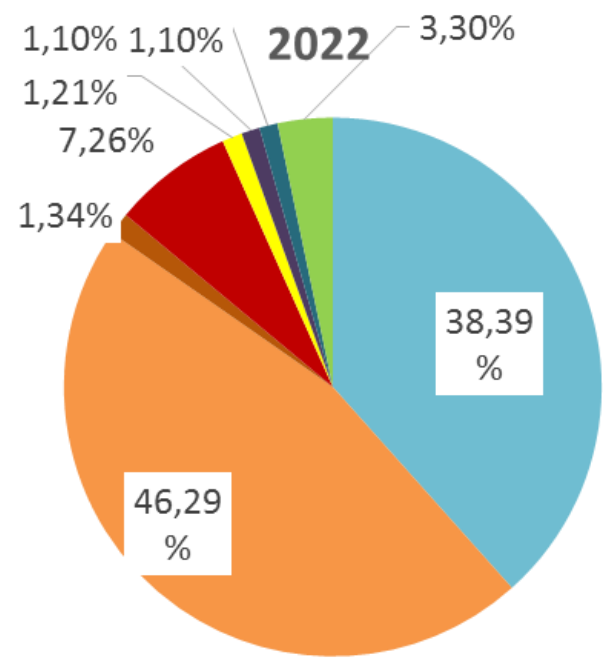

NO.	PROGRAM	2022	
		(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,39	17.439.693.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	46,29	21.025.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,34	610.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,26	3.300.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,30	1.500.000.000
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1,21	550.000.000
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,10	500.000.000
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1,10	500.000.000
	TOTAL	100	45.424.693.000




Realisasi Fisik & Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir Februari 2022

^{*)}Realiasi keuangan diambil dari e-controlling Status 4 Maret 2022

^{*)} Data Masuk dari Bidang status Jum'at 4 Maret 2022

Disperakim

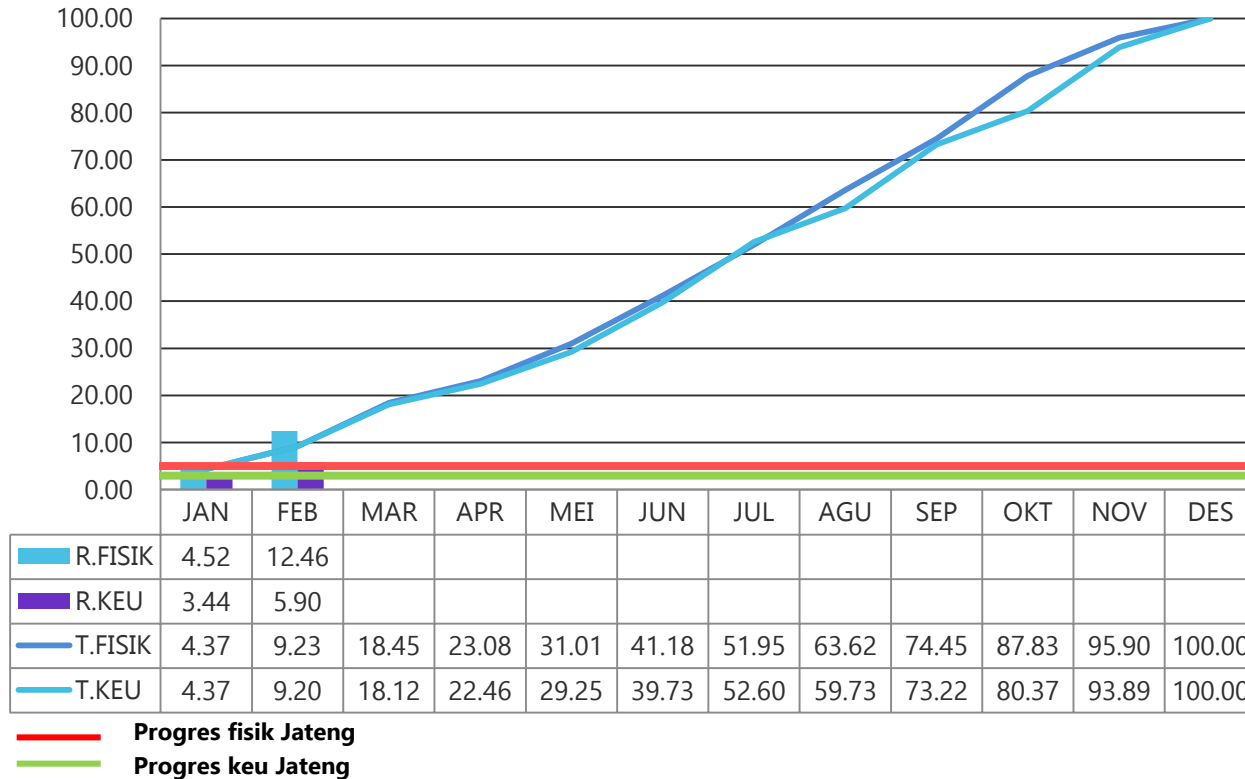


	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	9,23	18,45
Target Keu	9,20	18,12
Real. Fisik	12,46	23,00
Real. Keu	5,90	22,65
Dev. Fisik	3,23	4,55
Dev. Keu	-3,30	4,52

**PROVINSI
JAWA
TENGAH**
(Status 7
Maret
2022)

Target Fisik	6,1
Target Keu	5,44
Real. Fisik	5,29
Real. Keu	3,82
Dev. Fisik	-0,81
Dev. Keu	-1,62

Sekretariat

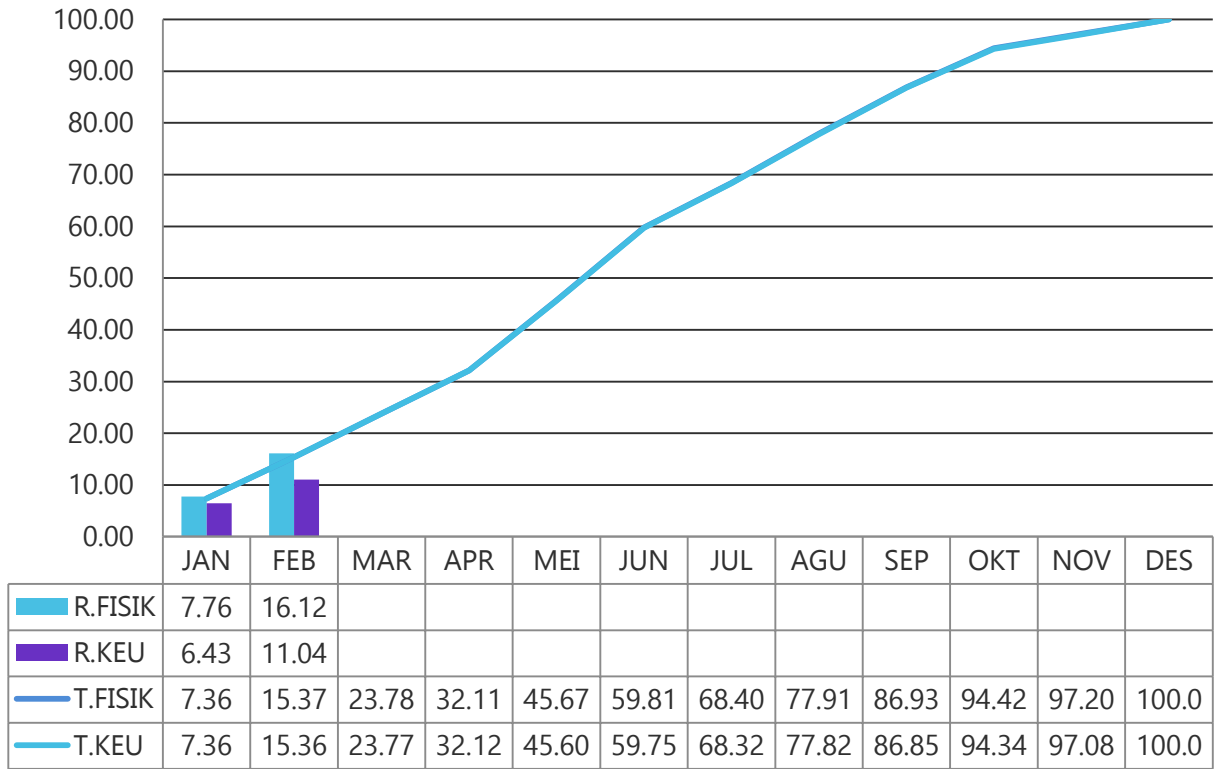

	Feb	Mar (Prognosis)
Target Fisik	15,37	23,78
Target Keu	15,36	23,77
Real. Fisik	16,12	23,96
Real. Keu	11,04	23,84
Dev. Fisik	0,75	0,18
Dev. Keu	-4,32	0,08


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Program						
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	157.428.000	0,00	-4,32	Rakor persiapan penyusunan renja 2023, telah dilaksanakan akhir Februari. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan masuk ke progres bulan berikutnya.	Akan masuk dalam SPJ bulan berikutnya.
Subbag Keuangan						
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.524.693.000	0,00	-6,41	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
3	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	441.840.000	0,00	-1,80	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	4.000.000	0,00	-31,25	Fisik sudah realisasi, keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Akan masuk dalam SPJ bulan berikutnya.
5	Pelaksanaan Rapat Persiapan Sosialisasi Semesteran dan Sosialisasi Semesteran	21.700.000	-50,00	-50,00	Pelaksanaan Rapat Persiapan Sosialisasi ditunda menyesuaikan dengan terbitnya regulasi Harmonisasi Pajak	Dijadwalkan kembali akhir Maret/awal April
6	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Triwulanan	18.300.000	0,00	-7,43	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan	Akan digunakan pada rapat berikutnya

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Sub-Sub Kegiatan	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Umum dan Kepegawaian						
7	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Dinas	250.000.000	0,00	-0,96	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
8	Pengadaan Alat Studio	196.750.000	-32,00	-31,98	Pengadaan alat studio ditunda karena adanya revisi desain	Akan direalisasikan di bulan Maret
9	Penyediaan Pelayanan Surat Menyurat	95.000.000	0,00	-0,86	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
10	Pembayaran Listrik	600.000.000	0,00	-6,66	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya
11	Pengadaan Jasa Keamanan	825.000.000	0,00	-1,88	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan	Dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya

Bidang Perumahan

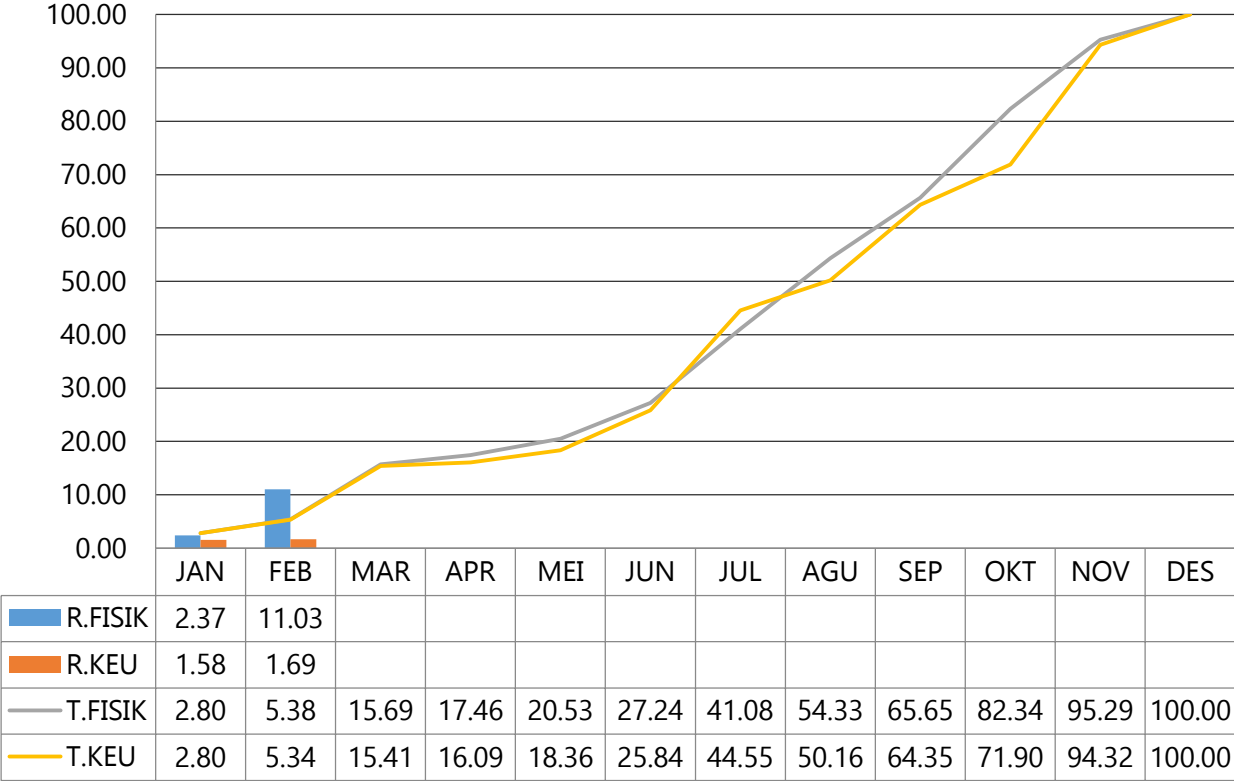

	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	5,38	15,69
Target Keu	5,34	15,41
Real. Fisik	11,03	25,43
Real. Keu	1,69	25,05
Dev. Fisik	5,65	9,74
Dev. Keu	-3,65	9,65

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.826.000	-2,22	-2,22	Acara rapat persiapan ditunda untuk mendukung acara bimtek RTLH di 29 Kabupaten	Dijadwalkan kembali di bulan Maret
2	Koordinasi Lapangan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	178.512.000	-5,03	-5,03	Koordinasi lapangan ditunda untuk mendukung acara bimtek RTLH di 29 Kabupaten	Dijadwalkan kembali di bulan Maret
3	Rapat Persiapan dan Rapat Pendukung Kegiatan Pendataan dan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	1.500.000	15,00	-50,00	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
4	Rapat Persiapan dan Rapat Pendukung Kegiatan Pendataan dan Verivali Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	1.500.000	-51,00	-100,00	- Acara rapat persiapan yang seharusnya dilaksanakan 2x baru dapat dilaksanakan 1x karena untuk mendukung acara bimtek RTLH di 29 Kabupaten. - Realisasi keuangan belum terbayarkan karena dilaksanakan di akhir bulan Februari	- Dijadwalkan kembali di bulan Maret - Masuk sebagai progres bulan Maret
5	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	5,57	-12,59	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	0,18	-0,47	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
7	Bimtek Validasi Data SIMPERUM	13.519.000	1,18	-4,54	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
8	Sosialisasi Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Sederhana Sehat atau Relokasi Program Pemerintah	7.703.000	-83,37	-94,52	Acara sosialisasi ditunda untuk mendukung acara bimtek RTLH di 29 Kabupaten	Dijadwalkan kembali di tanggal 7 Maret 2022
9	Workshop Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	57.830.000	0,42	-97,21	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
10	Sosialisasi Hunian Tetap (HUNTAP), Hunian Sementara (HUNTARA), dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat / Komunitas Rusus/Rusun di Jawa Tengah	11.100.000	1.99	-0.27	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
11	Sosialisasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Terdampak Bencana	8.857.000	0,29	-0,56	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
12	Pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah, HUNTAP, HUNTARA, Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masy.	83.787.000	0,00	-0,10	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		

Seksi Perumahan Umum						
1	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	2.925.000	0,00	-100,00	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Maret
2	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	40.266.000	-40,28	-63,06	Pelaksanaan dialihkan fokus ke Persiapan PB Bencana dan PB Relokasi	Pelaksanaan dilaksanakan bulan Maret - April
3	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana	141.965.000	0,65	-2,73	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Maret
4	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	13.750.000	0,00	-16,36	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
5	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	3.120.000	77,56	-7,21	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
6	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	58.140.000	18,77	-9,75	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya

--	--	--	--	--	--	--


No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
7	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	78.170.000	0,40	-4,17	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
8	Rapat Koordinasi Pembangunan Rusus-Rusun	3.000.000	16,67	-25,00	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
9	Pendampingan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Lingkungan	65.524.000	1,92	-5,17	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Maret
10	Pendampingan Pelaksanaan Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	99.206.000	4,57	-0,40	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
11	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	9.000.000	-8,33	-8,33	Belanja makan minum belum dibayarkan	Akan dibayarkan di bulan Maret
12	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah	169.625.000	0,00	-2,05	Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil	Menjadi Potensi SILPA

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		

Seksi Perumahan Swadaya

1	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	3.300.000	43,18	-16,52	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
2	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	994.350.000	-21,21	-33,80	Bimtek kerjasama dengan pihak ketiga belum semuanya dilakukan karena harus menyesuaikan jadwal pihak ketiga	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Maret-April
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	7.500.000	3,21	-14,67	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
4	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	2.525.000	21,46	-38,61	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
	Persiapan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM	1.325.000	0,00	-100,00	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya
5	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	915.129.000	-9,94	-22,21	Bimtek kerjasama dengan pihak ketiga belum semuanya dilakukan karena harus menyesuaikan jadwal pihak ketiga	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Maret-April
5	Koordinasi Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	277.010.000	-1,73	-27,20	Bimtek kerjasama dengan pihak ketiga belum semuanya dilakukan karena harus menyesuaikan jadwal pihak ketiga	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Maret-April
6	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	746.719.000	0,61	-1,24	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Progres keuangan masuk ke bulan selanjutnya

Bidang Kawasan Permukiman

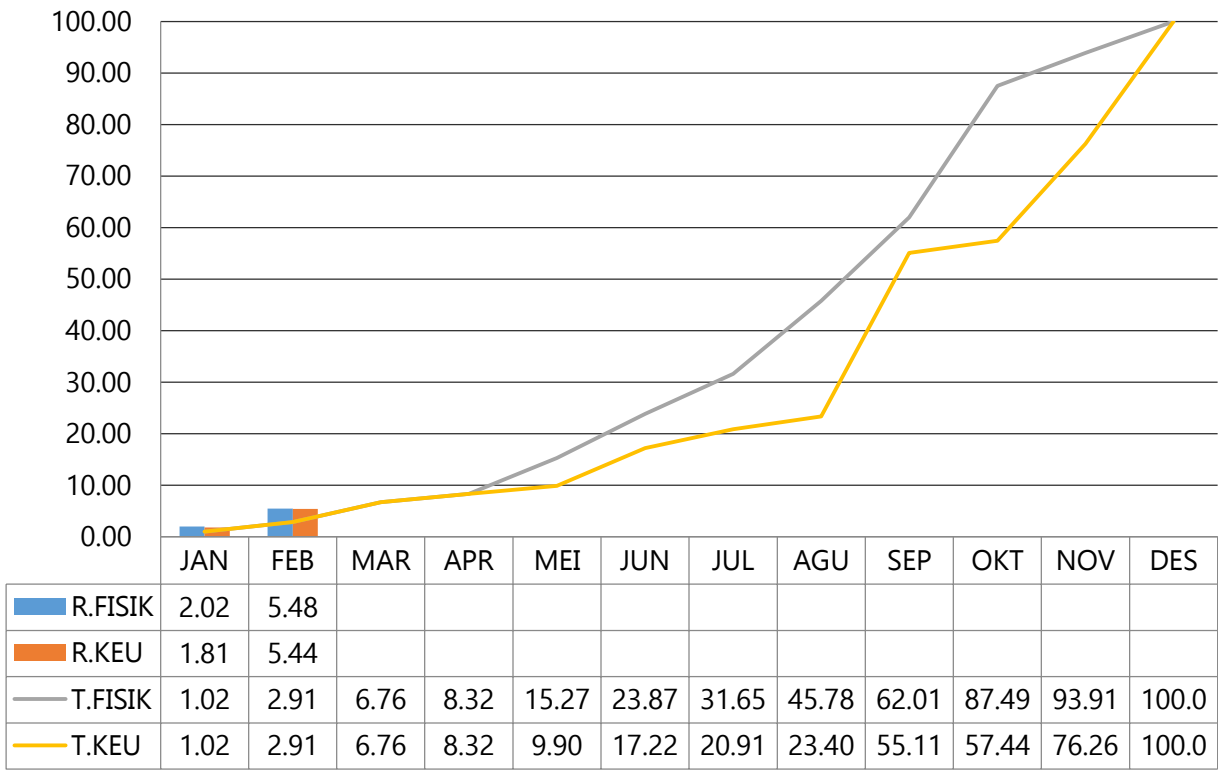

	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	2,91	6,76
Target Keu	2,91	6,76
Real. Fisik	5,48	7,74
Real. Keu	5,44	7,74
Dev. Fisik	2,57	0,98
Dev. Keu	2,53	0,98


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	FGD Pendataan Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	18.050.000	-94,46	-94,46	Perubahan jadwal pelaksanaan FGD Belanja Hibah untuk Badan Keswadayaan Masyarakat untuk Penanganan Kawasan Kumuh karena masih dalam proses pematangan prioritasasi Kabupaten/Kota yang akan menerima hibah PSU	FGD dijadwalkan ulang pada tanggal 22 Maret di Kab. Karanganyar, 23 Maret di Kab. Pati, dan 24 Maret di kantor Disperakim Prov. Jateng
2	Koordinasi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	24.925.000	0,00	-1,69	Kegiatan sudah dilaksanakan	SPJ dilaksanakan bulan Maret
2	Koordinasi Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	106.112.000	0,00	-0,01	Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil	Menjadi Potensi SILPA
	Persiapan Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	35.388.000	-8,70	-8,70	Perjalanan dinas persiapan studi di Kab. Blora dan Rembang ditunda karena ada perubahan pada KAK dokumen studi	Dijadwalkan kembali di bulan Maret

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	-7,69	-7.69	Adanya perubahan rencana perjalanan dinas terkait koordinasi pelaksanaan integrasi penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh dan Bankeu Sarpras Kab/Kota karena menyesuaikan dengan kesiapan kabupaten/kota	Penjadwalan ulang perjalanan dinas bulan Maret
	FGD Pendampingan Bankeu Kab/Kota 2022	6.500.000	-100,00	-100,00	Penjadwalan ulang pelaksanaan FGD karena masih menunggu hasil koordinasi terkait identifikasi lokasi bankeu sarpras dengan Kabupaten/Kota	FGD dijadwalkan ulang pada bulan Maret
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kawasan Permukiman	126.851.000	0,00	-1,08	Efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas	Akan dioptimalkan untuk kegiatan bulan berikutnya
Seksi Pengembangan PSU						
5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PSU Permukiman Provinsi Jawa Tengah	133.262.000	0,00	-0,32	-Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil -Penyesuaian honorarium tenaga penyuluhan	Menjadi Potensi SILPA

Bidang Pertanahan

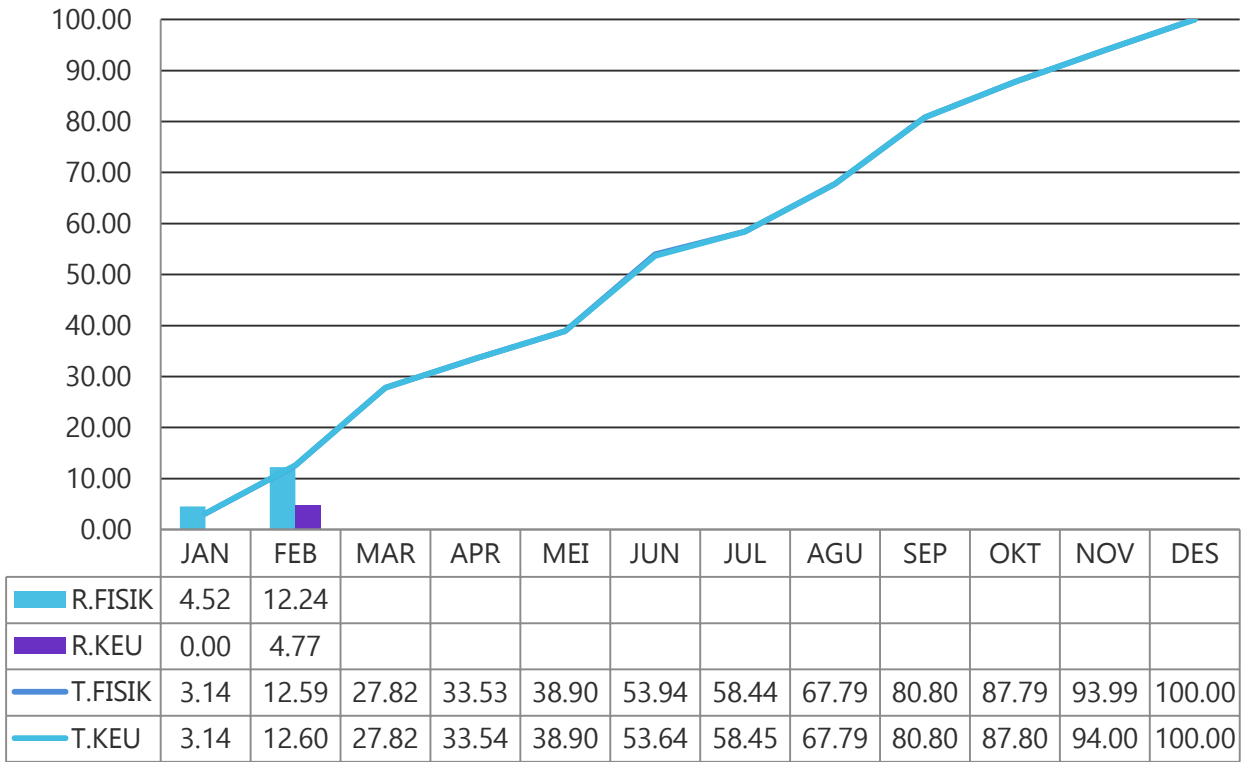

	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	12,59	27,82
Target Keu	12,60	27,82
Real. Fisik	12,24	23,11
Real. Keu	4,77	21,14
Dev. Fisik	-0,35	-4,71
Dev. Keu	-7,83	-6,68


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Koordinasi Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah	10.000.000	-33,99	-34,00	Penyesuaian schedule Kegiatan dengan Kanwil BPN dikarenakan petugas lapangan BPN terpapar virus covid 19	dijadwalkan bulan maret
2	Survei Pendahuluan Guna Penentuan Koordinat Lokasi Sampel Bidang Tanah	9.000.000	-32,22	-32,22	Penyesuaian schedule Kegiatan dengan Kanwil BPN dikarenakan petugas lapangan BPN terpapar virus covid 19	dijadwalkan bulan maret
3	Pengambilan Data Lapang atau Koordinat Titik Sampel Lokasi Bidang Tanah	9.000.000	-32,22	-32,22	Penyesuaian schedule Kegiatan dengan Kanwil BPN dikarenakan petugas lapangan BPN terpapar virus covid 19	dijadwalkan bulan maret
4	Rapat Verifikasi Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	16.875.000	-8,00	-8,00	Penyesuaian schedule Kegiatan dengan Kanwil BPN dikarenakan petugas lapangan BPN terpapar virus covid 19	dijadwalkan bulan maret
5	Penyampaian Penjelasan Rencana Pembangunan secara langsung kepada masyarakat di Lokasi Rencana Pembangunan	103.600.000	5,34	-13,62	Fisik sudah realisasi, keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Maret
6	Identifikasi Kepemilikan Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan	74.830.000	-15,05	-15,05	disesuaikan dengan pengajuan penlok perpanjangan/pembaruan penetapan lokasi dari instansi yang membutuhkan tanah	dijadwalkan kembali bulan berikutnya sesuai pengajuan dari instansi yang membutuhkan tanah

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
7	Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pada Trase atau Basic Design di Lokasi Rencana Pembangunan	74.844.000	-13,92	-13,92	disesuaikan dengan pengajuan penlok perpanjangan/pembaruan penetapan lokasi dari instansi yang membutuhkan tanah	dijadwalkan kembali bulan berikutnya sesuai pengajuan dari instansi yang membutuhkan tanah
8	Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	127.201.000	-14,62	-14,62	- Belanja ATK diseuaikan dengan kebutuhan - Perubahan jadwal koordinasi pada bulan february dikarenakan menyesuaikan jadwal kegiatan	- Digunakan sebagai pendukung kegiatan pada bulan berikutnya - Penyesuaian jadwal kembali di bulan berikutnya
9	Diseminasi Fungsi Zonasi Nilai Tanah Sebagai Acuan Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	9.000.000	-32,22	-32,22	tim pelaksana dari Kanwil BPN terpapar covid sehingga rapat koordinasi ditunda	dijadwalkan bulan maret
Seksi Fasilitas Permasalahan Pertanahan						
10	Sosialisasi tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Tanah Kas Desa	50.900.000	-40,12	-40,12	Sosialisasi ditunda karena menyesuaikan dengan pelaksanaan PTSL dengan Kantor Pertanahan di Kabupaten	Sosialisasi di 5 kabupaten akan dilaksanakan pada bulan Maret
11	Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B dan Sertifikasi Tanah Kas Desa	190.720.000	-5,71	-14,80	Koordinasi persiapan dan pelaksanaan sertifikasi LP2B dan TKD ditunda karena menyesuaikan dengan pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten dan sosialisasi sertifikasi LP2B	Sosialisasi akan dilaksanakan di Bulan April

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
12	Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan untuk Pembangunan Nasional	10.125.000	6,67	-22,22	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Maret
13	Pelaksanaan Mediasi Permasalahan Pertanahan	78.925.000	-2,44	-7,74	Belum ada permintaan mediasi permasalahan pertanahan lintas kabupaten/kota, sehingga proses mediasi belum dapat dilaksanakan	Telah dilakukan pendataan permasalahan pertanahan lintas kabupaten/kota dan dalam wilayah kabupaten/kota
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan						
14	Rapat Koordinasi Kendala Implementasi Peraturan Pertanahan di Jawa Tengah, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal	16.751.000	0,00	-2,98	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Maret
15	Rapat Koordinasi Rencana Program Reforma Agraria, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	20.030.000	-10,13	-90,01	- Pengambilan di sesuaikan dengan harga pasar dan blangkon (Cetak dan ATK) - Narasumber Kemendagri tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara Rakortek Pertanahan	- Akan dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja
16	Pemantauan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (LP2B)	24.350.000	14,34	-20,00	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Maret
17	Penataan Akses Reforma Agraria Peningkatan Taraf Hidup dengan Program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pemanfaatan lahan	263.012.000	2,17	-1,58	Progres fisik sudah direalisasikan, progres keuangan akan dibayarkan pada bulan berikutnya	Masuk dalam progres keuangan bulan Maret

Bidang Keterpaduan PKP

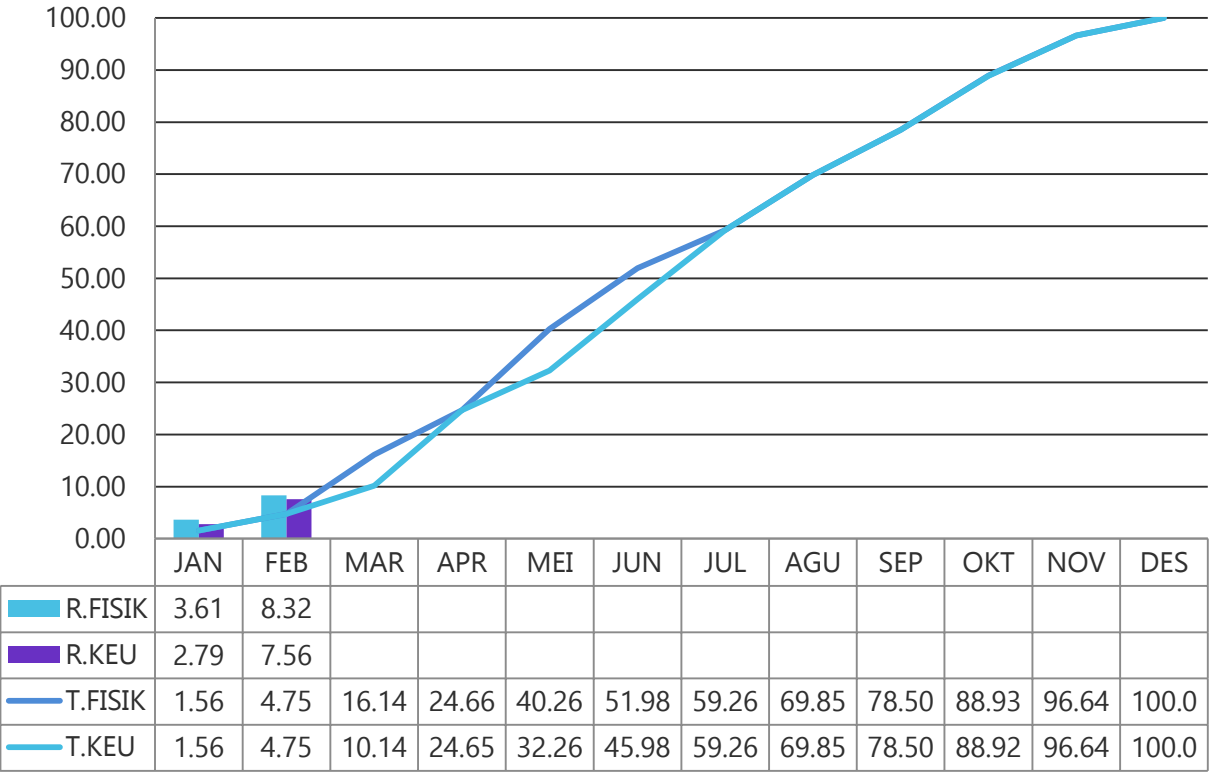

	Feb	Maret (Prognosis)
Target Fisik	4,75	16,14
Target Keu	4,75	10,14
Real. Fisik	8,32	17,59
Real. Keu	7,56	15,37
Dev. Fisik	3,57	1,45
Dev. Keu	2,81	5,23

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Fasilitasi Pokja/ Forum PKP dan Pengembangan Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	88.571.000	1,30	-0,73	Rakor Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah tidak menghadirkan narasumber	Akan dioptimalkan untuk kegiatan bulan berikutnya
Seksi Pengelolaan data PKPP						
2	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	44.744.000	0,00	-0,01	Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil	Menjadi Potensi SILPA



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Februari 2022

*) Data Masuk dari Bidang status Jum'at 4 Maret 2022

Bidang Perumahan

Pengadaan Langsung (Terkontrak: 14/30 Paket)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
6		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
7		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
8		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 25 Februari 2022	25 Feb – 26 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
9		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
10		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
11		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses Penawaran Kontrak	
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI

20	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
21		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
22		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
23		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
24		Jasa Konsultansi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
25		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
26		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
27		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
28		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
29		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
30		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember

Tender

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender		Oktober - Desember

Swakelola Tipe IV

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Tumanggal Kabupaten Purbalingga	120.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 23 Februari 2022	23 Februari 2022 - 22 Juli 2022 (150 hari)
2		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan	144.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
3		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bongas Kabupaten Pemalang	48.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 2 Maret 2022	2 Maret 2022 - 29 Juli 2022 (150 hari)
4		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sriwulan Kabupaten Demak	144.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
5		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Blerong Kabupaten Demak	72.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 4 Maret 2022	4 Maret 2022 - 31 Juli 2022 (150 hari)
6		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bedono Kabupaten Demak	84.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan Ditandatangani 21 Februari 2022	21 Februari 2022 - 20 Juli 2022 (150 hari)
7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga	200.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (1 orang penerima bantuan mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
8		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Kebumen	250.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
9		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purworejo	150.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
10		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali	200.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
13	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Pekalongan	1.015.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
14		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Wonogiri	945.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
15		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Tegal	210.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22

Bidang Kawasan Permukiman

Tender & Seleksi

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender		Juli
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender		Juli
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender		Juli
5		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi		Mei
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi		Mei
7		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi		Mei

Pengadaan Langsung

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
8	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Evaluasi Penawaran	April
9		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung	Evaluasi Penawaran	April
10		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

(lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
11		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
12		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
13		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
14		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung		April


Bidang Keterpaduan PKP

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Terkontrak Tanggal 1 Maret 2022	Maret-Desember
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK & HPS	Maret
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK & HPS	Maret
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK & HPS	Maret
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Pengadaan Langsung		April
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK & HPS	Maret


Sekretariat

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	150.000.000	Pengadaan Langsung		

Realisasi Belanja Blangkon

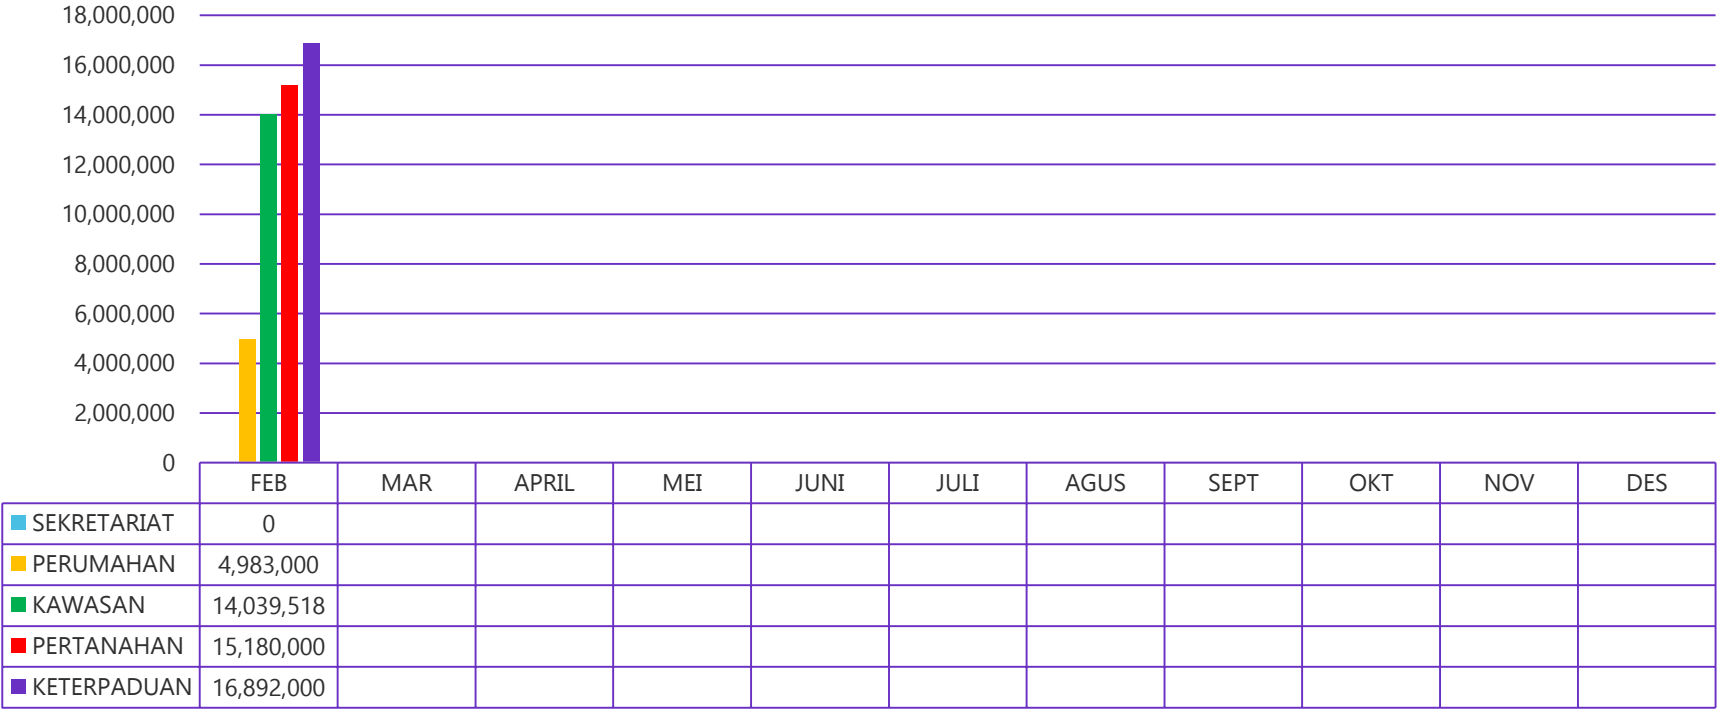

*) Data Masuk dari Bidang status Jum'at 4 Maret 2022



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Februari 2022


Respon LaporGub




TOTAL

12


Konten Media Sosial




Konten Berita Web Dinas

[illegible]

Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos




Laporan Hasil Survey Kepuasan Website

[illegible]

Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website

Minggu IV



PENEKANAN

1. Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang **belum mengumpulkan Perjanjian Kinerja TA 2022 dan Laporan Kinerja (LKj) TA 2021** ke Subbag Program s.d. **Senin, 7 Maret 2022** adalah sebagai berikut:
 - **PK 2022:** semua Eselon III, IV dan Sub Koordinator.
 - **LKj 2021:**
 - **Kabid Pertanahan (soft + hard copy)**
 - **Sub Koordinator Fasilitas Pengadaan Tanah (soft + hard copy)**
2. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Disperakim No. 55/SEK-UMPEG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 hal Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2022, dimohon untuk seluruh Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang **belum mengumpulkan Indikator Kinerja Individu (IKI) TA 2022** segera mengumpulkan ke Subbag Umpeg paling lambat **Rabu, 9 Maret 2022**.
3. Mohon bagi ASN di lingkungan Disperakim yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk **segera mengirimkan bukti pelaporan ke Subbag Keuangan** paling lambat **15 Maret 2022**. Adapun rekap jumlah yang belum melaporkan:

	SEKRETARIAT	PERUMAHAN	KAWASAN	PERTANAHAN	KETERPADUAN	TOTAL
SUDAH	13	3	1	3	1	21
BELUM	17	14	17	8	9	65



Terima
Kasih

RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JANUARI 2022



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**




OUTLINE

1. Komposisi Anggaran TA 2022
2. Pelaporan Progres Pelaksanaan APBD Status Akhir Januari TA 2022
3. Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media
5. Penekanan

KOMPOSISI ANGGARAN APBD

NO	BIDANG - SEKRETARIAT	PAGU ANGGARAN 2022
1	Sekretariat	17.439.693.000
2	Perumahan	21.025.000.000
3	Kawasan Permukiman	3.910.000.000
4	Pertanahan	1.550.000.000
5	Keterpaduan Pkp	1.500.000.000
TOTAL DINAS		45.424.693.000

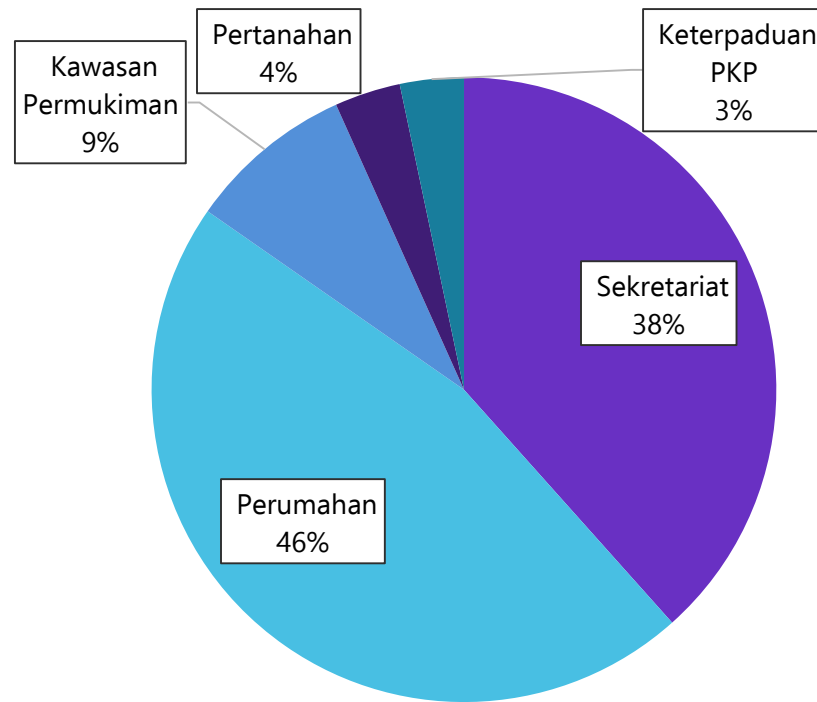




Realisasi Anggaran APBD^{*)}

Status Akhir Januari 2022


^{*)}Realiasi keuangan diambil dari e-controlling Status 3 Feb 2022

Disperakim

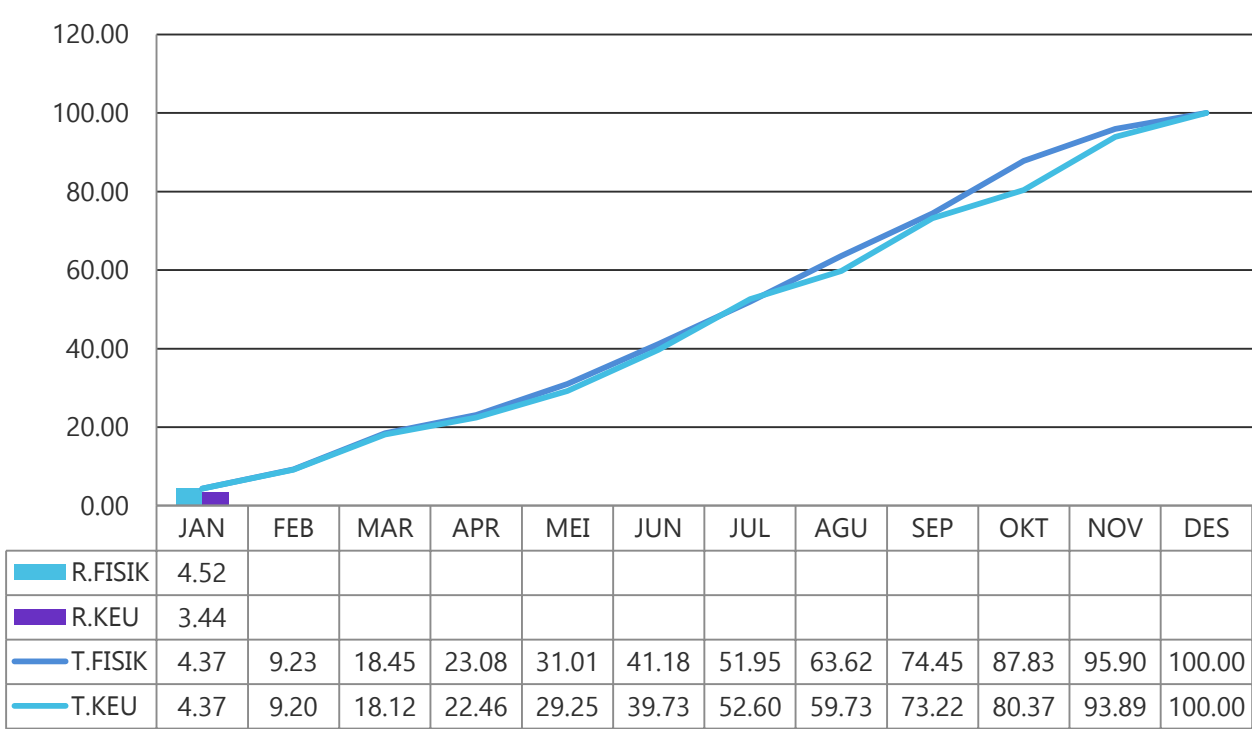

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	4,37	9,23
Target Keu	4,37	9,20
Real. Fisik	4,44	12,08
Real. Keu	3,60	11,91
Dev. Fisik	0,15	2,85
Dev. Keu	-0,93	2,74

Sekretariat

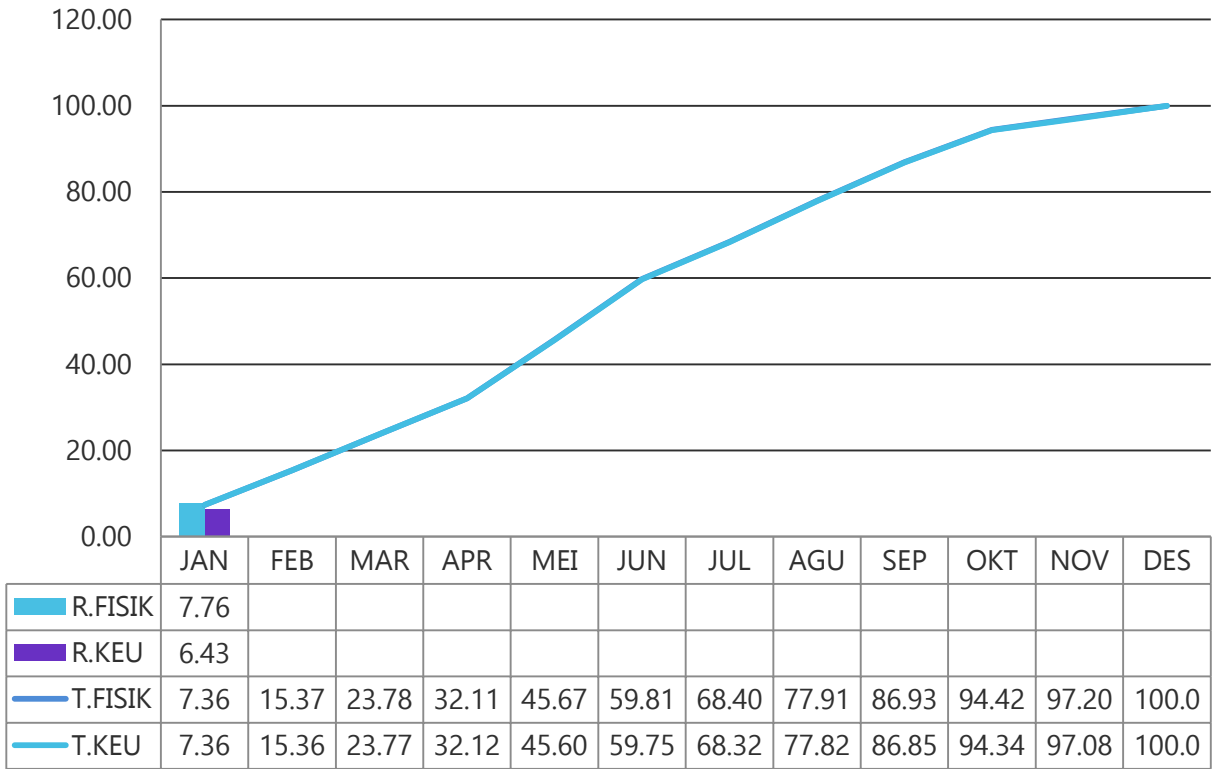


	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	7,36	15,37
Target Keu	7,36	15,36
Real. Fisik	7,76	15,52
Real. Keu	6,43	15,49
Dev. Fisik	0,40	0,15
Dev. Keu	-0,93	0,13

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Subbag Program						
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	157.428.000	0,00	-1,59	Belanja Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Sosialisasi Rumpun Infrastruktur telah dilaksanakan pada Minggu ke-4 bulan Januari	Akan masuk dalam SPJ bulan berikutnya.
Subbag Keuangan						
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.524.693.000	0,00	-1,23	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	
3	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	441.840.000	0,00	-8,05	Belum ada SK Pengelola Keuangan sehingga honor belum dapat disalurkan	Pembayaran honor pengelola keuangan menunggu turunnya SK
4	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.160.000	0,00	-8,33	Honorarium Pejabat Pengadaan belum disalurkan karena belum ada pengadaan barang/jasa yang menggunakan pejabat pengadaan	Menunggu adanya pengadaan barang/jasa
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Triwulanan	18.300.000	0,00	-7,43	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan	Akan digunakan pada rapat berikutnya
Subbag Umum dan Kepegawaian						
6	Pembayaran Listrik	600.000.000	0,00	-3,05	Dibayarkan sesuai dengan tagihan	
7	Pengadaan Jasa Keamanan	825.000.000	0,00	-1,08	Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan	

Bidang Perumahan

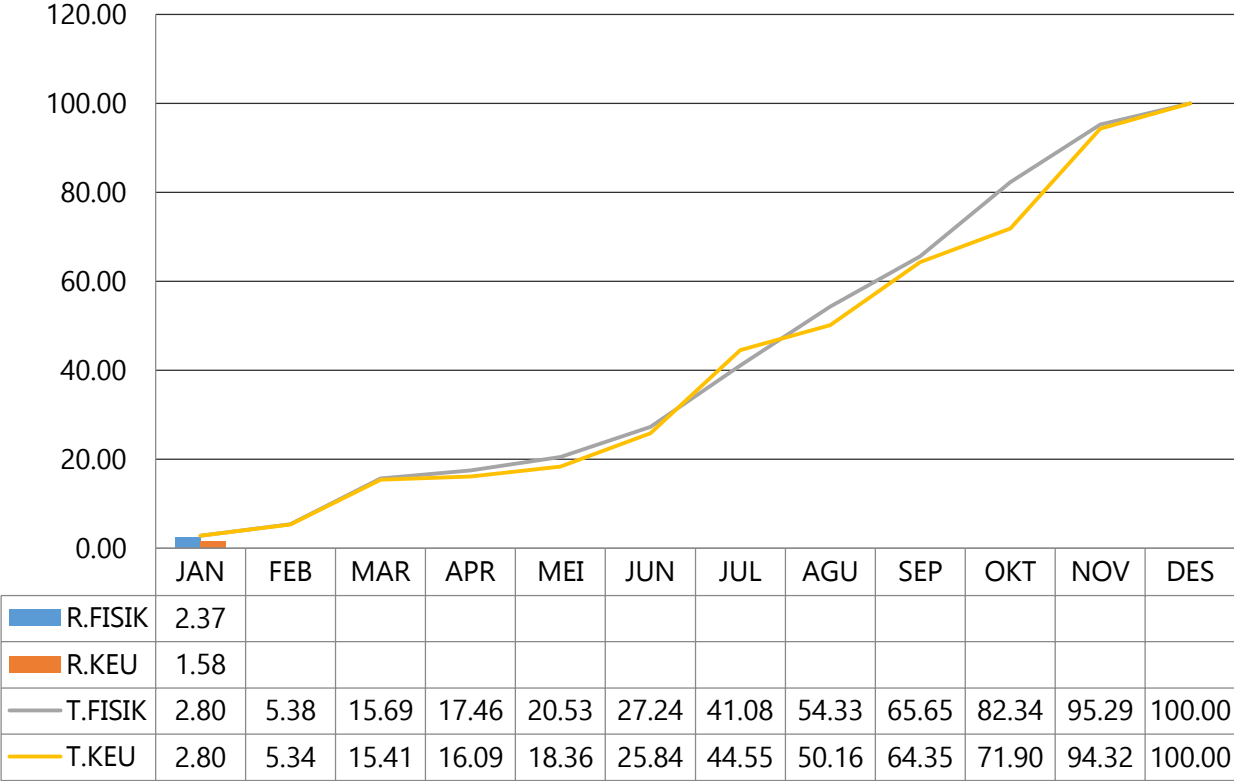

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	2,80	5,38
Target Keu	2,80	5,34
Real. Fisik	2,37	10,84
Real. Keu	1,58	10,50
Dev. Fisik	-0,43	5,46
Dev. Keu	-1,22	5,17

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan						
1	Rapat Persiapan dan Rapat Pendukung Kegiatan Pendataan dan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	1.500.000	-50,00	-50,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Akan diagendakan kembali di bulan Februari
2	Rapat Persiapan dan Rapat Pendukung Kegiatan Pendataan dan Verivali Calon Penerima bantuan material Rumah bagi korban bencana alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah	1.500.000	-50,00	-50,00	Kegiatan belum dilaksanakan	Akan diagendakan kembali di bulan Februari
3	Pelaksanaan Verivali Lapangan calon penerima manfaat Rumah Sederhana Sehat	2.036.945.000	0,09	-0,04	Kegiatan sudah dilaksanakan di akhir bulan Januari	Akan di-SPJkan di bulan Februari
4	Bimtek Validasi Data SIMPERUM	13.519.000	-1,76	-1,77	Belanja ATK untuk Bimtek Validasi Data Simperum belum dilaksanakan	Dibelanjakan di bulan Februari
5	Sosialisasi Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Sederhana Sehat atau Relokasi Program Pemerintah	7.703.000	-0,47	-0,47	Belanja ATK belum dilaksanakan	Dibelanjakan di bulan Februari

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
6	Workshop Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	57.830.000	-7,96	-7,96	Pelaksanaan Kegiatan yang semula direncanakan bulan Januari, baru terlaksana pada 7 Februari 2022	Akan masuk dalam progres bulan berikutnya
7	Sosialisasi Hunian Tetap (HUNTAP), Hunian Sementara (HUNTARA), dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat / Komunitas Rusus/Rusun di Jawa Tengah	11.100.000	1,86	-0,14	ATK Sudah dibelanjakan namun belum SPJ	Akan di-SPJkan di bulan Februari
8	Sosialisasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Terdampak Bencana	8.857.000	-0,85	-0,85	Belanja ATK belum dilaksanakan	Dibelanjakan di bulan Februari
9	Pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah, HUNTAP, HUNTARA, Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat	83.787.000	-0,10	-0,10	Belanja ATK belum dilaksanakan	Dibelanjakan di bulan Februari
10	Rapat Koordinasi Stakeholder Pembiayaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	5.723.000	10,22	-0,26	ATK Sudah dibelanjakan namun belum SPJ	Akan di-SPJkan di bulan Februari


Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perumahan Umum						
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	13.750.000	0,00	-5,45	kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi belum masuk proses SPJ bulan Januari	pembayaran makan minum rapat akan dilaksanakan bulan Februari
2	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Akibat Korban Bencana	78.170.000	0,00	-0,14	ATK Sudah dibelanjakan namun belum SPJ	pembayaran ATK akan dilaksanakan bulan Februari
3	Rapat Koordinasi Pembangunan Rusus-Rusun	3.000.000	25,00	-25,00	Belanja makan minum belum dibayarkan	Akan dibayarkan di bulan Februari
4	Rapat Serah Terima Hasil Pematangan Lahan Aset Provinsi Jawa Tengah	750.000	-25,00	0,00		
5	Pendampingan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Lingkungan	65.524.000	0.00	-0.29		

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perumahan Swadaya						
1	Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	994.350.000	-20,39	-20,39	Bimtek kerjasama dengan pihak ketiga belum semuanya dilakukan karena harus menyesuaikan jadwal pihak ketiga	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Februari - Maret
2	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	7.500.000	-9,33	-9,33	Rakortek ditunda karena adanya percepatan pencairan tahap 1 kuota penanganan bankeupemdes usulan kerja sama.	Rakortek akan dilakukan pada Bulan Februari
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat	2.525.000	-0,75	-27,13	Rakortek ditunda karena adanya percepatan pencairan tahap 1 swakelola (pembentukan pokmas swakelola). Sehingga dilakukan bimtek ke kabupaten terlebih dahulu untuk penyiapan pokmas swakelola	Rakortek akan dilakukan pada bulan Februari setelah bimtek dengan kabupaten selesai, untuk persiapan pelaksanaan pembangunan
4	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	915.129.000	-10,40	-10,40	Bimtek kerjasama dengan pihak ketiga belum semuanya dilakukan karena harus menyesuaikan jadwal pihak ketiga	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Februari - Maret
5	Koordinasi Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	277.010.000	-3,14	-3,14	Bimtek kerjasama dengan pihak ketiga belum semuanya dilakukan karena harus menyesuaikan jadwal pihak ketiga	Bimtek akan dilanjutkan kegiatannya pada bulan Februari - Maret

Bidang Kawasan Permukiman

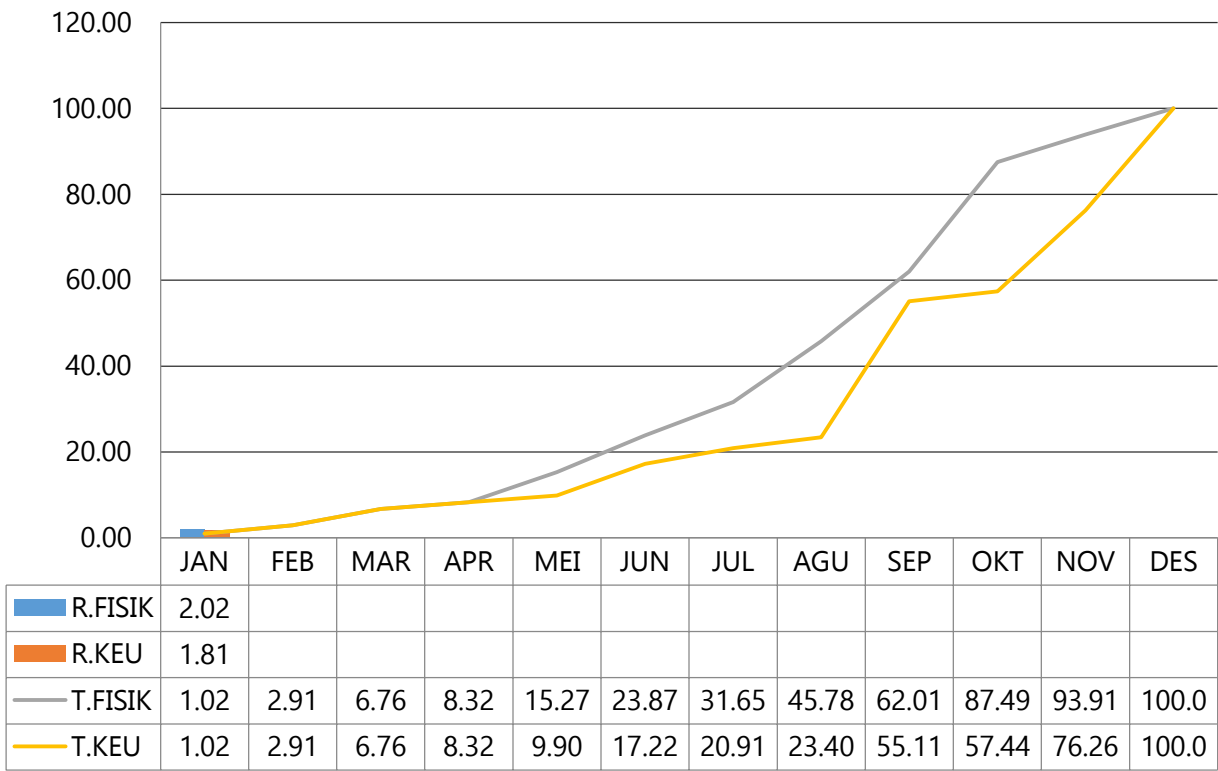


	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	1,02	2,91
Target Keu	1,02	2,91
Real. Fisik	2,02	5,51
Real. Keu	1,81	5,51
Dev. Fisik	1,00	2,60
Dev. Keu	0,79	2,60

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman						
1	Koordinasi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	24.925.000	0,00	-1,69	Kegiatan sudah dilaksanakan	SPJ dilaksanakan bulan Februari
2	Koordinasi Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	106.112.000	0,00	-0,01	Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil	Menjadi Potensi SILPA
Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	67.749.000	-5,25	-5,25	Adanya perubahan rencana perjalanan dinas	Penjadwalan ulang perjalanan dinas
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kawasan Permukiman	126.851.000	-1,08	-1,08	Adanya perubahan rencana perjalanan dinas	Penjadwalan ulang perjalanan dinas
Seksi Pengembangan PSU						
5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PSU Permukiman Provinsi Jawa Tengah	133.262.000	0,00	-0,17	Iuran BPJS ada yang belum terbayarkan	SPJ dilaksanakan bulan Februari

Bidang Pertanahan

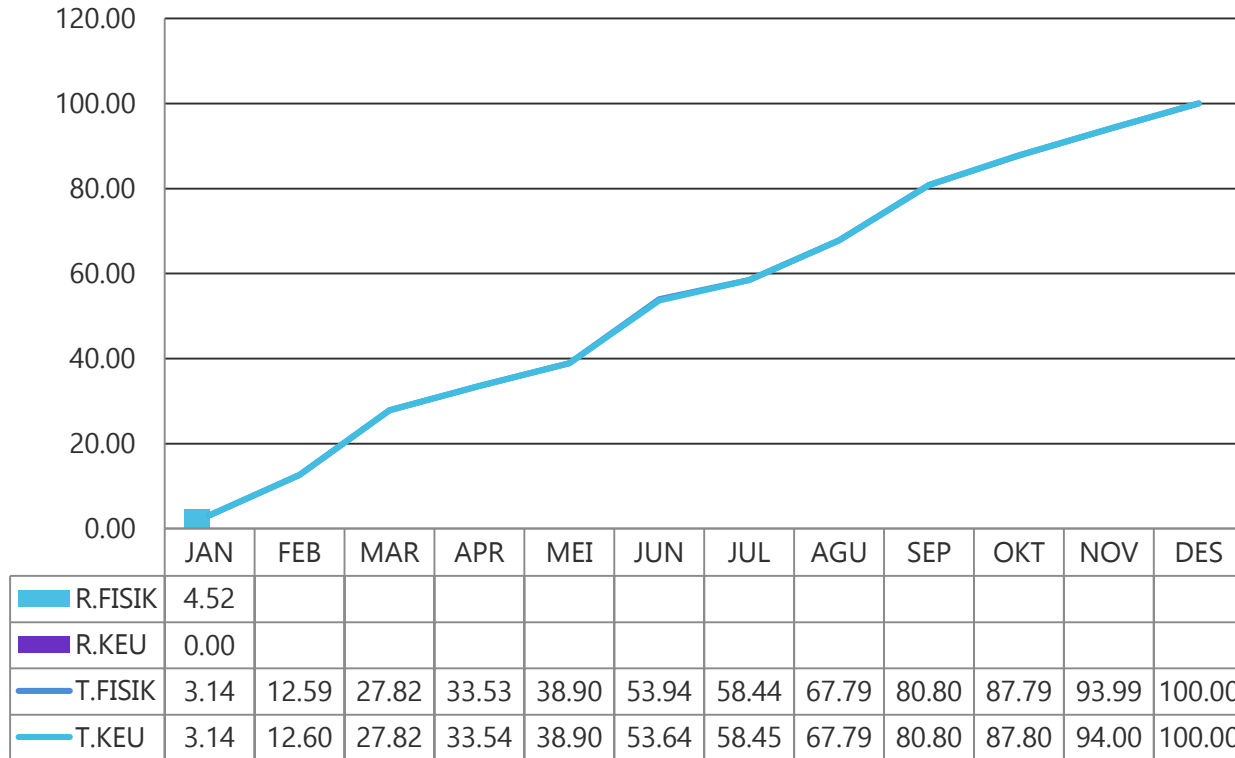


	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	3,14	12,59
Target Keu	3,14	12,60
Real. Fisik	4,52	13,12
Real. Keu	0,00	13,12
Dev. Fisik	1,38	0,52
Dev. Keu	-3,14	0,52

*) S.d. status 8 Feb 2022 realisasi keuangan Bid. Pertanahan belum masuk ke system e-controlling, realisasi keuangan manual: 4,50%

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah						
1	Penyampaian Penjelasan Rencana Pembangunan secara langsung kepada masyarakat di Lokasi Rencana Pembangunan	103.600.000	-5,63	-5,63	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena bersamaan dengan jadwal konsultasi publik pengadaan tanah tol Bawen-Jogja	Diagendakan kembali di bulan Maret
2	Identifikasi Kepemilikan Tanah di Lokasi Rencana Pembangunan	74.830.000	-7,03	-7,03	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena bersamaan dengan jadwal konsultasi publik pengadaan tanah tol Bawen-Jogja	Diagendakan kembali di bulan Maret
3	Verifikasi dan Validasi Bidang Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pada Trase atau Basic Design di Lokasi Rencana Pembangunan	74.844.000	-6,37	-6,37	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena bersamaan dengan jadwal konsultasi publik pengadaan tanah tol Bawen-Jogja	Diagendakan kembali di bulan Maret
4	Konsolidasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	127.201.000	-5,24	-5,24	Belum ada pengambilan ATK di bulan Januari	Akan diambil pada bulan februari

Bidang Keterpaduan PKP

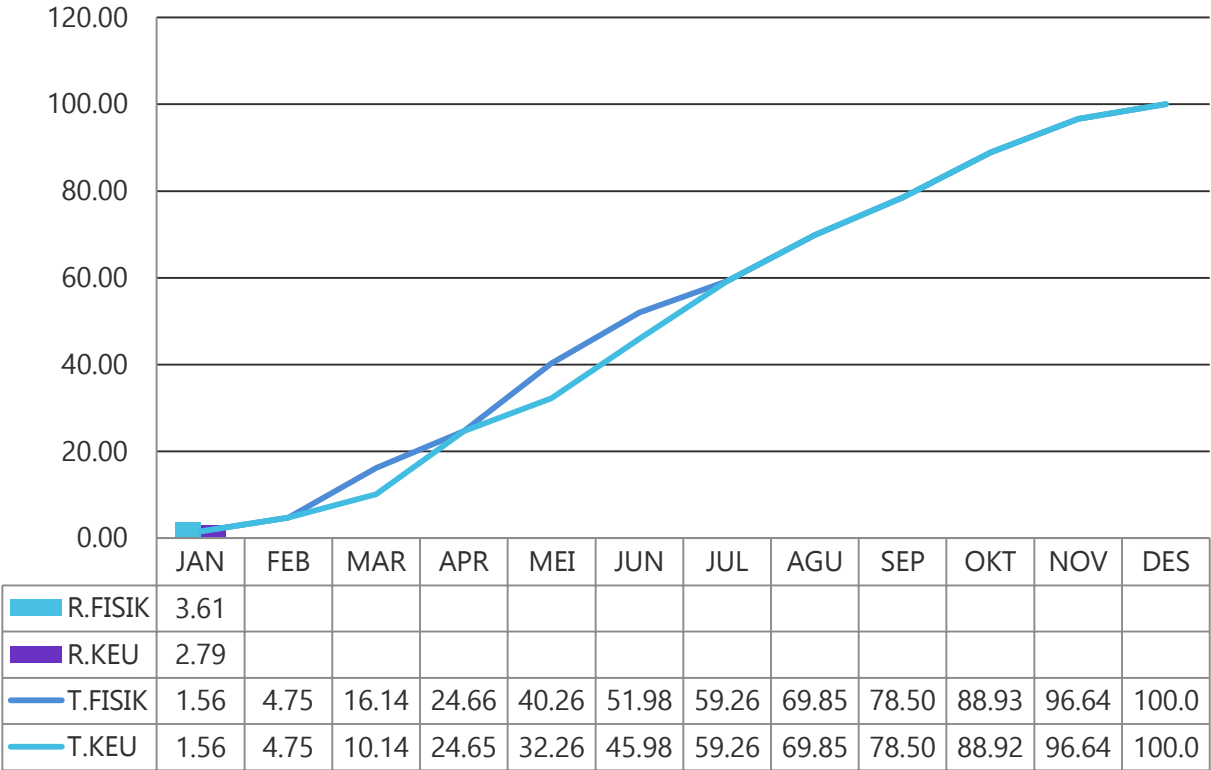

	Jan	Feb (Prognosis)
Target Fisik	1,56	4,75
Target Keu	1,56	4,75
Real. Fisik	3,61	5,44
Real. Keu	2,79	5,44
Dev. Fisik	2,05	0,69
Dev. Keu	1,23	0,69

Keterangan Deviasi Negatif

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ SSK	Pagu	Deviasi (%)		Alasan	Upaya Penyelesaian
			Fisik	Keu		
Seksi Keterpaduan Infrastruktur						
1	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	44.744.000	0,00	-0,01	Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil	Menjadi Potensi SILPA
Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman						
2	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	44.421.000	0,00	-0,51	- Sisa JKK dan JKM tenaga pendukung karena menyesuaikan dengan tagihan riil - Foto Copy diambilkan dari SSK lainnya	- Menjadi Potensi SILPA - Pengeluaran akan disesuaikan di bulan berikutnya



PELAPORAN PROGRES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status Akhir Januari 2022

Bidang Perumahan

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banjarnegara	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
2		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Banyumas	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
3		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
4		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Boyolali	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
5		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Brebes	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
6		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Demak	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
7		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Karanganyar	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
8		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kebumen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
9		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
10		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Klaten	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	

Bidang Perumahan (lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
11	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
12		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pati	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
13		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pekalongan	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
14		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Pemalang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
15		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Purbalingga	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
16		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Rembang	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)
17		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
18		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung	Proses ulang paket	
19		Pendataan dan Verivali Data Backlog & RTLH di Kecamatan Kab. Wonosobo	100.000.000	Pengadaan Langsung	Sudah terkontrak 4 Februari 2022	4 Feb- 5 Mei 2022 (90 Hari Kalender)

Bidang Perumahan (lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Tumanggal Kabupaten Purbalingga	120.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
2		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan	144.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
3		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bongas Kabupaten Pemalang	48.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
4		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sriwulan Kabupaten Demak	144.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
5		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Blerong Kabupaten Demak	72.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
6		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Bedono Kabupaten Demak	84.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	Pengajuan SK Penerima Bantuan	Februari - Juni
7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga	200.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (1 orang penerima bantuan mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22
8		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Kebumen	250.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
9		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Purworejo	150.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
10		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali	200.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22

Bidang Perumahan (lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI						
1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	1.000.000.000	Tender		Oktober - Desember
2		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
3		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	60.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
4		Pematangan Lahan Aset Provinsi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	80.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
5		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
6		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
7		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
8		Jasa Konsultasi Andalalin di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	100.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
9		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
10		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
11		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
12		Jasa Konsultasi UKL/UPL di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	50.000.000	Pengadaan Langsung		Oktober - Desember
13		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Pekalongan	1.015.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22

Bidang Perumahan (lanjutan)

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
14		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Wonogiri	945.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022.	2 Feb 22 - 2 Juli 22
15		Swakelola Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Relokasi Program Pemerintah di Kota Tegal	210.000.000	Swakelola Tipe IV Dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat	SK Penerima Bantuan ditandatangani 31 Januari 2022. (ada 1 penerima mengundurkan diri)	2 Feb 22 - 2 Juli 22

Bidang Kawasan Permukiman


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA						
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Skala Prioritas Provinsi	50.000.000	Pengadaan Langsung		April
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN						
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 1)	500.000.000	Tender		Juli
3		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 2)	400.000.000	Tender		Juli
4		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara 3)	250.000.000	Tender		Juli
5		Penyusunan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	200.000.000	Seleksi		Mei
6		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Tradisional Provinsi Jawa Tengah	250.000.000	Seleksi		Mei
7		Studi Identifikasi Kawasan Permukiman Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal dan Kota Pekalongan)	250.000.000	Seleksi		Mei
8		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung		April
9		Penyusunan DED/Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat	90.000.000	Pengadaan Langsung		April
10		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 1)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
11		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 2)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

Bidang Kawasan Permukiman

NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
12		Perbaikan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah barang bagi pemenang lomba hari habitat Juara Harapan 3)	200.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
13		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli
14		Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Hadiah Lomba Hari Habitat (3 kab/kota)	70.000.000	Pengadaan Langsung		Juli

Bidang Keterpaduan PKP


NO.	SUB-KEGIATAN	NAMA PAKET	NILAI PAKET (Rp)	METODE	PROGRES LELANG	Pelaksanaan
KEGIATAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENENGAH						
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Konsultan Individual Keterpaduan Implementasi dan Kemitraan Penyelenggaraan P3KP dan Pertanahan	60.000.000	Pengadaan Langsung	Penyusunan KAK	Maret
2		Konsultan Kajian Penyelenggaraan PKP dan Pertanahan Secara Terpadu dan Terintegrasi	100.000.000	Tender	Penyusunan KAK	Maret
3		Konsultan Penyusunan Perencanaan Kemitraan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Tender	Penyusunan KAK	Maret
4		Konsultan Evaluasi Kebijakan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Tender	Penyusunan KAK	Maret
5		Alat Peraga/ Bahan Praktek Pelatihan	100.000.000	Seleksi		April
6		Konsultan Individual Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah	42.000.000	Seleksi		Maret

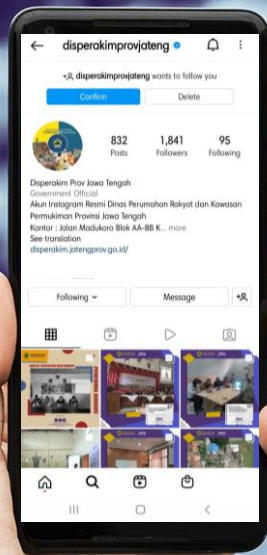

PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA

Status Akhir Januari 2022

Respon LaporGub




Pada bulan Januari 2022, terdapat 12 laporan permintaan informasi melalui web LAPORGUB dan sudah terjawab tuntas.

Adapun rincian laporan tersebut terdiri dari :


- 8 laporan terkait RTLH
- 2 laporan terkait rumah bersubsidi
- 2 laporan terkait ganti rugi tanah

[illegible]


Konten Media Sosial



Konten Berita Web Dinas



Laporan Akumulatif Followers Dan Subscribers Medsos




Laporan Hasil Survey Kepuasan Website

[illegible]

Laporan Jumlah Akumulatif Pengunjung Website

Minggu IV


[illegible]

PENEKANAN


1. Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan agar **mengumpulkan Perjanjian Kinerja TA 2022 dan Laporan Kinerja (LKj) TA 2021** ke Subbag Program selambat-lambatnya **Selasa, 8 Februari 2022** sesuai dengan ketentuan dan format yang telah disampaikan melalui nota dinas No. 049/PROG/II/2022 tanggal 4 Februari 2022.

STRUKTUR DPA DAN RAB

2021

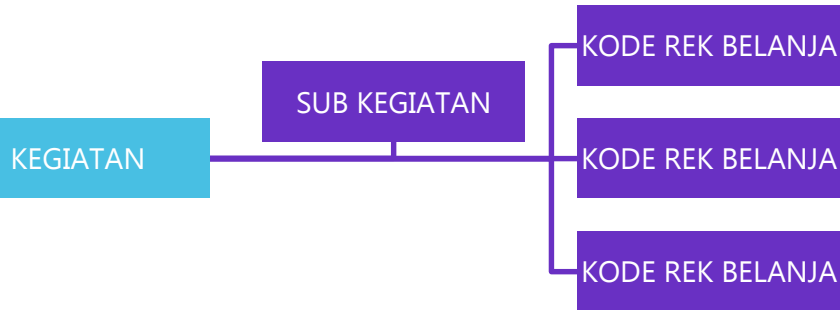

2022

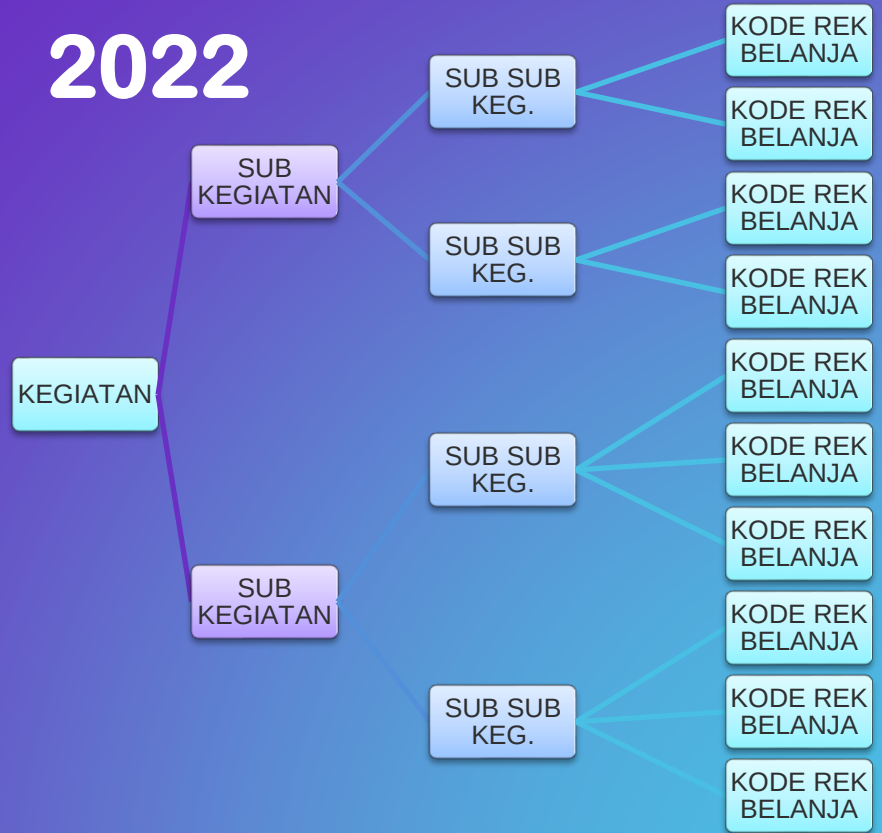

- Struktur DPA dan RAB TA. 2022 lebih detil sampai level SUB SUB KEGIATAN, sehingga berpotensi terjadi kesalahan input pada kode rekening yang sama namun dalam SSK yang berbeda (salah kamar input).
- Langkah –langkah melakukan SPJ secara berkala dalam 1 bulan, jangan dilakukan 1 kali ditumpuk pada akhir bulan.
- Pencantuman Detil Sub Kegiatan - Sub Sub Kegiatan pada bukti pengeluaran.
- Pendampingan terhadap Bendahara Pengeluaran Bidang dalam input SPJ, biasanya person yang melakukan input E-budgeting – RKO – dan e-Penatausahaan dilakukan oleh orang yang berbeda dan kurang koordinasi pada saat tahapan pelaksanaan kegiatan – sub kegiatan dan sub sub kegiatannya.



Terima
Kasih
