

# RAPAT PENGENDALIAN TINGKAT OPD

STATUS AKHIR TA 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

# OUTLINE



- 1. Realisasi Fisik dan Keuangan Status Akhir Tahun 2020**
- 2. Program/Kegiatan dan Komposisi Anggaran 2021**
- 3. Rko dan Target TA. 2021**
- 4. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa TA 2021**
- 5. Penekanan ;**






# **REALISASI FISIK DAN KEUANGAN STATUS AKHIR TAHUN 2020**

# REALISASI BELANJA TA. 2020

| BELANJA LANGSUNG                                 |                    |                       |         |                                    |               |                       |               |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| NO                                               | BIDANG             | PAGU                  |         | REALISASI KEUANGAN s.d 28 Des 2020 |               | SILPA s.d 28 Des 2020 |               |
|                                                  |                    | Rp                    | %       | Rp                                 | %             | Rp                    | %             |
| 1                                                | SEKRETARIAT        | 5.419.533.000         | 24,29%  | 4.811.596.868                      | 88,78%        | 607.936.132           | 11,22%        |
| 2                                                | PERUMAHAN          | 13.886.258.000        | 62,24%  | 11.154.102.305                     | 80,32%        | 2.732.155.695         | 19,68%        |
| 3                                                | KAWASAN PERMUKIMAN | 739.557.000           | 3,31%   | 670.117.236                        | 90,61%        | 69.439.764            | 9,39%         |
| 4                                                | PERTANAHAN         | 1.171.827.000         | 5,25%   | 1.153.003.300                      | 98,39%        | 18.823.700            | 1,61%         |
| 5                                                | KETERPADUAN PKP    | 1.094.598.000         | 4,91%   | 1.084.571.051                      | 99,08%        | 10.026.949            | 0,92%         |
|                                                  | TOTAL DINAS        | 22.311.773.000        | 100,00% | 18.873.390.760                     | 84,59%        | 3.438.382.240         | 15,41%        |
|                                                  |                    |                       |         |                                    |               |                       |               |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG                           |                    |                       |         |                                    |               |                       |               |
| NO                                               | BIDANG             | PAGU                  |         | REALISASI KEUANGAN s.d 28 Des 2020 |               | SILPA s.d 28 Des 2020 |               |
|                                                  |                    | Rp                    | %       | Rp                                 | %             | Rp                    | %             |
| 1                                                | Gaji dan Tunjangan | 11.929.049.000        | 100,00% | 11.632.898.627                     | 97,52%        | 296.150.373           | 2,48%         |
|                                                  |                    |                       |         |                                    |               |                       |               |
| <b>TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG</b> |                    | <b>34.240.822.000</b> |         | <b>30.506.289.387</b>              | <b>89,09%</b> | <b>3.734.532.613</b>  | <b>10,91%</b> |

# DISPERAKIM

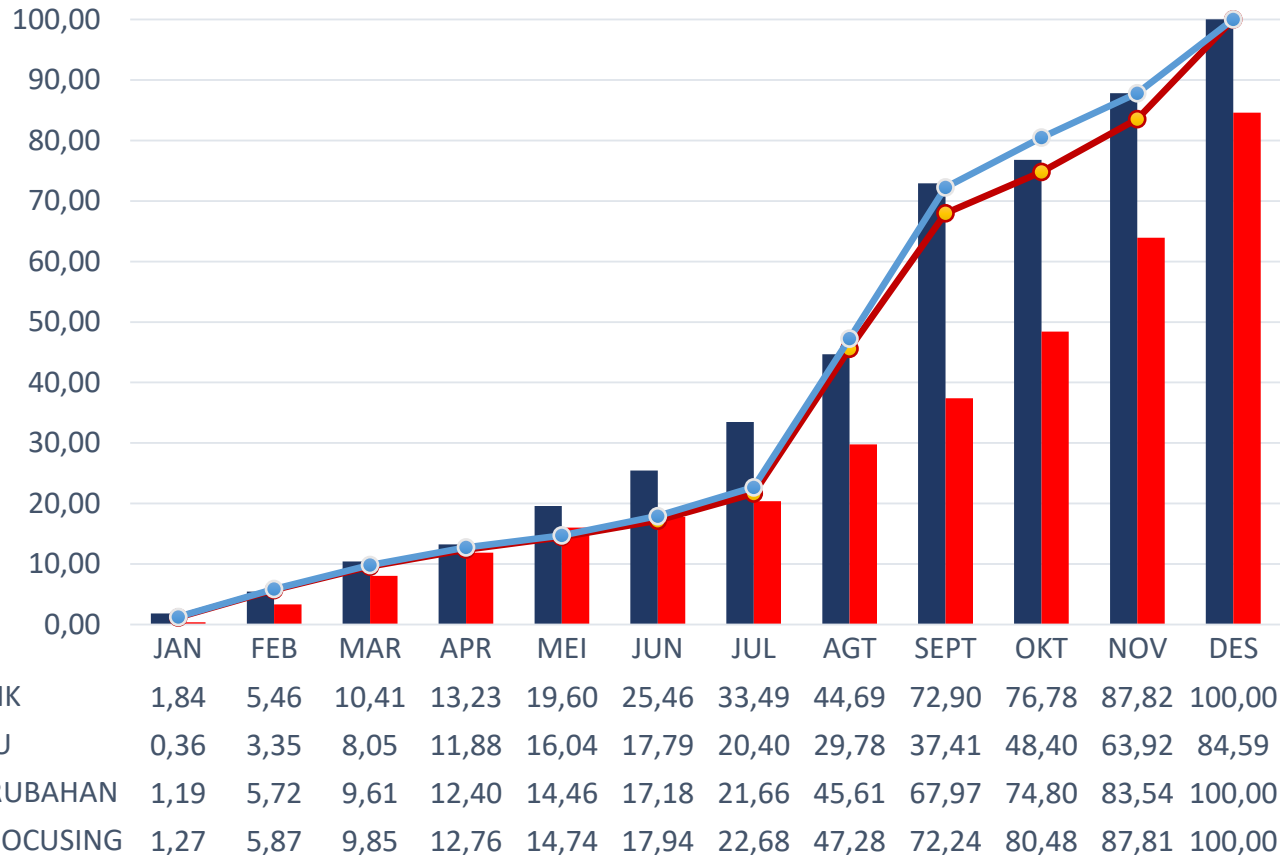


|             | Des     |
|-------------|---------|
| Renc. Fisik | 100     |
| Real. Fisik | 100     |
| Dev. Fisik  | -       |
| Renc. Keu   | 100     |
| Real. Keu   | 84,59   |
| Dev. Keu    | (15,41) |

# REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN 28 DESEMBER 2020

| NO | BIDANG                | PAGU                  |                | REALISASI KEUANGAN s.d<br>28 Des 2020 |               | SILPA                |               | TERHADAP<br>DINAS |
|----|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
|    |                       | Rp                    | %              | Rp                                    | %             | Rp                   | %             |                   |
| 1  | SEKRETARIAT           | 5.419.533.000         | 24,29%         | 4.811.596.868                         | 88,78%        | 607.936.132          | 11,22%        | 2,72%             |
| 2  | PERUMAHAN             | 13.886.258.000        | 62,24%         | 11.154.102.305                        | 80,32%        | 2.732.155.695        | 19,68%        | 12,25%            |
| 3  | KAWASAN<br>PERMUKIMAN | 739.557.000           | 3,31%          | 670.117.236                           | 90,61%        | 69.439.764           | 9,39%         | 0,31%             |
| 4  | PERTANAHAN            | 1.171.827.000         | 5,25%          | 1.153.003.300                         | 98,39%        | 18.823.700           | 1,61%         | 0,08%             |
| 5  | KETERPADUAN PKP       | 1.094.598.000         | 4,91%          | 1.084.571.051                         | 99,08%        | 10.026.949           | 0,92%         | 0,04%             |
|    | <b>TOTAL DINAS</b>    | <b>22.311.773.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>18.873.390.760</b>                 | <b>84,59%</b> | <b>3.438.382.240</b> | <b>15,41%</b> | <b>15,41%</b>     |

| SILPA BELANJA<br>LANGSUNG | RP                   | %           |
|---------------------------|----------------------|-------------|
| EFISIENSI                 | 428.017.735          | 12,45%      |
| SISA KONTRAK              | 2.821.561.704        | 82,06%      |
| SESUAI KEBUTUHAN          | 188.802.701          | 5,49%       |
| <b>TOTAL</b>              | <b>3.438.382.140</b> | <b>100%</b> |

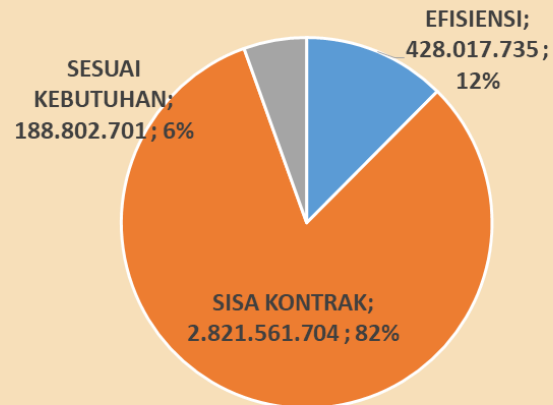



# **PROGRAM/KEGIATAN DAN KOMPOSISI ANGGARAN 2021**

# URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DISPERAKIM TA. 2021

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019

## 2 URUSAN

**1. URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
(Rp. 19.268.100.000)**

**2. URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG PERTANAHAN  
(Rp.1.757.000.000)**

**NON URUSAN - KEGIATAN  
RUTIN  
(Rp. 20.778.752.000)**

## 7 PROGRAM

1. Program Pengembangan Perumahan (Rp. 12.989.600.000)
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) (Rp. 4.193.500.000)
1. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rp. 2.085.000.000)

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Rp. 589.500.000)
2. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Rp. 572.500.000)
3. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Rp. 595.000.000)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
(Rp. 20.778.752.000)


## 13 KEGIATAN, 45 SUB KEG

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
5. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
6. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

1. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi;
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
3. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan;
3. Administrasi Umum
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

| NO                  | PROGRAM                                                                                                            | PAGU USULAN           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                   | Pengembangan Perumahan                                                                                             | 12.989.600.000        |
| 2                   | Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)                                                             | 4.193.500.000         |
| 3                   | Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 2.085.000.000         |
| 4                   | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                                                | 589.500.000           |
| 5                   | Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee                                  | 572.500.000           |
| 6                   | Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum                                                                             | 595.000.000           |
| 7                   | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Termasuk BTL (Gaji & Tunjangan ASN)                                             | 20.778.752.000        |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                                                                                                    | <b>41.803.852.000</b> |

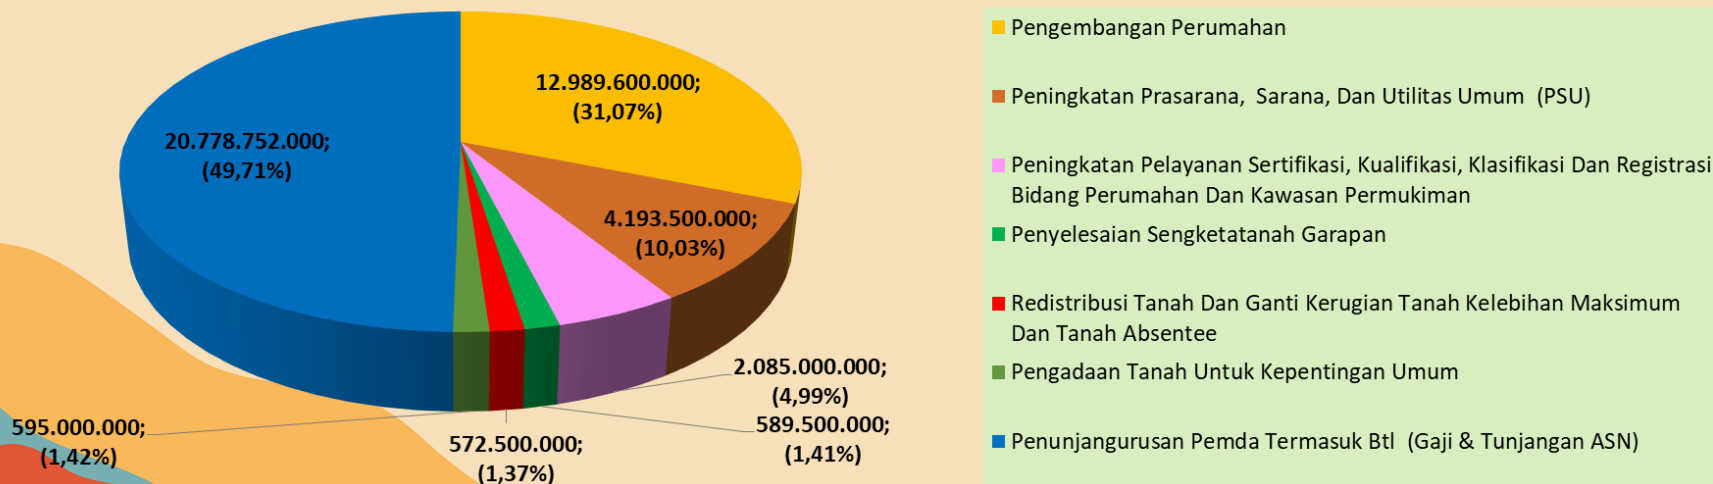




# **RKO DAN TARGET TA. 2021**



# TARGET DINAS TA. 2021 – e-RKO 2021

PAGU ANGGARAN


RP. 41.803.852.000,-

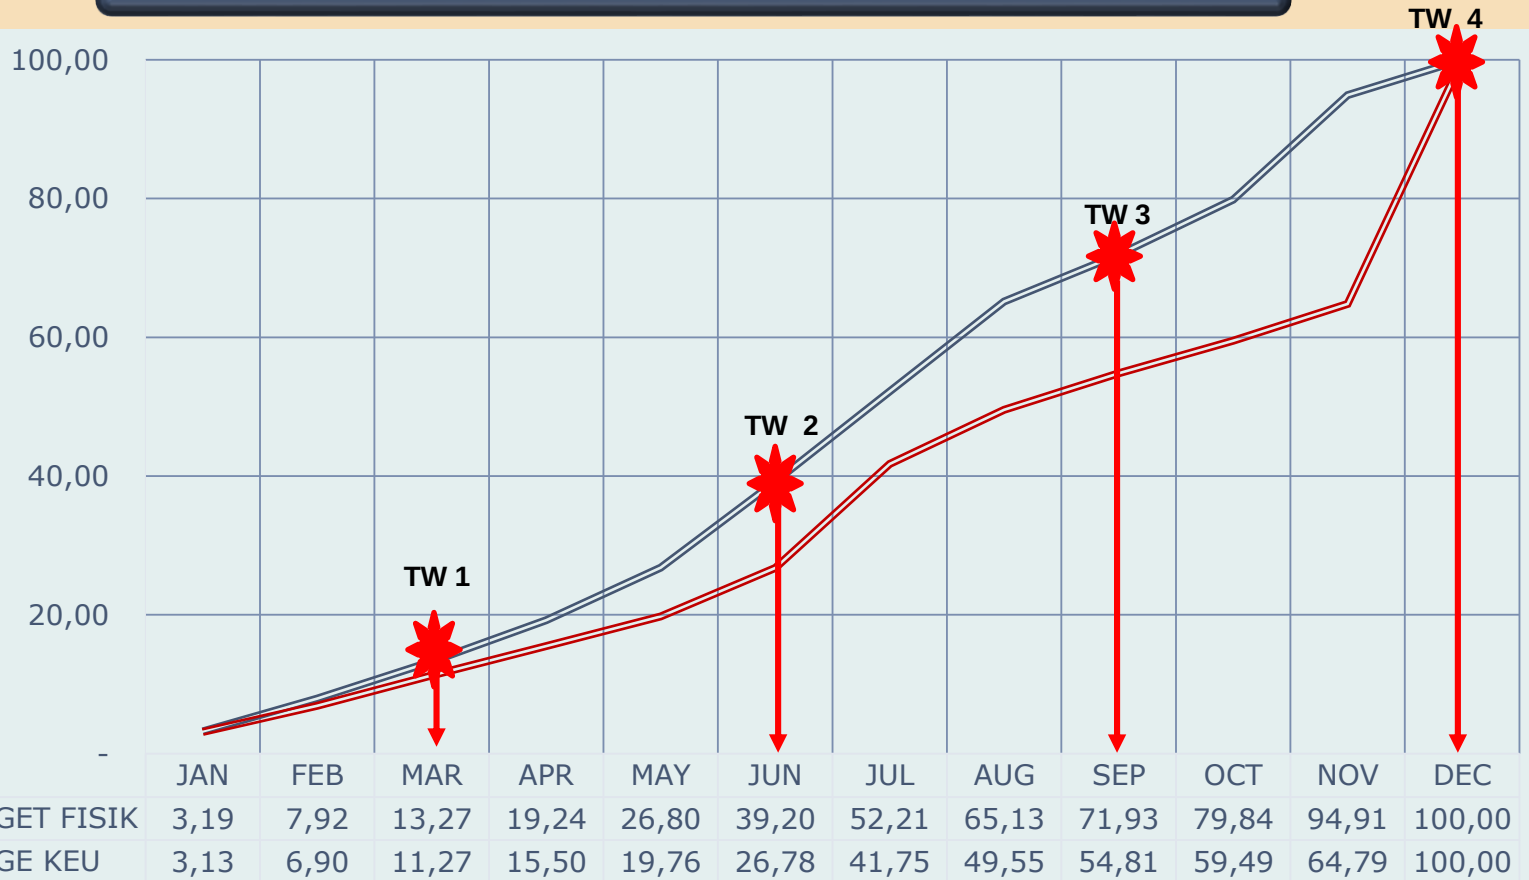

# TARGET SEKRETARIAT

PAGU ANGGARAN


RP. 20.778.752.000, -

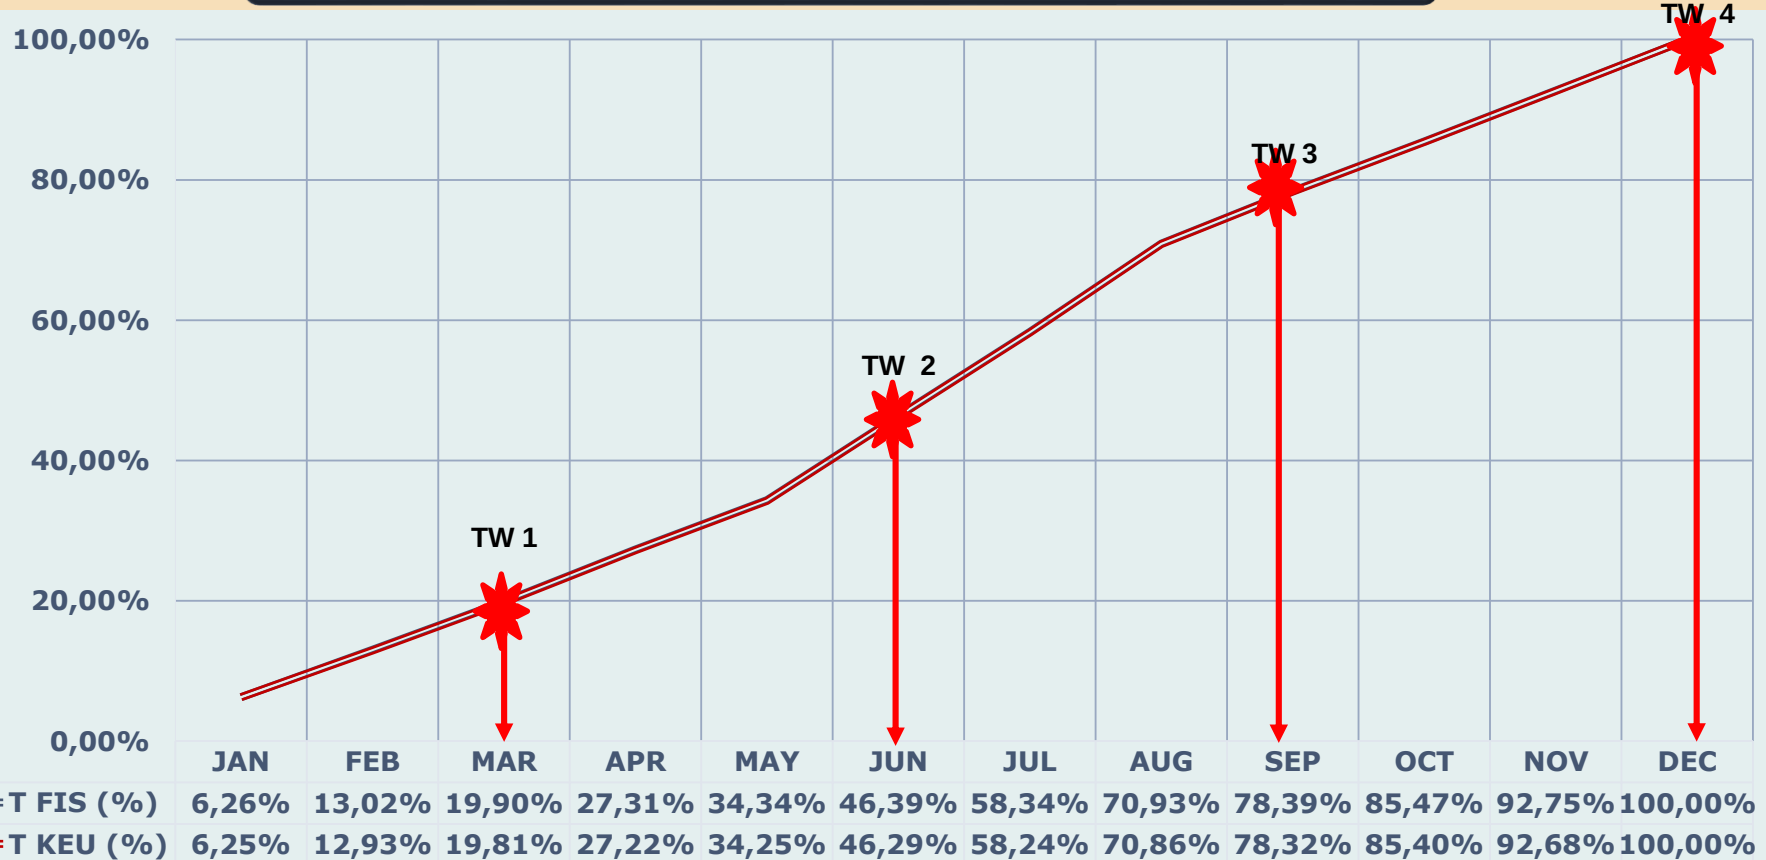

# TARGET BIDANG PERUMAHAN

PAGU ANGGARAN


RP. 12.989.600.000, -

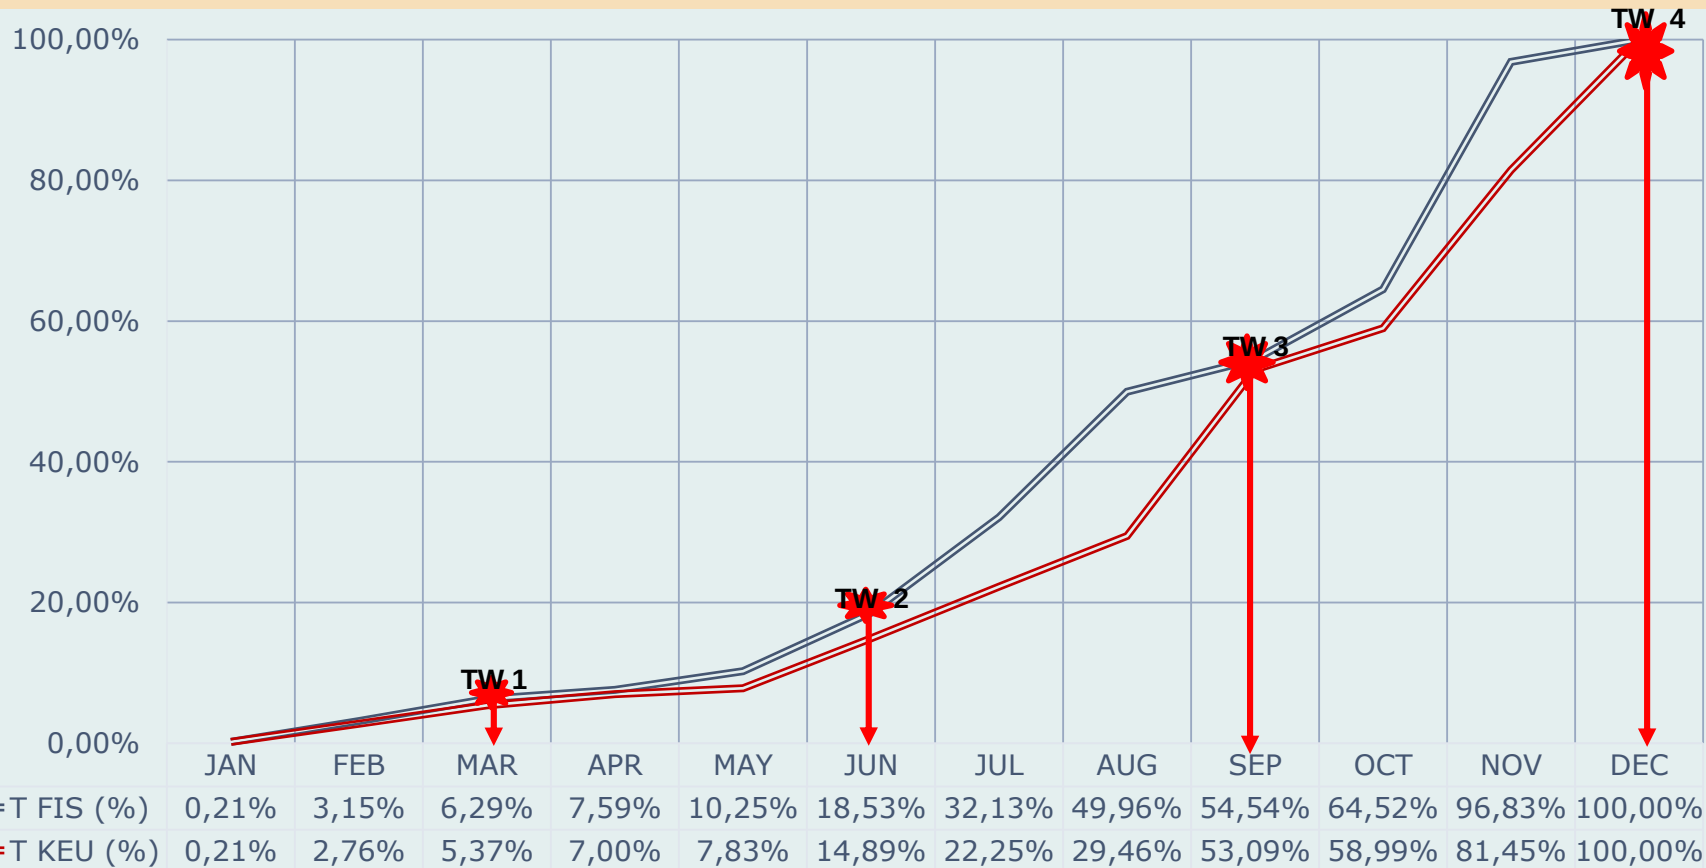

# TARGET BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

PAGU ANGGARAN


RP. 4.193.500.000, -

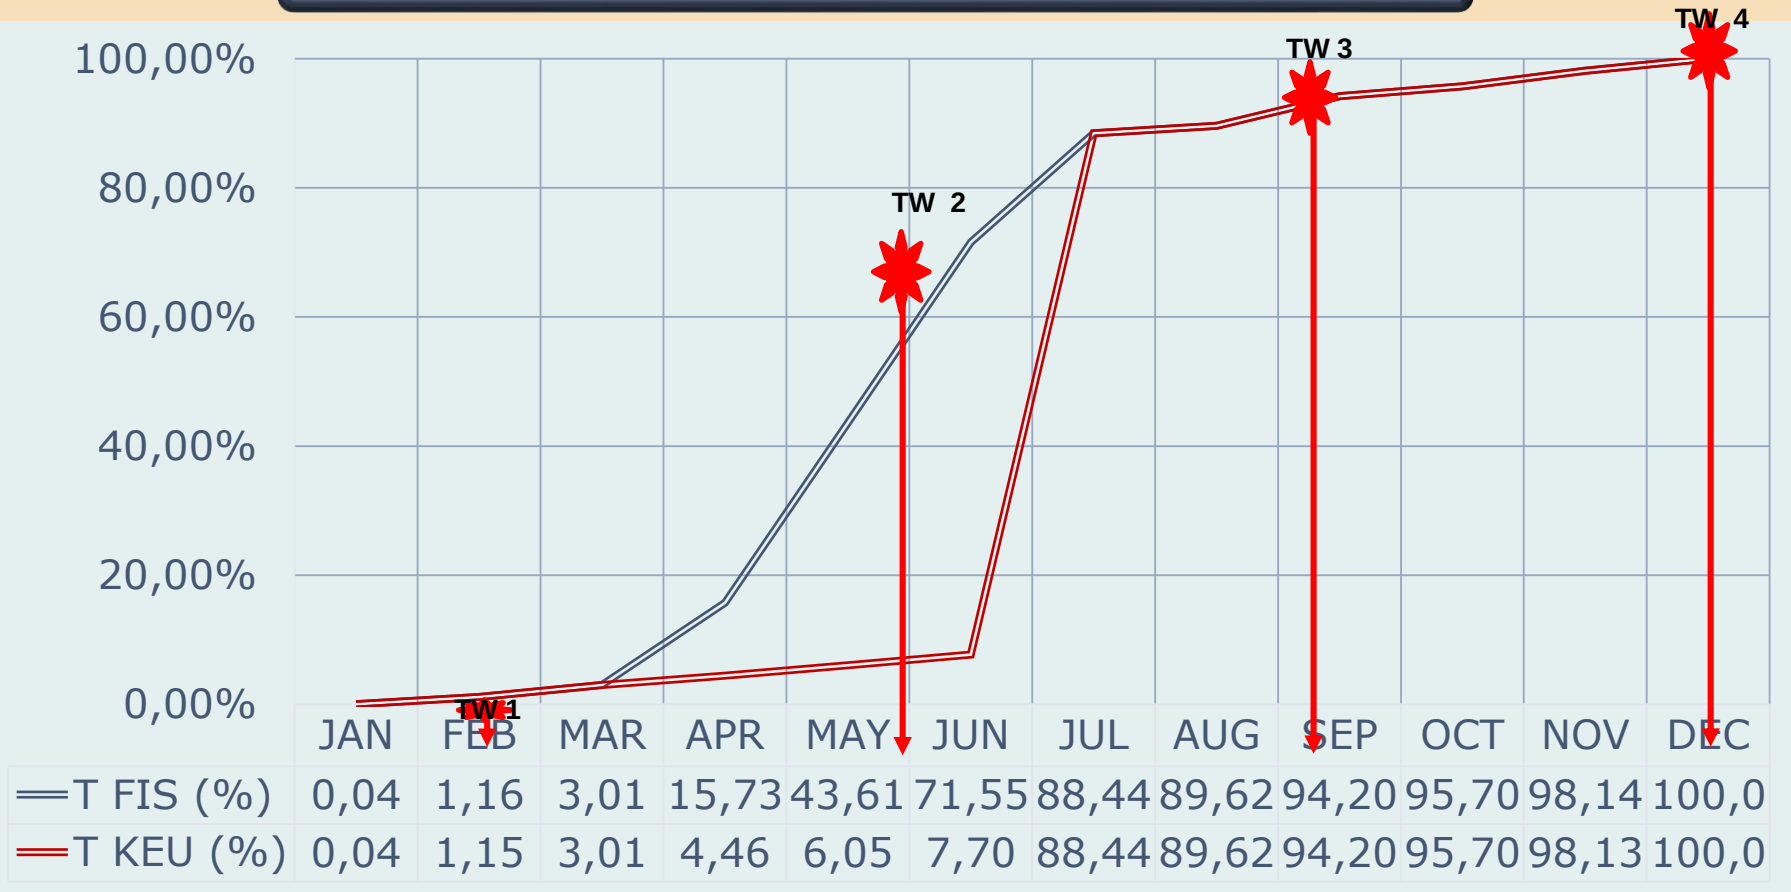

# TARGET BIDANG PERTANAHAN

PAGU ANGGARAN


RP. 1.757.000.000 , -

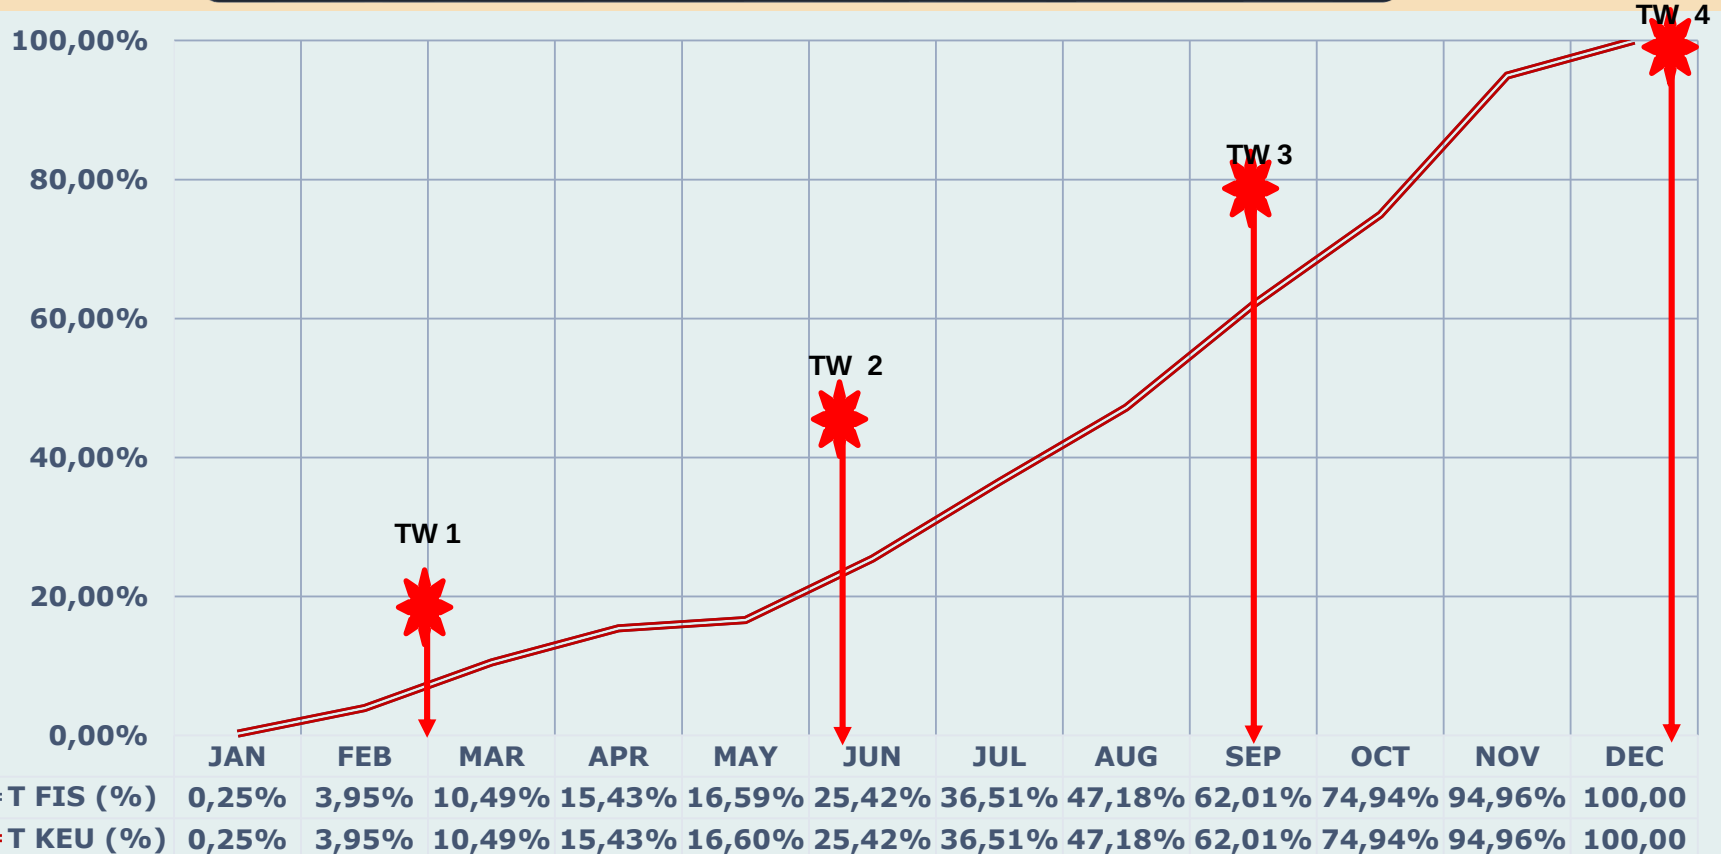


# TARGET BIDANG KETERPADUAN PKP

PAGU ANGGARAN


RP. 2.085.000.000, -

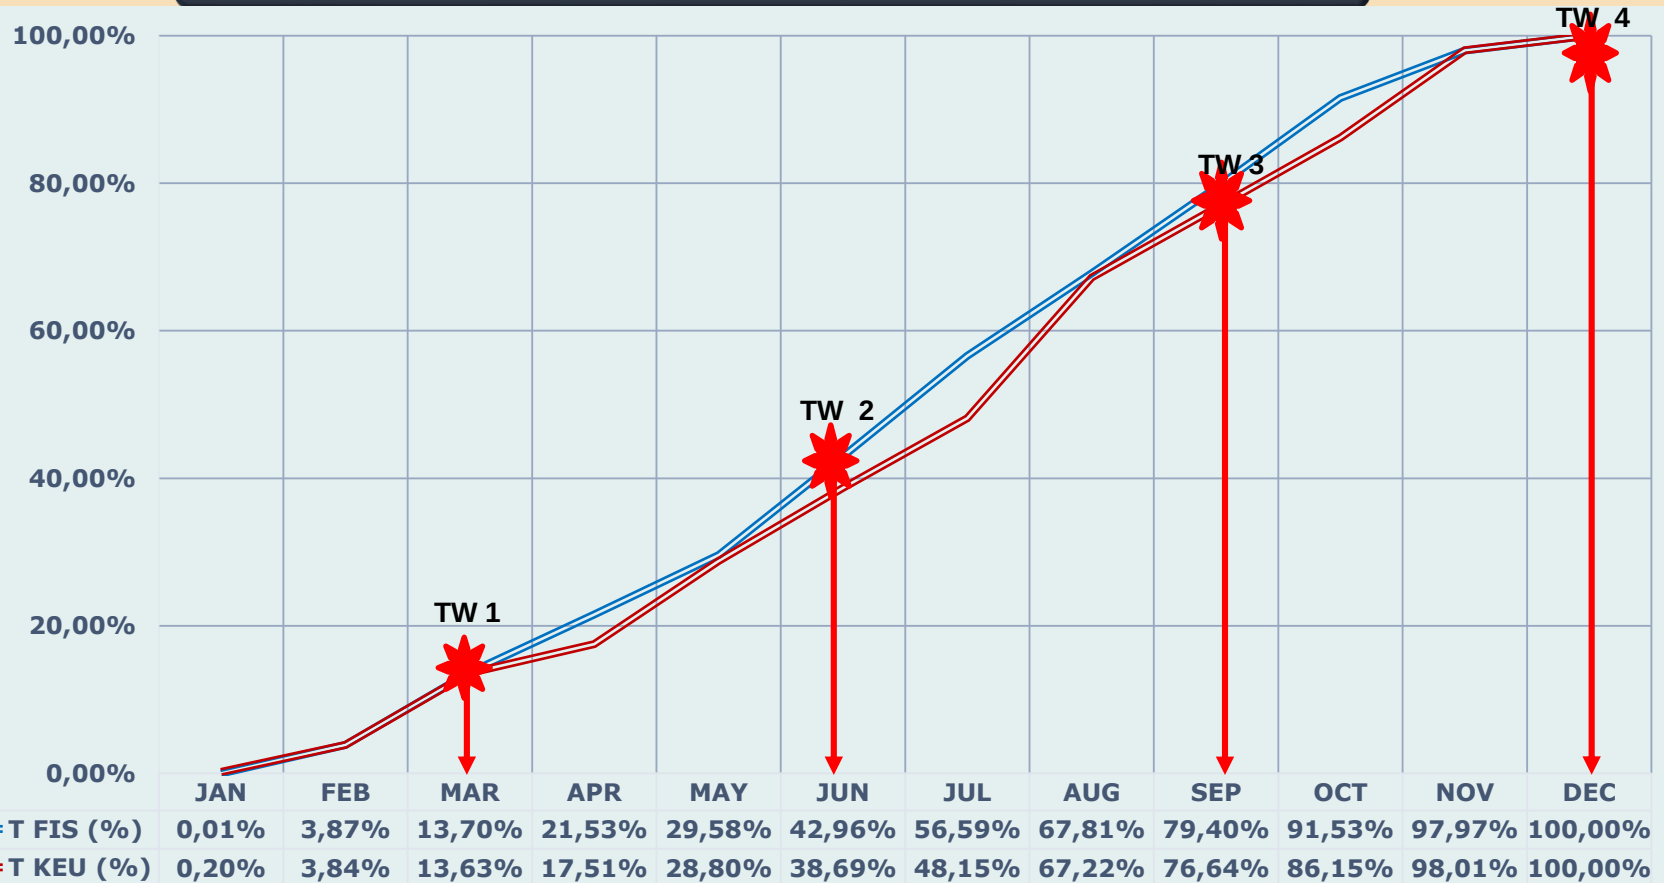



# **REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2021**

**PENYEDIA**  
10,686,028,000  
; 26%

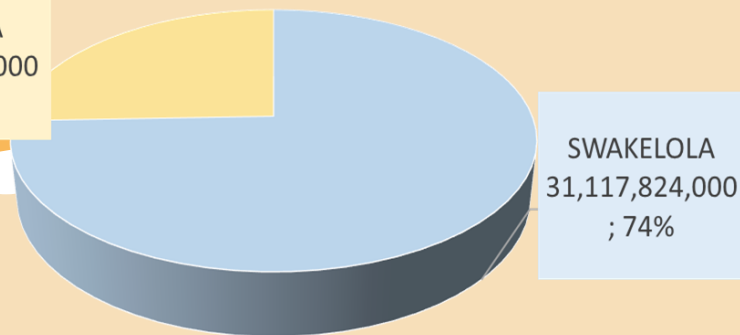

**SWAKELOLA: 113 PAKET ; Rp. 31.117.824.000,-**

**PENYEDIA : 158 PAKET ; Rp. 10.686.028.000,-**

| NO    | BIDANG-<br>SEKRETARIAT | SWAKELOLA |                | PAKET PENYEDIA |                | TENDER |               | SELEKSI |             | PENUNJUKAN<br>LANGSUNG |     | PENGADAAN<br>LANGSUNG |               | PENGADAAN<br>DIKECUALIKAN |               | TOTAL |                |
|-------|------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|-------------|------------------------|-----|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------|----------------|
|       |                        | JML       | RP.            | JML            | RP.            | JML    | RP.           | JML     | RP.         | JML                    | RP. | JML                   | RP.           | JML                       | RP.           | JML   | RP.            |
| 1     | SEKRETARIAT            | 34        | 16.822.289.000 | 48             | 3.956.463.000  | 2      | 1.386.645.000 | -       | -           | -                      | -   | 41                    | 1.573.728.000 | 5                         | 996.090.000   | 82    | 20.778.752.000 |
| 2     | PERUMAHAN              | 36        | 11.825.399.000 | 30             | 1.164.201.000  | -      | -             | 2       | 490.000.000 | -                      | -   | 28                    | 674.201.000   | -                         | -             | 66    | 12.989.600.000 |
| 3     | KAWASAN<br>PERMUKIMAN  | 12        | 618.275.000    | 37             | 3.575.225.000  | 6      | 3.150.000.000 | -       | -           | -                      | -   | 30                    | 388.825.000   | 1                         | 36.400.000    | 49    | 4.193.500.000  |
| 4     | KETERPADUAN PKP        | 15        | 699.676.000    | 19             | 1.385.324.000  | -      | -             | 1       | 325.000.000 | -                      | -   | 18                    | 1.060.324.000 | -                         | -             | 34    | 2.085.000.000  |
| 5     | PERTANAHAN             | 16        | 1.152.185.000  | 23             | 604.815.000    | -      | -             | -       | -           | -                      | -   | 24                    | 604.815.000   | -                         | -             | 39    | 1.757.000.000  |
| TOTAL |                        | 113       | 31.117.824.000 | 157            | 10.686.028.000 | 8      | 4.536.645.000 | 3       | 815.000.000 | -                      | -   | 141                   | 4.301.893.000 | 6                         | 1.032.490.000 | 271   | 41.803.852.000 |

SUMBER DATA : Aplikasi SIRUP Lokal status 6 Desember 2020




# SCHEDULE PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2021

SUMBER DATA : Aplikasi SIRUP Lokal status 6 Desember 2020

| REKAP DINAS            |     | DES 2020      | Jan-21        | FEB         | MAR         | APR        | MAY           | JUN         | JUL        | AUG        | SEP | OCT        | NOV | DEC | TOTAL          |
|------------------------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-----|------------|-----|-----|----------------|
| TENDER                 | JML | 6             | 1             | -           | -           | -          | 1             | -           | -          | -          | -   | -          | -   | -   | 8              |
|                        | RP  | 3.150.000.000 | 386.645.000   | -           | -           | -          | 1.000.000.000 | -           | -          | -          | -   | -          | -   | -   | 4.536.645.000  |
| SELEKSI                | JML | -             | 1             | -           | 2           | -          | -             | -           | -          | -          | -   | -          | -   | -   | 3              |
|                        | RP  | -             | 325.000.000   | -           | 490.000.000 | -          | -             | -           | -          | -          | -   | -          | -   | -   | 815.000.000    |
| PENGADAAN LANGSUNG     | JML | 3             | 95            | 22          | 8           | 2          | 2             | 3           | 1          | 1          | -   | 4          | -   | -   | 141            |
|                        | RP  | 278.302.000   | 3.089.823.000 | 408.743.000 | 108.476.000 | 24.100.000 | 205.000.000   | 115.300.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | -   | 17.149.000 | -   | -   | 4.301.893.000  |
| PENGADAAN DIKECUALIKAN | JML | 5             | 1             | -           | -           | -          | -             | -           | -          | -          | -   | -          | -   | -   | 6              |
|                        | RP  | 996.090.000   | 36.400.000    | -           | -           | -          | -             | -           | -          | -          | -   | -          | -   | -   | 1.032.490.000  |
| JUMLAH                 | JML | 14            | 98            | 22          | 10          | 2          | 3             | 3           | 1          | 1          | -   | 4          | -   | -   | 158            |
|                        | RP  | 4.424.392.000 | 3.837.868.000 | 408.743.000 | 598.476.000 | 24.100.000 | 1.205.000.000 | 115.300.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | -   | 17.149.000 | -   | -   | 10.686.028.000 |

# GRAFIK SEBARAN JADWAL PENGADAAN PAKET PEKERJAAN KONTRAKTUAL / PENYEDIA TA. 2021

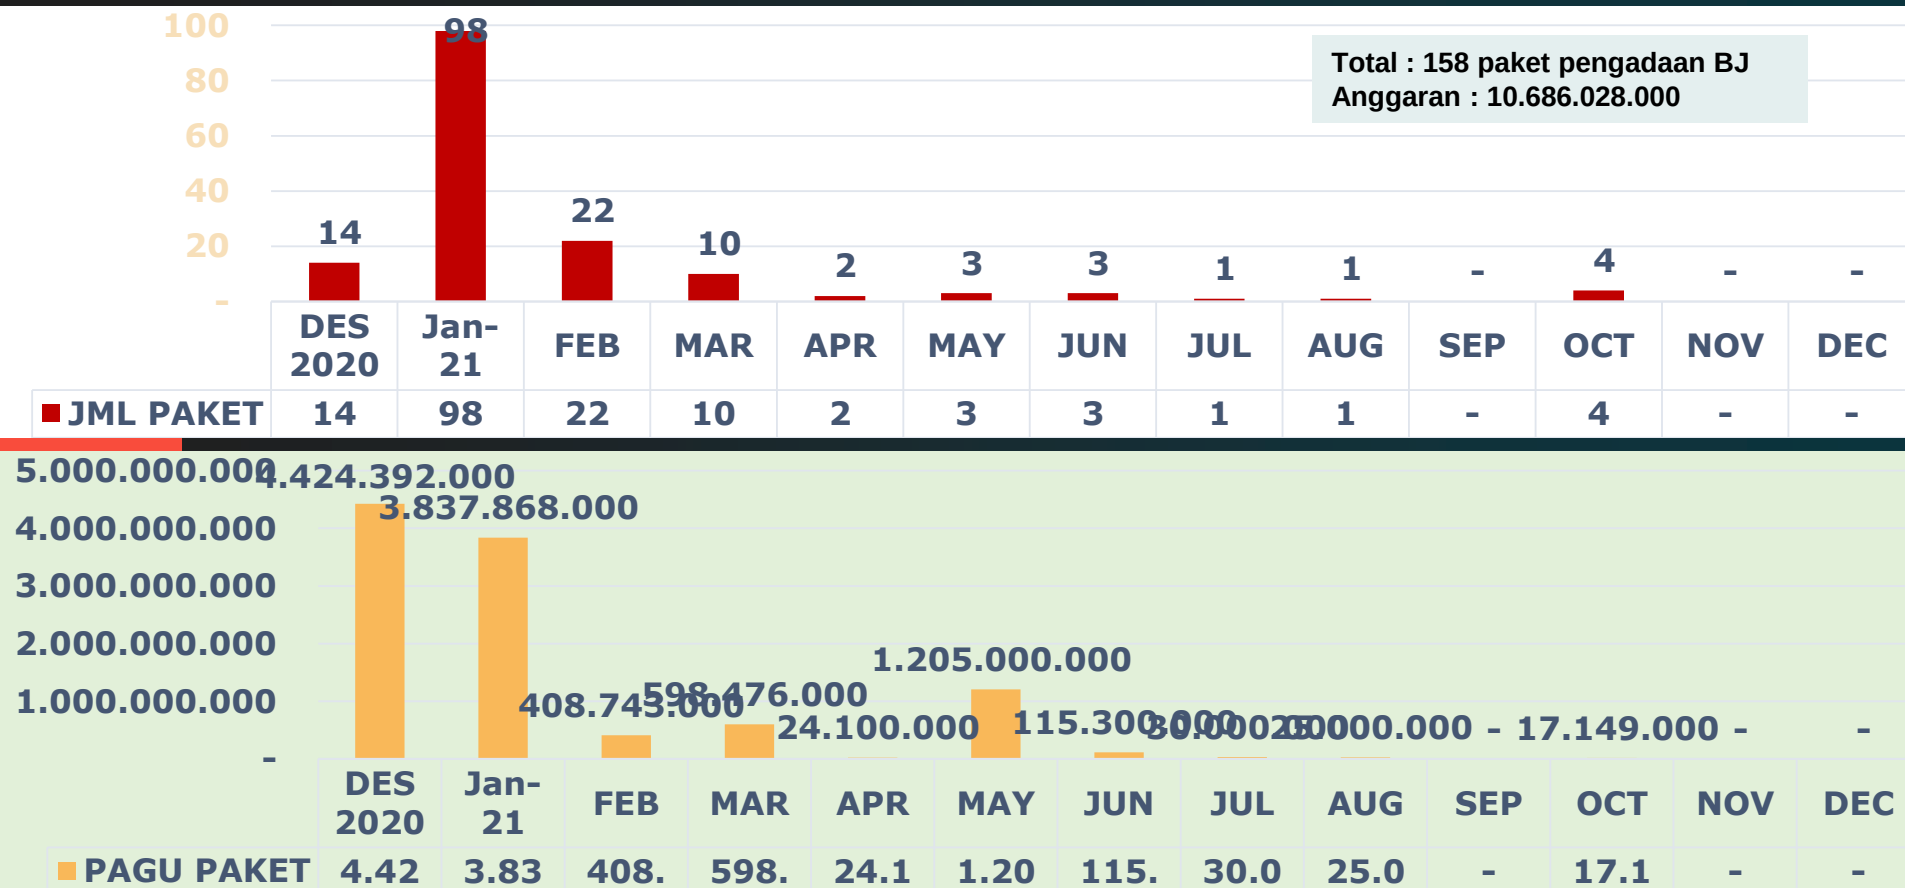

**REKAP PAKET YANG DILELANGKAN ULP DESEMBER 2020 dan JANUARI 2021**
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
**TA 2021**

| NO | BIDANG             | BIDANG DAN SUB KEGIATAN                                                                                            | NAMA PAKET                                                | ANGGARAN      | METODE  | SEMBER | KODE RUPL | WAKTU            |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    |                    |                                                                                                                    |                                                           |               |         | DANA   |           | PEMILIHAN        |
| 1  | SEKRETARIAT        | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                                              | <a href="#">Penyediaan Jasa Keamanan (10 bulan)</a>       | 386.645.000   | Tender  | APBD   | 530002637 | 04 Januari 2021  |
| 2  | KAWASAN PERMUKIMAN | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                    | <a href="#">Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir</a>  | 300.000.000   | Tender  | APBD   | 540001173 | 01 Desember 2020 |
| 3  | KAWASAN PERMUKIMAN | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                    | <a href="#">Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir</a>  | 300.000.000   | Tender  | APBD   | 540000229 | 01 Desember 2020 |
| 4  | KAWASAN PERMUKIMAN | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                    | <a href="#">Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir</a>  | 300.000.000   | Tender  | APBD   | 540000228 | 01 Desember 2020 |
| 5  | KAWASAN PERMUKIMAN | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                    | <a href="#">Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir</a>  | 500.000.000   | Tender  | APBD   | 540000220 | 01 Desember 2020 |
| 6  | KAWASAN PERMUKIMAN | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                    | <a href="#">Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir</a>  | 750.000.000   | Tender  | APBD   | 540000217 | 01 Desember 2020 |
| 7  | KAWASAN PERMUKIMAN | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                    | <a href="#">Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir</a>  | 1.000.000.000 | Tender  | APBD   | 540000192 | 01 Desember 2020 |
| 8  | KETERPADUAN        | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | <a href="#">Penyusunan Rencana Pengelolaan Klinik PKP</a> | 325.000.000   | Seleksi | APBD   | 520000926 | 04 Januari 2021  |

# REKAP PAKET YANG DILELANGKAN ULP MARET DAN MEI 2021

## DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


TA 2021

| NO | BIDANG      | BIDANG DAN SUB KEGIATAN                                                                 | NAMA PAKET                                                                                           | ANGGARAN      | METODE  | SEMBER | KODE RUPL | WAKTU         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|
|    |             |                                                                                         |                                                                                                      |               |         | DANA   |           | PEMILIHAN     |
| 1  | SEKRETARIAT | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            | <a href="#">Pembangunan Plts Rooftop</a>                                                             | 1.000.000.000 | Tender  | APBD   | 540000256 | 03 Mei 2021   |
| 2  | PERUMAHAN   | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | <a href="#">Identifikasi Kebutuhan Rumah Khusus Bagi Nelayan 7 Kabupaten / Kota di Pantura</a>       | 265.000.000   | Seleksi | APBD   | 520000931 | 01 Maret 2021 |
| 3  | PERUMAHAN   | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | <a href="#">Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi di Desa Sidaharja Kec Suradadi Kab Tegal</a> | 225.000.000   | Seleksi | APBD   | 520000930 | 01 Maret 2021 |



# **PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA**

# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT



**Total**

31

24

17

13

10

13

8

8

9


9

1


6

Pada Bulan Des 2020 terdapat 6 permohonan informasi dan telah tuntas terjawab.

# LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




# LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS

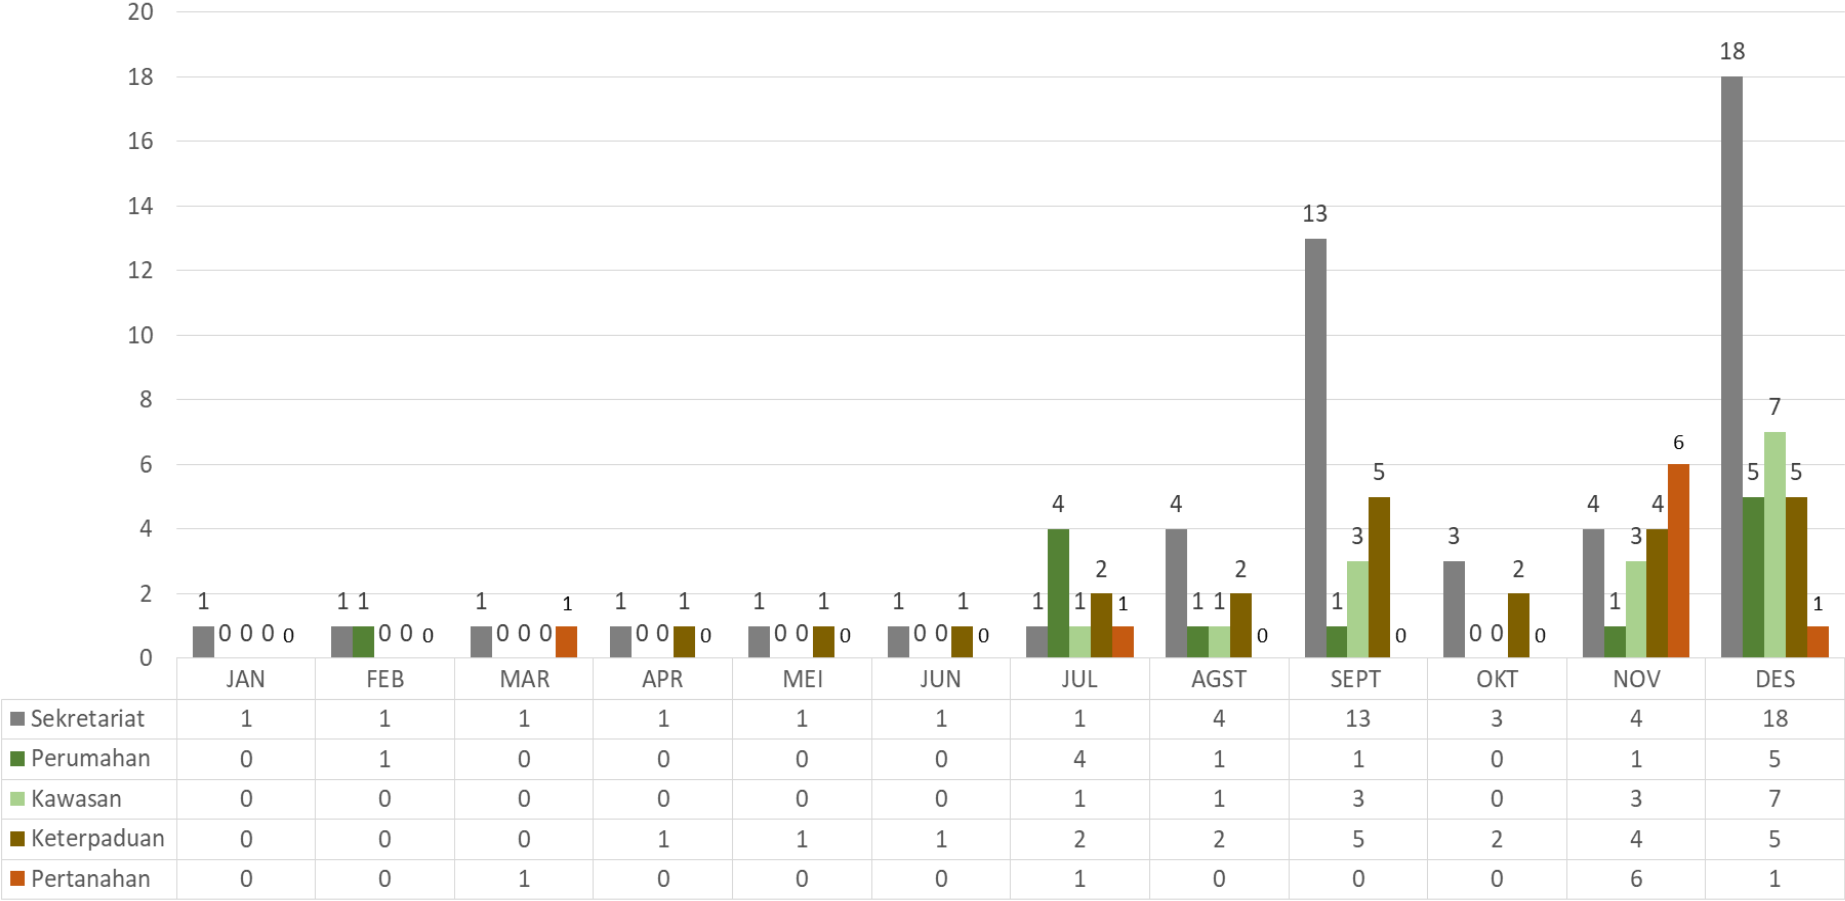



# LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS



# PENEKANAN

- 1. Untuk semua Bidang yg masih mempunyai tanggungan SPJ TA 2020,segera sampaikan Ke subag keuangan.**
- 2. TU Nihil disampaikan ke Subbag Keuangan selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulannya.**
- 3. Pengesahan SPJ TU/GU dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.**
- 4. CPNS harap mem-follow dan subscribe semua sosial media Disperakim**

# DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN

| BIDANG             | PK 2021 | LKj 2020 | TARGET KINERJA BULANAN |
|--------------------|---------|----------|------------------------|
| PERUMAHAN          | X       | X        | X                      |
| KAWASAN PERMUKIMAN | ✓       | ✓        | X                      |
| KETERPADUAN PKP    | ✓       | ✓        | ✓                      |
| PERTANAHAN         | ✓       | X        | X                      |
| SEKRETARIAT        | ✓       | ✓        | ✓                      |

STATUS TANGGAL 7 JAN 2021 jam 16.00 WIB



**TERIMAKASIH**

# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR NOVEMBER 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH


# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PELAPORAN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE DISPERAKIM
7. PENEKANAN APBD
8. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN




# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020


## PAGU AWAL

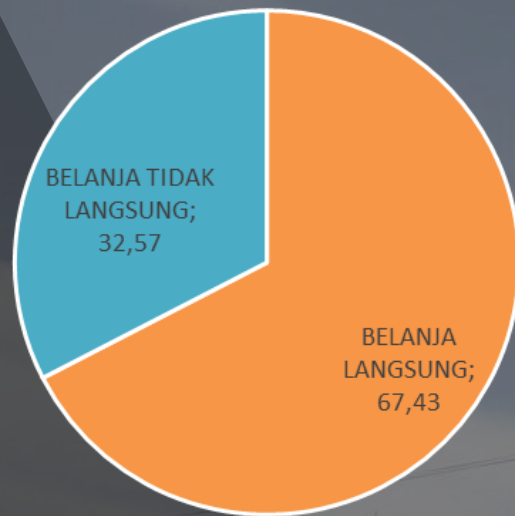

## PAGU REFOCUSING

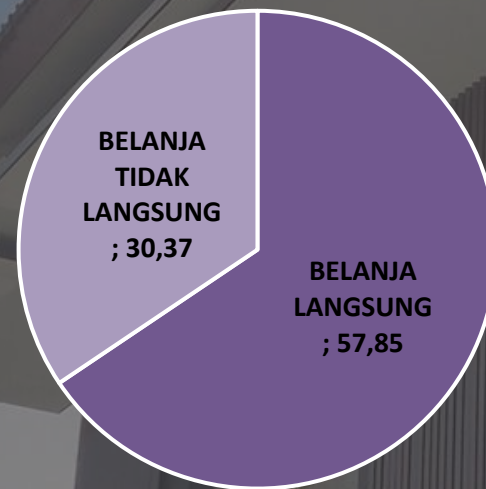

## PAGU PERUBAHAN ANGGARAN

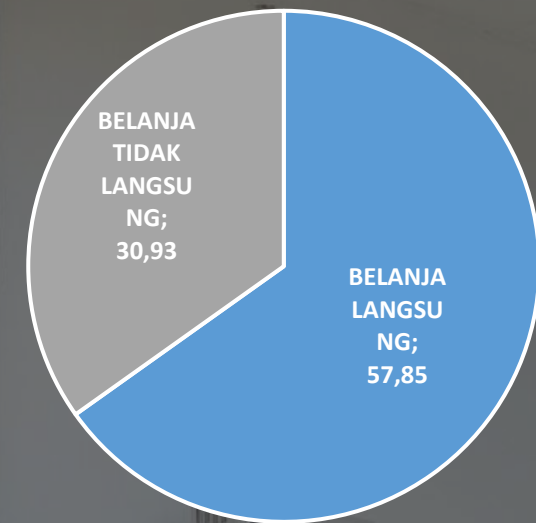


| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>44.612.807.000</b> |

| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 22.311.773.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>34.024.164.000</b> |


| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 22.311.773.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.929.049.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>34.240.822.000</b> |

# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020


**PAGU AWAL**

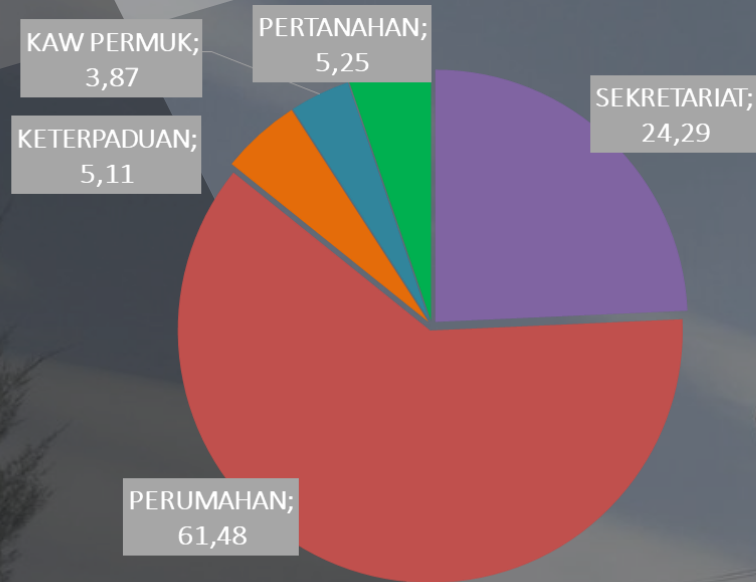

**PAGU REFOCUSING**

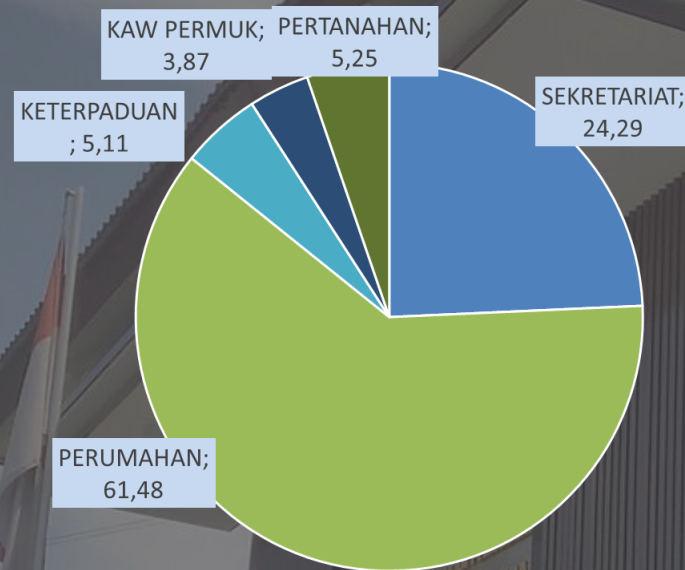

**PAGU PERUBAHAN ANGGARAN**

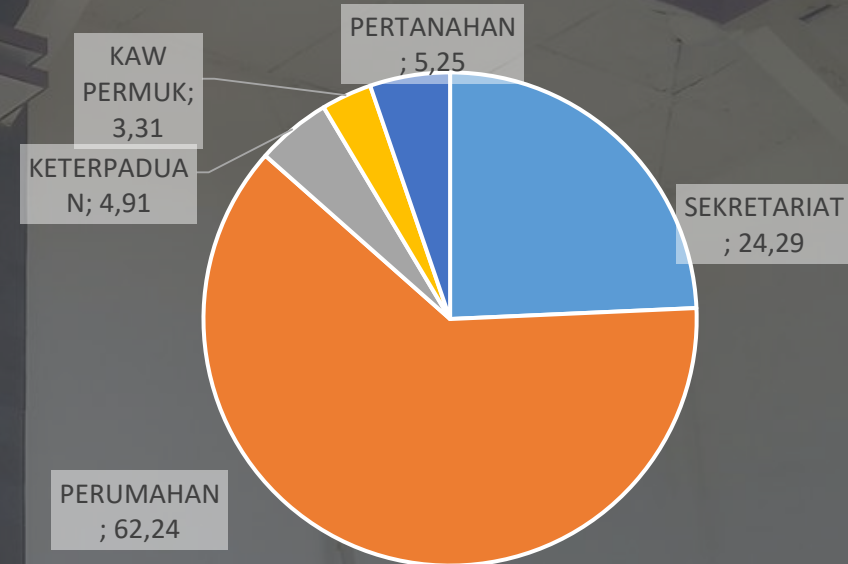

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 24,29  |
| 2     | PERUMAHAN   | 13.716.562.000 | 61,48  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.140.949.000  | 5,11   |
| 4     | KAW PERMUK  | 862.902.000    | 3,87   |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.171.827.000  | 5,25   |
| TOTAL |             | 22.311.773.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 24,29  |
| 2     | PERUMAHAN   | 13.886.258.000 | 62,24  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.094.598.000  | 4,91   |
| 4     | KAW PERMUK  | 739.557.000    | 3,31   |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.171.827.000  | 5,25   |
| TOTAL |             | 22.311.773.000 | 100,00 |






# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

STATUS AKHIR NOVEMBER 2020

# DISPERAKIM

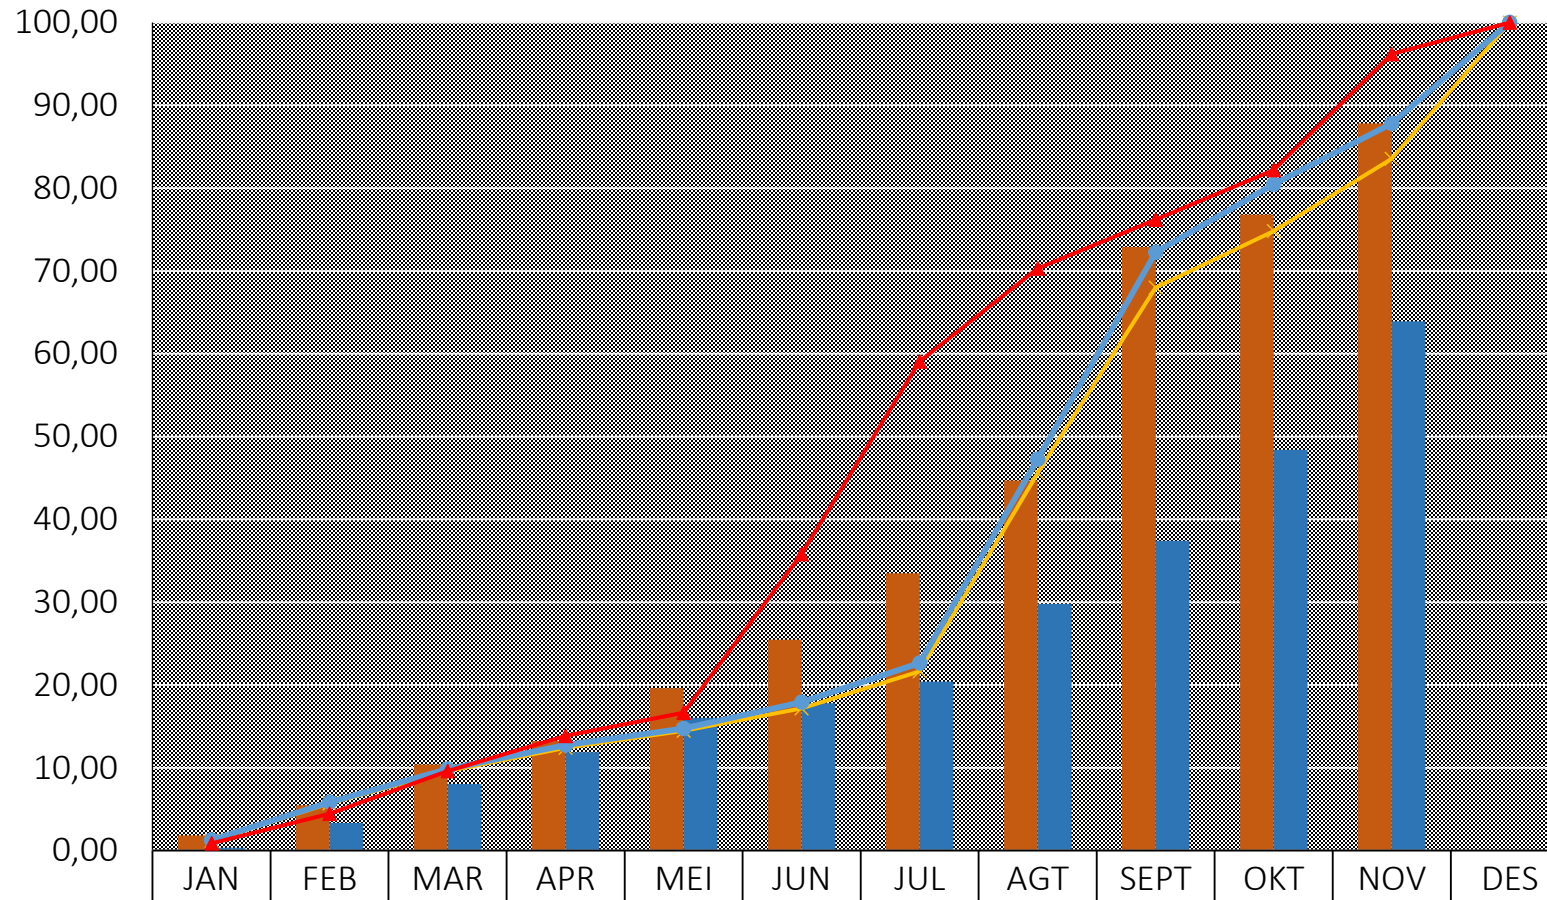


|                 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REAL FISIK      | 1,84 | 5,46 | 10,41 | 13,23 | 19,60 | 25,46 | 33,49 | 44,69 | 72,90 | 76,78 | 87,82 |        |
| REAL KEU        | 0,36 | 3,35 | 8,05  | 11,88 | 16,04 | 17,79 | 20,40 | 29,78 | 37,41 | 48,40 | 63,92 |        |
| TF/K PERUBAHAN  | 1,19 | 5,72 | 9,61  | 12,40 | 14,46 | 17,18 | 21,66 | 45,61 | 67,97 | 74,80 | 83,54 | 100,00 |
| TF/K REFOCUSING | 1,27 | 5,87 | 9,85  | 12,76 | 14,74 | 17,94 | 22,68 | 47,28 | 72,24 | 80,48 | 87,81 | 100,00 |
| TF/K AWAL       | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,00 |

|             | Nov     | Des |
|-------------|---------|-----|
| Renc. Fisik | 83,54   | 100 |
| Real. Fisik | 87,82   |     |
| Dev. Fisik  | 4,28    |     |
| Renc. Keu   | 83,54   | 100 |
| Real. Keu   | 63,92   |     |
| Dev. Keu    | (19,62) |     |

**CATATAN :** Realisasi keuangan berdasarkan e-penatausahaan status 6 Desember 2020 sebesar Rp. 15.169.682.392,- atau 67,99 %

# SEKRETARIAT

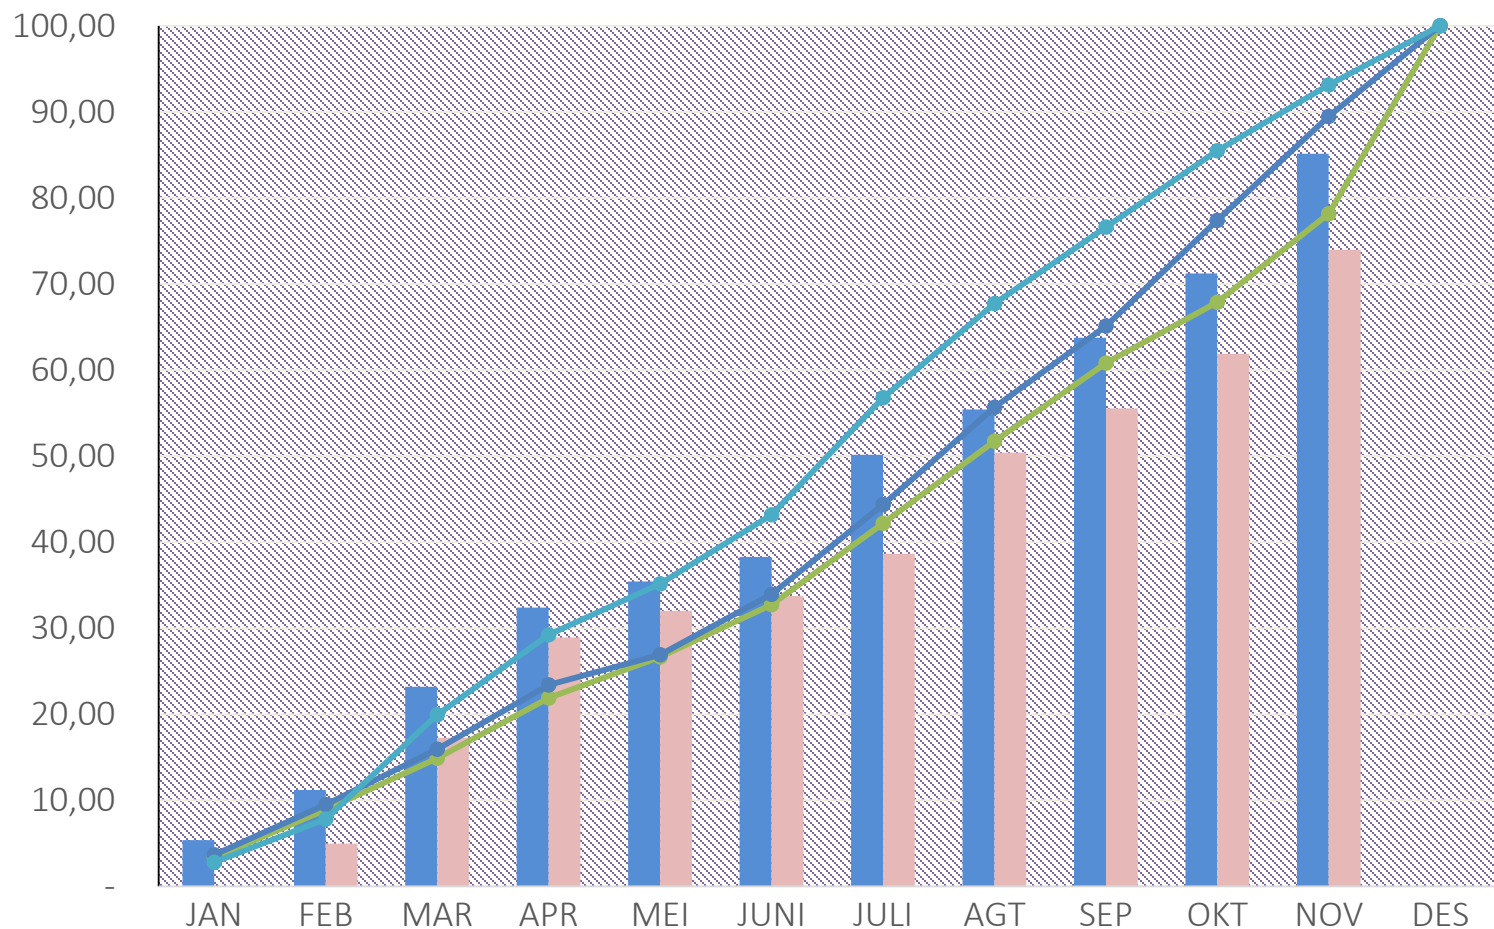

REALISASI FISIK

REALISASI KEU

TARGET F/K PERUBAHAN

TARGET F/K REFOCUSING

TARGET F/K AWAL

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGT

SEP

OKT

NOV

DES

5,36

11,21

23,20

32,40

35,43

38,28

50,15

55,43

63,75

71,21

85,13

-

4,96

17,28

28,94

32,01

33,75

38,65

50,41

55,53

61,89

73,97

3,36

8,90

14,89

21,89

26,67

32,73

42,18

51,74

60,81

67,88

78,16

100,00

3,66

9,50

15,93

23,41

26,91

33,95

44,37

55,68

65,13

77,38

89,47

100,00

2,80

7,81

19,94

29,23

35,15

43,17

56,78

67,71

76,63

85,47

93,12

100,00

Nov

Des

Renc. Fisik 78,16 100

Real. Fisik 85,13

Dev. Fisik 6,97


Renc. Keu 78,16 100

Real. Keu 73,97

Dev. Keu (4,19)

CATATAN : Realisasi keuangan Sekretariat berdasarkan e-penatausahaan status 6 Desember 2020 sebesar Rp. 4.043.349.600 atau 74,61%

# PERUMAHAN

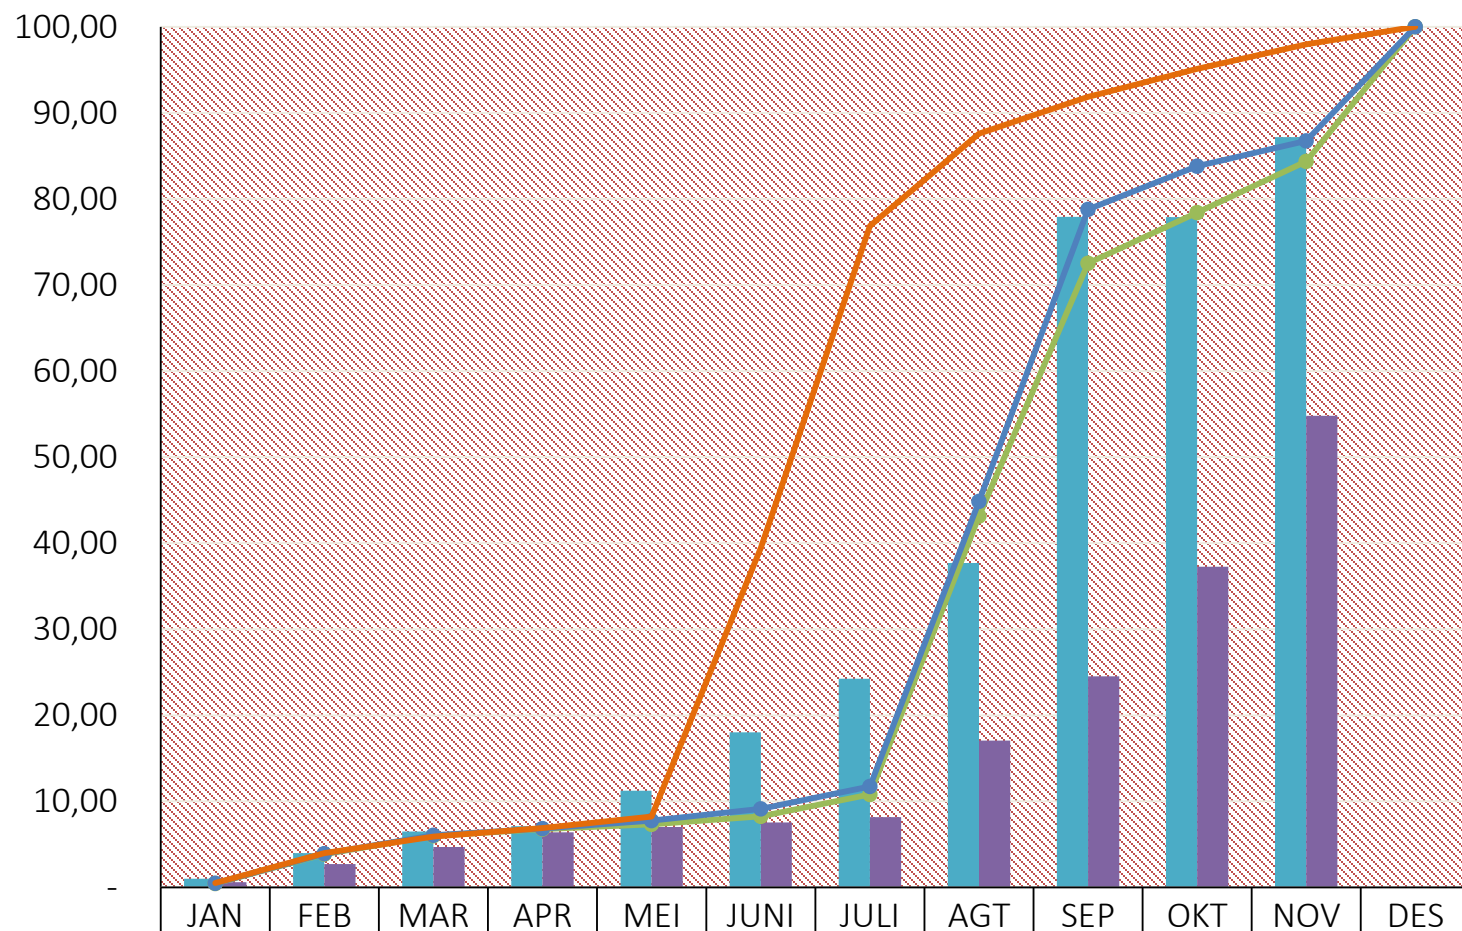


|                       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK       | 1,01 | 3,99 | 6,49 | 7,12 | 11,22 | 18,03 | 24,26 | 37,70 | 77,93 | 77,90 | 87,17 |        |
| REALISASI KEU         | 0,60 | 2,71 | 4,68 | 6,41 | 7,01  | 7,54  | 8,16  | 17,05 | 24,51 | 37,26 | 54,79 |        |
| TARGET F/K PERUBAHAN  | 0,46 | 3,85 | 6,00 | 6,76 | 7,32  | 8,26  | 10,81 | 43,16 | 72,53 | 78,41 | 84,35 | 100,00 |
| TARGET F/K REFOCUSING | 0,48 | 3,91 | 6,07 | 6,82 | 7,77  | 9,11  | 11,73 | 44,86 | 78,78 | 83,81 | 86,76 | 100,00 |
| TARGET F/K AWAL       | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,88 | 8,24  | 39,46 | 76,87 | 87,58 | 91,86 | 95,11 | 97,98 | 100,00 |

|             |         |     |
|-------------|---------|-----|
|             | Nov     | Des |
| Renc. Fisik | 84,35   | 100 |
| Real. Fisik | 87,17   |     |
| Dev. Fisik  | 2,82    |     |
| Renc. Keu   | 84,35   | 100 |
| Real. Keu   | 54,79   |     |
| Dev. Keu    | (29,56) |     |

CATATAN : Realisasi keuangan Bidang Perumahan berdasarkan e-penatausahaan status 6 Desember 2020 sebesar Rp. 8.426.155.205 atau 60,68%

# KAWASAN PERMUKIMAN

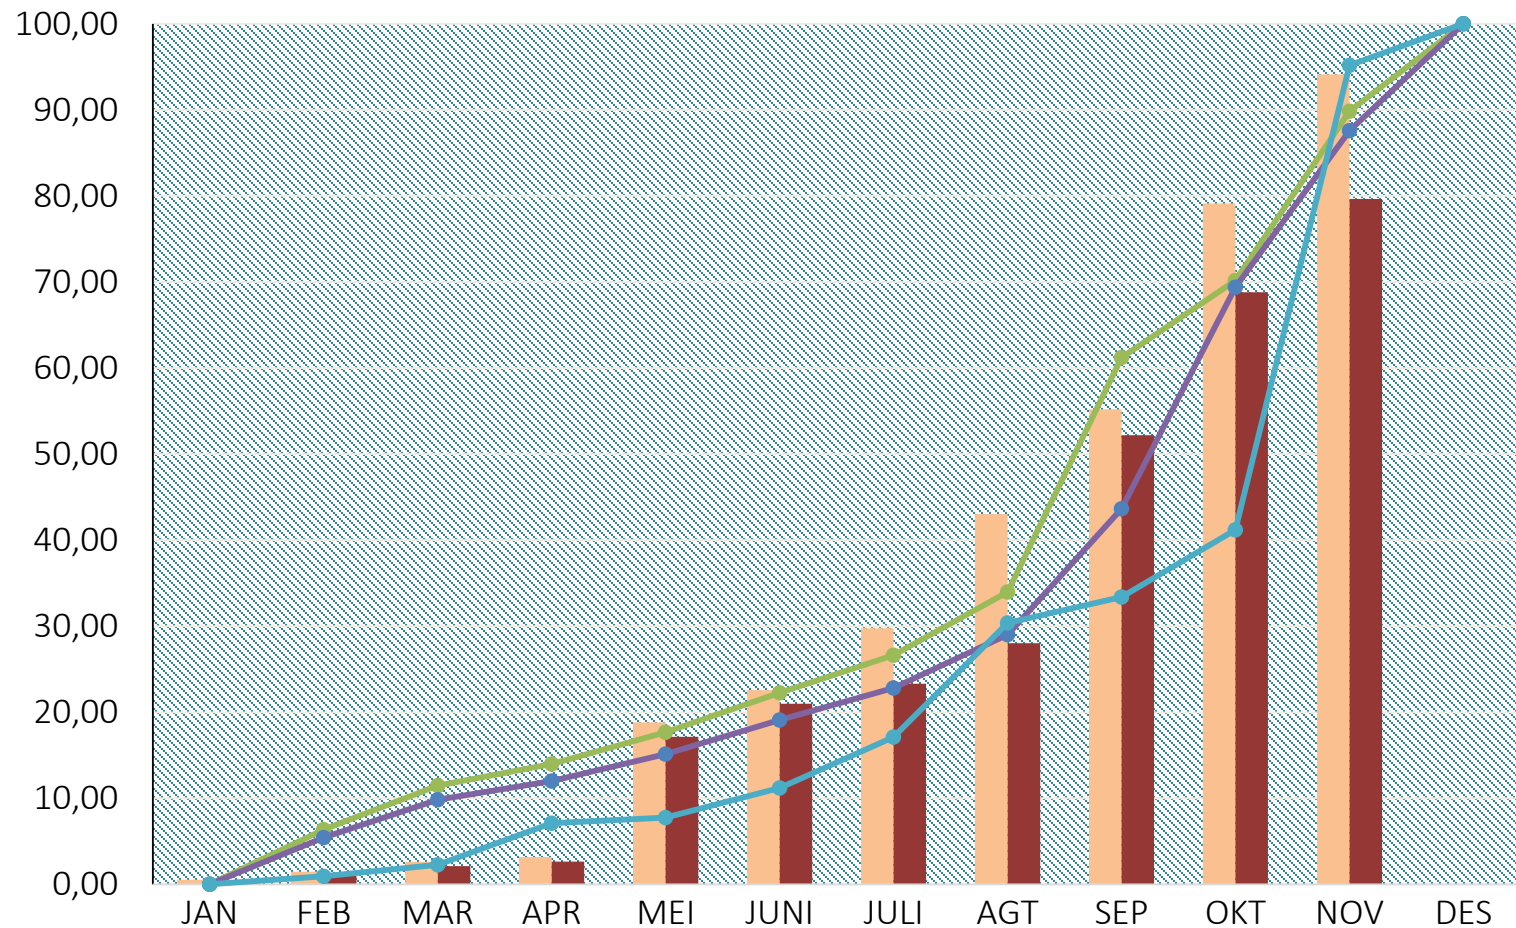

REALISASI FISIK

REALISASI KEU

TARGET F/K PERUBAHAN

TARGET F/K REFOCUSING


TARGET F/K AWAL

|      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0,54 | 1,47 | 2,61  | 3,18  | 18,81 | 22,56 | 29,75 | 43,03 | 55,19 | 79,12 | 94,14 |        |
| 0,00 | 1,28 | 2,11  | 2,64  | 17,14 | 20,99 | 23,31 | 28,04 | 52,19 | 68,80 | 79,64 |        |
| 0,00 | 6,36 | 11,49 | 14,00 | 17,68 | 22,27 | 26,62 | 33,99 | 61,21 | 70,18 | 89,84 | 100,00 |
| 0,00 | 5,45 | 9,85  | 12,00 | 15,15 | 19,09 | 22,81 | 29,01 | 43,64 | 69,40 | 87,58 | 100,00 |
| 0,00 | 0,94 | 2,29  | 7,09  | 7,77  | 11,21 | 17,11 | 30,38 | 33,38 | 41,19 | 95,17 | 100,00 |

|             | Nov     | Des |
|-------------|---------|-----|
| Renc. Fisik | 89,84   | 100 |
| Real. Fisik | 94,14   |     |
| Dev. Fisik  | 4,30    |     |
| Renc. Keu   | 89,84   | 100 |
| Real. Keu   | 79,64   |     |
| Dev. Keu    | (10,20) |     |

CATATAN : Realisasi keuangan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan e-penatausahaan status 6 Desember 2020 sebesar Rp.588.966.786 atau 79,64%

# KETERPADUAN PKPP

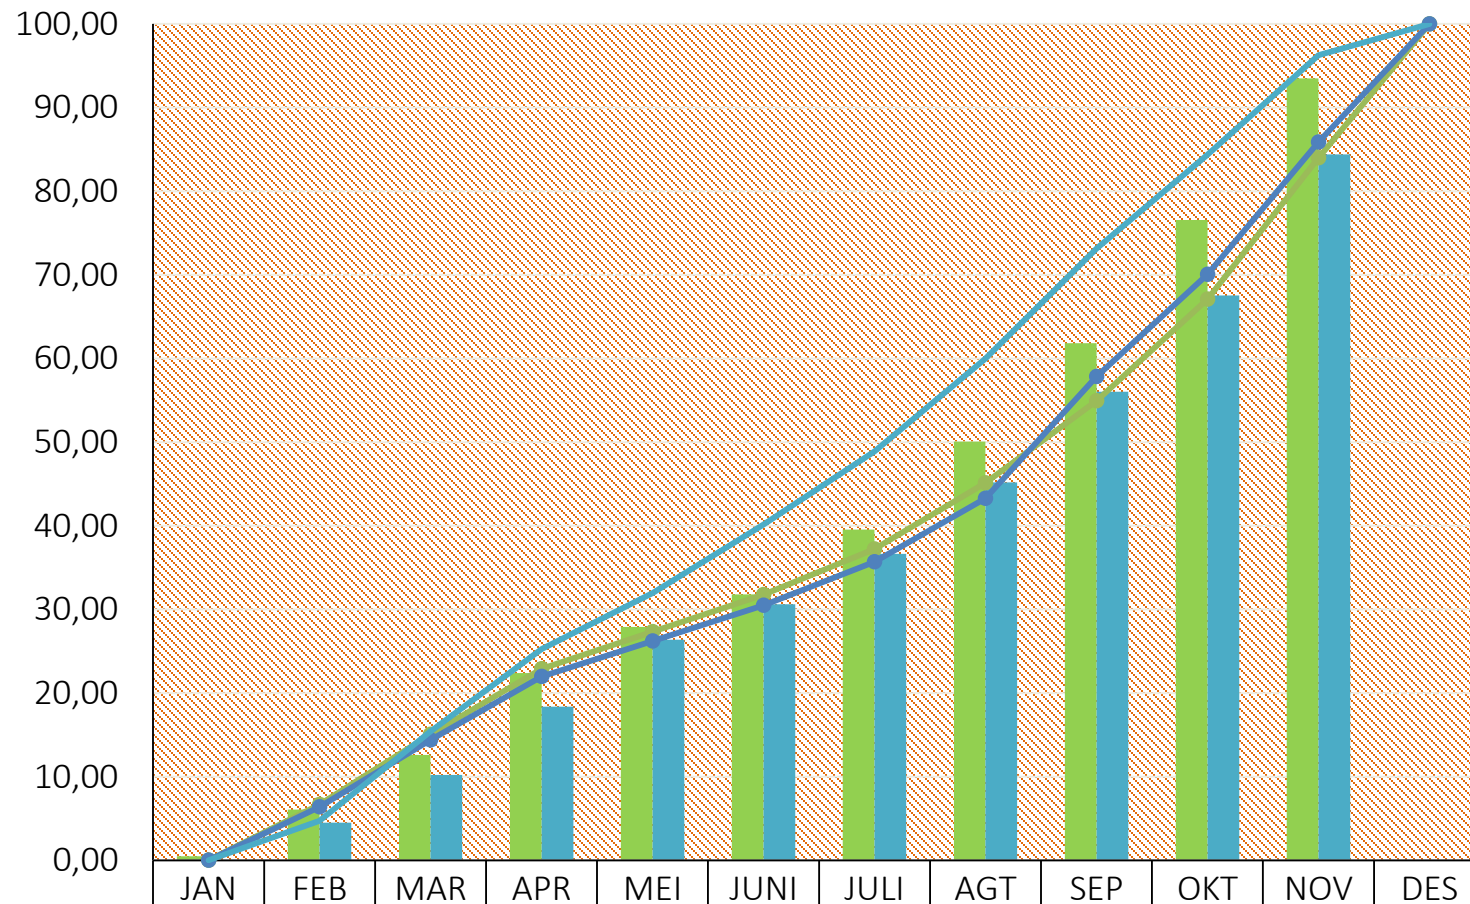


|                       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK       | 0,48 | 6,06 | 12,60 | 22,40 | 27,90 | 31,80 | 39,54 | 50,06 | 61,85 | 76,58 | 93,49 |        |
| REALISASI KEU         | 0,00 | 4,52 | 10,22 | 18,38 | 26,39 | 30,62 | 36,64 | 45,18 | 56,03 | 67,54 | 84,42 |        |
| TARGET F/K PERUBAHAN  | 0,00 | 6,69 | 15,07 | 22,90 | 27,33 | 31,76 | 37,21 | 45,13 | 54,96 | 67,10 | 83,99 | 100,00 |
| TARGET F/K REFOCUSING | 0,00 | 6,38 | 14,38 | 21,98 | 26,23 | 30,48 | 35,70 | 43,29 | 57,85 | 70,07 | 85,89 | 100,00 |
| TARGET F/K AWAL       | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 25,26 | 31,96 | 40,15 | 48,88 | 59,98 | 73,14 | 84,37 | 96,26 | 100,00 |

|             |       |     |
|-------------|-------|-----|
|             | Nov   | Des |
| Renc. Fisik | 83,99 | 100 |
| Real. Fisik | 93,49 |     |
| Dev. Fisik  | 9,50  |     |
| Renc. Keu   | 83,99 | 100 |
| Real. Keu   | 84,42 |     |
| Dev. Keu    | 0,43  |     |

**CATATAN :** Realisasi keuangan Bidang Keterpaduan PKP berdasarkan e-penatausahaan status 6 Desember 2020 sebesar Rp.979.216.501 atau 89,46%

# PERTANAHAN

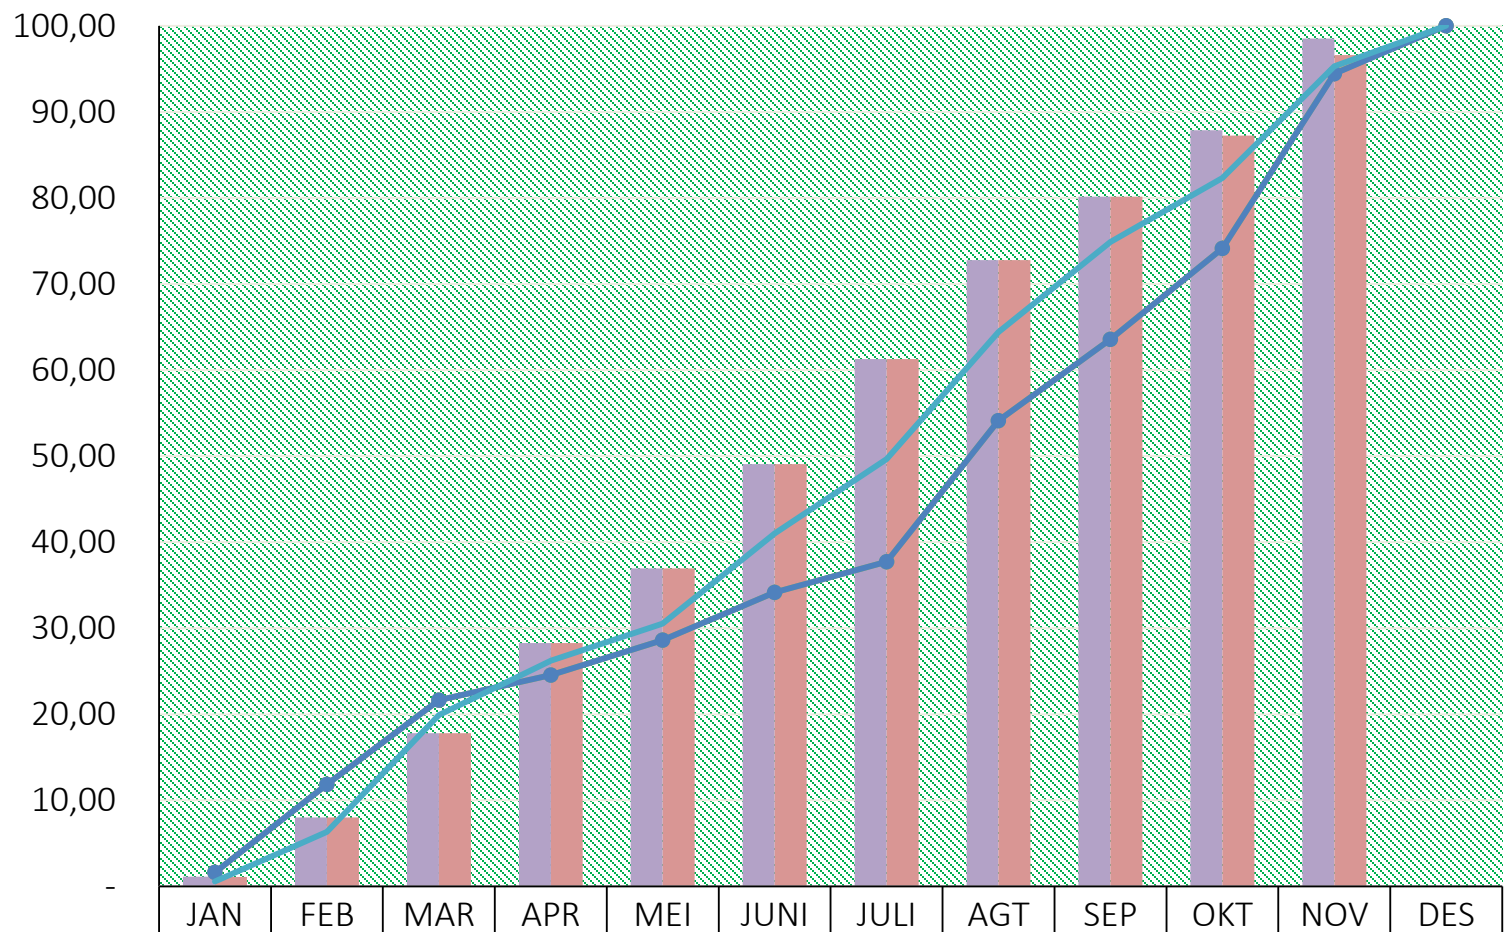

|                       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK       | 1,13 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 | 61,29 | 72,78 | 80,14 | 87,86 | 98,52 |        |
| REALISASI KEU         | 1,11 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 | 61,29 | 72,78 | 80,14 | 87,23 | 96,60 |        |
| TARGET F/K PERUBAHAN  | 1,62 | 11,86 | 21,65 | 24,55 | 28,61 | 34,16 | 37,73 | 54,13 | 63,57 | 74,14 | 94,45 | 100,00 |
| TARGET F/K REFOCUSING | 1,62 | 11,86 | 21,65 | 24,55 | 28,61 | 34,16 | 37,73 | 54,13 | 63,57 | 74,14 | 94,45 | 100,00 |
| TARGET F/K AWAL       | 0,58 | 6,34  | 19,91 | 26,24 | 30,53 | 41,00 | 49,66 | 64,40 | 74,88 | 82,31 | 95,29 | 100,00 |

|             | Nov   | Des |
|-------------|-------|-----|
| Renc. Fisik | 94,45 | 100 |
| Real. Fisik | 98,52 |     |
| Dev. Fisik  | 4,07  |     |
| Renc. Keu   | 94,45 | 100 |
| Real. Keu   | 96,60 |     |
| Dev. Keu    | 2,15  |     |

CATATAN : Realisasi keuangan Bidang Pertanahan berdasarkan e-penatausahaan status 6 Desember 2020 sebesar Rp.1.131.994.300 atau 96,60%





# **PENJELASAN KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**

STATUS AKHIR NOVEMBER 2020



# SEKRETARIAT

| NO | KEGIATAN                                                                       | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                | FISIK   | KEU    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                      | -       | -16,91 | Sisa pelaksanaan kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah          | -       | -23,87 | Menyesuaikan Kebutuhan (efisiensi)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | -       | -2,60  | Sisa lelang                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | -       | -3,85  | Sisa lelang                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | -       | -4,22  | Sisa lelang                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | -       | -27,72 | Realisasi keuangan akan ditagihkan sesuai prestasi progres fisik. Kontrak akan berakhir pada 21 Desember 2020.                                                                                                                                                                    |
| 7  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | -       | -0,49  | Sisa lelang                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | -       | -1,97  | <ul style="list-style-type: none"><li>Karena adanya covid, belanja makan minum yang semula direncanakan prasmanan, diganti menjadi nasi box dan untuk internal saja</li><li>Efisiensi pelaksanaan rapat yang semula direncanakan tatap muka, dilaksanakan secara daring</li></ul> |
| 9  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | -       | -1,21  | <ul style="list-style-type: none"><li>Efisiensi pelaksanaan rapat yang semula direncanakan tatap muka, dilaksanakan secara daring</li></ul>                                                                                                                                       |

# BIDANG PERUMAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         | FISIK   | KEU    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | -       | -38,68 | <ul style="list-style-type: none"><li>Pembayaran termin paket pengadaan dibayarkan di bulan Desember</li><li>Honorarium PPHP dibayarkan di bulan Desember</li><li>Perjalanan dinas dilaksanakan di bulan Desember</li></ul> |
| 2  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | -       | -11,51 | <ul style="list-style-type: none"><li>Pembayaran kontraktual Konsultan dan Honor tenaga Entri Data dibayarkan Bulan Desember.</li><li>Sisa pelaksanaan kegiatan/lelang</li></ul>                                            |
| 3  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | -4,64   | -7,99  | <ul style="list-style-type: none"><li>Paket jasa konsultansi Review Desain Pondasi Rusunawa Jawa Tengah di Kab. Kendal masih dalam proses pelaksanaan</li><li>Honorarium TFL dibayarkan di bulan Desember</li></ul>         |

# BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN


| NO | KEGIATAN                                                | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | FISIK   | KEU    |                                                                                                                         |
| 1  | Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan Permukiman      | -       | -21,35 | Efisiensi pelaksanaan rapat koordinasi melalui zoom                                                                     |
| 2  | Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | -3,65   | -12,28 | <ul style="list-style-type: none"><li>Efisiensi pelaksanaan rapat koordinasi melalui zoom</li><li>Sisa lelang</li></ul> |

# BIDANG PERTANAHAN

| NO | KEGIATAN                                                           | DEVIASI |       | KETERANGAN                |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|
|    |                                                                    | FISIK   | KEU   |                           |
| 1  | Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan | -       | -1,51 | Sisa pelaksanaan kegiatan |

# BIDANG KETERPADUAN PKPP

| NO | KEGIATAN                                                                              | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                       | FISIK   | KEU   |                                                                                                                                                      |
| 1  | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | -       | -0,92 | <ul style="list-style-type: none"><li>Pembayaran sisa honor pokja di bulan Desember</li><li>Pergeseran jadwal perjalanan dinas luar daerah</li></ul> |




# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA


STATUS AKHIR NOVEMBER 2020

# REKAP PENGADAAN BARANG/JASA

TOTAL PAKET: 306

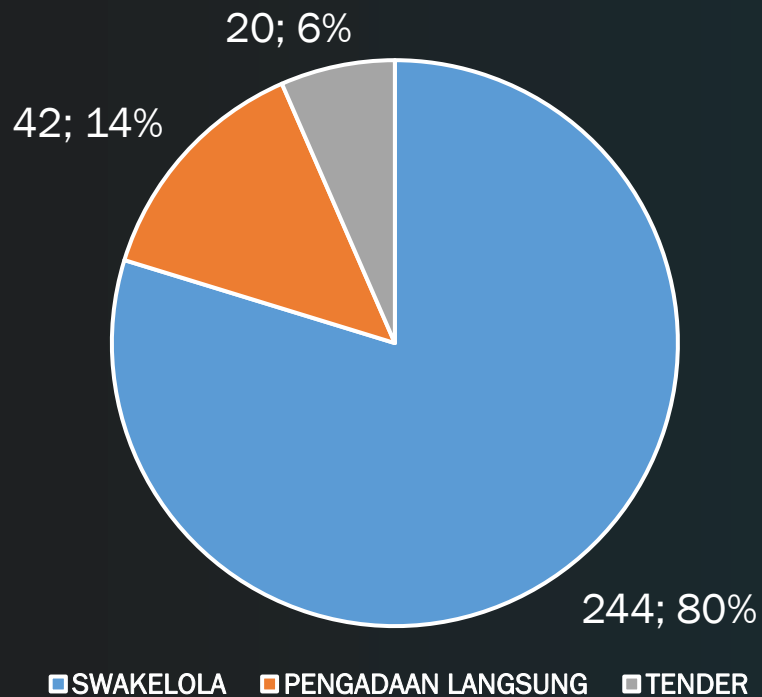

TOTAL ANGGARAN: 22.311.773.000

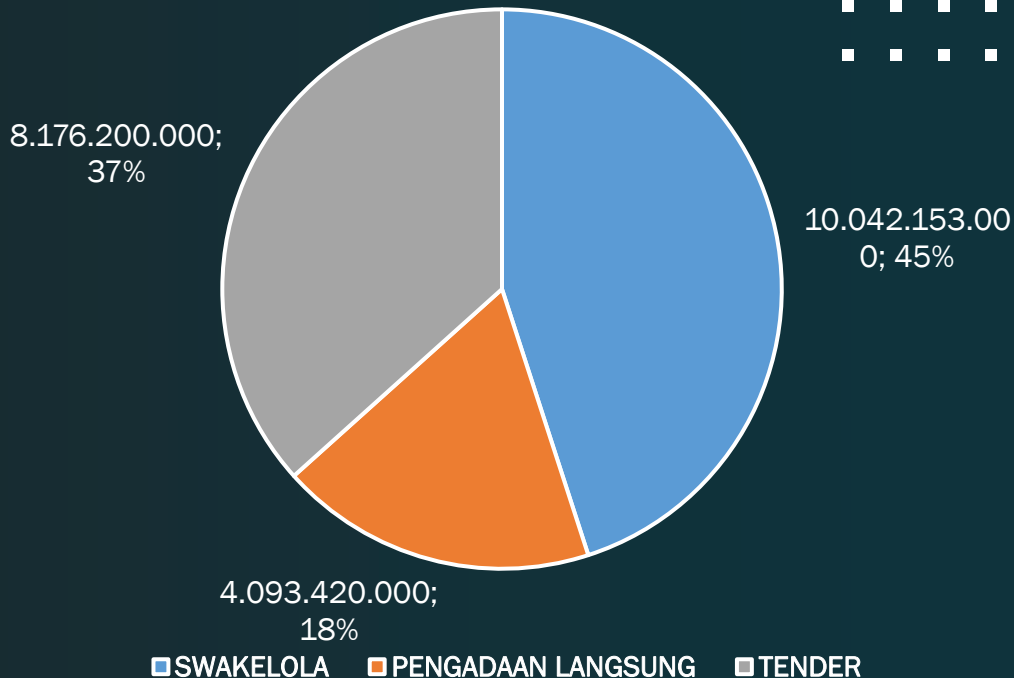

| NO    | BIDANG             | PAGU           | SWAKELOLA      |     | PENGADAAN LANGSUNG |     | TENDER        |     | TOTAL PAKET    |     |
|-------|--------------------|----------------|----------------|-----|--------------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
|       |                    |                | Rp             | Jml | Rp                 | Jml | Rp            | Jml | Rp             | Jml |
| 1     | SEKRETARIAT        | 5.419.533.000  | 3.627.773.000  | 64  | 1.520.560.000      | 16  | 271.200.000   | 1   | 5.419.533.000  | 81  |
| 2     | PERUMAHAN          | 13.886.258.000 | 4.130.258.000  | 55  | 2.011.000.000      | 16  | 7.745.000.000 | 18  | 13.886.258.000 | 89  |
| 3     | KAWASAN PERMUKIMAN | 739.557.000    | 579.557.000    | 40  | -                  | -   | 160.000.000   | 1   | 739.557.000    | 41  |
| 4     | KETERPADUAN PKPP   | 1.094.598.000  | 621.898.000    | 46  | 472.700.000        | 8   | -             | -   | 1.094.598.000  | 54  |
| 5     | PERTANAHAN         | 1.171.827.000  | 1.082.667.000  | 39  | 89.160.000         | 2   | -             | -   | 1.171.827.000  | 41  |
| TOTAL |                    | 22.311.773.000 | 10.042.153.000 | 244 | 4.093.420.000      | 42  | 8.176.200.000 | 20  | 22.311.773.000 | 306 |

SELURUH PAKET SUDAH TERKONTRAK

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                    | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE       | PROGRES LELANG                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                                         |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (7 bulan)               | 271.200.000         | Tender Cepat | Masa Kontrak 1 Juni s.d. 31 Desember 2020                                               |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                                         |
| 2                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan | 490.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 20 Oktober 2020) |
| 3                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang  | 420.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 20 Oktober 2020) |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak    | 595.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 20 Oktober 2020) |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara   | 350.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati               | 315.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 7                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes   | 630.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 17 Juli s.d. 14 Oktober 2020                                       |
| 8                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemasang | 770.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 19 Oktober 2020) |

| NO.                       | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                         |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara                                                                                            | 420.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 10                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo                                                                                                | 245.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 11                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung                                                                                              | 385.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 12                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen                                                                                                 | 700.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 17 Juli s.d. 14 Oktober 2020 (perpanjangan s.d. 8 November 2020)   |
| 13                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten                                                                                                  | 350.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 8 November 2020) |
| 14                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen                                                                                                  | 350.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 17 Juli s.d. 14 Oktober 2020 (perpanjangan s.d. 8 November 2020)   |
| 15                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo                                                                                               | 630.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
|                           |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo Tahap II                                                                                      | 175.000.000         |         |                                                                                         |
| 16                        | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 14 Juli s.d. 11 September 2020                                     |
| 17                        |                                                                                                                                         | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000         | Seleksi | Masa Kontrak Tanggal 17 Juni s.d. 15 Oktober 2020                                       |
| 18                        |                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000         | Seleksi | Masa Kontrak Tanggal 17 Juni s.d. 15 September 2020                                     |
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                     |         |                                                                                         |
| 19                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Pemukiman                                                               | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                                                                         | 160.000.000         | Seleksi | Masa Kontrak 20 Juli s.d. 17 September 2020                                             |



# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 10 Juli 2020         |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Masa Kontrak 2 Januari s.d. 31 Desember 2020  |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Masa Kontrak 2 Januari s.d. 31 Desember 2020  |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 9 Maret 2020         |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 118.560.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 20 Juli 2020         |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 3 Agustus 2020       |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 8 September 2020     |
| 8   |                                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 21 Juli 2020         |
| 9   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Masa Kontrak 14 s.d. 28 September 2020        |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       | Masa Kontrak 23 Oktober s.d. 21 Desember 2020 |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       | Masa Kontrak 22 Oktober s.d. 20 November 2020 |
| 12  |                                                                                | Rehab Gedung Penataan Interior Ruang Kantor Disperakim Provinsi Jawa Tengah                               | 182.250.000      | Masa Kontrak 23 Oktober s.d. 21 Desember 2020 |
| 13  |                                                                                | Rehab Gedung Peninggian (Leveling) Area Parkir dan Kantin Belakang                                        | 173.340.000      | Masa Kontrak 23 Oktober s.d. 21 Desember 2020 |
| 14  |                                                                                | Rehab Gedung (Pengadaan dan Pemasangan Pintu Geser Automatis)                                             | 49.410.000       | Masa Kontrak 5 November s.d. 30 November 2020 |
| 15  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020                 |
| 16  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Belanja Sewa Hotel                                                                                        | 86.400.000       | Sudah terlaksana 6-7 Maret 2020               |



# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERUMAHAN**

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                 | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                              | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020  |
| 2  |                                                                                                                                          | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       | Masa Kontrak 7 Juli s.d. 4 Oktober 2020       |
| 3  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 175.000.000      | Masa Kontrak 10 Juli s.d. 23 Agustus 2020     |
| 4  |                                                                                                                                          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru I                                                                      | 100.000.000      | Masa Kontrak 15 Juli s.d. 14 Oktober 2020     |
| 5  |                                                                                                                                          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru II                                                                     | 100.000.000      | Masa Kontrak 15 Juli s.d. 14 Oktober 2020     |
| 6  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      | Masa Kontrak 3 April s.d. 28 November 2020    |
| 7  |                                                                                                                                          | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 42.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020    |
| 8  |                                                                                                                                          | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Masa Kontrak 31 Jan s.d. 30 Maret 2020        |
| 9  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pekerjaan Review Desain Pondasi Rusunawa Jawa Tengah di Kab. Kendal                                       | 50.000.000       | Masa Kontrak 6 November s.d. 20 Desember 2020 |
| 10 |                                                                                                                                          | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      | Masa Kontrak 5 Agustus s.d. 18 Okt 2020       |
| 11 |                                                                                                                                          | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      | Masa Kontrak 5 Agustus s.d. 18 Okt 2020       |
| 12 |                                                                                                                                          | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      | Masa Kontrak 12 Agustus s.d. 25 Sept 2020     |
| 13 |                                                                                                                                          | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      | Masa Kontrak 12 Agustus s.d. 25 Sept 2020     |
| 14 |                                                                                                                                          | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      | Masa Kontrak 11 Agustus s.d. 24 Sept 2020     |
| 15 |                                                                                                                                          | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      | Masa Kontrak 11 Agustus s.d. 24 Sept 2020     |
| 16 |                                                                                                                                          | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      | Masa Kontrak 14 Juli s.d. 11 Sept 2020        |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Paket kegiatan fullboard Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                        | 56.700.000       | Sudah Terlaksana 18-19 November 2020            |
| 2   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       | Masa Kontrak 21 Juli s.d. 18 November 2020      |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Masa Kontrak 17 Februari s.d. 16 April 2020     |
| 4   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Masa Kontrak 12 Maret 2020 s.d. 7 Desember 2020 |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Masa kontrak 3 Februari s.d. 31 Desember 2020   |
| 6   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       | Masa Kontrak 20 Februari s.d. 20 Desember 2020  |
| 7   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Masa Kontrak 20 Februari s.d. 20 Desember 2020  |
| 8   | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Konsultan Individual Evaluasi dan Pemantauan                                                                            | 66.000.000       | Masa Kontrak 12 Februari s.d. 31 Desember 2020  |


# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                             | NAMA PAKET                                 | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi<br>Pembangunan Untuk                                | Sewa Hotel Paket Full board                | 24.160.000       | Sudah terlaksana pada 25 s.d. 26 November 2020 |
| 2   | Kepentingan Umum dan<br>Penanganan Tertib<br>Administrasi Pertanahan | Belanja Jasa Konsultansi Non<br>Konstruksi | 65.000.000       | Masa Kontrak 7 Agustus s.d. 6 Oktober 2020     |

# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

## Catatan :

Data yang ditampilkan masih status akhir Oktober 2020. dikarenakan sedang terjadi maintenance pada website LAPORGUB sejak Minggu 1 Bulan November hingga saat ini.

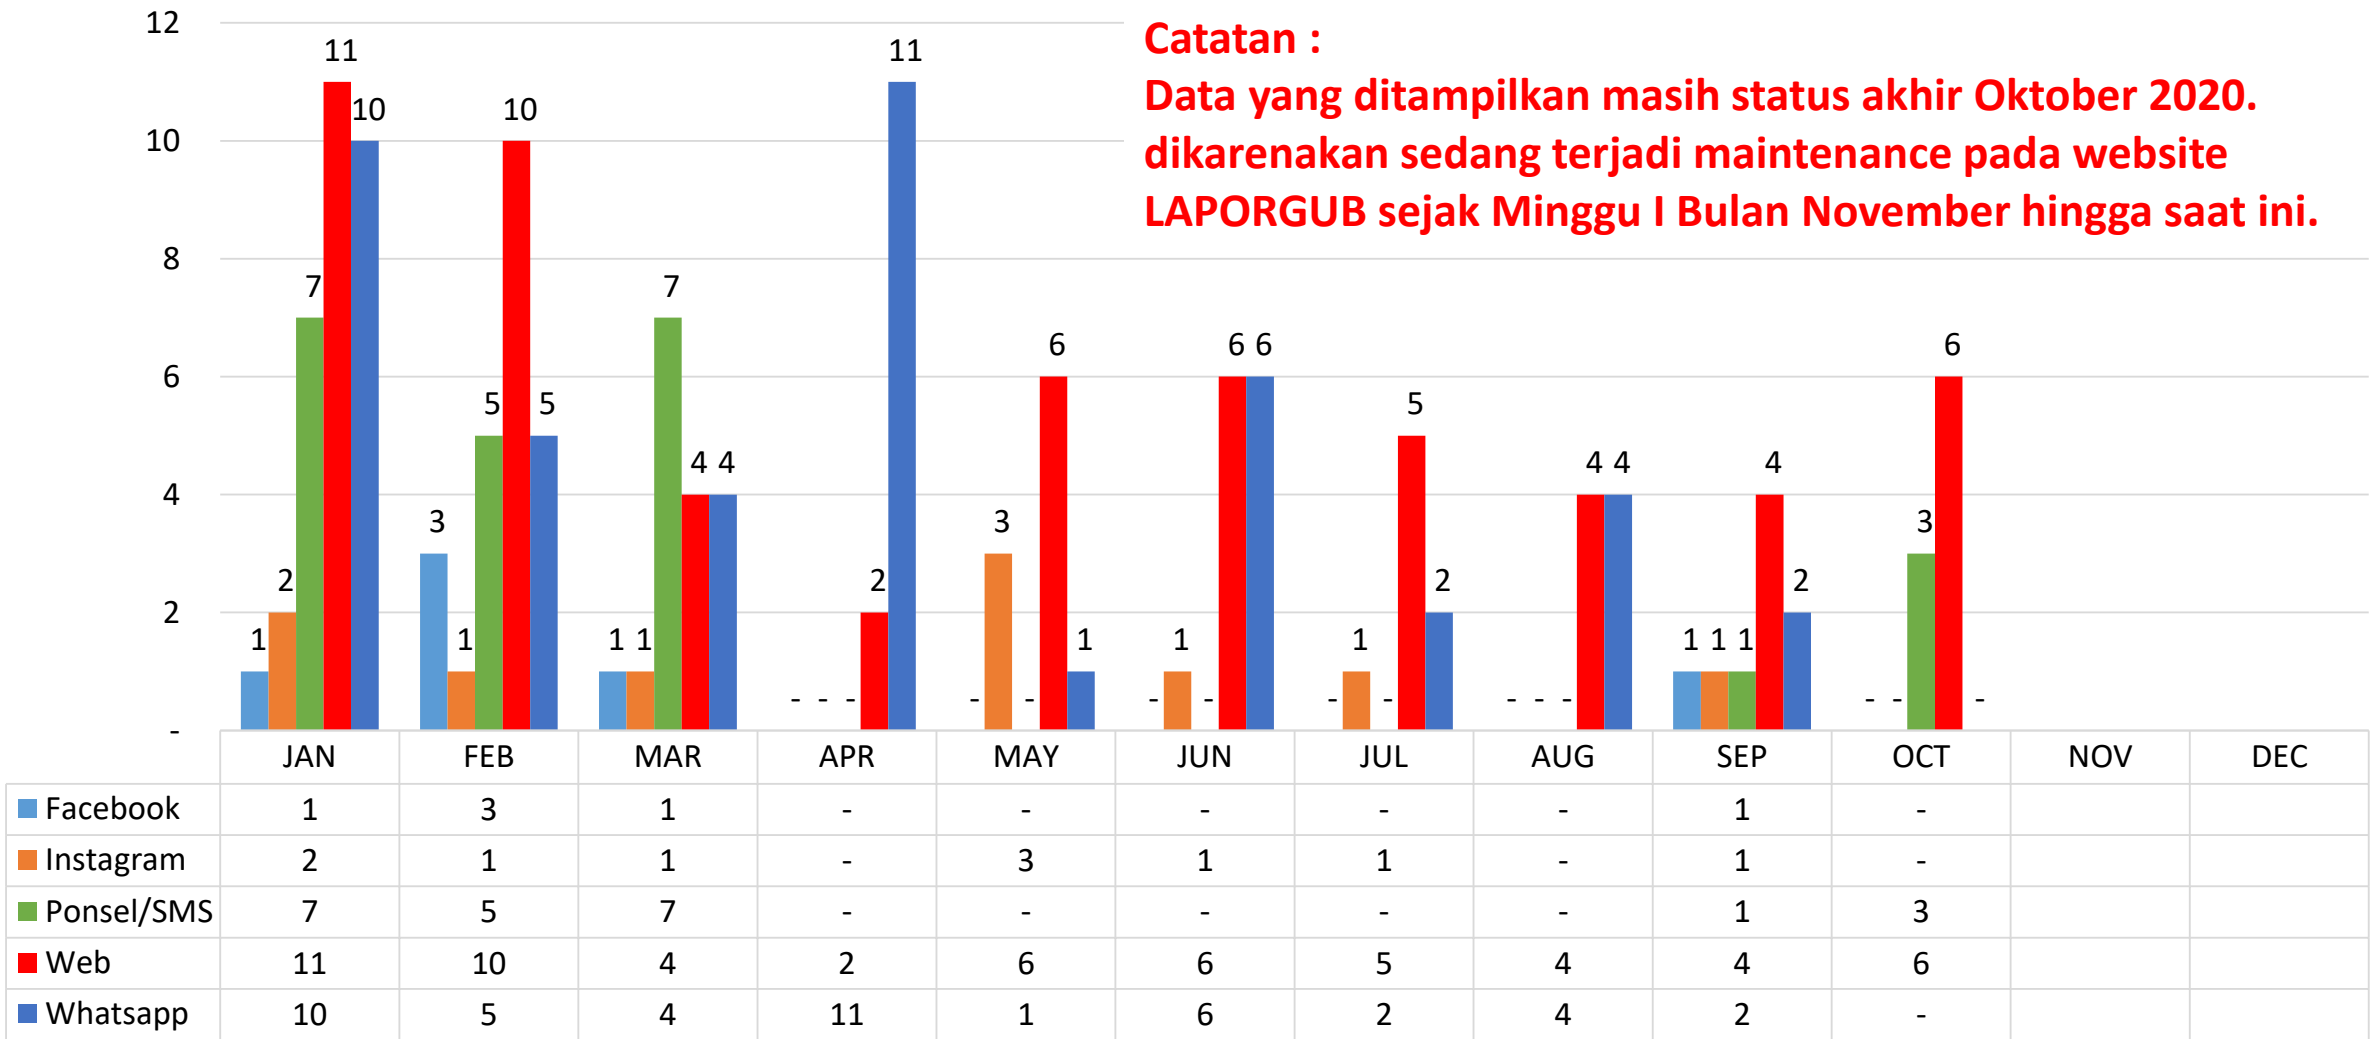

**Total**

**24**

**17**

**13**

**10**

**13**

**8**

**8**

**9**

**9**


Terdapat 9 permohonan informasi dan telah tuntas terjawab.

2020-12-04 07:43

- Laporan
- Tindakan
- Statistik
- Managemen User

### Statistik Laporan Pengaduan s/d December 2020 (Website)

Source: laporgub.jatengprov.go.id




Belum Dijawab Verifikasi Progres Selesai Perlu Tindaklanjuti Hasil Survei Hasil Mediasi Dikembalikan Bukan Wewenang Ditolak

Highcharts.com

### Statistik Laporan Pengaduan s/d December 2020 (SMS LapoGub)

Source: SMS LapoGub 08112920200

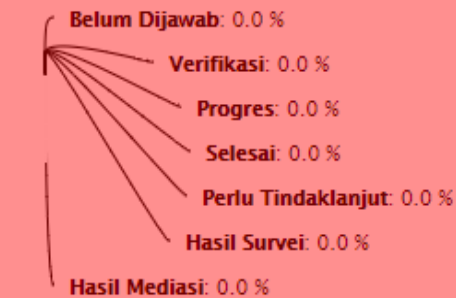

Belum Dijawab Verifikasi Progres Selesai Perlu Tindaklanjuti Hasil Survei




Password




Logout

Layar tampilan pada website LAPORGUB.

# LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




# LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS

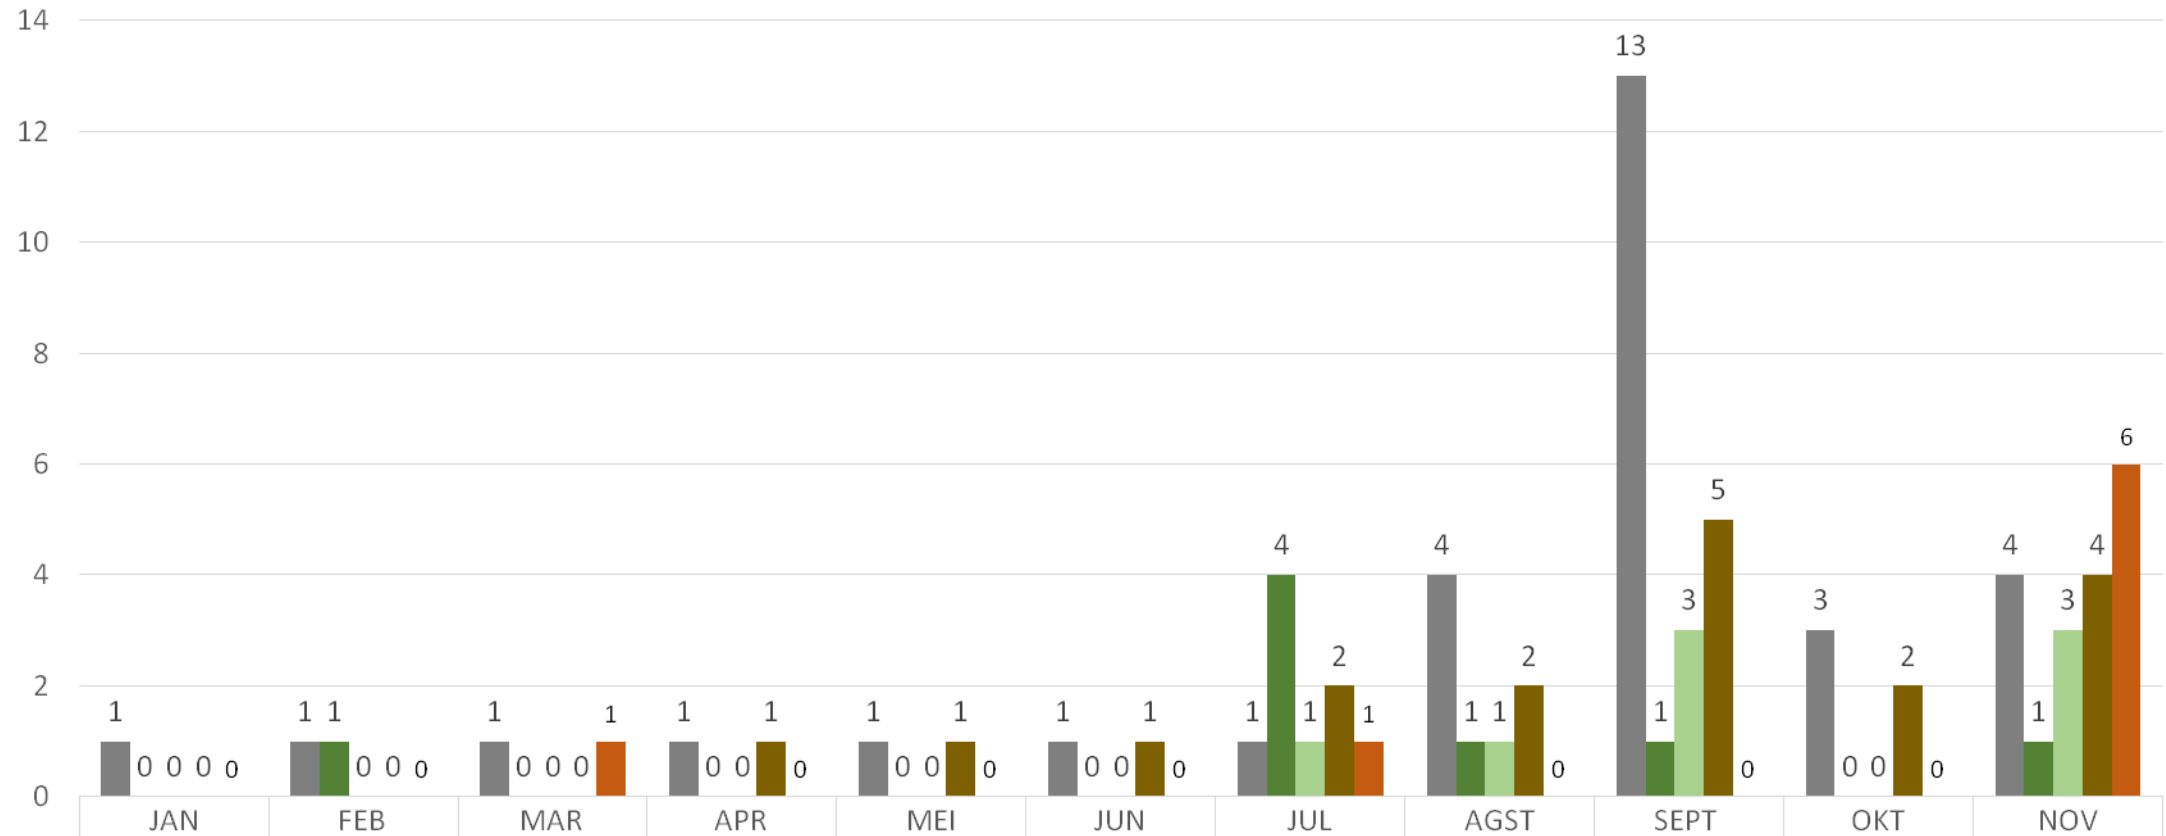

|               | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| ■ Sekretariat | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 4    | 13   | 3   | 4   |
| ■ Perumahan   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 1    | 1    | 0   | 1   |
| ■ Kawasan     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1    | 3    | 0   | 3   |
| ■ Keterpaduan | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2    | 5    | 2   | 4   |
| ■ Pertanian   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0    | 0    | 0   | 6   |

# LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS





# PENEKANAN APBD

1. Setiap bidang harap mengumpulkan **capaian kinerja status November dan perkiraan Desember 2020** ke Subbag Program paling lambat **Senin, 14 Desember 2020**.
2. Setiap Pejabat Eselon III dan IV harus segera menyusun **Laporan Kinerja Pejabat Eselon (LKj) TA 2020 (format kertas A4)**, dikumpulkan dalam kondisi sudah ditandatangani ke Subbag Program dalam bentuk hard dan soft file **paling lambat 30 Desember 2020** (Tanda tangan Kepala Dinas akan dimintakan secara kolektif oleh Subbag Program).
3. Setiap bidang harap menyusun **RKA dan RAB usulan kegiatan TA 2022** dengan memperhatikan **pemenuhan Target Capaian Kinerja Renstra-RPJMD 2018-2023**. Dikumpulkan setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk softfile dan hardfile ke Subbag Program selambat-lambatnya **Senin, 14 Desember 2020**.
4. Batas Akhir Pengajuan untuk disampaikan ke Subbag Keuangan:
  - Pengajuan **TU/GU** paling lambat tgl **4 Desember 2020**.
  - Pengajuan **TU/GU NIHIL** paling lambat tgl **18 Desember 2020**.
  - Pengajuan **LS** paling lambat tgl **8 Desember 2020**.
5. Bagi seluruh Pengelola Keuangan Bidang dimohon untuk memperhatikan batas waktu penyampaian berkas ke Subbag Keuangan terkait penandatanganan dokumen.

# PENEKANAN APBD


6. MENYIAPKAN SK PENGELOLA KEUANGAN TA. 2021 BERDASAR NOMENKLATUR SUB-KEGIATAN PERMENDAGRI 90 TH 2019, SELAMBAT-LAMBATNYA DISAMPAIKAN KE BPKAD HARI INI SENIN TANGGAL 7 DESEMBER 2020 JAM 14.00.

**APBN**



# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


## PAGU – Rp 511.716.349.000

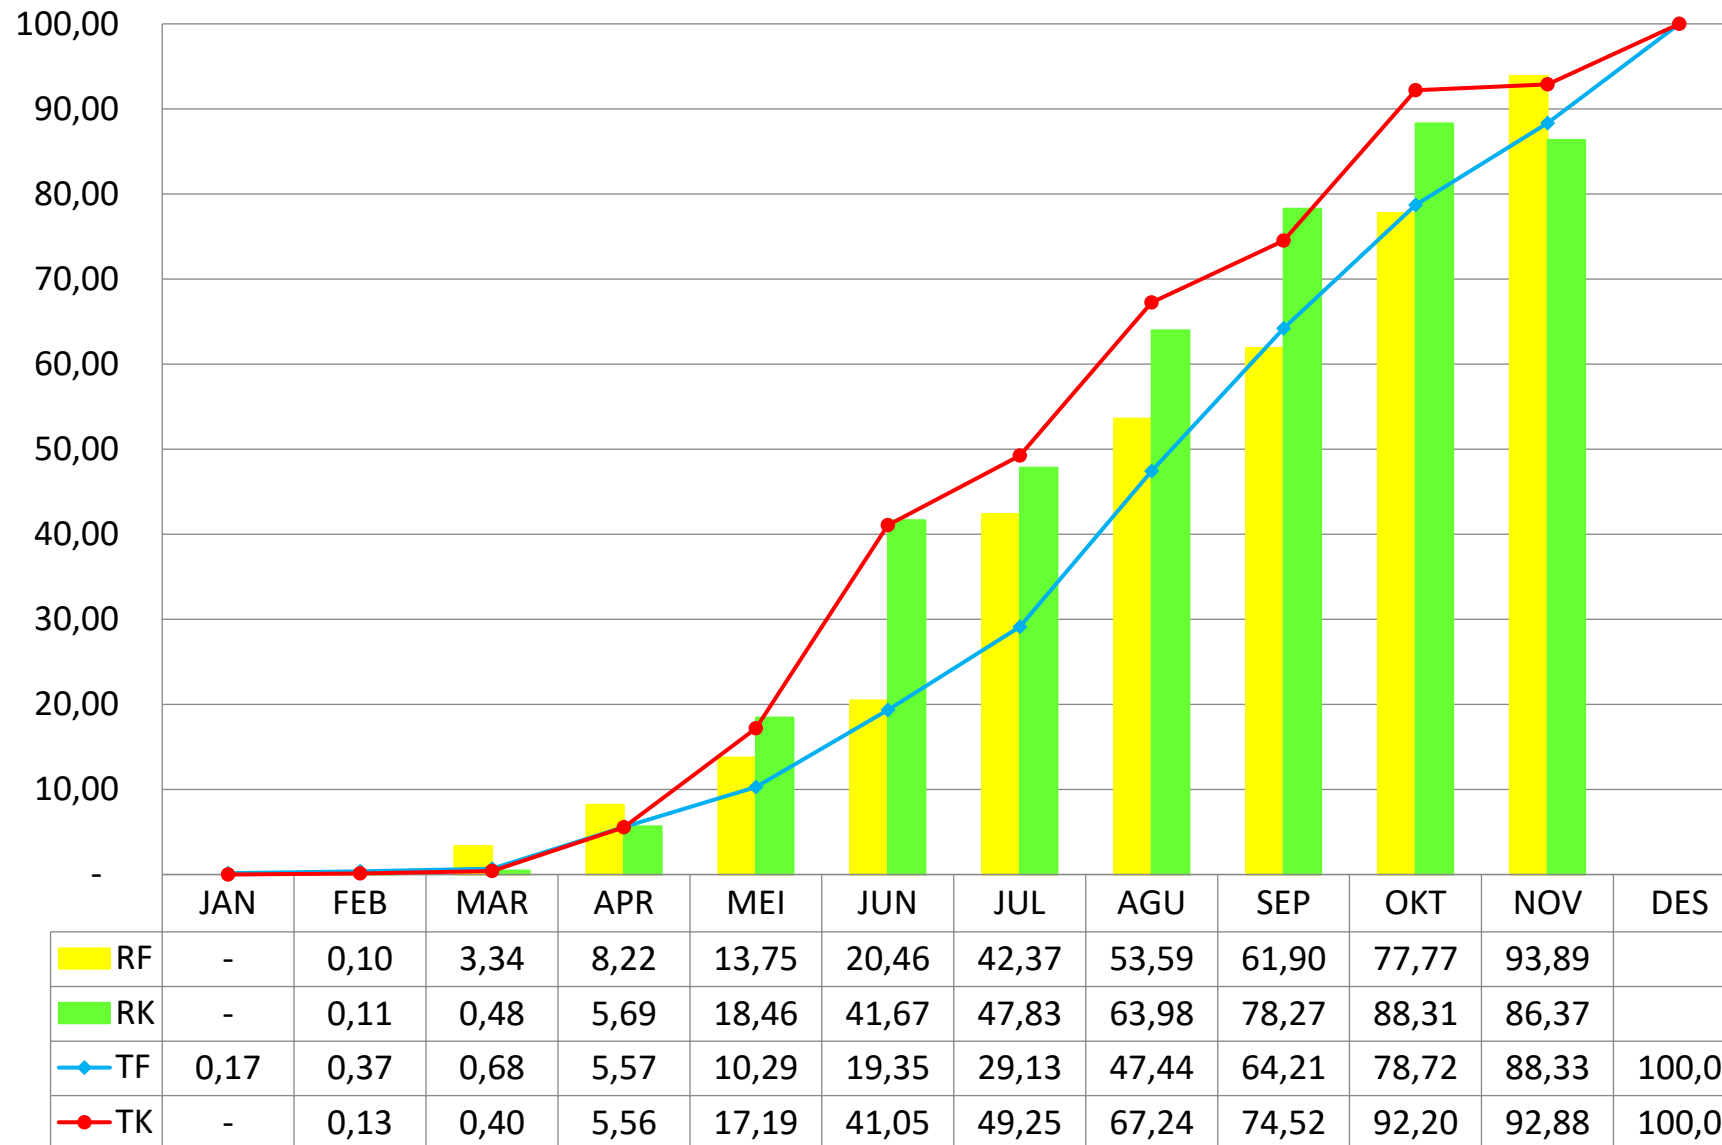

|             | Nov          | Des |
|-------------|--------------|-----|
| Renc. Fisik | 88,33        | 100 |
| Real. Fisik | <b>93,89</b> |     |
| Dev. Fisik  | 5,56         |     |
| Renc. Keu   | 92,88        | 100 |
| Real. Keu   | <b>86,37</b> |     |
| Dev. Keu    | (6,51)       |     |

# BPPW JATENG

## PAGU – Rp 1.026.566.754.000

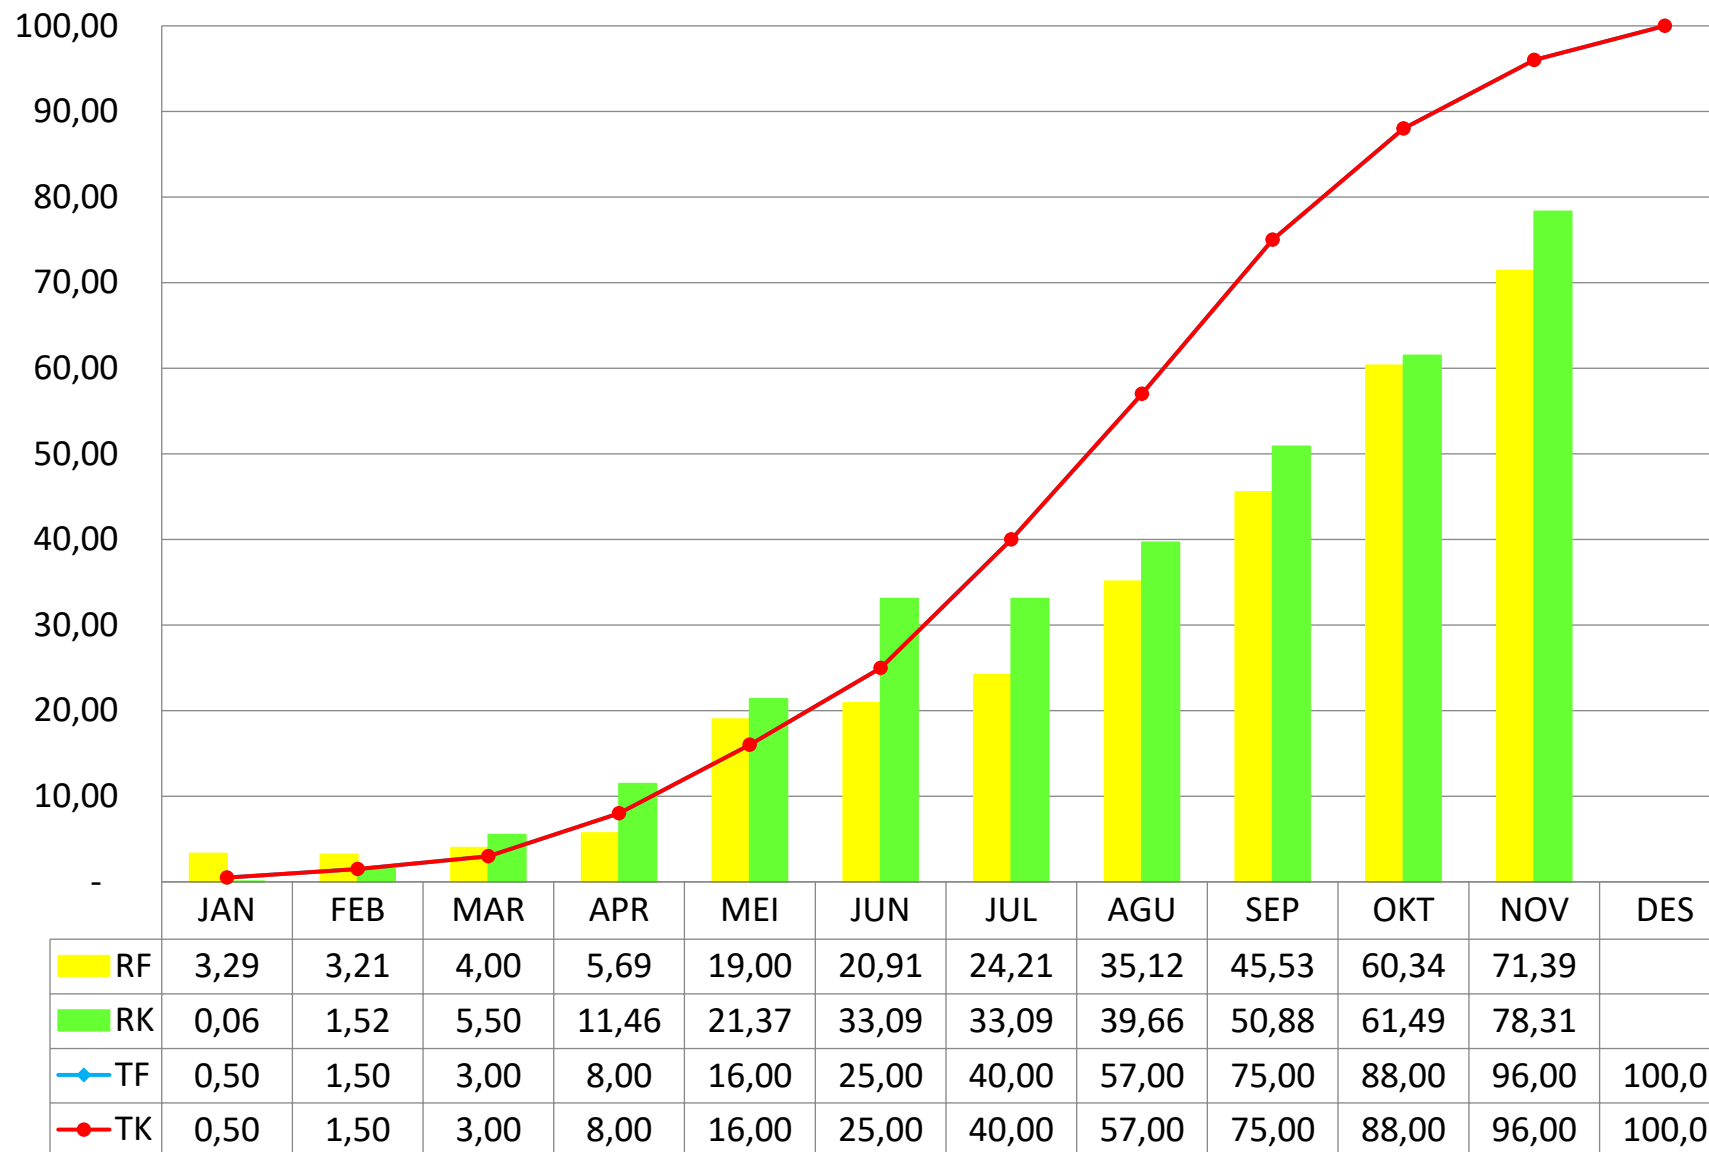

|             | Nov     | Des |
|-------------|---------|-----|
| Renc. Fisik | 96,00   | 100 |
| Real. Fisik | 71,39   |     |
| Dev. Fisik  | (24,61) |     |
| Renc. Keu   | 96,00   | 100 |
| Real. Keu   | 78,31   |     |
| Dev. Keu    | (17,69) |     |

**Status 06/12/2020 : keu  
=79,89%, fis= 73,09%**

A solid red square is positioned on the left side of the image. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**



# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR OKTOBER 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH


# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PELAPORAN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE DISPERAKIM
7. PENEKANAN APBD
8. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN




# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020


## PAGU AWAL

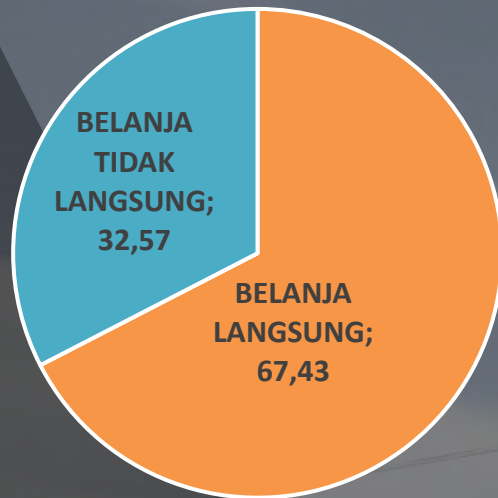

## PAGU REFOCUSING

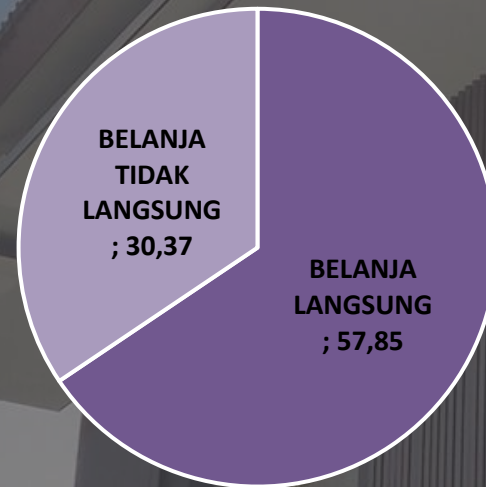

## PAGU PERUBAHAN ANGGARAN

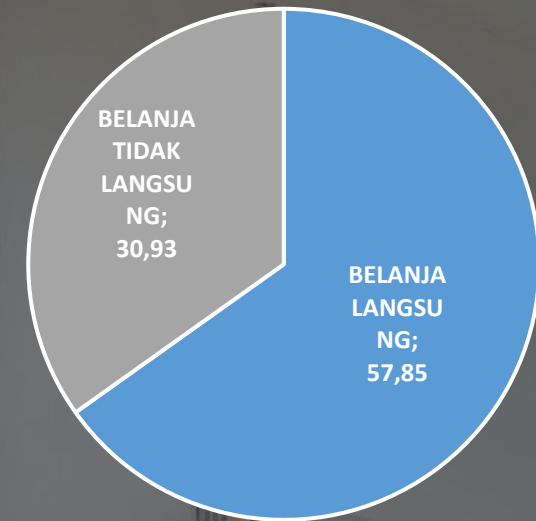


| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>44.612.807.000</b> |

| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 22.311.773.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>34.024.164.000</b> |


| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 22.311.773.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.929.049.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>34.240.822.000</b> |

# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020


**PAGU AWAL**

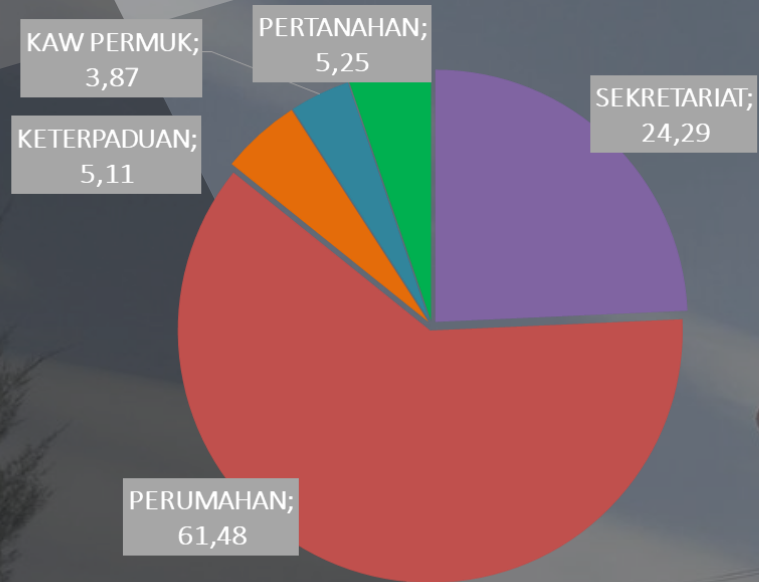

**PAGU REFOCUSING**

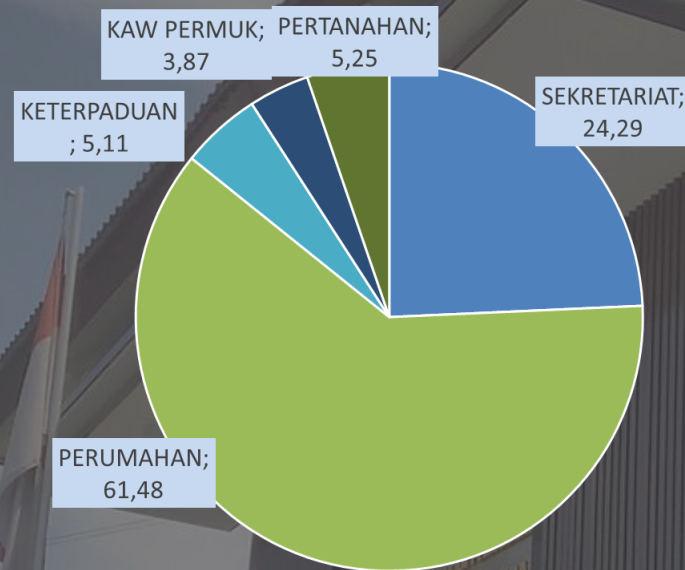

**PAGU PERUBAHAN ANGGARAN**

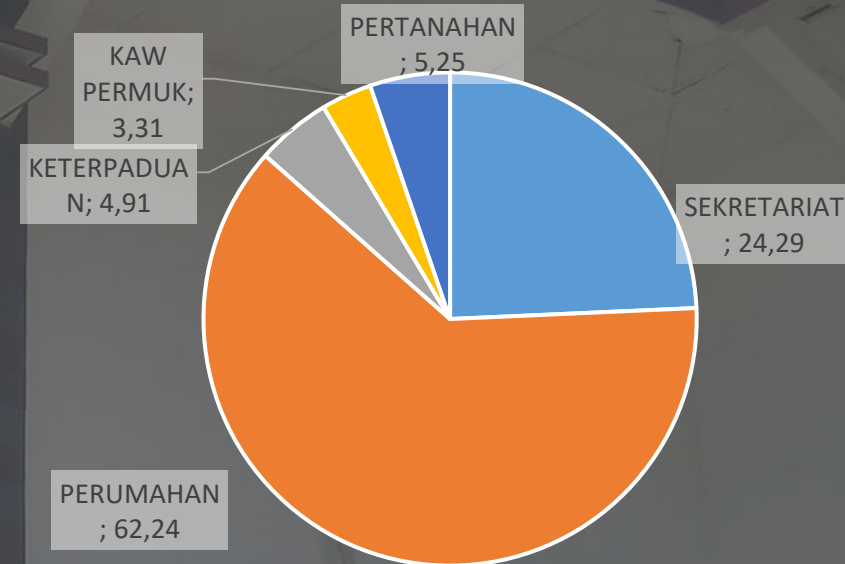

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 24,29  |
| 2     | PERUMAHAN   | 13.716.562.000 | 61,48  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.140.949.000  | 5,11   |
| 4     | KAW PERMUK  | 862.902.000    | 3,87   |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.171.827.000  | 5,25   |
| TOTAL |             | 22.311.773.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 24,29  |
| 2     | PERUMAHAN   | 13.886.258.000 | 62,24  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.094.598.000  | 4,91   |
| 4     | KAW PERMUK  | 739.557.000    | 3,31   |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.171.827.000  | 5,25   |
| TOTAL |             | 22.311.773.000 | 100,00 |






# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

STATUS AKHIR OKTOBER 2020


# DISPERAKIM

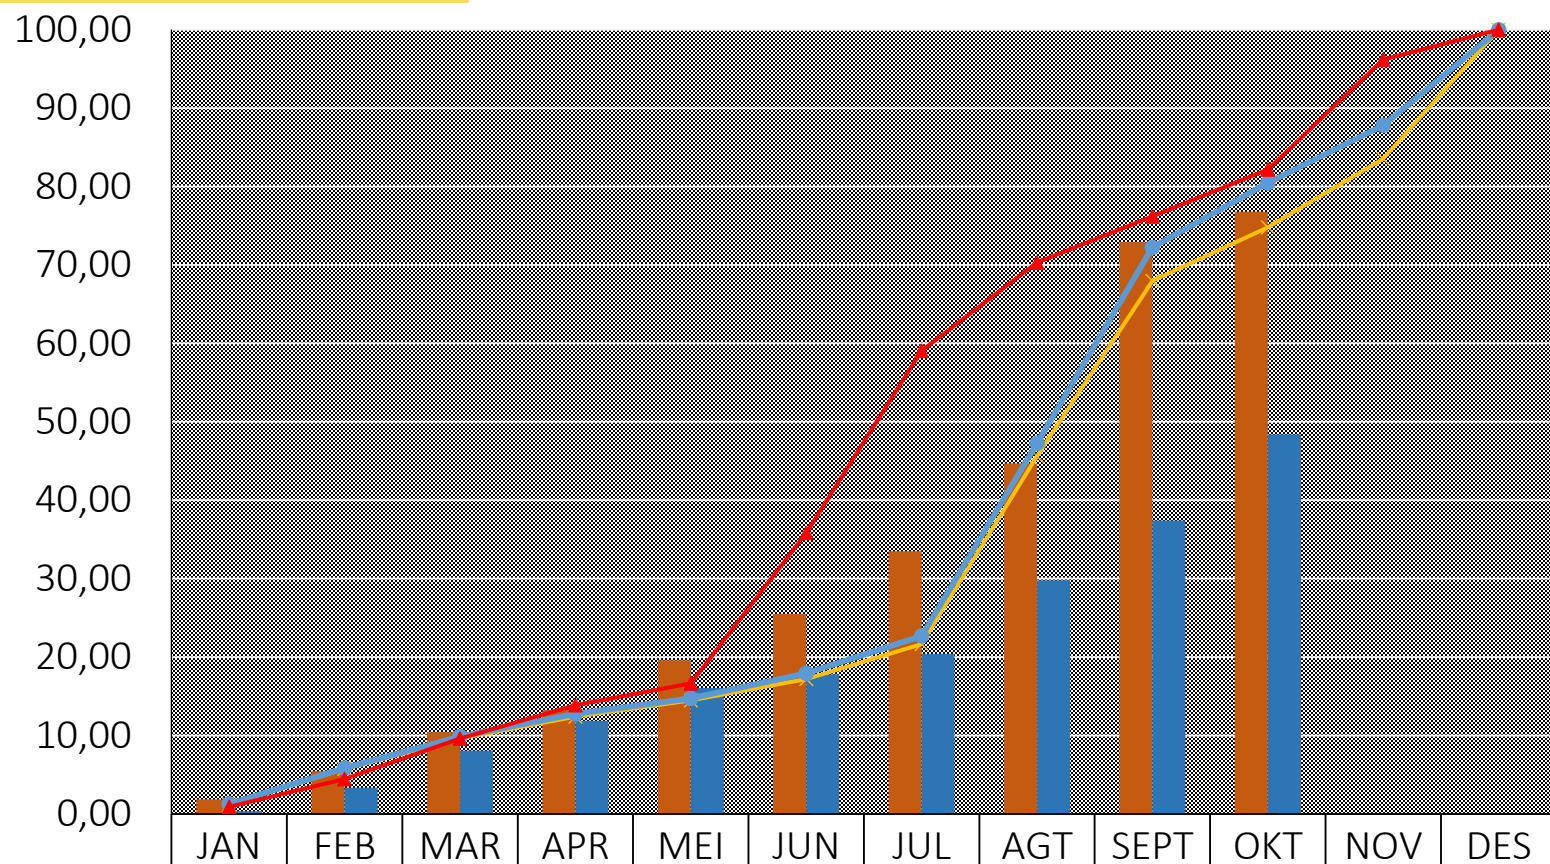

|             | Okt     | Nov   |
|-------------|---------|-------|
| Renc. Fisik | 74,80   | 83,54 |
| Real. Fisik | 76,78   |       |
| Dev. Fisik  | 1,98    |       |
| Renc. Keu   | 74,80   | 80,48 |
| Real. Keu   | 48,40   |       |
| Dev. Keu    | (26,40) |       |

|                 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REAL FISIK      | 1,84 | 5,46 | 10,41 | 13,23 | 19,60 | 25,46 | 33,49 | 44,69 | 72,90 | 76,78 |       |       |
| REAL KEU        | 0,36 | 3,35 | 8,05  | 11,88 | 16,04 | 17,79 | 20,40 | 29,78 | 37,41 | 48,40 |       |       |
| TF/K PERUBAHAN  | 1,19 | 5,72 | 9,61  | 12,40 | 14,46 | 17,18 | 21,66 | 45,61 | 67,97 | 74,80 | 83,54 | 100,0 |
| TF/K REFOCUSING | 1,27 | 5,87 | 9,85  | 12,76 | 14,74 | 17,94 | 22,68 | 47,28 | 72,24 | 80,48 | 87,81 | 100,0 |
| TF/K AWAL       | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,0 |


# SEKRETARIAT

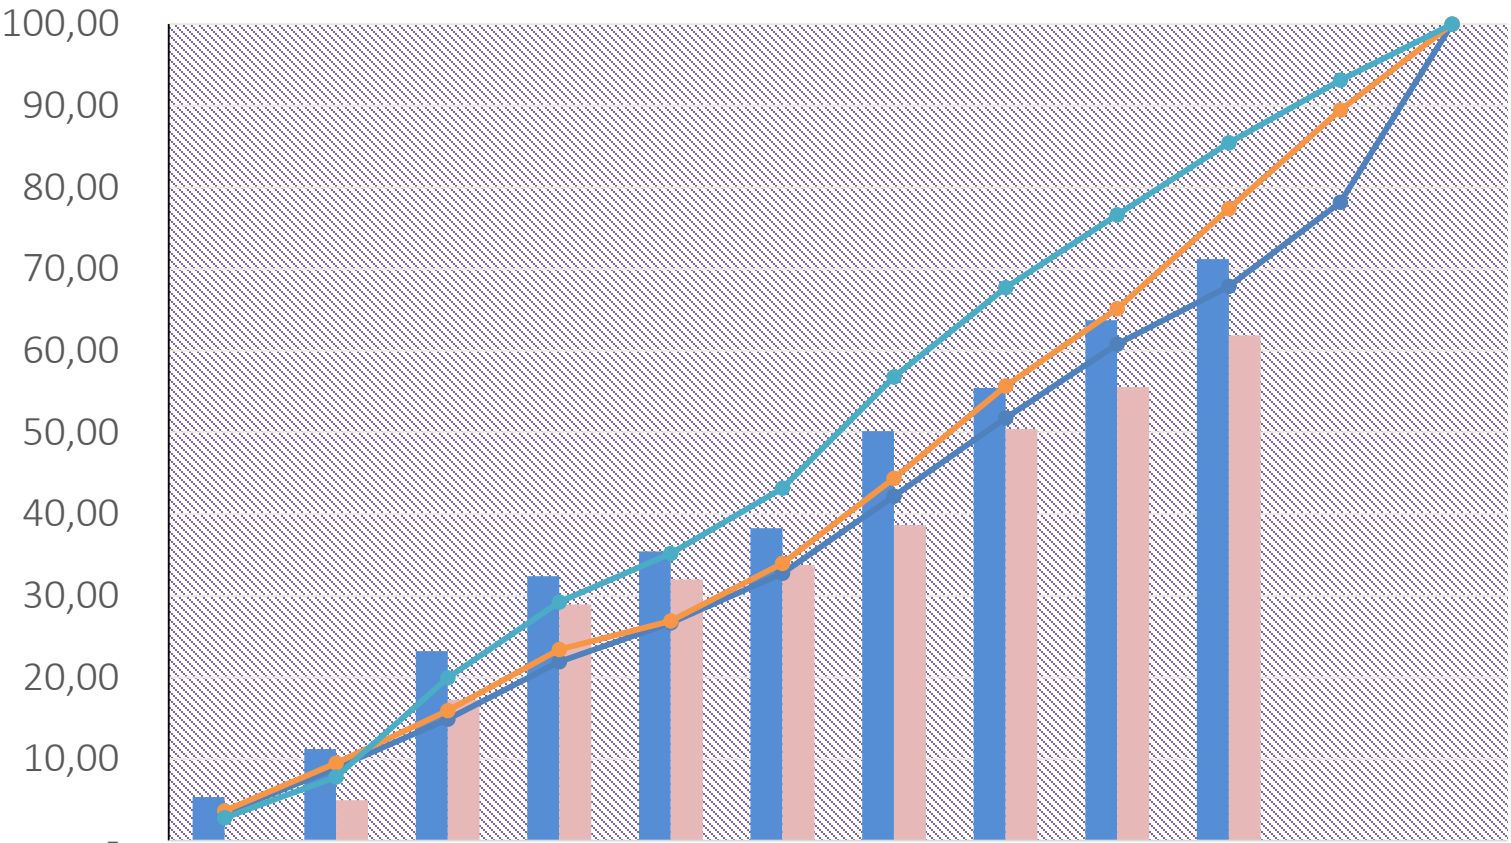

|                         |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ REALISASI FISIK       | JAN  | FEB  | MAR   | APR   | MEI   | JUNI  | JULI  | AGT   | SEP   | OKT   | NOV   | DES   |
| ■ REALISASI KEU         | -    | 4,96 | 17,28 | 28,94 | 32,01 | 33,75 | 38,65 | 50,41 | 55,53 | 61,89 |       |       |
| ● TARGET F/K PERUBAHAN  | 3,36 | 8,90 | 14,89 | 21,89 | 26,67 | 32,73 | 42,18 | 51,74 | 60,81 | 67,88 | 78,16 | 100,0 |
| ● TARGET F/K REFOCUSING | 3,66 | 9,50 | 15,93 | 23,41 | 26,91 | 33,95 | 44,37 | 55,68 | 65,13 | 77,38 | 89,47 | 100,0 |
| ● TARGET F/K AWAL       | 2,80 | 7,81 | 19,94 | 29,23 | 35,15 | 43,17 | 56,78 | 67,71 | 76,63 | 85,47 | 93,12 | 100,0 |

|             | Sept   | Okt   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 67,88  | 78,16 |
| Real. Fisik | 71,21  |       |
| Dev. Fisik  | 3,33   |       |
| Renc. Keu   | 67,88  | 78,16 |
| Real. Keu   | 61,89  |       |
| Dev. Keu    | (5,98) |       |


# PERUMAHAN

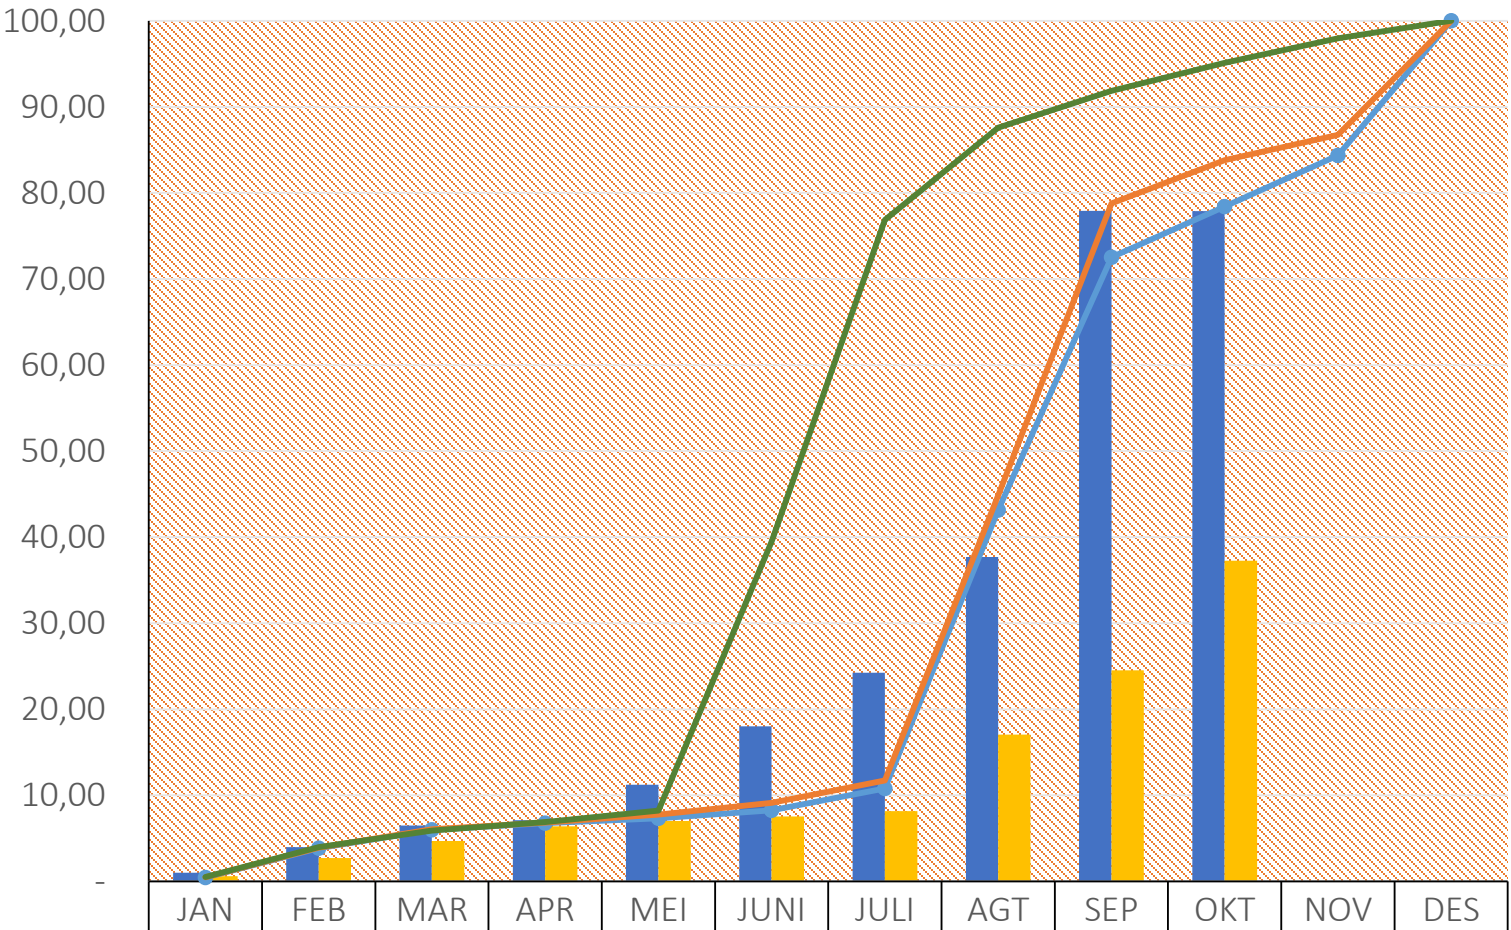

|             | Okt     | Nov   |
|-------------|---------|-------|
| Renc. Fisik | 78,41   | 84,35 |
| Real. Fisik | 77,90   |       |
| Dev. Fisik  | (0,51)  |       |
| Renc. Keu   | 78,41   | 84,35 |
| Real. Keu   | 37,26   |       |
| Dev. Keu    | (41,15) |       |


|                       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK       | 1,01 | 3,99 | 6,49 | 7,12 | 11,22 | 18,03 | 24,26 | 37,70 | 77,93 | 77,90 |       |        |
| REALISASI KEU         | 0,60 | 2,71 | 4,68 | 6,41 | 7,01  | 7,54  | 8,16  | 17,05 | 24,51 | 37,26 |       |        |
| TARGET F/K PERUBAHAN  | 0,46 | 3,85 | 6,00 | 6,76 | 7,32  | 8,26  | 10,81 | 43,16 | 72,53 | 78,41 | 84,35 | 100,00 |
| TARGET F/K REFOCUSING | 0,48 | 3,91 | 6,07 | 6,82 | 7,77  | 9,11  | 11,73 | 44,86 | 78,78 | 83,81 | 86,76 | 100,00 |
| TARGET F/K AWAL       | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,88 | 8,24  | 39,46 | 76,87 | 87,58 | 91,86 | 95,11 | 97,98 | 100,00 |

# KAWASAN PERMUKIMAN

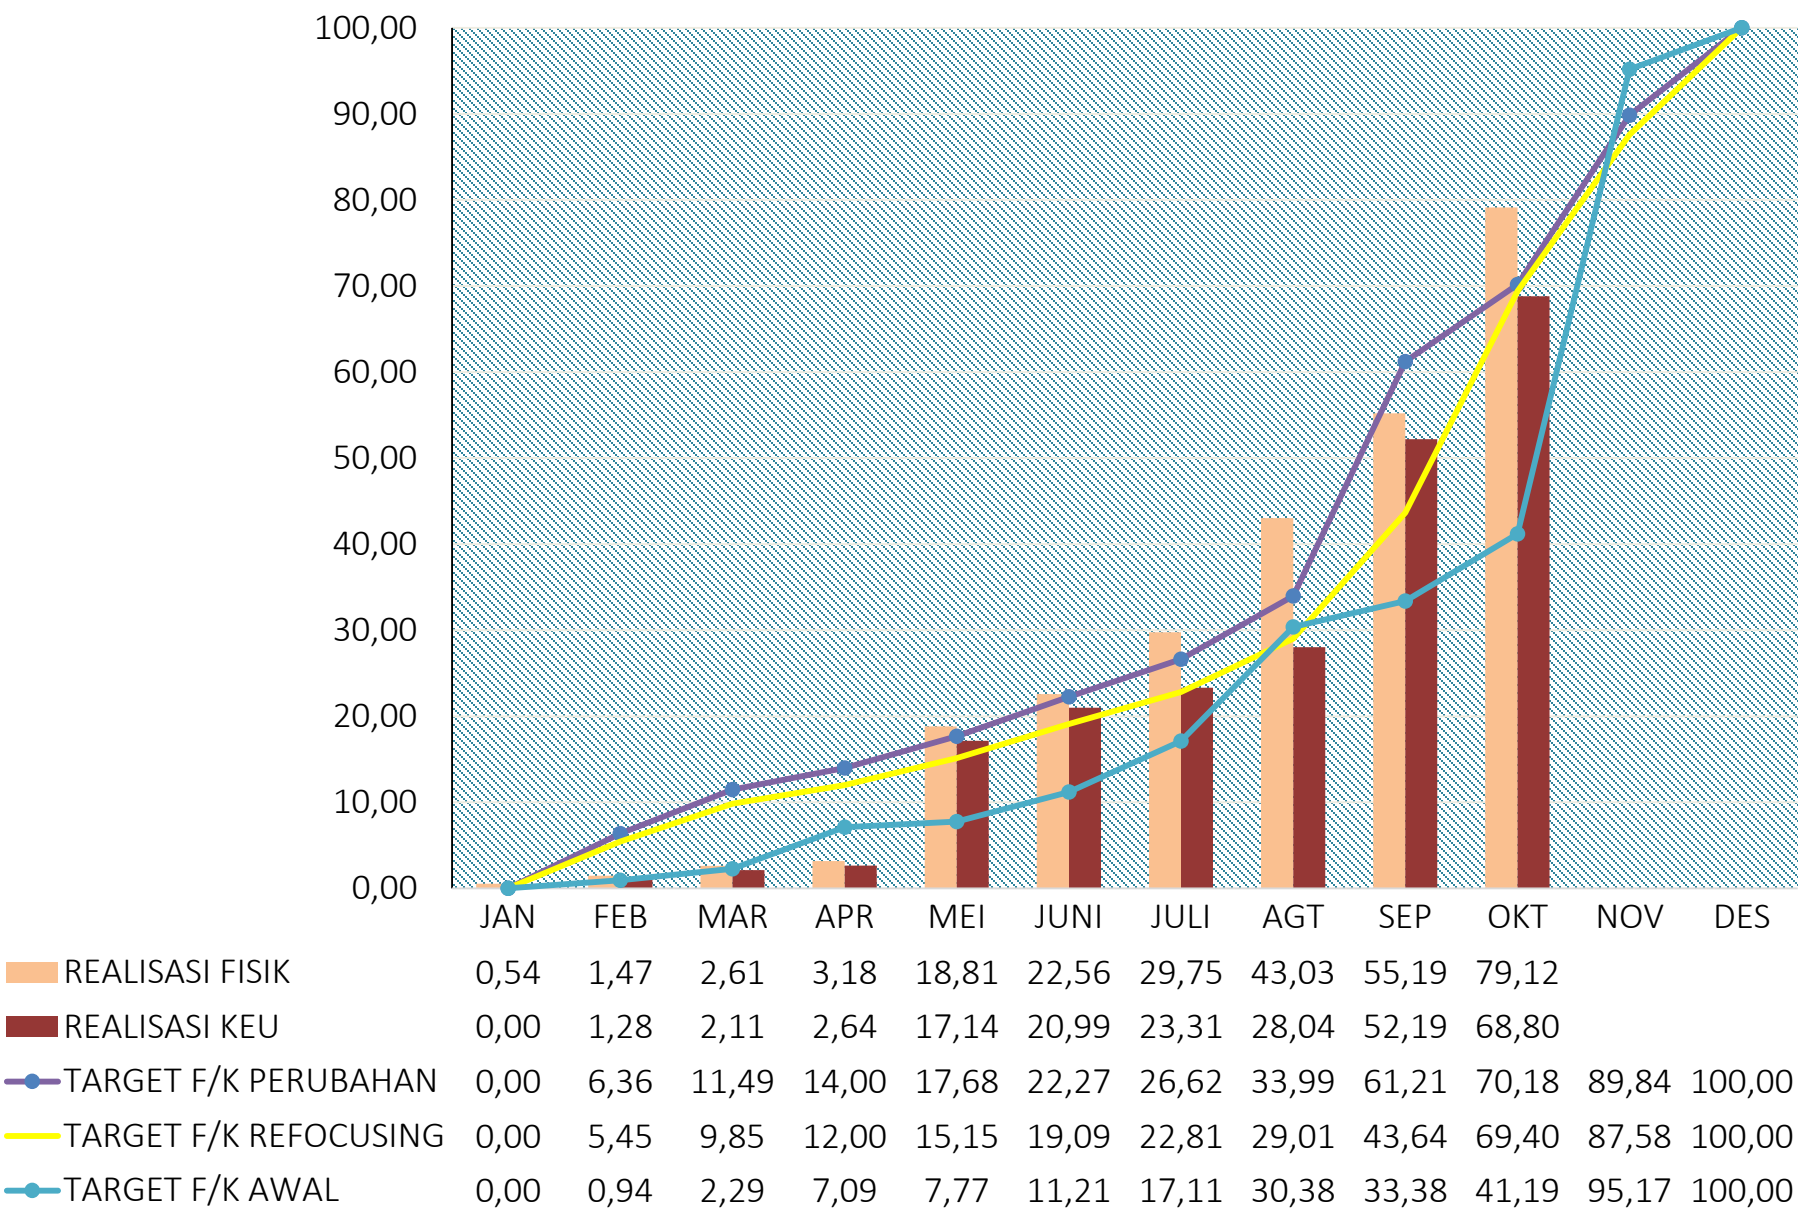

|             | Okt    | Nov   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 70,18  | 89,84 |
| Real. Fisik | 79,12  |       |
| Dev. Fisik  | 8,94   |       |
| Renc. Keu   | 70,18  | 89,84 |
| Real. Keu   | 68,80  |       |
| Dev. Keu    | (1,38) |       |

# KETERPADUAN PKPP

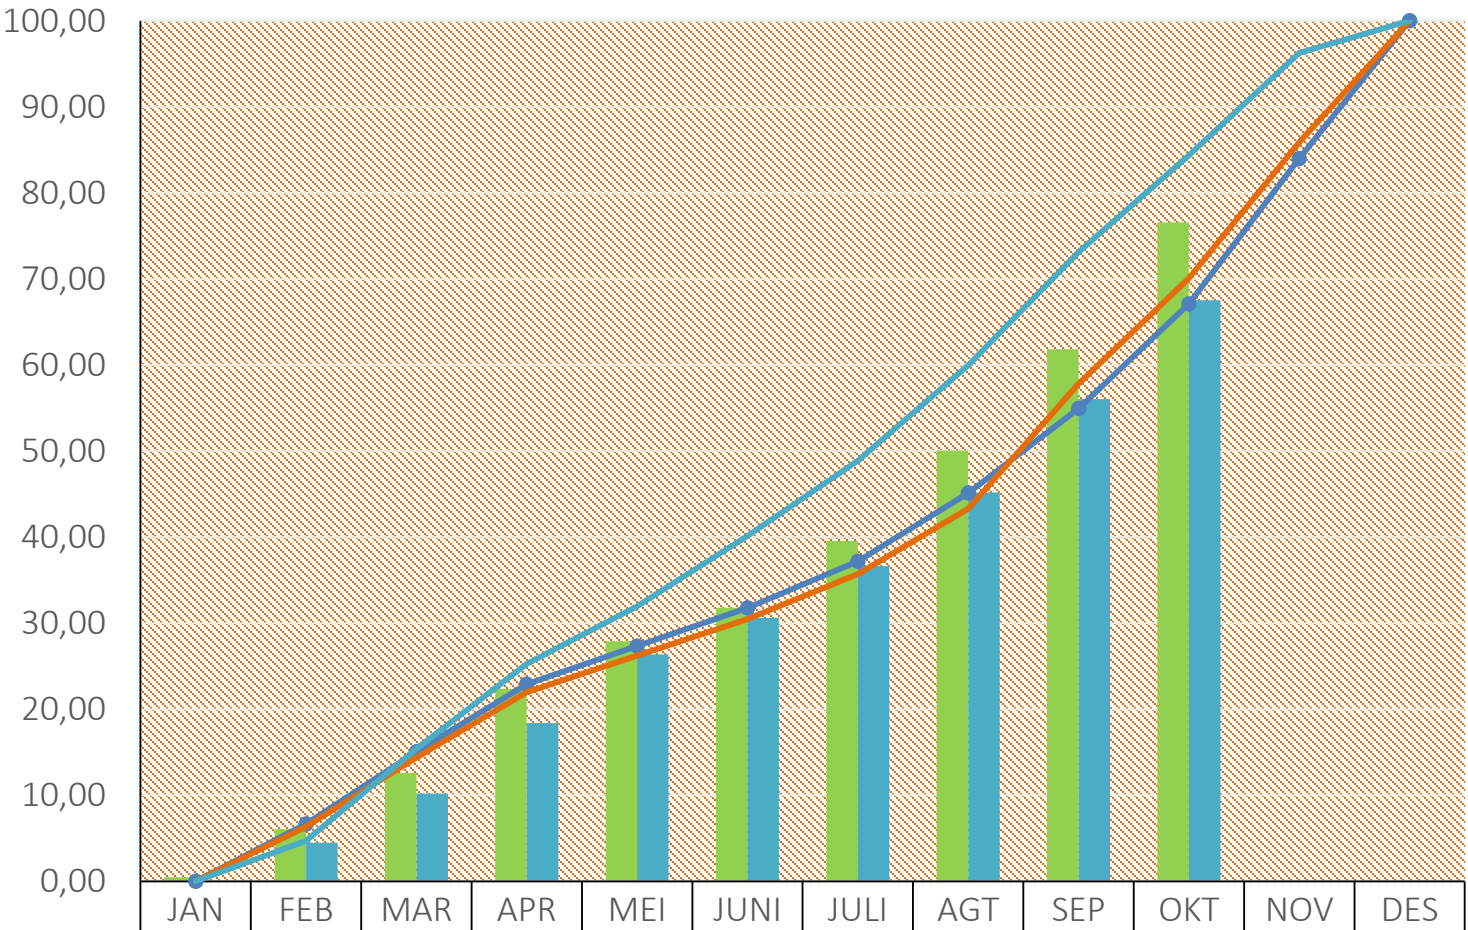


|                       | JAN  | FEB  | MAR   | APR   | MEI   | JUNI  | JULI  | AGT   | SEP   | OKT   | NOV   | DES    |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK       | 0,48 | 6,06 | 12,60 | 22,40 | 27,90 | 31,80 | 39,54 | 50,06 | 61,85 | 76,58 |       |        |
| REALISASI KEU         | 0,00 | 4,52 | 10,22 | 18,38 | 26,39 | 30,62 | 36,64 | 45,18 | 56,03 | 67,54 |       |        |
| TARGET F/K PERUBAHAN  | 0,00 | 6,69 | 15,07 | 22,90 | 27,33 | 31,76 | 37,21 | 45,13 | 54,96 | 67,10 | 83,99 | 100,00 |
| TARGET F/K REFOCUSING | 0,00 | 6,38 | 14,38 | 21,98 | 26,23 | 30,48 | 35,70 | 43,29 | 57,85 | 70,07 | 85,89 | 100,00 |
| TARGET F/K AWAL       | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 25,26 | 31,96 | 40,15 | 48,88 | 59,98 | 73,14 | 84,37 | 96,26 | 100,00 |

|             | Okt   | Nov   |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 67,10 | 83,99 |
| Real. Fisik | 76,58 |       |
| Dev. Fisik  | 9,48  |       |
| Renc. Keu   | 67,10 | 83,99 |
| Real. Keu   | 67,54 |       |
| Dev. Keu    | 0,44  |       |



# PERTANAHAN

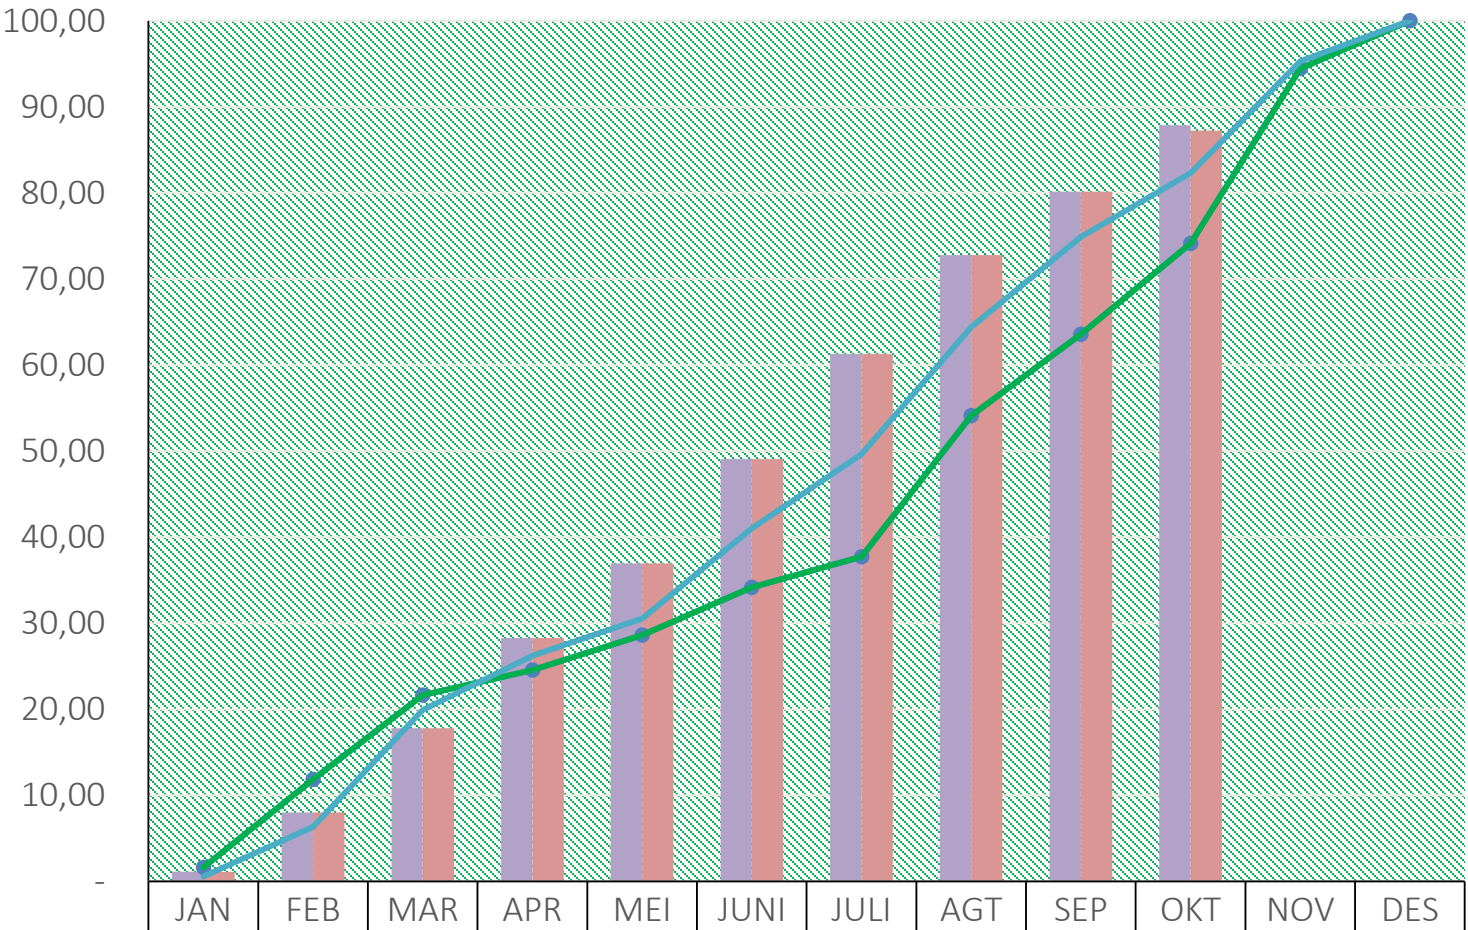

|                       |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| REALISASI FISIK       | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| REALISASI KEU         | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| TARGET F/K PERUBAHAN  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| TARGET F/K REFOCUSING | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| TARGET F/K AWAL       | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |

|             | Okt   | Nov   |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 74,14 | 94,45 |
| Real. Fisik | 87,86 |       |
| Dev. Fisik  | 13,72 |       |
| Renc. Keu   | 74,14 | 94,45 |
| Real. Keu   | 87,23 |       |
| Dev. Keu    | 13,09 |       |



# **PENJELASAN KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**

STATUS AKHIR OKTOBER 2020

# SEKRETARIAT

| NO | KEGIATAN                                                                             | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      | FISIK   | KEU    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                            | -       | -0,06  | Menyesuaikan Kebutuhan                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah                | -       | -1,21  | Menyesuaikan Kebutuhan                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah                | -       | -20,71 | Menyesuaikan Kebutuhan (efisiensi)                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                      | -       | -2,60  | Sisa lelang                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah       | -       | -10,38 | <ul style="list-style-type: none"><li>Sisa lelang</li><li>Honor tenaga pendukung dan pengelola keuangan SKPD sudah dibayarkan, namun belum GU</li></ul>                                                                             |
| 6  | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah      | -       | -7,76  | <ul style="list-style-type: none"><li>Sesuai kebutuhan/undangan dari instansi</li><li>Sudah dibayarkan, belum GU</li></ul>                                                                                                          |
| 7  | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah        | -       | -15,18 | <ul style="list-style-type: none"><li>Menyesuaikan kebutuhan</li><li>Dalam RAB sudah terinci nama majalah, seperti majalah cempaka yg sudah tidak terbit, dan beberapa majalah harganya lebih murah dari SHB yg digunakan</li></ul> |
| 8  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | -       | -1,12  | Dalam proses SPJ                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                      | -       | -4,22  | <ul style="list-style-type: none"><li>Sisa lelang</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| 10 | Makan minum                                                                          | -       | -0,37  |                                                                                                                                                                                                                                     |

# SEKRETARIAT

| NO | KEGIATAN                                                      | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               | FISIK   | KEU    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                 | -       | -15,25 | Keterlambatan pelaksanaan kegiatan                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                              | -       | -0,49  | Sisa lelang                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal                      | -6,87   | -6,87  | Tahap pencairan                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -       | -5,61  | <ul style="list-style-type: none"><li>SPJ pencairan Makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah masuk pada aplikasi di tanggal 1 Oktober (belum GU).</li><li>Makan minum rapat akan dilaksanakan di bulan Oktober.</li></ul> |



# BIDANG PERUMAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                 | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          | FISIK   | KEU    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                              | -2,41   | -53,60 | <ul style="list-style-type: none"><li>Material panel RUSPIN sedang dalam proses pengiriman ke lokasi Penerima Bantuan</li><li>Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dilaksanakan di bulan November s.d. Desember</li><li>Belanja Publikasi dilaksanakan bulan November</li></ul> |
| 2  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | -       | -2,45  | <ul style="list-style-type: none"><li>Pembayaran kontraktual Konsultan dan Honor tenaga Entri Data dibayarkan Bulan Desember.</li><li>Sisa pelaksanaan kegiatan/lelang</li></ul>                                                                                                  |
| 3  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | -       | -16,80 | <ul style="list-style-type: none"><li>Sisa lelang</li><li>Pelaksanaan paket Review Desain Pondasi Rusunawa di Kab Kendal bulan November</li></ul>                                                                                                                                 |


# BIDANG KETERPADUAN PKPP

| NO | KEGIATAN                                                                              | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                       | FISIK   | KEU   |                                                                                      |
| 1  | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | -       | -0,64 | • Ketidakhadiran personil Pokja PKP dalam rapat sehingga honor tidak dapat diberikan |

# BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | KEGIATAN                                                | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | FISIK   | KEU   |                                                                                                    |
| 1  | Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan Permukiman      | -       | -5,74 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan Kawasan Permukiman belum dapat dilakukan secara tatap muka |
| 2  | Kegiatan Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | -       | -4,44 | Pelaksanaan Bimtek belum dapat dilakukan secara tatap muka                                         |






# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA


STATUS AKHIR OKTOBER 2020

# REKAP PENGADAAN BARANG/JASA

TOTAL PAKET: 306

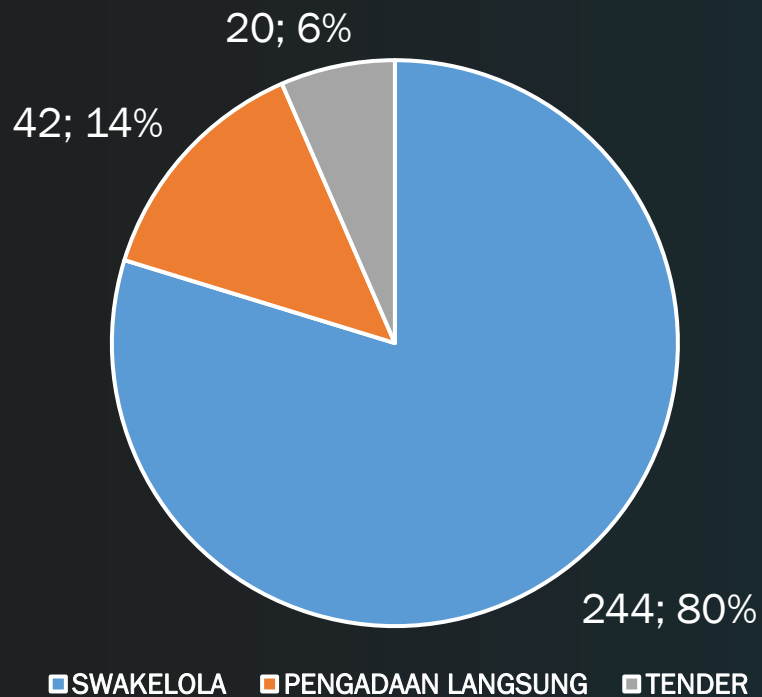


TOTAL ANGGARAN: 22.311.773.000

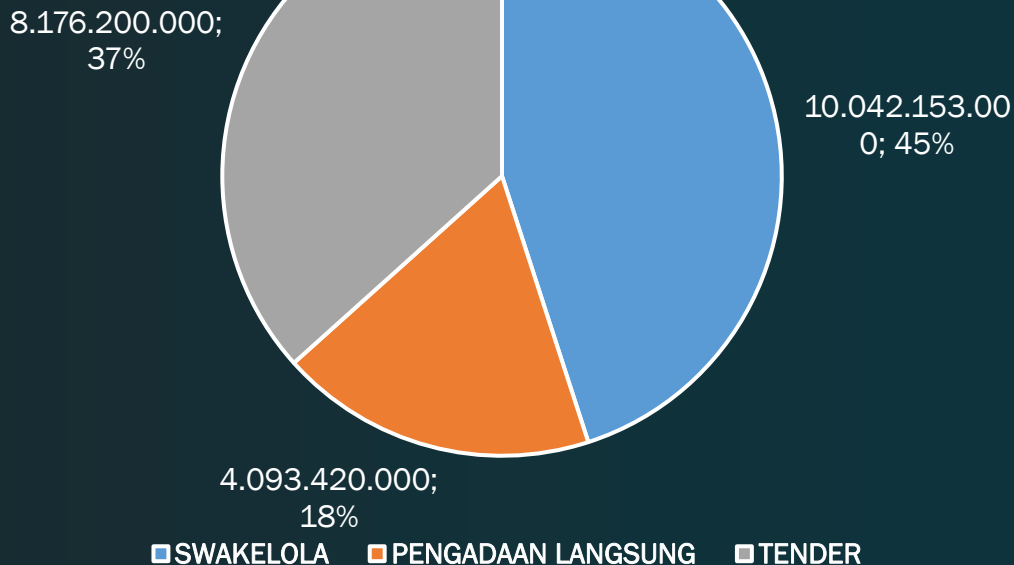

| NO    | BIDANG             | PAGU           | SWAKELOLA      |     | PENGADAAN LANGSUNG |     | TENDER        |     | TOTAL PAKET    |     |
|-------|--------------------|----------------|----------------|-----|--------------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
|       |                    |                | Rp             | Jml | Rp                 | Jml | Rp            | Jml | Rp             | Jml |
| 1     | SEKRETARIAT        | 5.419.533.000  | 3.627.773.000  | 64  | 1.520.560.000      | 16  | 271.200.000   | 1   | 5.419.533.000  | 81  |
| 2     | PERUMAHAN          | 13.886.258.000 | 4.130.258.000  | 55  | 2.011.000.000      | 16  | 7.745.000.000 | 18  | 13.886.258.000 | 89  |
| 3     | KAWASAN PERMUKIMAN | 739.557.000    | 579.557.000    | 40  | -                  | -   | 160.000.000   | 1   | 739.557.000    | 41  |
| 4     | KETERPADUAN PKPP   | 1.094.598.000  | 621.898.000    | 46  | 472.700.000        | 8   | -             | -   | 1.094.598.000  | 54  |
| 5     | PERTANAHAN         | 1.171.827.000  | 1.082.667.000  | 39  | 89.160.000         | 2   | -             | -   | 1.171.827.000  | 41  |
| TOTAL |                    | 22.311.773.000 | 10.042.153.000 | 244 | 4.093.420.000      | 42  | 8.176.200.000 | 20  | 22.311.773.000 | 306 |



# PROGRES PENGADAAN BARANG JASA

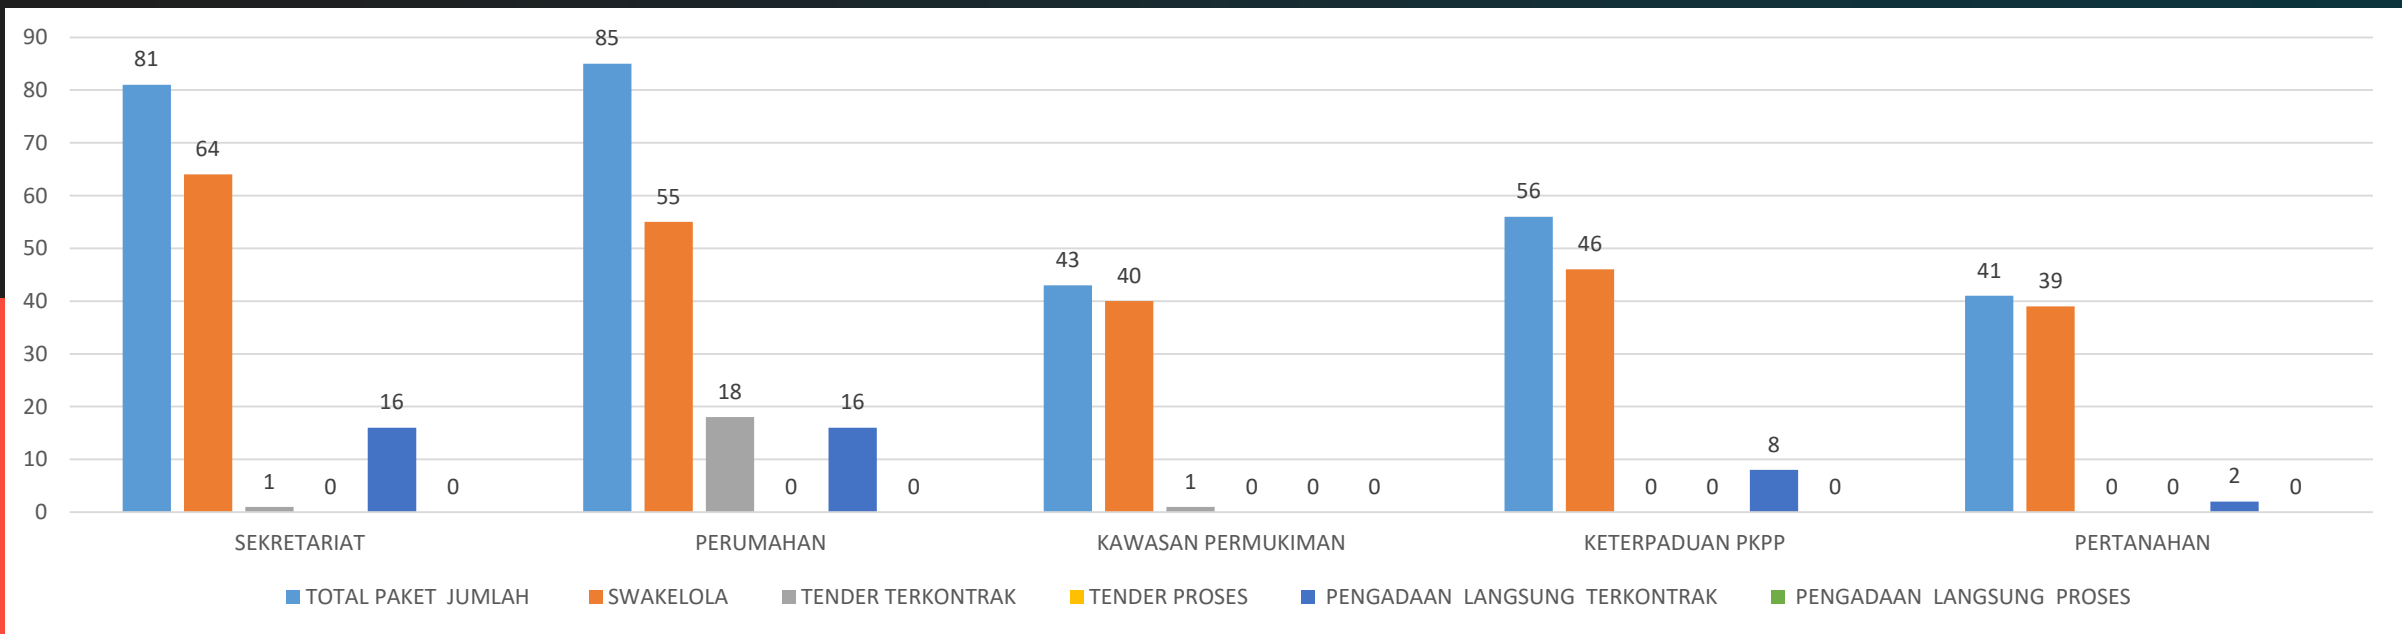

| NO          | BIDANG             | TOTAL PAKET | SWAKELOLA | TENDER     |        | PENGADAAN LANGSUNG |        |
|-------------|--------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------------------|--------|
|             |                    | JUMLAH      | JUMLAH    | TERKONTRAK | PROSES | TERKONTRAK         | PROSES |
| 1           | SEKRETARIAT        | 81          | 64        | 1          | 0      | 16                 | 0      |
| 2           | PERUMAHAN          | 85          | 55        | 18         | 0      | 15                 | 1      |
| 3           | KAWASAN PERMUKIMAN | 43          | 40        | 1          | 0      | 0                  | 0      |
| 4           | KETERPADUAN PKPP   | 56          | 46        | 0          | 0      | 7                  | 1      |
| 5           | PERTANAHAN         | 41          | 39        | 0          | 0      | 1                  | 1      |
| TOTAL PAKET |                    | 306         | 244       | 20         | 0      | 39                 | 3      |

RINGKASAN PAKET SUDAH TERKONTRAK : TENDER: 19 DARI 19 PAKET; PENGADAAN LANGSUNG: 39 DARI 42PAKET

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                    | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE       | PROGRES LELANG                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                                         |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (7 bulan)               | 271.200.000         | Tender Cepat | Masa Kontrak 1 Juni s.d. 31 Desember 2020                                               |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                                         |
| 2                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan | 525.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 20 Oktober 2020) |
| 3                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang  | 840.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 20 Oktober 2020) |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak    | 735.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 20 Oktober 2020) |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara   | 560.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati               | 490.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 7                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes   | 840.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 17 Juli s.d. 14 Oktober 2020                                       |
| 8                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemasang | 840.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 19 Oktober 2020) |

| NO.                       | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                         |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara                                                                                            | 455.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 10                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo                                                                                                | 385.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 11                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung                                                                                              | 455.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
| 12                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen                                                                                                 | 770.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 17 Juli s.d. 14 Oktober 2020 (perpanjangan s.d. 8 November 2020)   |
| 13                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten                                                                                                  | 420.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 (perpanjangan s.d. 8 November 2020) |
| 14                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen                                                                                                  | 385.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 17 Juli s.d. 14 Oktober 2020 (perpanjangan s.d. 8 November 2020)   |
| 15                        |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo                                                                                               | 630.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020                                     |
|                           |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo Tahap II                                                                                      | 175.000.000         |         |                                                                                         |
| 16                        | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 14 Juli s.d. 11 September 2020                                     |
| 17                        |                                                                                                                                         | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000         | Seleksi | Masa Kontrak Tanggal 17 Juni s.d. 15 Oktober 2020                                       |
| 18                        |                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000         | Seleksi | Masa Kontrak Tanggal 17 Juni s.d. 15 September 2020                                     |
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                     |         |                                                                                         |
| 19                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Pemukiman                                                               | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                                                                         | 160.000.000         | Seleksi | Masa Kontrak 20 Juli s.d. 17 September 2020                                             |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 10 Juli 2020         |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Masa Kontrak 2 Januari s.d. 31 Desember 2020  |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Masa Kontrak 2 Januari s.d. 31 Desember 2020  |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 9 Maret 2020         |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 197.600.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 20 Juli 2020         |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 3 Agustus 2020       |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 8 September 2020     |
| 8   |                                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 21 Juli 2020         |
| 9   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Masa Kontrak 14 s.d. 28 September 2020        |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       | Masa Kontrak 23 Oktober s.d. 21 Desember 2020 |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       | Masa Kontrak 22 Oktober s.d. 20 November 2020 |
| 12  |                                                                                | Rehab Gedung Penataan Interior Ruang Kantor Disperakim Provinsi Jawa Tengah                               | 182.250.000      | Masa Kontrak 23 Oktober s.d. 21 Desember 2020 |
| 13  |                                                                                | Rehab Gedung Peninggian (Leveling) Area Parkir dan Kantin Belakang                                        | 173.340.000      | Masa Kontrak 23 Oktober s.d. 21 Desember 2020 |
| 14  |                                                                                | Rehab Gedung (Pengadaan dan Pemasangan Pintu Geser Automatis)                                             | 49.410.000       | Masa Kontrak 5 November s.d. 30 November 2020 |
| 15  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020                 |
| 16  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Belanja Sewa Hotel                                                                                        | 86.400.000       | Sudah terlaksana 6-7 Maret 2020               |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERUMAHAN**

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                 | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                              | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020 |
| 2  |                                                                                                                                          | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       | Masa Kontrak 7 Juli s.d. 4 Oktober 2020      |
| 3  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 210.000.000      | Masa Kontrak 10 Juli s.d. 23 Agustus 2020    |
| 4  |                                                                                                                                          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru I                                                                      | 100.000.000      | Masa Kontrak 15 Juli s.d. 14 Oktober 2020    |
| 5  |                                                                                                                                          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru II                                                                     | 100.000.000      | Masa Kontrak 15 Juli s.d. 14 Oktober 2020    |
| 6  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      | Masa Kontrak 3 April s.d. 28 November 2020   |
| 7  |                                                                                                                                          | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 64.800.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020   |
| 8  |                                                                                                                                          | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Masa Kontrak 31 Jan s.d. 30 Maret 2020       |
| 9  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pekerjaan Review Desain Pondasi Rusunawa Jawa Tengah di Kab. Kendal                                       | 50.000.000       | Upload Dokumen Penawaran                     |
| 10 |                                                                                                                                          | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      | Masa Kontrak 5 Agustus s.d. 18 Okt 2020      |
| 11 |                                                                                                                                          | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      | Masa Kontrak 5 Agustus s.d. 18 Okt 2020      |
| 12 |                                                                                                                                          | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      | Masa Kontrak 12 Agustus s.d. 25 Sept 2020    |
| 13 |                                                                                                                                          | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      | Masa Kontrak 12 Agustus s.d. 25 Sept 2020    |
| 14 |                                                                                                                                          | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      | Masa Kontrak 11 Agustus s.d. 24 Sept 2020    |
| 15 |                                                                                                                                          | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      | Masa Kontrak 11 Agustus s.d. 24 Sept 2020    |
| 16 |                                                                                                                                          | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      | Masa Kontrak 14 Juli s.d. 11 Sept 2020       |

**BELUM TERKONTRAK: 1 PAKET**

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Paket kegiatan fullboard Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                        | 56.700.000       | Rencana pelaksanaan 18-19 November 2020         |
| 2   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       | Masa Kontrak 21 Juli s.d. 18 November 2020      |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Masa Kontrak 17 Februari s.d. 16 April 2020     |
| 4   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Masa Kontrak 12 Maret 2020 s.d. 7 Desember 2020 |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Masa kontrak 3 Februari s.d. 31 Desember 2020   |
| 6   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       | Masa Kontrak 20 Februari s.d. 20 Desember 2020  |
| 7   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Masa Kontrak 20 Februari s.d. 20 Desember 2020  |
| 8   | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Konsultan Individual Evaluasi dan Pemantauan                                                                            | 66.000.000       | Masa Kontrak 12 Februari s.d. 31 Desember 2020  |


**BELUM TERKONTRAK: 1 PAKET**

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                                      | NAMA PAKET                                 | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi<br>Pembangunan Untuk<br>Kepentingan Umum dan<br>Penanganan Tertib<br>Administrasi Pertanahan | Sewa Hotel Paket Full board                | 24.160.000       | Pelaksanaan Bulan November.                |
| 2   |                                                                                                               | Belanja Jasa Konsultansi Non<br>Konstruksi | 65.000.000       | Masa Kontrak 7 Agustus s.d. 6 Oktober 2020 |

**BELUM TERKONTRAK: 1 PAKET**

# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

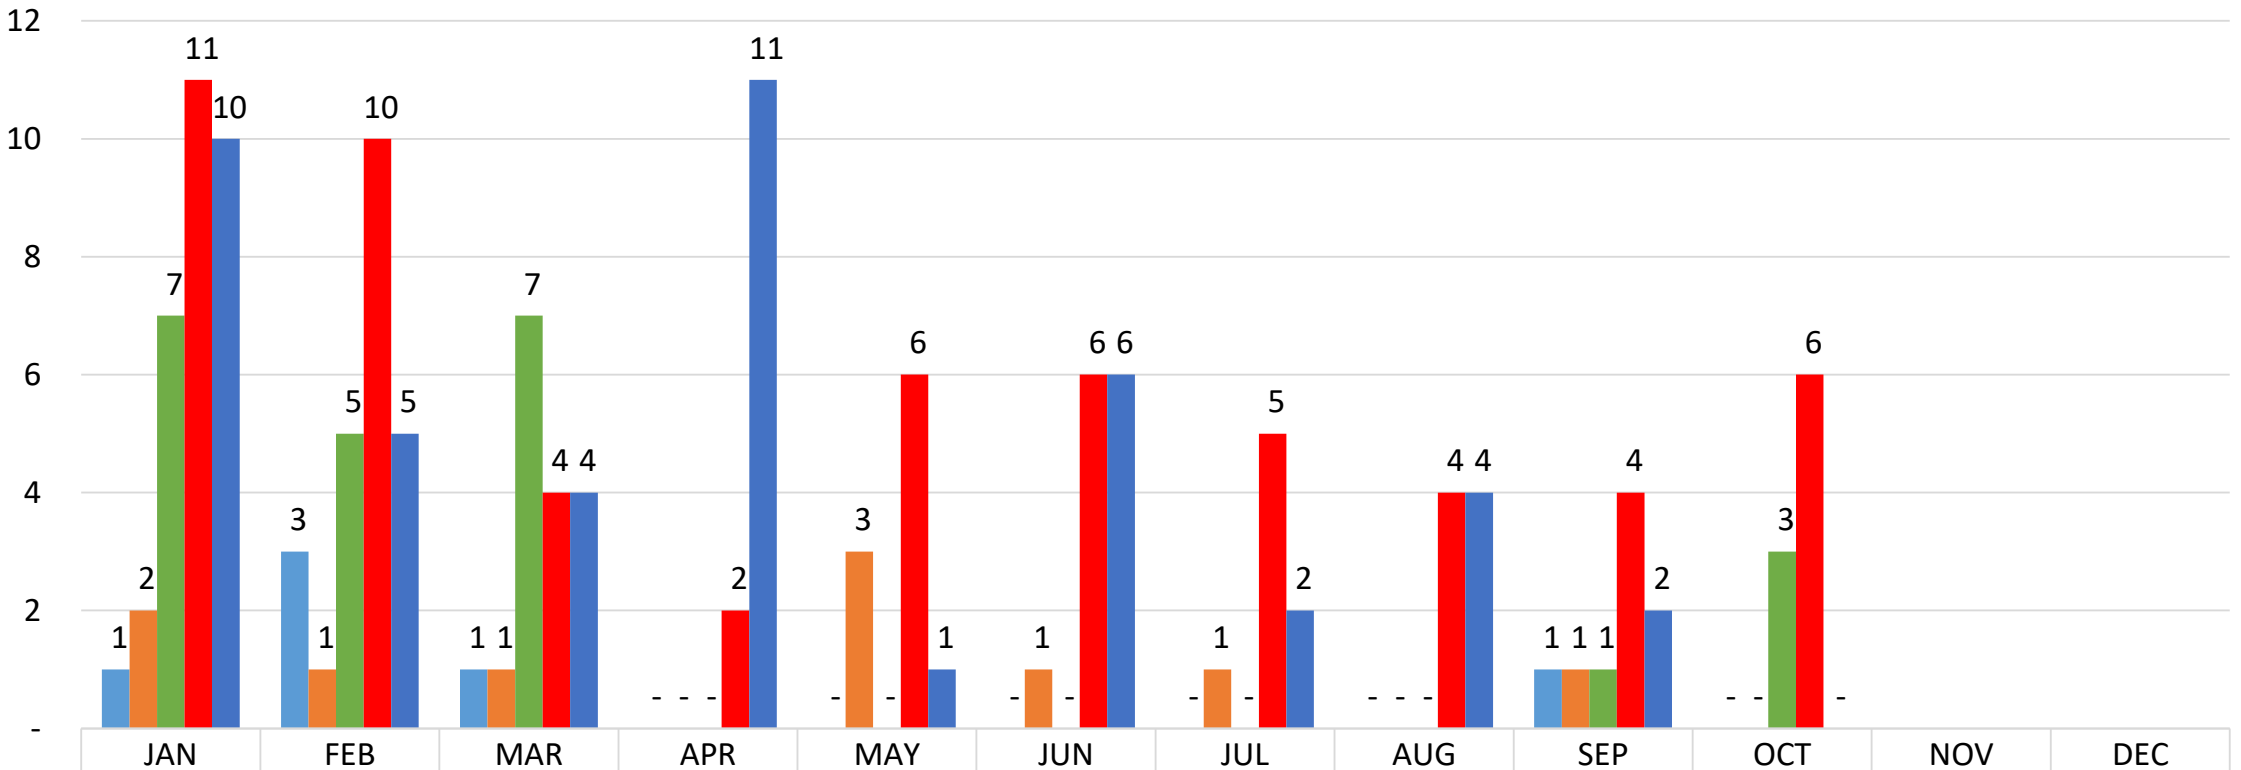

**Total**

**24**

**17**

**13**

**10**

**13**

**8**

**8**


**9**

**9**


Terdapat 9 permohonan informasi dan telah tuntas terjawab.




# LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM



# LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS

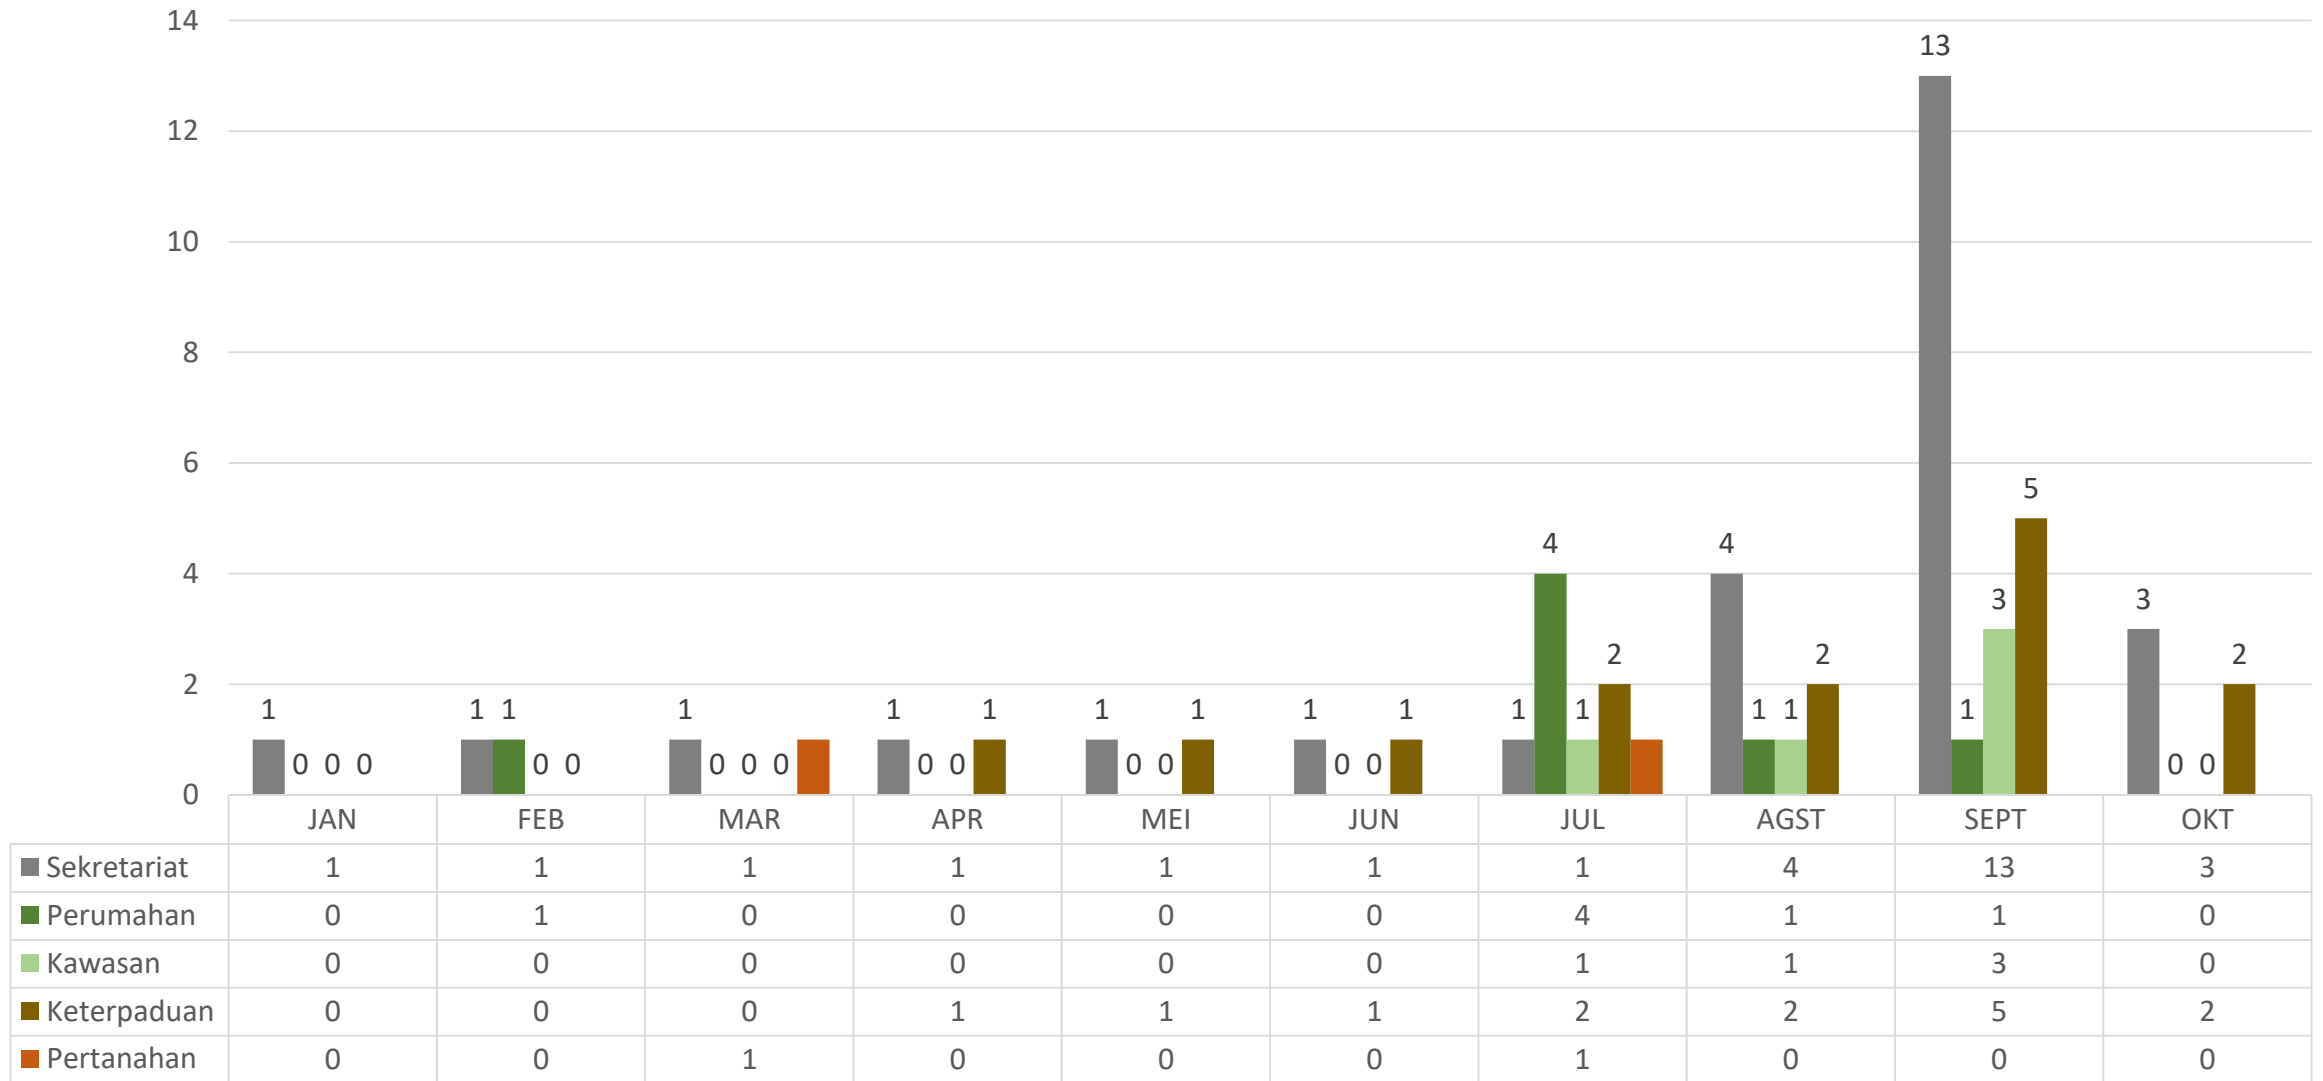

# LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS



# PENEKANAN APBD


1. Terkait dengan disahkannya DPPA 2020, seluruh Pejabat Eselon III dan IV harap menyusun PK Perubahan 2020. Tanggal penandatanganan 2 November 2020. Hard dan softcopy yang sudah ditandatangani dikumpulkan ke Subbag Program paling lambat Jum'at, 13 November 2020.
2. Bidang harap mengumpulkan dokumentasi kegiatan terbaru (foto dan video) sebagai materi konten media sosial Disperakim ke Subbag Program paling lambat Jum'at, 13 November 2020.
3. Bagi tenaga pendukung di setiap bidang yang belum mengumpulkan laporan bulanan ke Subbag Umpeg ditunggu sampai dengan pertengahan Desember.
4. Hasil evaluasi kebutuhan tenaga pendukung mohon segera diinformasikan kepada Kepala Subbag Umpeg, terkait dengan proses pengadaan yang akan dilaksanakan di bulan Januari.
5. Para pengelola keuangan (KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pembuat dokumen dan pembantu pembuat dokumen) harap hadir dalam acara Sosialisasi Percepatan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020 yang diselenggarakan pada hari selasa besok tgl 10. Jam 9.00 WIB di R.Rapat LT.1

**APBN**



# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

## PAGU – Rp 489.155.168.000

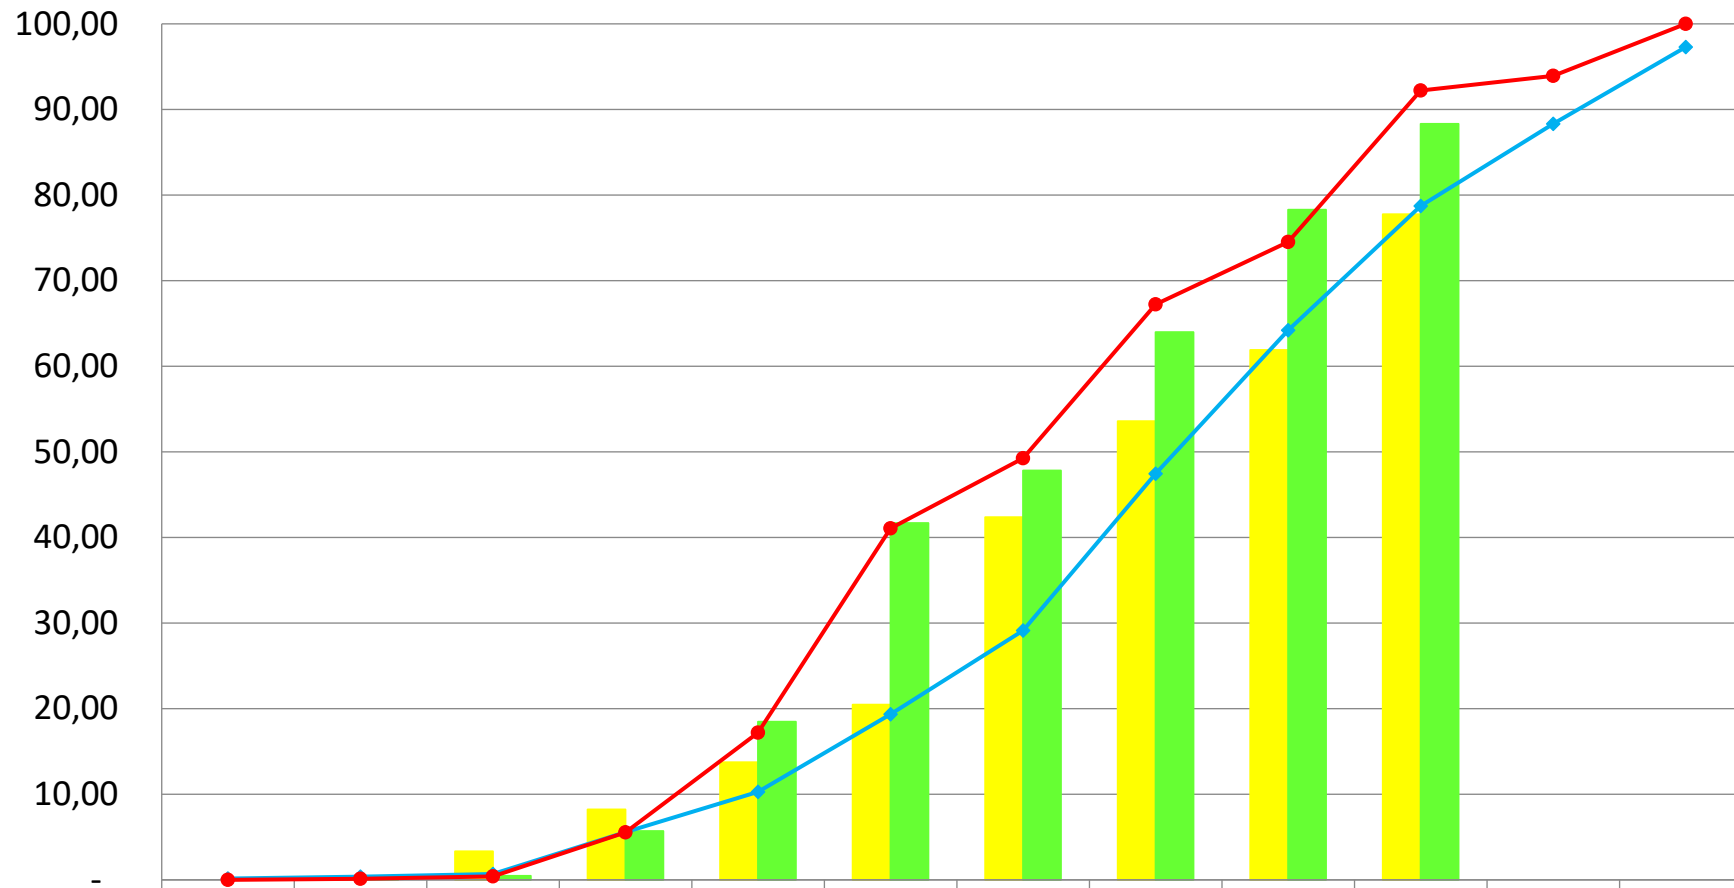


|             | Okt          | Nov   |
|-------------|--------------|-------|
| Renc. Fisik | 78,72        | 88,33 |
| Real. Fisik | <b>77,77</b> |       |
| Dev. Fisik  | (0,95)       |       |
| Renc. Keu   | 92,90        | 89,26 |
| Real. Keu   | 88,31        |       |
| Dev. Keu    | (3,89)       |       |

|    |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RF | -    | 0,10 | 3,34 | 8,22 | 13,75 | 20,46 | 42,37 | 53,59 | 61,90 | 77,77 |       |        |
| RK | -    | 0,11 | 0,48 | 5,69 | 18,46 | 41,67 | 47,83 | 63,98 | 78,27 | 88,31 |       |        |
| TF | 0,17 | 0,37 | 0,68 | 5,57 | 10,29 | 19,35 | 29,13 | 47,44 | 64,21 | 78,72 | 88,33 | 97,28  |
| TK | -    | 0,13 | 0,40 | 5,56 | 17,19 | 41,05 | 49,25 | 67,24 | 74,52 | 92,20 | 93,91 | 100,00 |

# BPPW JATENG

## PAGU – Rp 1.066.179.294

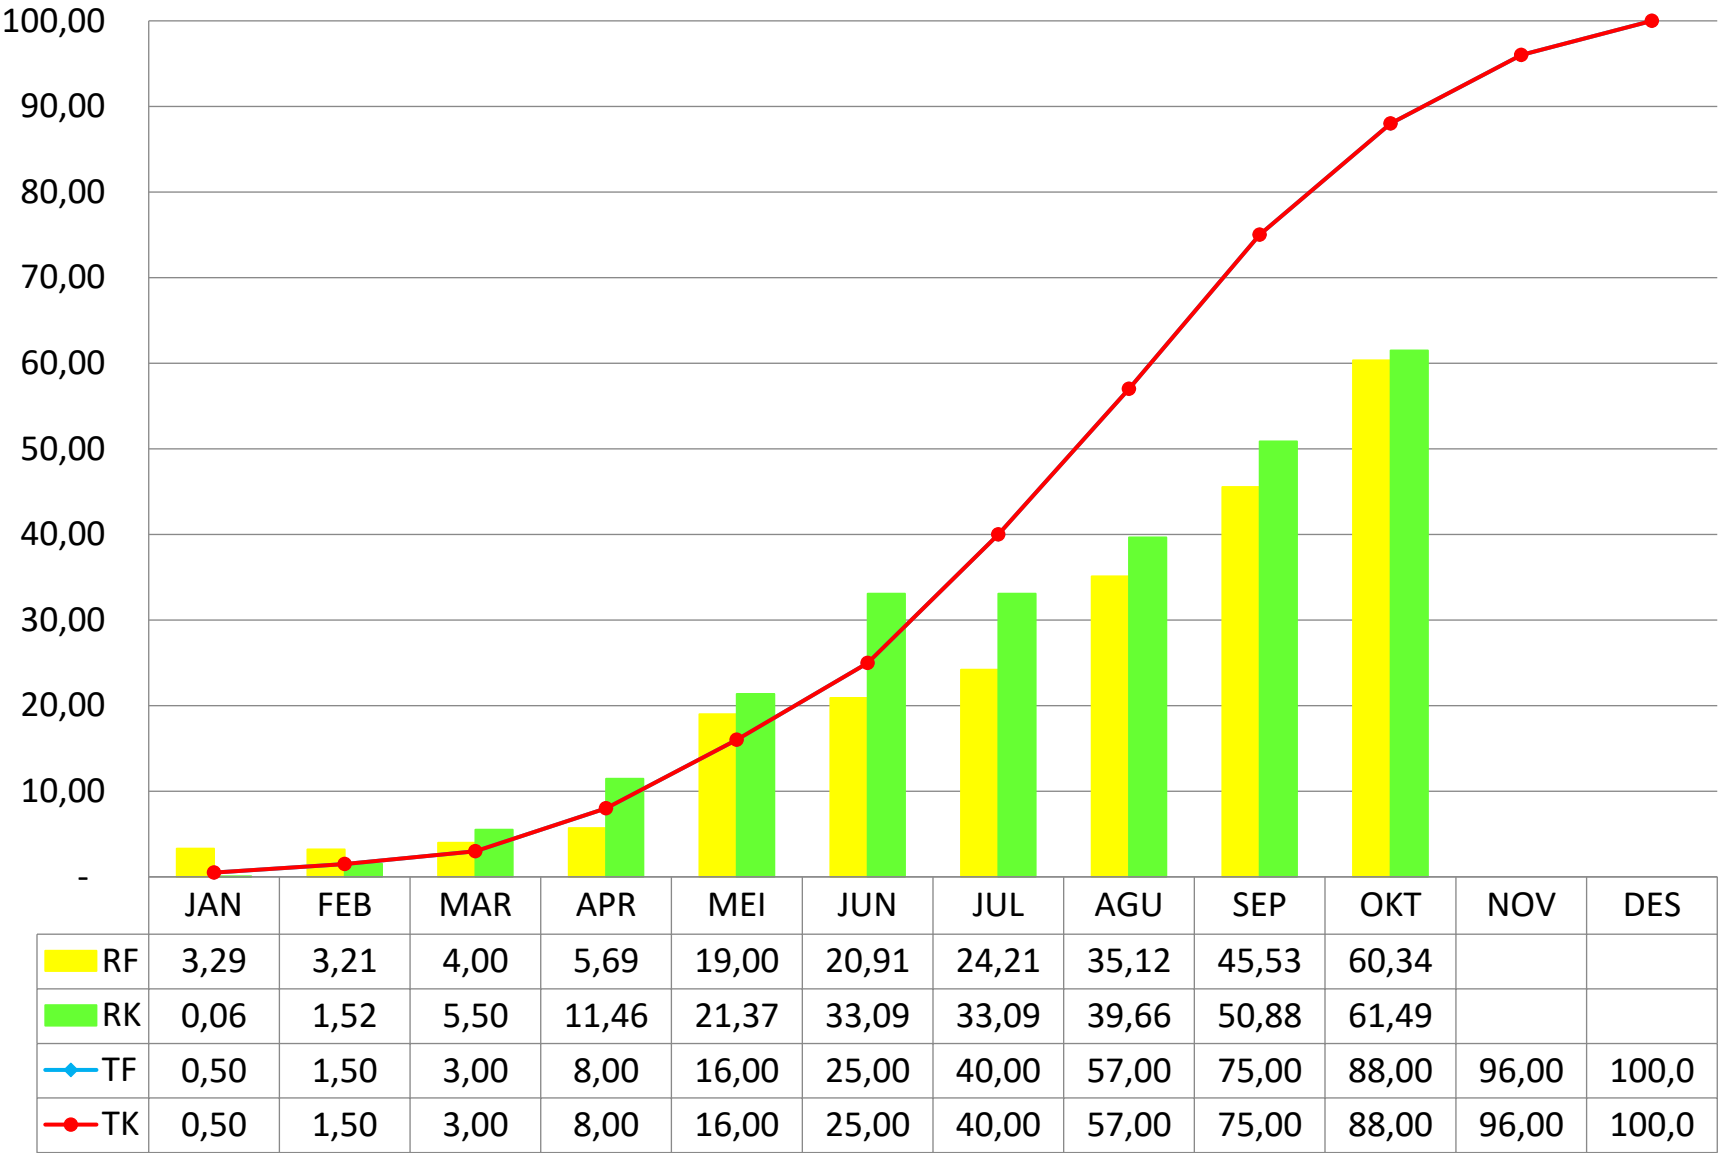

|             | Sept    | Okt   |
|-------------|---------|-------|
| Renc. Fisik | 75,00   | 88,00 |
| Real. Fisik | 45,53   |       |
| Dev. Fisik  | (29,47) |       |
| Renc. Keu   | 75,00   | 88,00 |
| Real. Keu   | 50,88   |       |
| Dev. Keu    | (24,12) |       |

A solid red square is positioned on the left side of the image. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**



# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR SEPTEMBER 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH


# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PELAPORAN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE DISPERAKIM
7. PENEKANAN APBD
8. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN




# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020

## PAGU AWAL

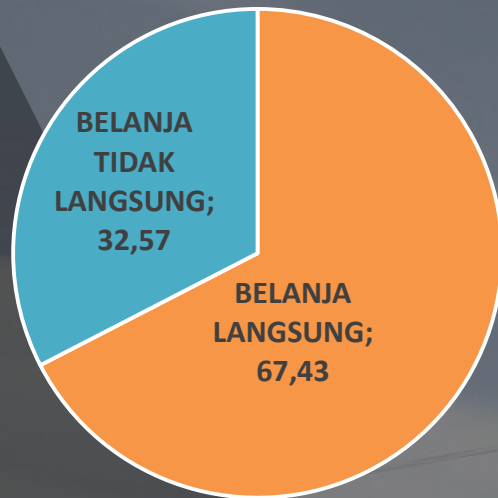


| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>44.612.807.000</b> |

## PAGU RASIONALISASI TAHAP 1

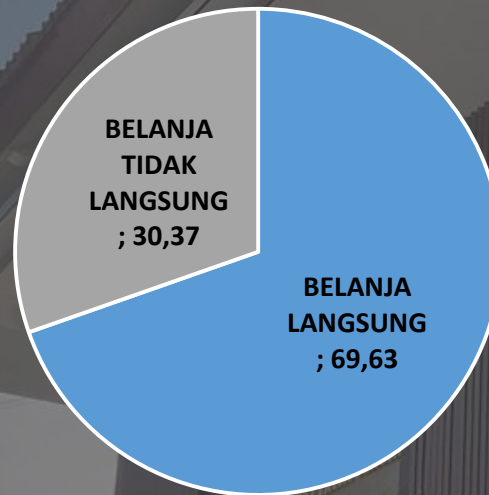

| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 26.855.467.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>38.567.858.000</b> |


## PAGU RASIONALISASI TAHAP 2

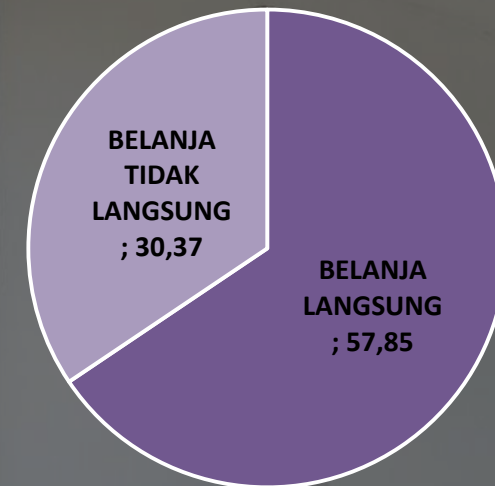


| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 22.311.773.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>34.024.164.000</b> |

# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020


**PAGU AWAL**

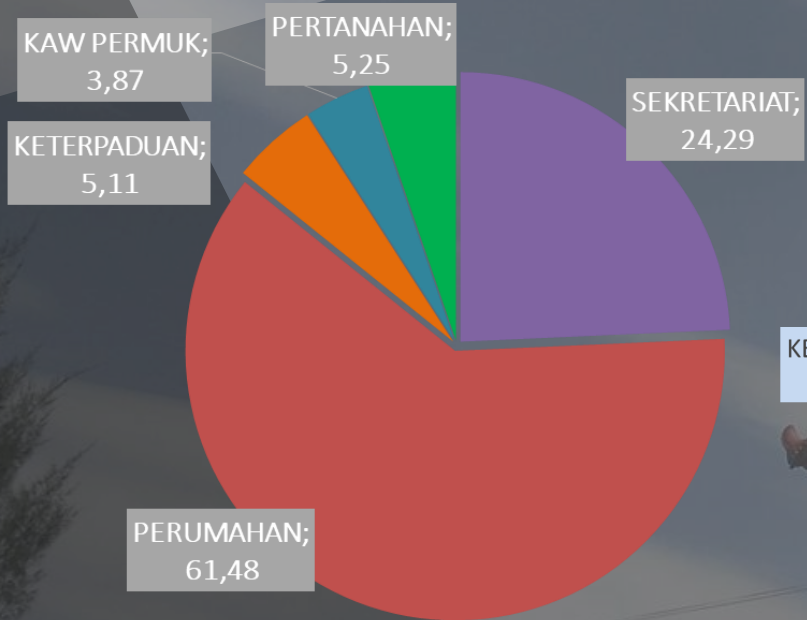

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 1**

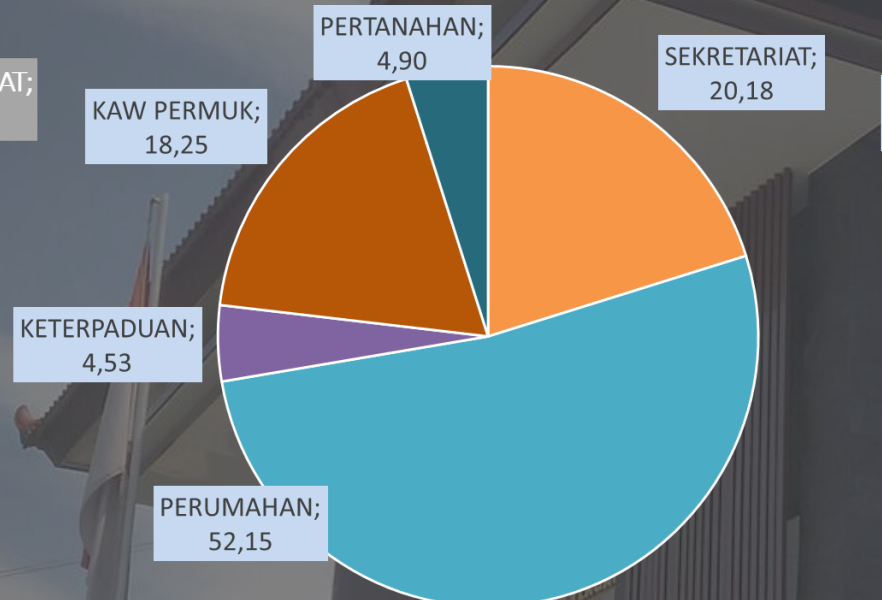

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 2**

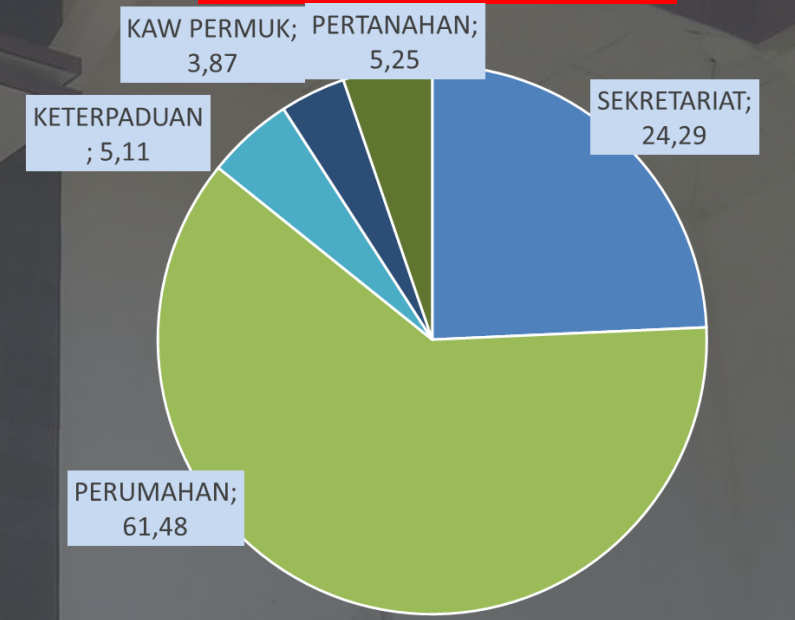

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 20,18  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.004.532.000 | 52,15  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.215.949.000  | 4,53   |
| 4     | KAW PERMUK  | 4.900.626.000  | 18,25  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.314.827.000  | 4,90   |
| TOTAL |             | 26.855.467.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 24,29  |
| 2     | PERUMAHAN   | 13.716.562.000 | 61,48  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.140.949.000  | 5,11   |
| 4     | KAW PERMUK  | 862.902.000    | 3,87   |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.171.827.000  | 5,25   |
| TOTAL |             | 22.311.773.000 | 100,00 |






# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

STATUS AKHIR SEPTEMBER 2020


# DISPERAKIM

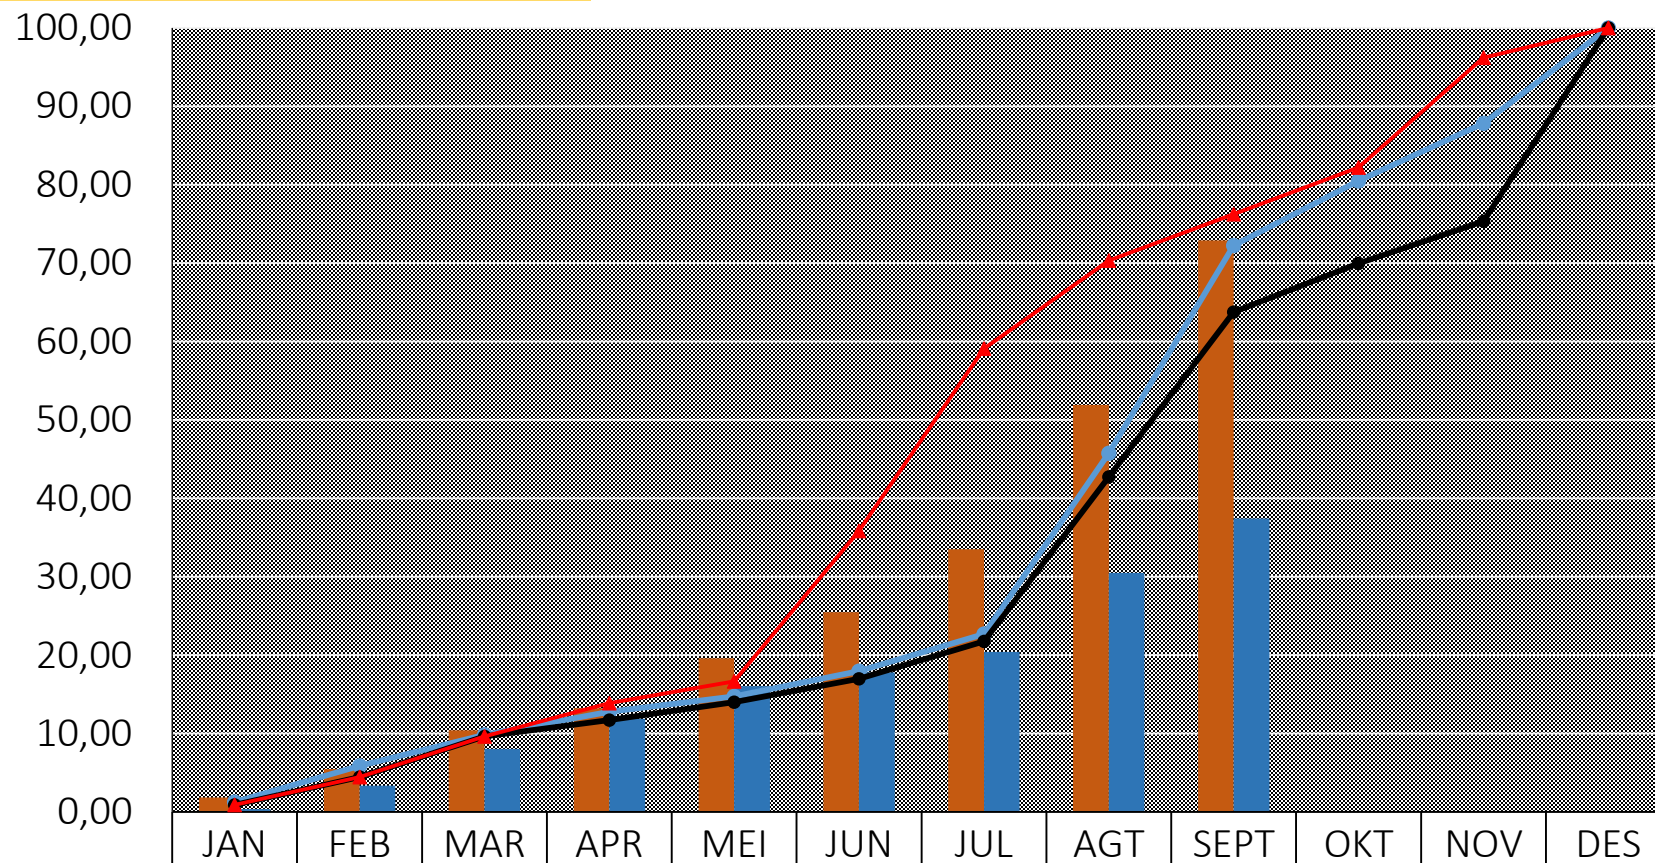

|             | Sept    | Okt   |
|-------------|---------|-------|
| Renc. Fisik | 72,24   | 80,48 |
| Real. Fisik | 72,90   |       |
| Dev. Fisik  | 0,66    |       |
| Renc. Keu   | 72,24   | 80,48 |
| Real. Keu   | 37,41   |       |
| Dev. Keu    | (34,83) |       |

|            |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REAL FISIK | 1,84 | 5,46 | 10,41 | 13,23 | 19,60 | 25,46 | 33,49 | 51,90 | 72,90 |       |       |       |
| REAL KEU   | 0,36 | 3,35 | 8,05  | 11,88 | 16,04 | 17,79 | 20,40 | 30,50 | 37,41 |       |       |       |
| TF/K RAS 2 | 1,27 | 5,87 | 9,85  | 12,76 | 14,74 | 17,94 | 22,68 | 45,73 | 72,24 | 80,48 | 87,81 | 100,0 |
| TF/K RAS 1 | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 11,72 | 13,98 | 16,98 | 21,73 | 42,74 | 63,76 | 69,95 | 75,35 | 100,0 |
| TF/K AWAL  | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,0 |


# SEKRETARIAT

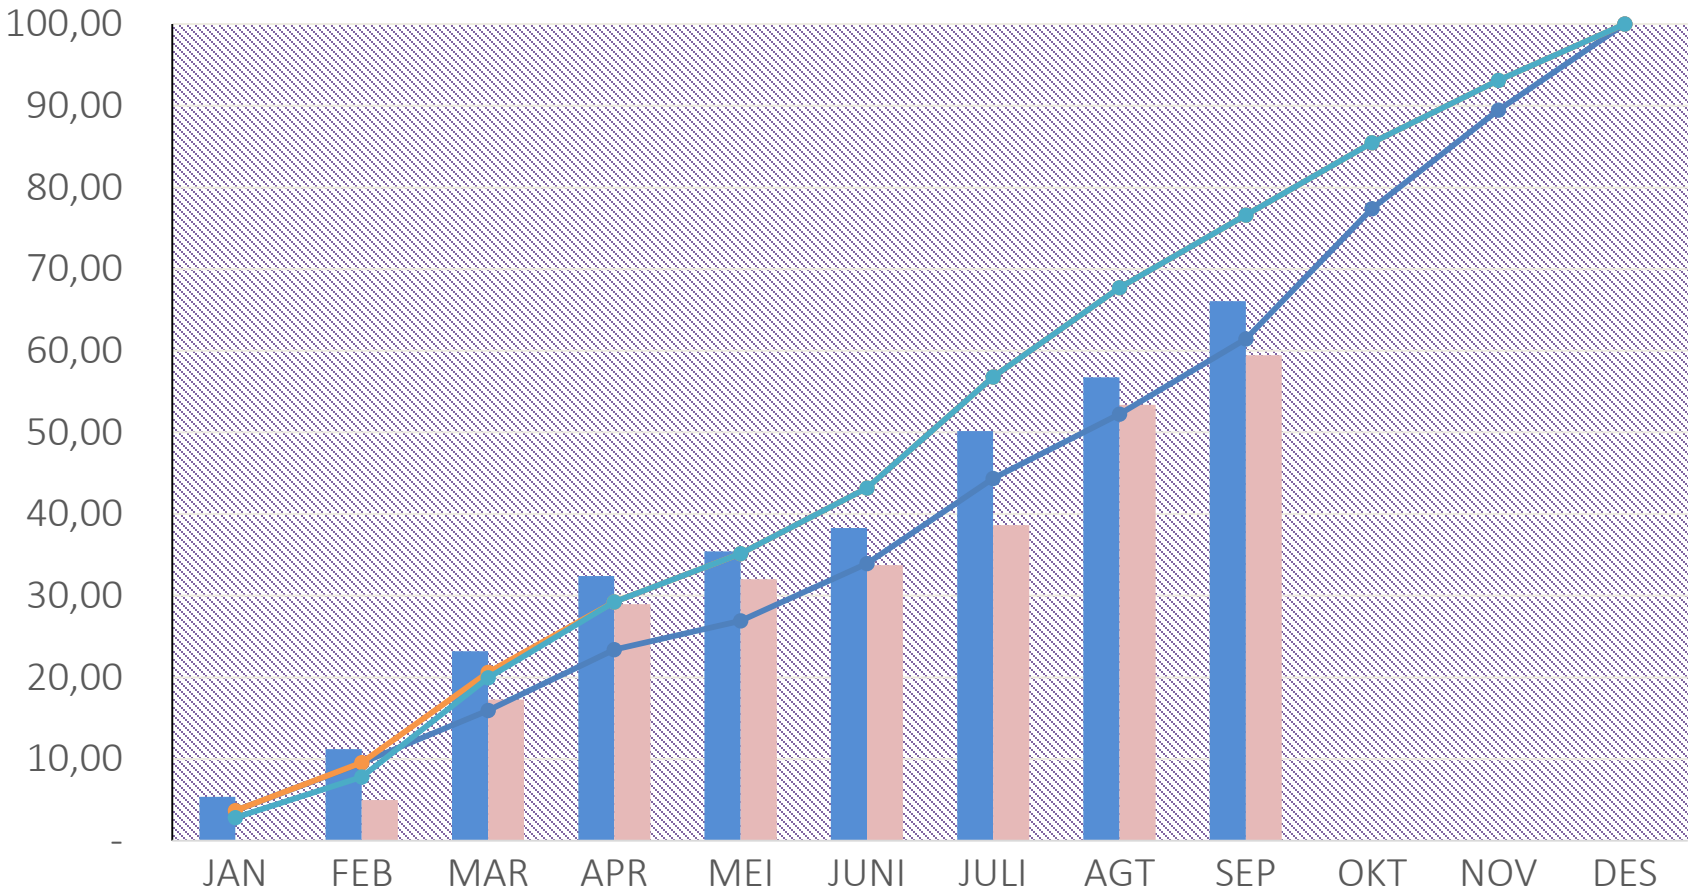

|                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK | 5,36 | 11,21 | 23,20 | 32,40 | 35,43 | 38,28 | 50,15 | 56,73 | 66,06 |       |       |        |
| REALISASI KEU   | -    | 4,96  | 17,28 | 28,94 | 32,01 | 33,75 | 38,65 | 53,39 | 59,45 |       |       |        |
| TARGET F/K-2    | 3,66 | 9,50  | 15,93 | 23,41 | 26,91 | 33,95 | 44,37 | 52,22 | 61,45 | 77,38 | 89,47 | 100,0  |
| TARGET F/K-1    | 3,66 | 9,54  | 20,59 | 29,23 | 35,15 | 43,17 | 56,78 | 67,71 | 76,63 | 85,47 | 93,12 | 100,00 |
| TARGET F/K-0    | 2,80 | 7,81  | 19,94 | 29,23 | 35,15 | 43,17 | 56,78 | 67,71 | 76,63 | 85,47 | 93,12 | 100,0  |

|             | Sept   | Okt   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 61,45  | 77,38 |
| Real. Fisik | 66,06  |       |
| Dev. Fisik  | 4,61   |       |
| Renc. Keu   | 61,45  | 77,38 |
| Real. Keu   | 59,45  |       |
| Dev. Keu    | (2,00) |       |

# PERUMAHAN

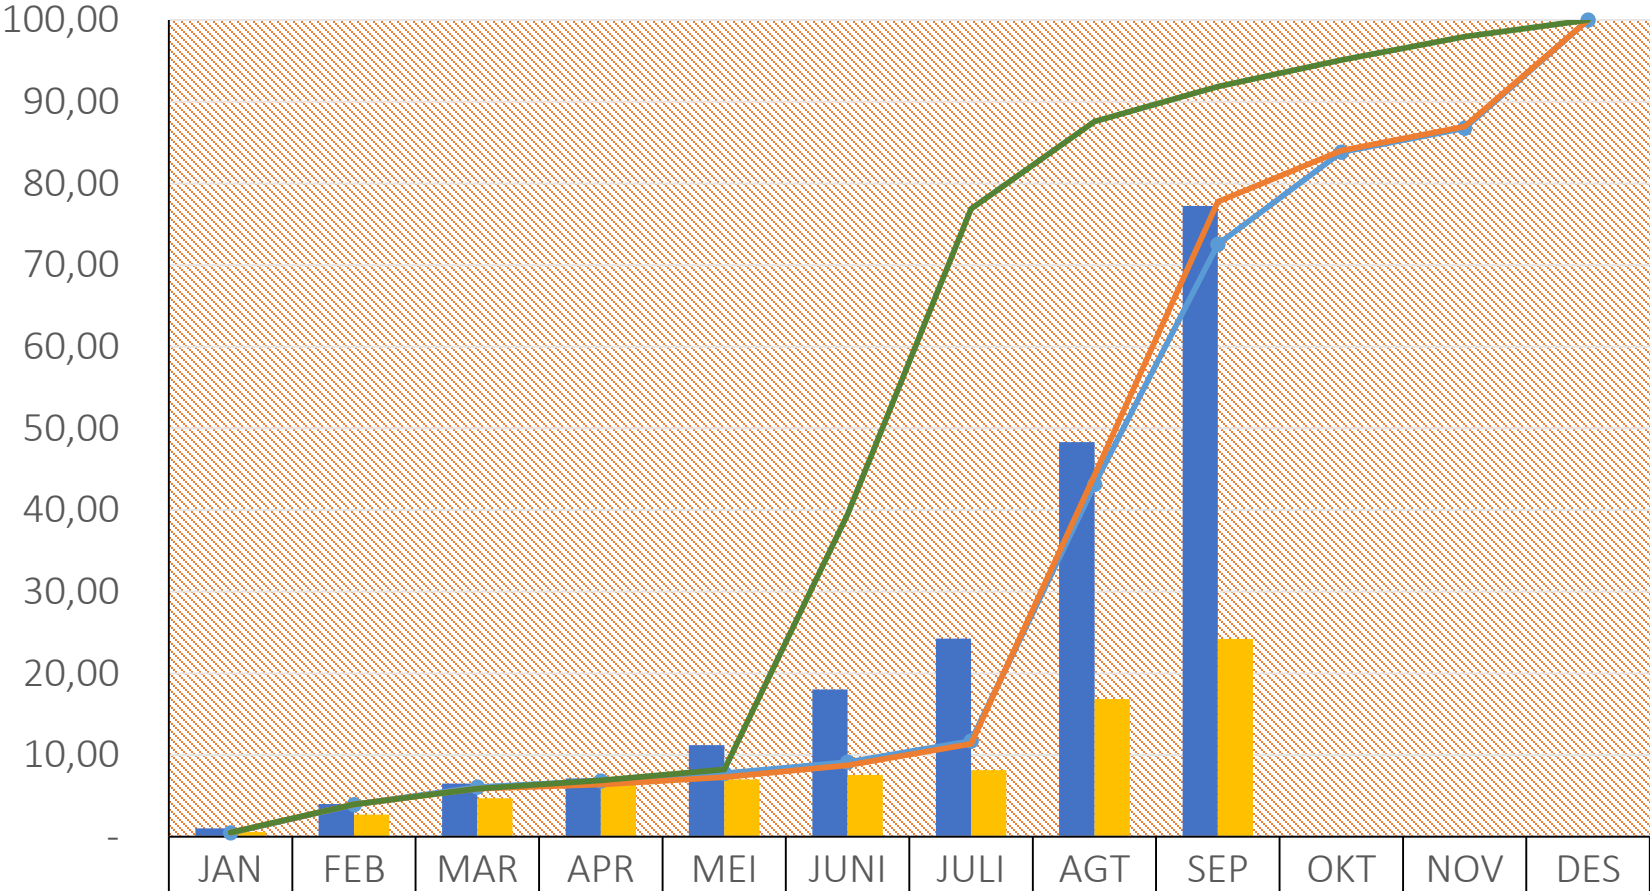


|                 |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 1,01 | 3,99 | 6,49 | 7,12 | 11,22 | 18,03 | 24,26 | 48,31 | 77,22 |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 0,60 | 2,71 | 4,68 | 6,41 | 7,01  | 7,54  | 8,16  | 16,84 | 24,21 |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 0,48 | 3,91 | 6,07 | 6,82 | 7,77  | 9,11  | 11,73 | 43,16 | 72,53 | 83,81 | 86,76 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,38 | 7,30  | 8,73  | 11,36 | 44,28 | 77,76 | 84,00 | 86,97 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,88 | 8,24  | 39,46 | 76,87 | 87,58 | 91,86 | 95,11 | 97,98 | 100,0 |

|             | Sept    | Okt   |
|-------------|---------|-------|
| Renc. Fisik | 72,53   | 83,81 |
| Real. Fisik | 77,22   |       |
| Dev. Fisik  | 4,69    |       |
| Renc. Keu   | 72,53   | 83,81 |
| Real. Keu   | 24,21   |       |
| Dev. Keu    | (48,32) |       |




# KAWASAN PERMUKIMAN

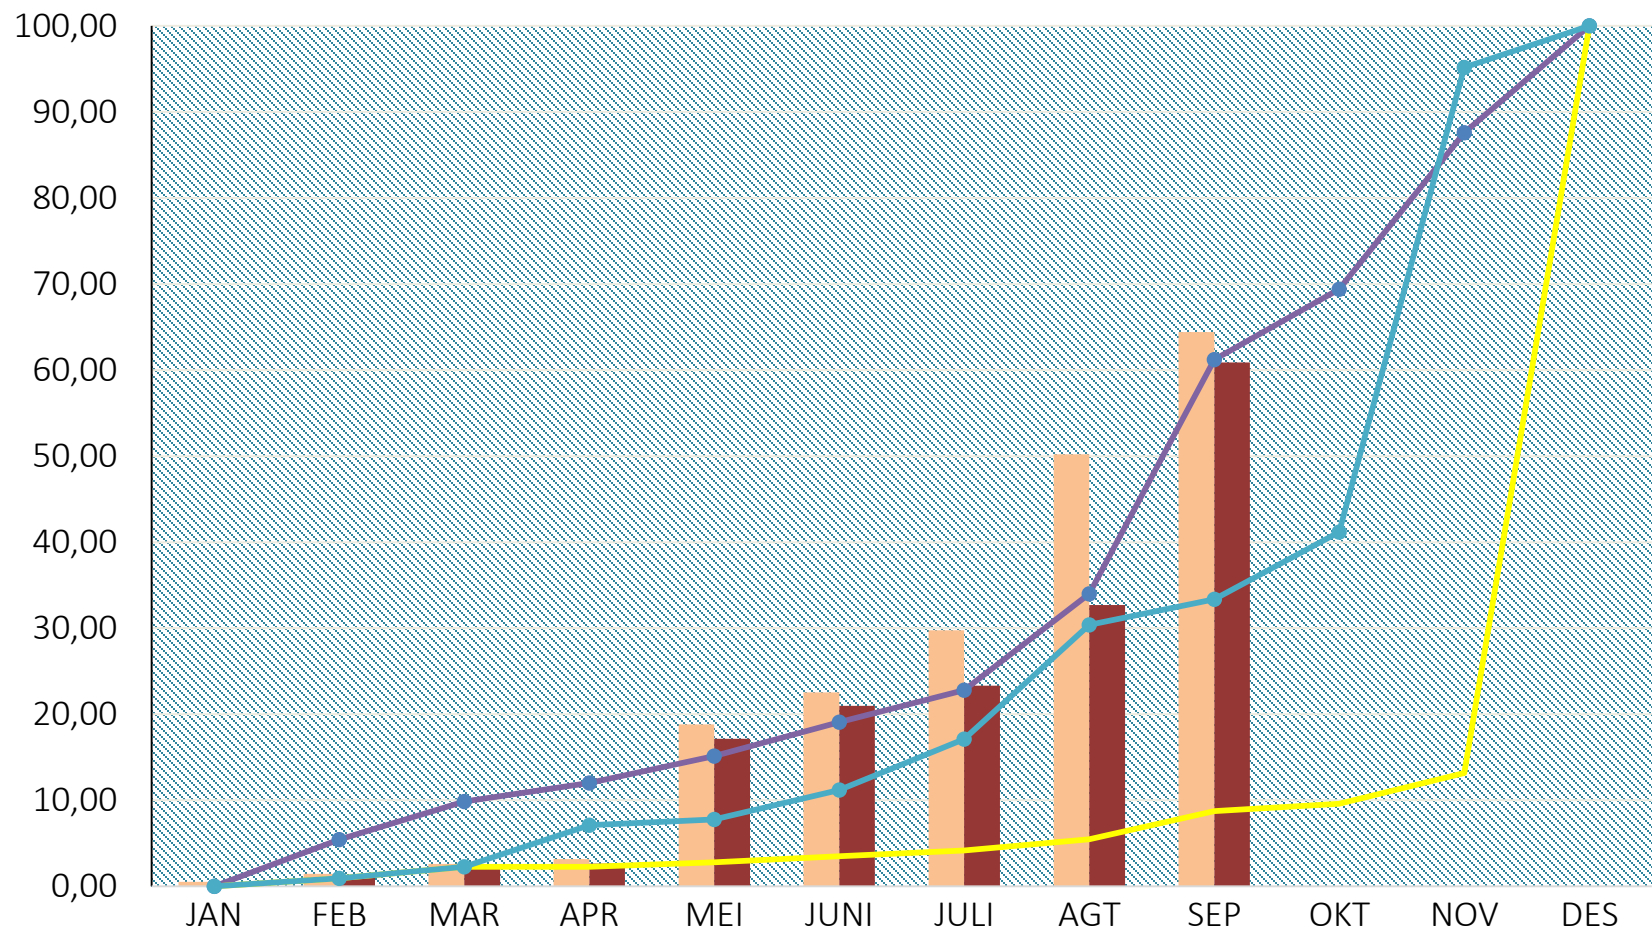

|                 |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK | 0,54 | 1,47 | 2,61 | 3,18  | 18,81 | 22,56 | 29,75 | 50,21 | 64,4  |       |       |        |
| REALISASI KEU   | 0,00 | 1,28 | 2,11 | 2,64  | 17,14 | 20,99 | 23,31 | 32,71 | 60,89 |       |       |        |
| TARGET F/K-2    | 0,00 | 5,45 | 9,85 | 12,00 | 15,15 | 19,09 | 22,81 | 33,99 | 61,21 | 69,40 | 87,58 | 100,00 |
| TARGET F/K-1    | 0,00 | 0,94 | 2,29 | 2,27  | 2,81  | 3,50  | 4,19  | 5,47  | 8,73  | 9,61  | 13,16 | 100,00 |
| TARGET F/K-0    | 0,00 | 0,94 | 2,29 | 7,09  | 7,77  | 11,21 | 17,11 | 30,38 | 33,38 | 41,19 | 95,17 | 100,00 |

|             | Sept   | Okt   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 61,21  | 69,40 |
| Real. Fisik | 64,40  |       |
| Dev. Fisik  | 3,19   |       |
| Renc. Keu   | 61,21  | 69,40 |
| Real. Keu   | 60,89  |       |
| Dev. Keu    | (0,32) |       |


# KETERPADUAN PKPP

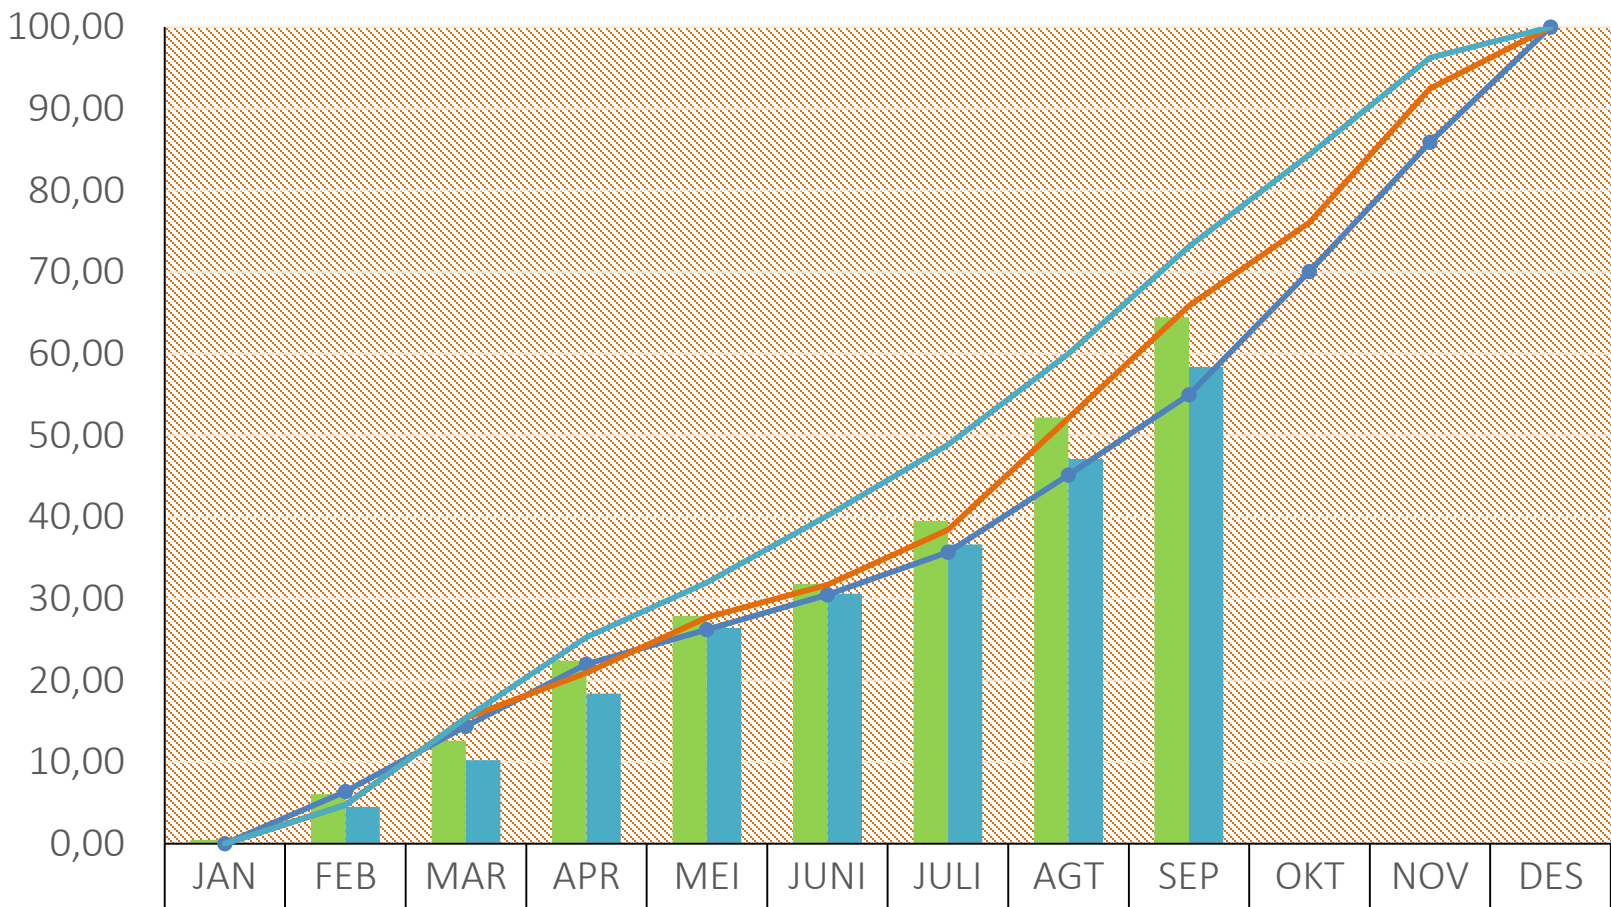

|                 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 0,48 | 6,06 | 12,60 | 22,40 | 27,90 | 31,80 | 39,54 | 52,18 | 64,47 |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 0,00 | 4,52 | 10,22 | 18,38 | 26,39 | 30,62 | 36,64 | 47,10 | 58,40 |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 0,00 | 6,38 | 14,38 | 21,98 | 26,23 | 30,48 | 35,70 | 45,13 | 54,96 | 70,07 | 85,89 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 20,94 | 27,72 | 31,71 | 38,44 | 52,10 | 65,86 | 76,06 | 92,47 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 25,26 | 31,96 | 40,15 | 48,88 | 59,98 | 73,14 | 84,37 | 96,26 | 100,0 |


|             | Sept  | Okt   |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 54,96 | 70,07 |
| Real. Fisik | 64,47 |       |
| Dev. Fisik  | 9,51  |       |
| Renc. Keu   | 54,96 | 70,07 |
| Real. Keu   | 58,40 |       |
| Dev. Keu    | 3,44  |       |

# PERTANAHAN

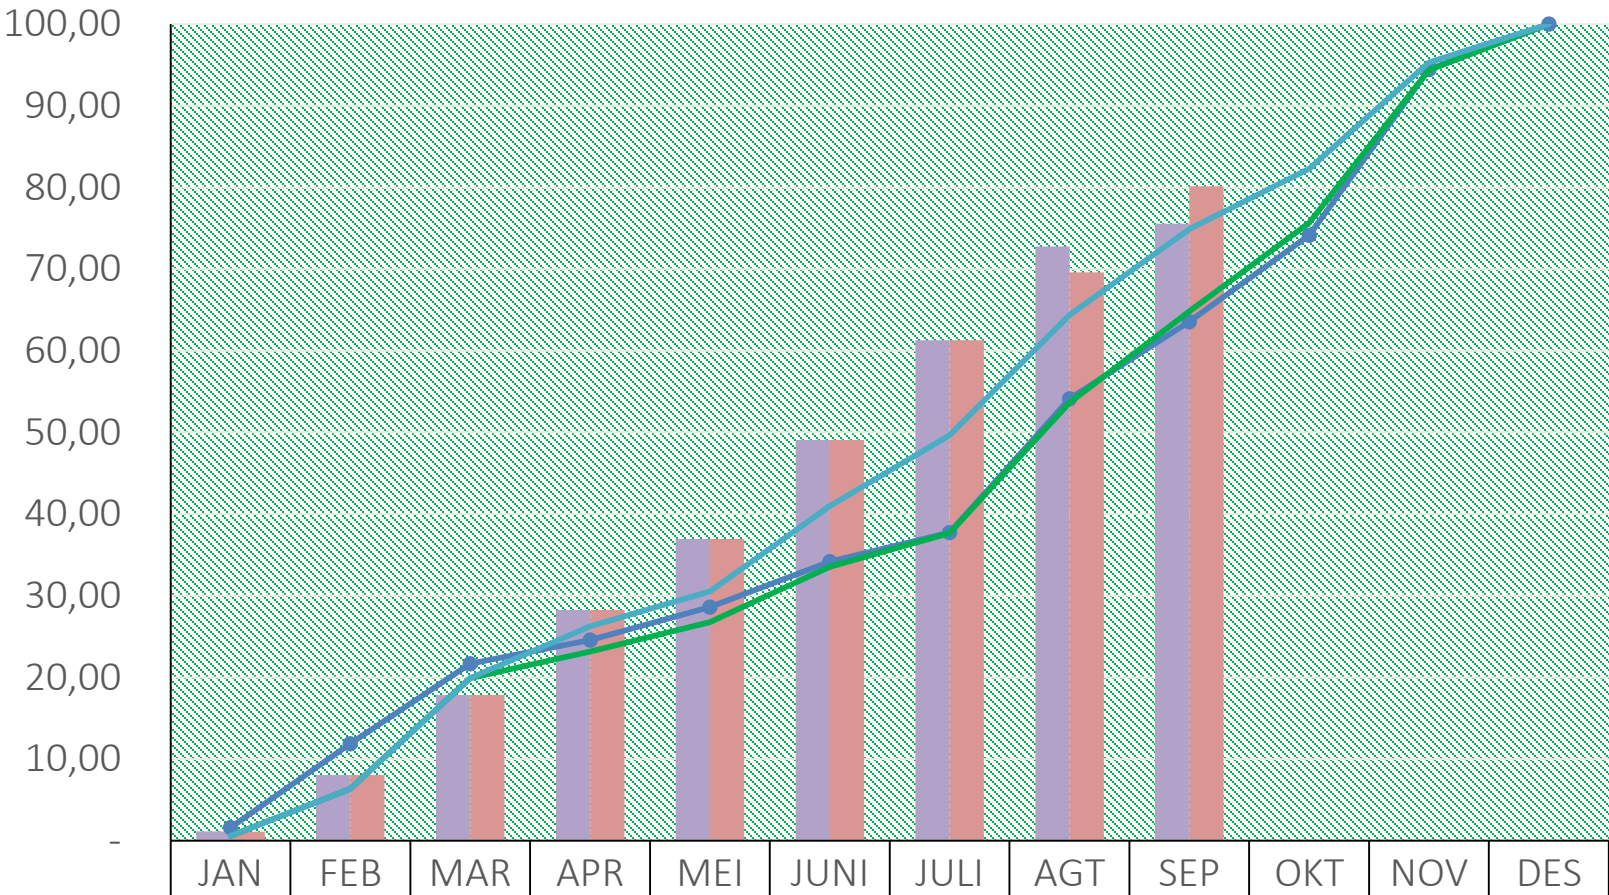

|                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 1,13 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 | 61,29 | 72,78 | 75,55 |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 1,11 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 | 61,29 | 69,58 | 80,14 |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 1,62 | 11,86 | 21,65 | 24,55 | 28,61 | 34,16 | 37,73 | 54,13 | 63,57 | 74,14 | 94,45 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,58 | 6,34  | 19,91 | 23,15 | 26,78 | 33,55 | 37,67 | 53,64 | 64,80 | 75,67 | 94,36 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,58 | 6,34  | 19,91 | 26,24 | 30,53 | 41,00 | 49,66 | 64,40 | 74,88 | 82,31 | 95,29 | 100,0 |

|             | Sept  | Okt   |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 63,57 | 74,14 |
| Real. Fisik | 75,55 |       |
| Dev. Fisik  | 11,98 |       |
| Renc. Keu   | 63,57 | 74,14 |
| Real. Keu   | 80,14 |       |
| Dev. Keu    | 16,57 |       |




# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA


STATUS AKHIR SEPTEMBER 2020

# REKAP PENGADAAN BARANG/JASA

**TOTAL PAKET : 303 PAKET**

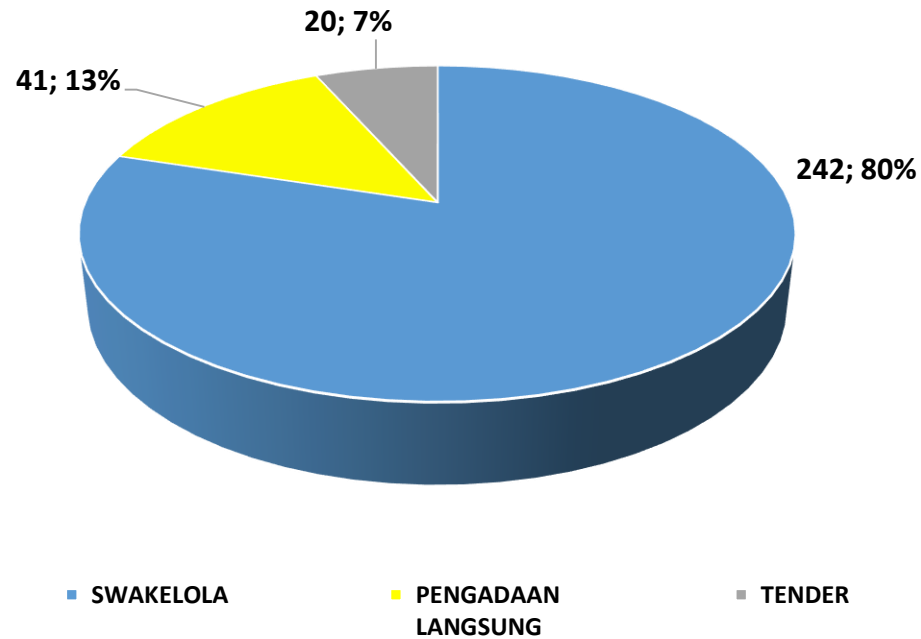


**TOTAL ANGGARAN : Rp. 22.311.773.000,-**

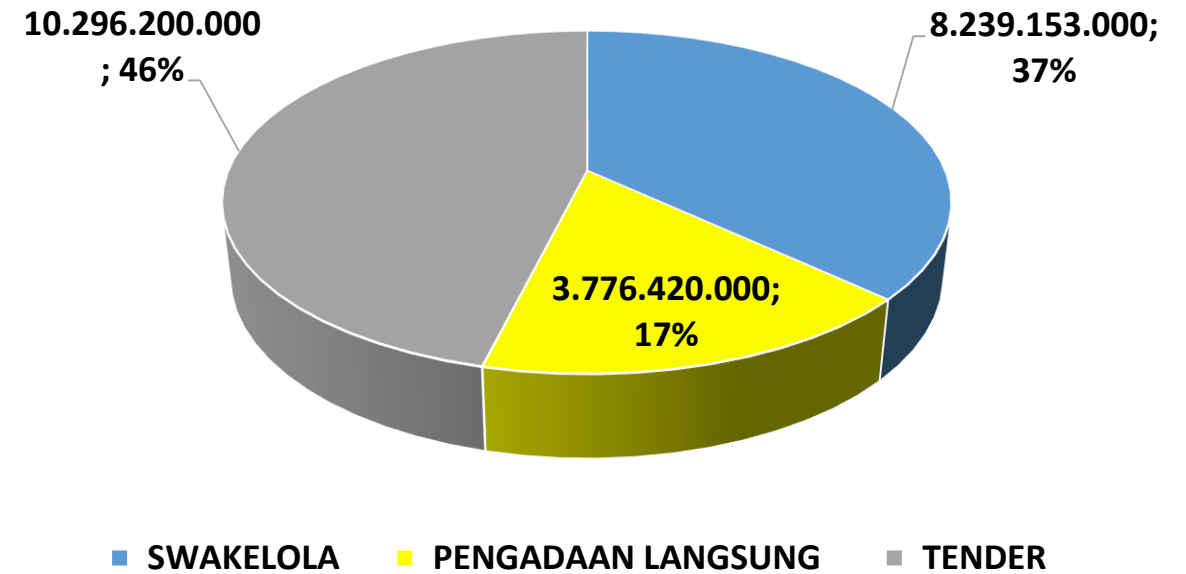

| NO | BIDANG             | PAGU                  | SWAKELOLA            |            | PENGADAAN LANGSUNG   |           | TENDER                |           | TOTAL PAKET           |            |
|----|--------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|
|    |                    |                       | Rp                   | Jml        | Rp                   | Jml       | Rp                    | Jml       | Rp                    | Jml        |
| 1  | SEKRETARIAT        | 5.419.533.000         | 3.627.773.000        | 63         | 1.115.560.000        | 13        | 676.200.000           | 2         | 5.419.533.000         | 78         |
| 2  | PERUMAHAN          | 13.716.562.000        | 2.192.562.000        | 52         | 2.064.000.000        | 16        | 9.460.000.000         | 17        | 13.716.562.000        | 85         |
| 3  | KAWASAN PERMUKIMAN | 862.902.000           | 702.902.000          | 42         | -                    | -         | 160.000.000           | 1         | 862.902.000           | 43         |
| 4  | KETERPADUAN PKPP   | 1.140.949.000         | 633.249.000          | 46         | 507.700.000          | 10        | -                     | -         | 1.140.949.000         | 56         |
| 5  | PERTANAHAN         | 1.171.827.000         | 1.106.667.000        | 39         | 89.160.000           | 2         | -                     | -         | 1.171.827.000         | 41         |
|    | <b>TOTAL</b>       | <b>22.311.773.000</b> | <b>8.239.153.000</b> | <b>242</b> | <b>3.776.420.000</b> | <b>41</b> | <b>10.296.200.000</b> | <b>20</b> | <b>22.311.773.000</b> | <b>303</b> |

# PROGRES PENGADAAN BARANG JASA

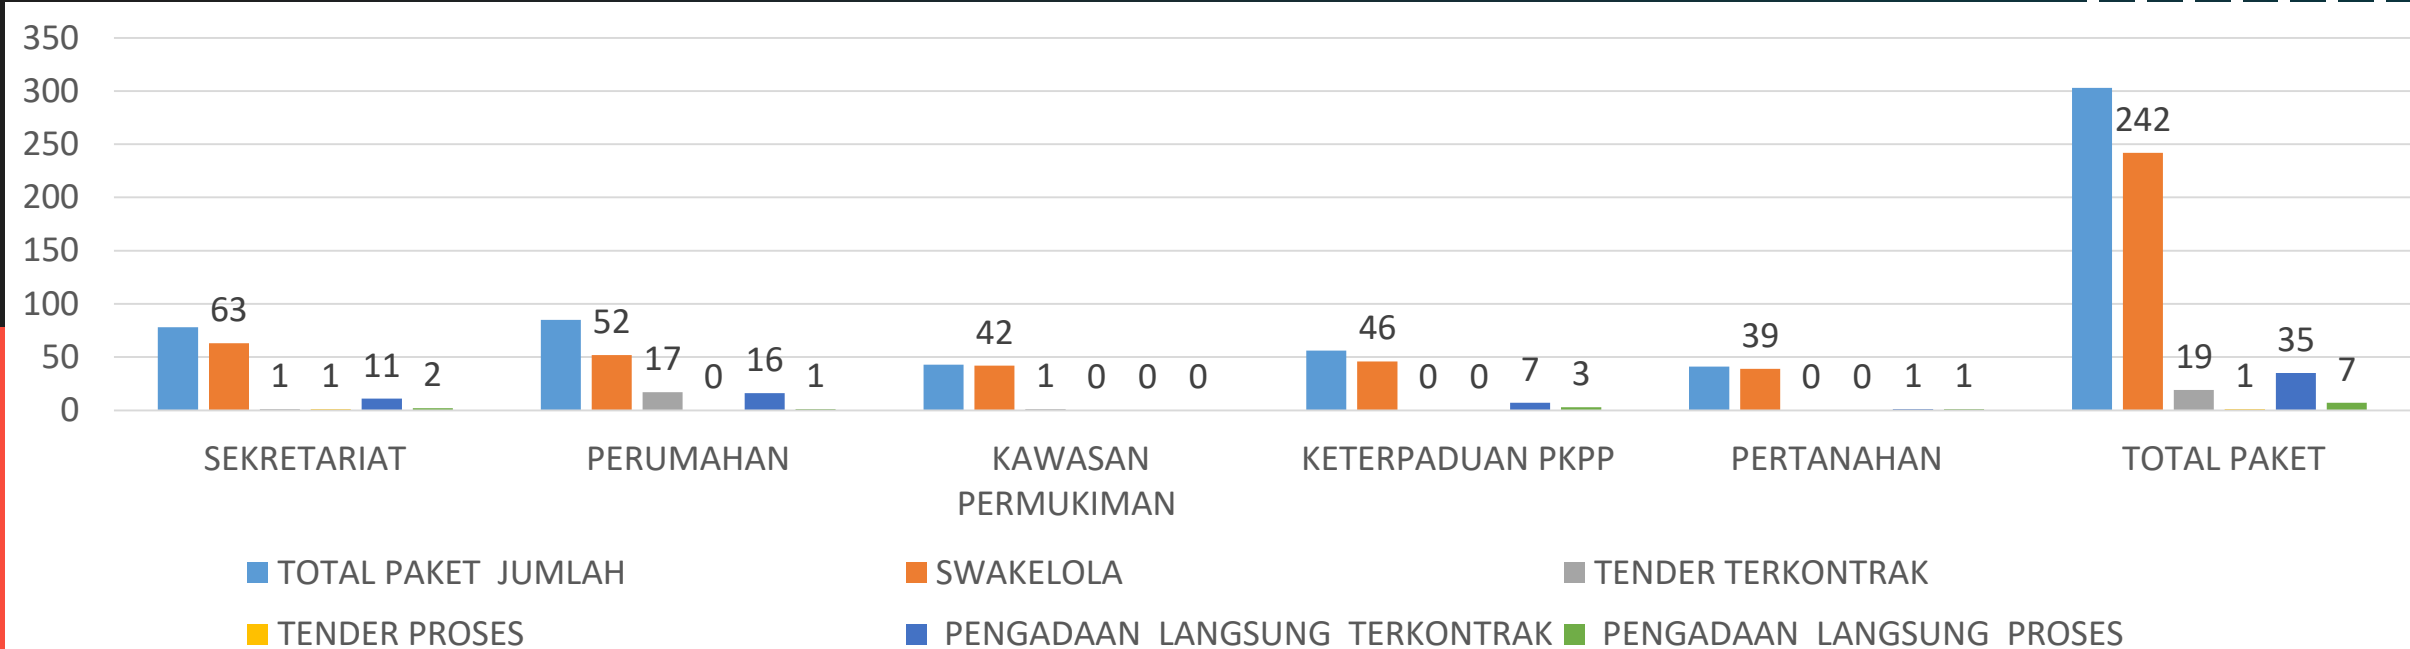

| NO | BIDANG             | TOTAL PAKET | SWAKELOLA | TENDER     |        | PENGADAAN LANGSUNG |        |
|----|--------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------------------|--------|
|    |                    | JUMLAH      | JUMLAH    | TERKONTRAK | PROSES | TERKONTRAK         | PROSES |
| 1  | SEKRETARIAT        | 78          | 63        | 1          | 1      | 11                 | 2      |
| 2  | PERUMAHAN          | 85          | 52        | 17         | 0      | 15                 | 1      |
| 3  | KAWASAN PERMUKIMAN | 43          | 42        | 1          | 0      | 0                  | 0      |
| 4  | KETERPADUAN PKPP   | 56          | 46        | 0          | 0      | 7                  | 3      |
| 5  | PERTANAHAN         | 41          | 39        | 0          | 0      | 1                  | 1      |
|    | TOTAL PAKET        | 303         | 242       | 19         | 1      | 34                 | 7      |

RINGKASAN PAKET SUDAH TERKONTRAK : TENDER: 19 DARI 20 PAKET; PENGADAAN LANGSUNG: 32 DARI 41 PAKET

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                        | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE       | PROGRES LELANG                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                                   |                     |              |                                                     |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (7 bulan)                   | 271.200.000         | Tender Cepat | Masa Kontrak 1 Juni s.d. 31 Desember 2020           |
| 2                | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor                                      | 405.000.000         | Tender       | Persiapan lelang                                    |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                                   |                     |              |                                                     |
| 3                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan     | 525.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang      | 840.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak        | 735.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara       | 560.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 7                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati                   | 490.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 8                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes       | 840.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 17 Juli s.d. 14 Oktober 2020   |
| 9                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemasang     | 840.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 10               |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara | 455.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 11               |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo     | 385.000.000         | Tender       | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |



# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                 | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 12  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung                                                                                              | 455.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 13  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen                                                                                                 | 770.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 17 Juli s.d. 14 Oktober 2020   |
| 14  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten                                                                                                  | 420.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 15  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen                                                                                                  | 385.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 17 Juli s.d. 14 Oktober 2020   |
| 16  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo                                                                                               | 840.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 26 Juni s.d. 23 September 2020 |
| 17  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000         | Tender  | Masa Kontrak Tanggal 14 Juli s.d. 11 September 2020 |
| 18  |                                                                                                                                          | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000         | Seleksi | Masa Kontrak Tanggal 17 Juni s.d. 15 Oktober 2020   |
| 19  |                                                                                                                                          | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000         | Seleksi | Masa Kontrak Tanggal 17 Juni s.d. 15 September 2020 |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.                       | KEGIATAN                                                                  | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------|
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                           |                                      |                  |         |                                             |
| 20                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Pemukiman | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                                  |
| 21                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                                  |
| 22                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                                  |
| 23                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                                  |
| 24                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                                  |
| 25                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                                  |
| 26                        | Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 160.000.000      | Seleksi | Masa Kontrak 20 Juli s.d. 17 September 2020 |
| 27                        |                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | -                | Seleksi | DIHENTIKAN                                  |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 10 Juli 2020        |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Masa Kontrak 2 Januari s.d. 31 Desember 2020 |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Masa Kontrak 2 Januari s.d. 31 Desember 2020 |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 9 Maret 2020        |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 197.600.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 20 Juli 2020        |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 3 Agustus 2020      |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 8 September 2020    |
| 8   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 21 Juli 2020        |
| 9   |                                                                                | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Masa Kontrak 14 s.d. 28 September 2020       |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       | Persiapan lelang                             |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       | Persiapan lelang                             |
| 12  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020                |
| 13  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Belanja Sewa Hotel                                                                                        | 86.400.000       | Sudah terlaksana 6-7 Maret 2020              |

**BELUM TERKONTRAK: 2 PAKET**

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERUMAHAN**

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020 |
| 2  |                                                                                                                                         | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       | Masa Kontrak 7 Juli s.d. 4 Oktober 2020      |
| 3  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 210.000.000      | Masa Kontrak 10 Juli s.d. 23 Agustus 2020    |
| 4  |                                                                                                                                         | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru I                                                                      | 100.000.000      | Masa Kontrak 15 Juli s.d. 14 Oktober 2020    |
| 5  |                                                                                                                                         | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru II                                                                     | 100.000.000      | Masa Kontrak 15 Juli s.d. 14 Oktober 2020    |
| 6  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      | Masa Kontrak 3 April s.d. 28 November 2020   |
| 7  |                                                                                                                                         | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 64.800.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020   |
| 8  |                                                                                                                                         | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Masa Kontrak 31 Jan s.d. 30 Maret 2020       |
| 9  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan Akses Rusunawa Kota Semarang                                    | 50.000.000       | Rencana Pelaksanaan Bulan Oktober            |
| 10 |                                                                                                                                         | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      | Masa Kontrak 5 Agustus s.d. 18 Okt 2020      |
| 11 |                                                                                                                                         | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      | Masa Kontrak 5 Agustus s.d. 18 Okt 2020      |
| 12 |                                                                                                                                         | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      | Masa Kontrak 12 Agustus s.d. 25 Sept 2020    |
| 13 |                                                                                                                                         | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      | Masa Kontrak 12 Agustus s.d. 25 Sept 2020    |
| 14 |                                                                                                                                         | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      | Masa Kontrak 11 Agustus s.d. 24 Sept 2020    |
| 15 |                                                                                                                                         | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      | Masa Kontrak 11 Agustus s.d. 24 Sept 2020    |
| 16 |                                                                                                                                         | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      | Masa Kontrak 14 Juli s.d. 11 Sept 2020       |

**BELUM TERKONTRAK: 1 PAKET**

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Sewa Hotel 1                                                                                                    | -                | <b>DIHENTIKAN</b>                                    |
| 2   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel 2                                                                                                    | 56.700.000       | Rencana pelaksanaan bulan November                   |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       | Masa Kontrak 21 Juli s.d. 18 November 2020           |
| 4   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Masa Kontrak 17 Februari s.d. 16 April 2020          |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Masa Kontrak 12 Maret 2020 s.d. 7 Desember 2020      |
| 6   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Masa kontrak 3 Februari s.d. 31 Desember 2020        |
| 7   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       | Masa Kontrak 20 Februari s.d. 20 Desember 2020       |
| 8   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel Forum Pokja PKP Paket Fullboard Dalam Daerah                                                         | 5.000.000        | Rencana pelaksanaan bulan Oktober (melalui zoom)     |
| 9   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Masa Kontrak 20 Februari s.d. 20 Desember 2020       |
| 10  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Belanja Sewa Hotel                                                                                                      | 30.000.000       | Rencana Pelaksanaan Bulan Oktober (diubah mjd rakor) |
| 11  |                                                                                                    | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                 | 66.000.000       | Masa Kontrak 12 Februari s.d. 31 Desember 2020       |

**BELUM TERKONTRAK: 3 PAKET**

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KAW. PERMUKIMAN**


| NO. | KEGIATAN                                       | NAMA PAKET                          | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | -                | DIHENTIKAN     |
| 2   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | -                | DIHENTIKAN     |
| 3   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | -                | DIHENTIKAN     |

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                         | NAMA PAKET                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi                                                                 | Sewa Hotel Paket Full board             | 24.160.000       | Pelaksanaan Bulan November.                |
| 2   | Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 65.000.000       | Masa Kontrak 7 Agustus s.d. 6 Oktober 2020 |

**BELUM TERKONTRAK: 1 PAKET**

# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT



**Total**

31

24

17

13

10

13

8

8

9


-

-


-



# LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




# LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS



|               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| ■ Sekretariat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| ■ Perumahan   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1  |
| ■ Kawasan     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3  |
| ■ Keterpaduan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5  |
| ■ Pertanian   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  |

# LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS




**APBN**



# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

## PAGU – Rp 489.155.168.000

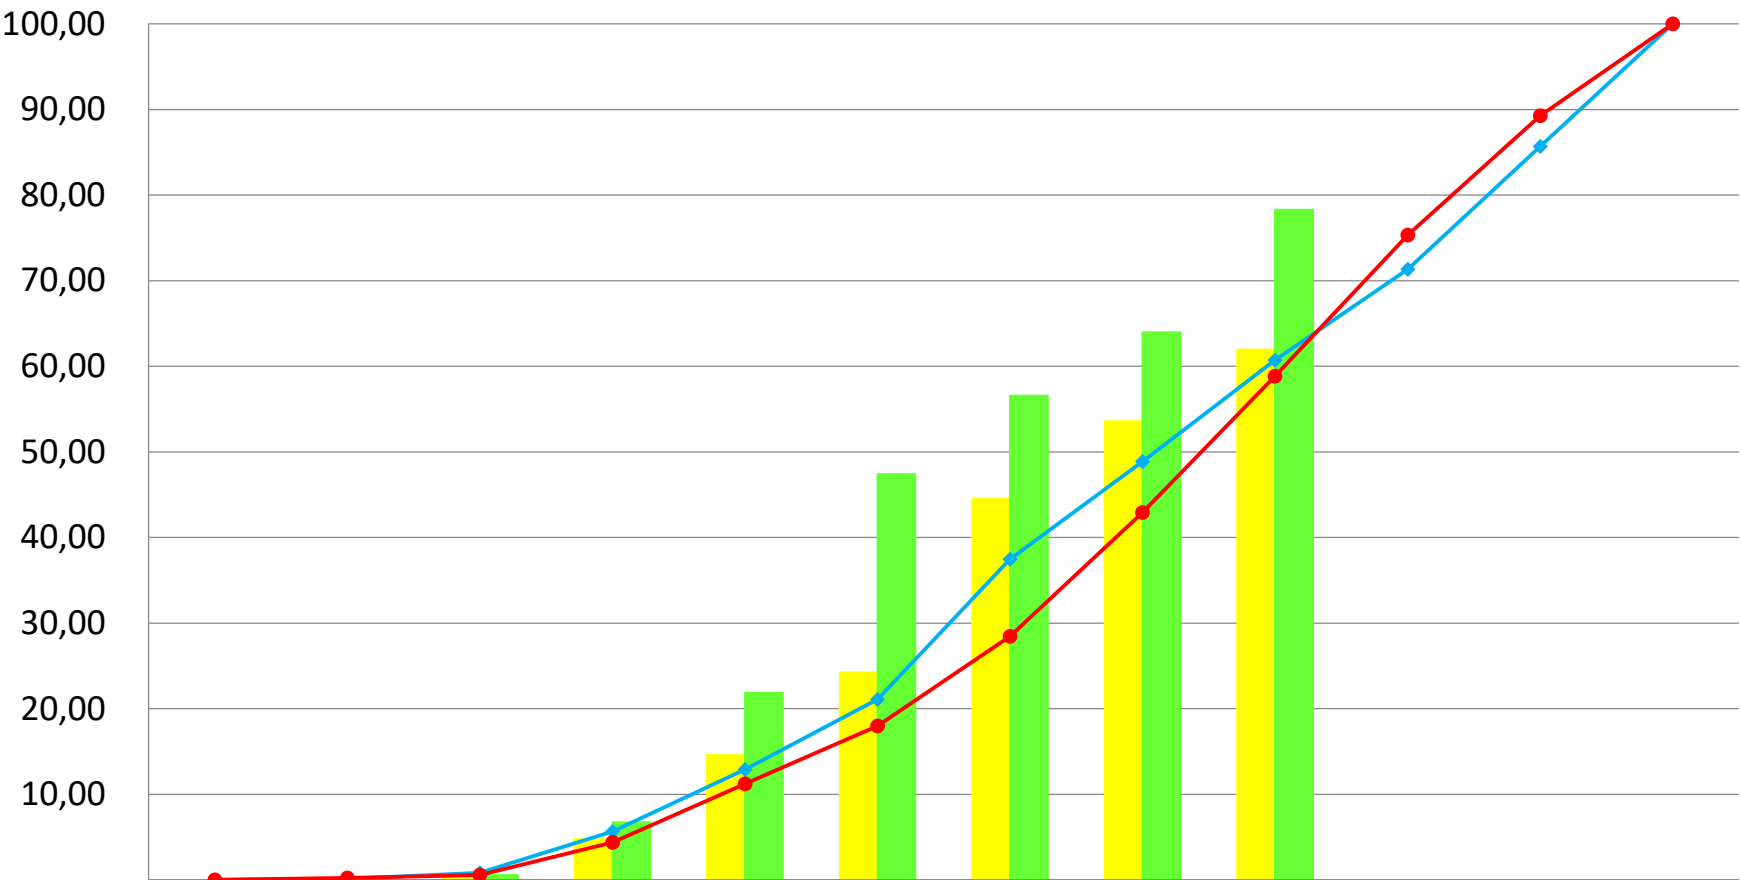


|    |   |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----|---|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RF | - | 0,22 | 0,55 | 4,76 | 14,60 | 24,22 | 44,53 | 53,59 | 61,93 |       |       |        |
| RK | - | 0,13 | 0,56 | 6,73 | 21,85 | 47,40 | 56,56 | 63,98 | 78,27 |       |       |        |
| TF | - | 0,12 | 0,83 | 5,65 | 12,90 | 21,09 | 37,47 | 48,86 | 60,70 | 71,31 | 85,68 | 100,00 |
| TK | - | 0,21 | 0,57 | 4,38 | 11,20 | 17,97 | 28,47 | 42,90 | 58,83 | 75,32 | 89,29 | 100,00 |

|             | Sept         | Okt   |
|-------------|--------------|-------|
| Renc. Fisik | 60,70        | 71,31 |
| Real. Fisik | <b>61,93</b> |       |
| Dev. Fisik  | 1,23         |       |
| Renc. Keu   | 58,83        | 75,32 |
| Real. Keu   | <b>78,27</b> |       |
| Dev. Keu    | 19,44        |       |

# BPPW JATENG

## PAGU – Rp 1.066.179.294

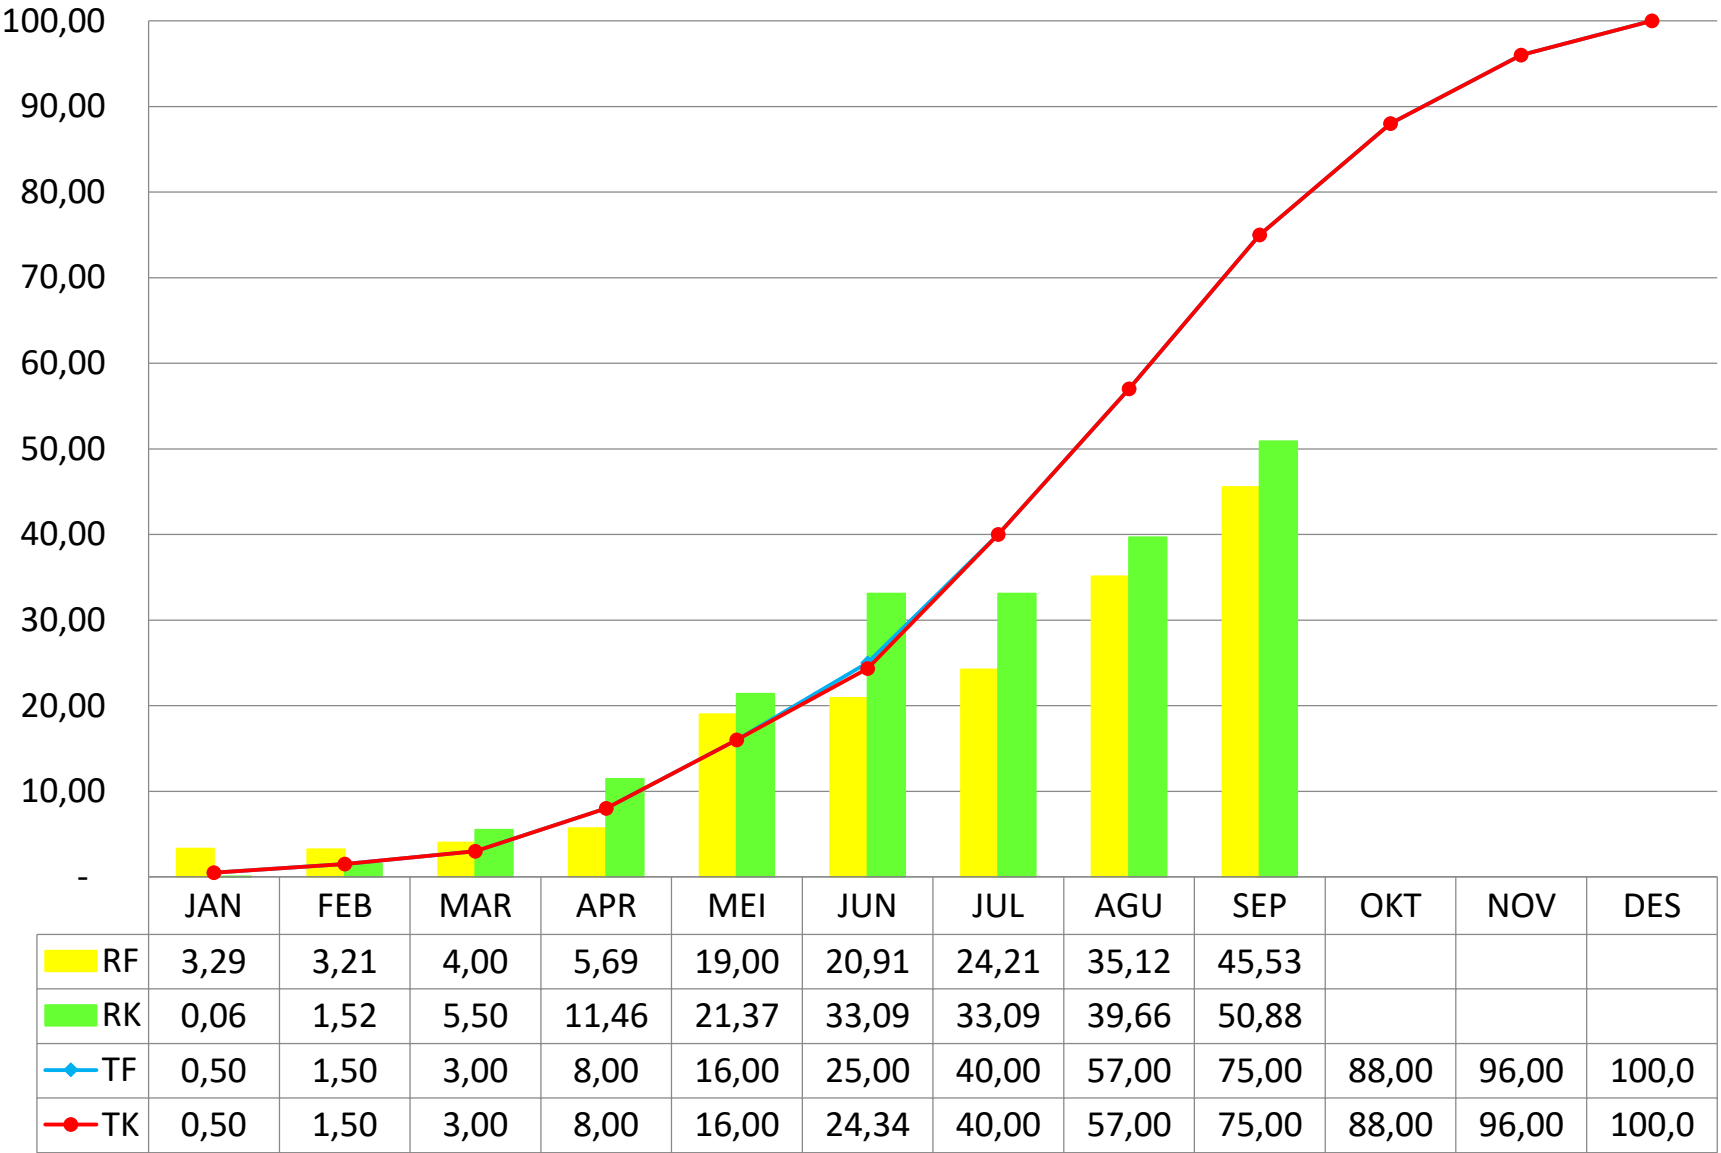

|             | Sept    | Okt   |
|-------------|---------|-------|
| Renc. Fisik | 75,00   | 88,00 |
| Real. Fisik | 45,53   |       |
| Dev. Fisik  | (29,47) |       |
| Renc. Keu   | 75,00   | 88,00 |
| Real. Keu   | 50,88   |       |
| Dev. Keu    | (24,12) |       |

A solid red square is positioned on the left side of the slide. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**



# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR AGUSTUS 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH


# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PELAPORAN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE DISPERAKIM
7. PENEKANAN APBD
8. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN




# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020

## PAGU AWAL

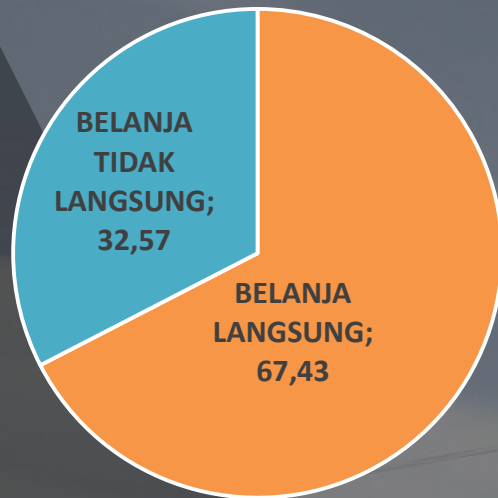


| BELANJA                | PAGU           |
|------------------------|----------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000 |
| TOTAL                  | 44.612.807.000 |

## PAGU RASIONALISASI TAHAP 1

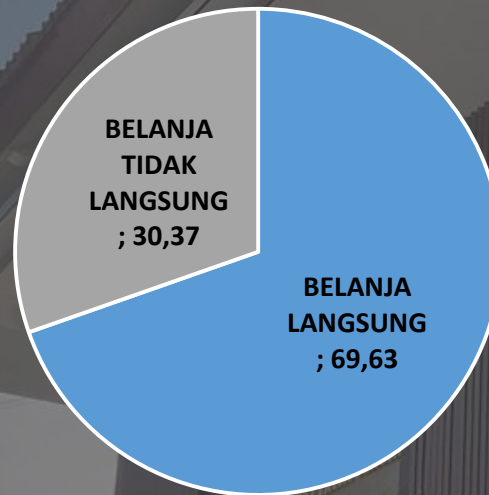

| BELANJA                | PAGU           |
|------------------------|----------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 26.855.467.000 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000 |
| TOTAL                  | 38.567.858.000 |


## PAGU RASIONALISASI TAHAP 2

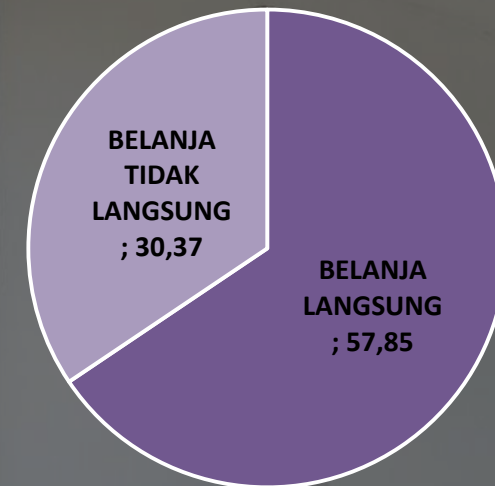


| BELANJA                | PAGU           |
|------------------------|----------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 22.311.773.000 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000 |
| TOTAL                  | 34.024.164.000 |

# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020


**PAGU AWAL**

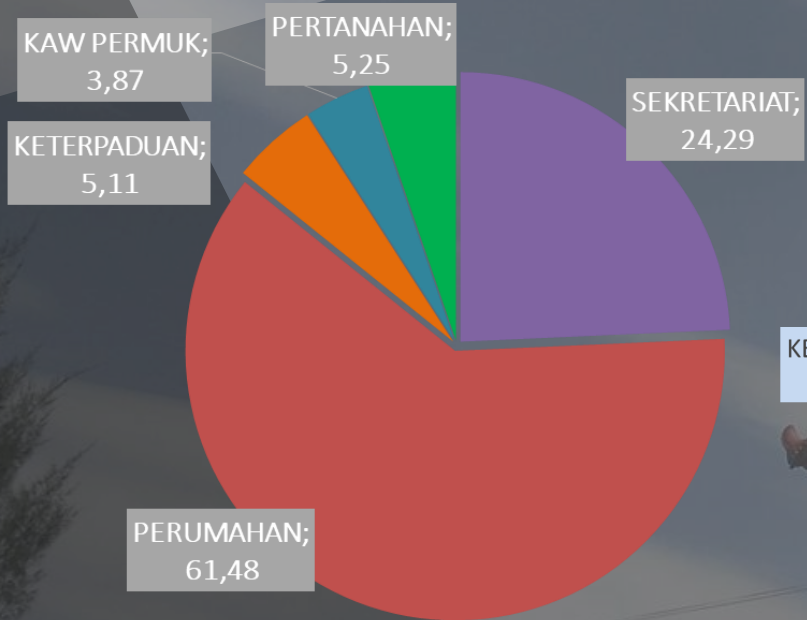

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 1**

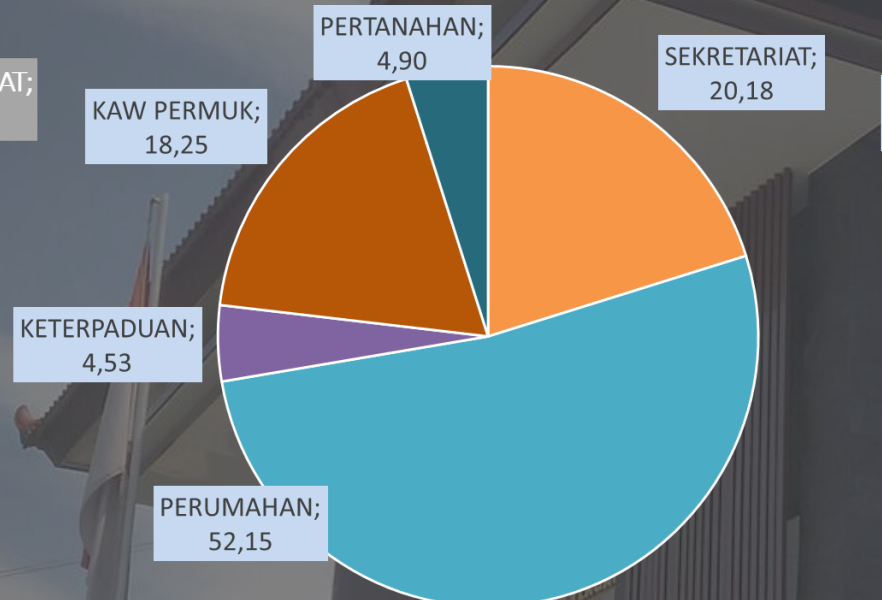

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 2**

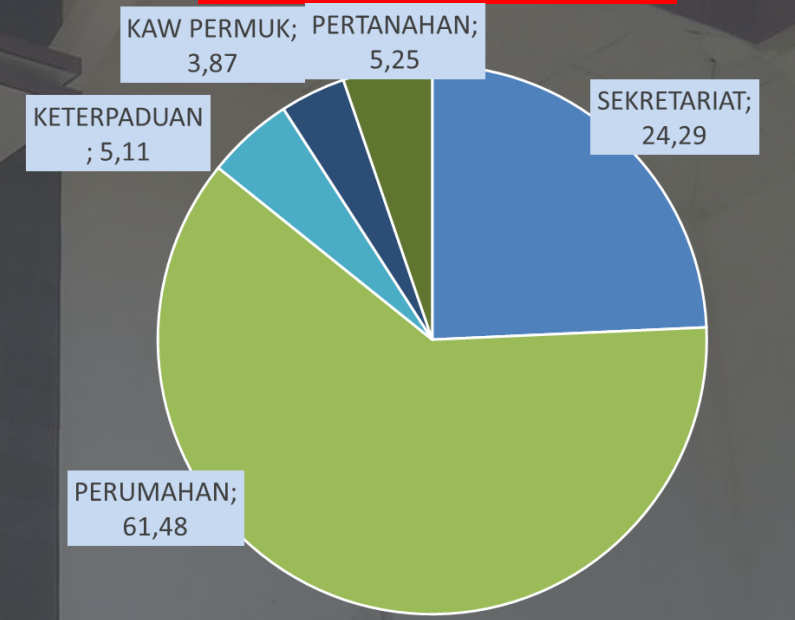

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 20,18  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.004.532.000 | 52,15  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.215.949.000  | 4,53   |
| 4     | KAW PERMUK  | 4.900.626.000  | 18,25  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.314.827.000  | 4,90   |
| TOTAL |             | 26.855.467.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 24,29  |
| 2     | PERUMAHAN   | 13.716.562.000 | 61,48  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.140.949.000  | 5,11   |
| 4     | KAW PERMUK  | 862.902.000    | 3,87   |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.171.827.000  | 5,25   |
| TOTAL |             | 22.311.773.000 | 100,00 |






# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

STATUS AKHIR AGUSTUS 2020


# DISPERAKIM

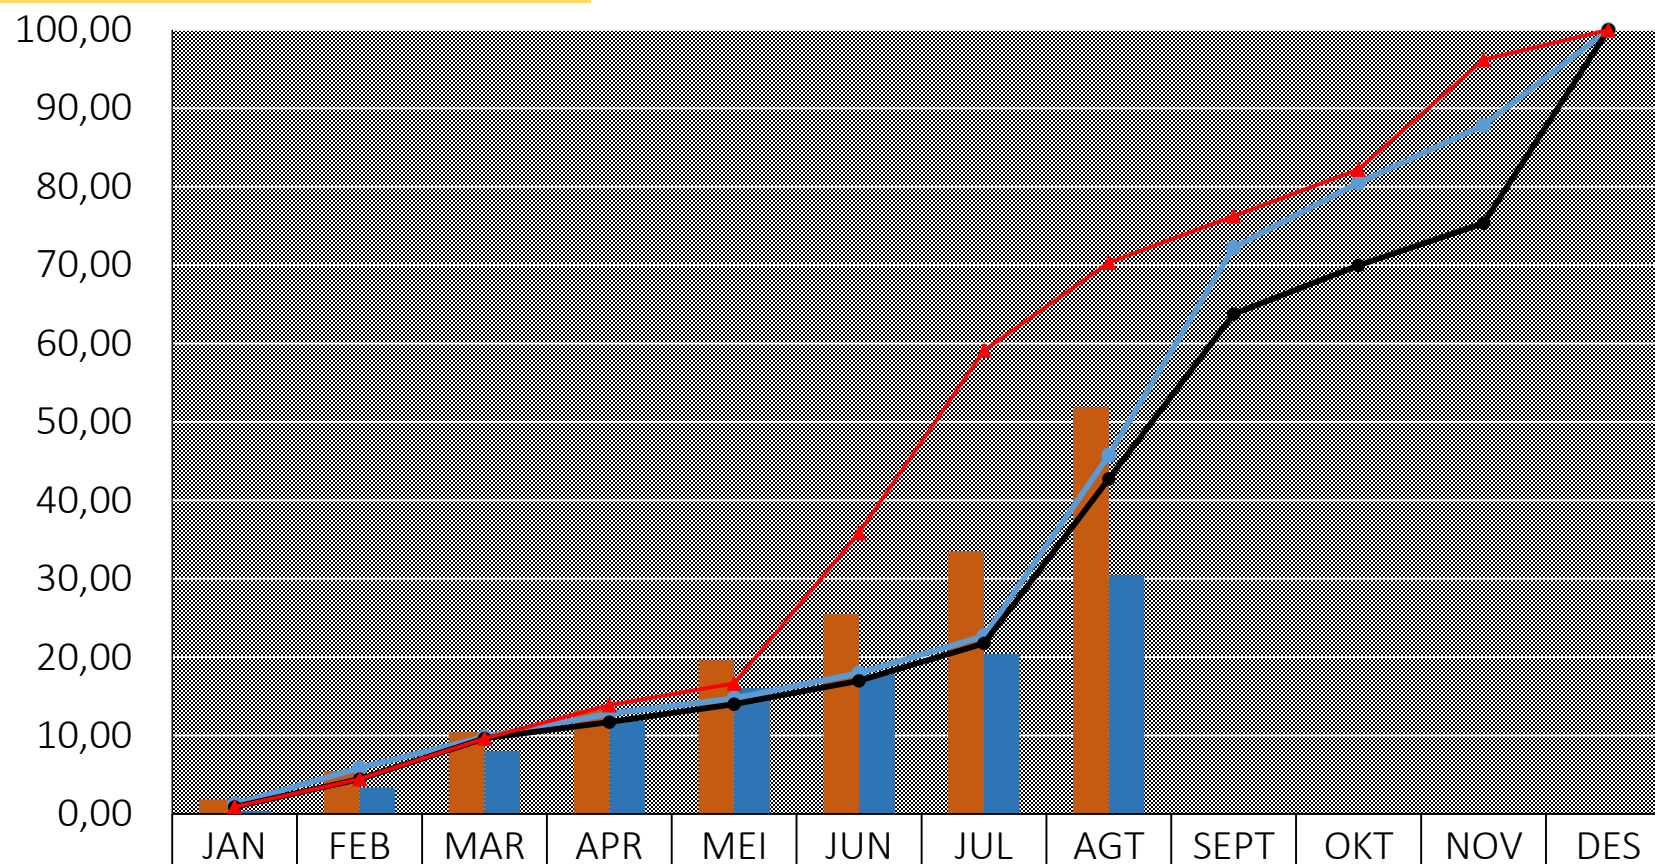

|             | Agus    | Sept  |
|-------------|---------|-------|
| Renc. Fisik | 45,73   | 72,24 |
| Real. Fisik | 51,90   |       |
| Dev. Fisik  | 6,17    |       |
| Renc. Keu   | 45,73   | 72,24 |
| Real. Keu   | 30,50   |       |
| Dev. Keu    | (15,23) |       |

|            | JAN  | FEB  | MAR   | APR   | MEI   | JUN   | JUL   | AGT   | SEPT  | OKT   | NOV   | DES   |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REAL FISIK | 1,84 | 5,46 | 10,41 | 13,23 | 19,60 | 25,46 | 33,49 | 51,90 |       |       |       |       |
| REAL KEU   | 0,36 | 3,35 | 8,05  | 11,88 | 16,04 | 17,79 | 20,40 | 30,50 |       |       |       |       |
| TF/K RAS 2 | 1,27 | 5,87 | 9,85  | 12,76 | 14,74 | 17,94 | 22,68 | 45,73 | 72,24 | 80,48 | 87,81 | 100,0 |
| TF/K RAS 1 | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 11,72 | 13,98 | 16,98 | 21,73 | 42,74 | 63,76 | 69,95 | 75,35 | 100,0 |
| TF/K AWAL  | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,0 |

# SEKRETARIAT

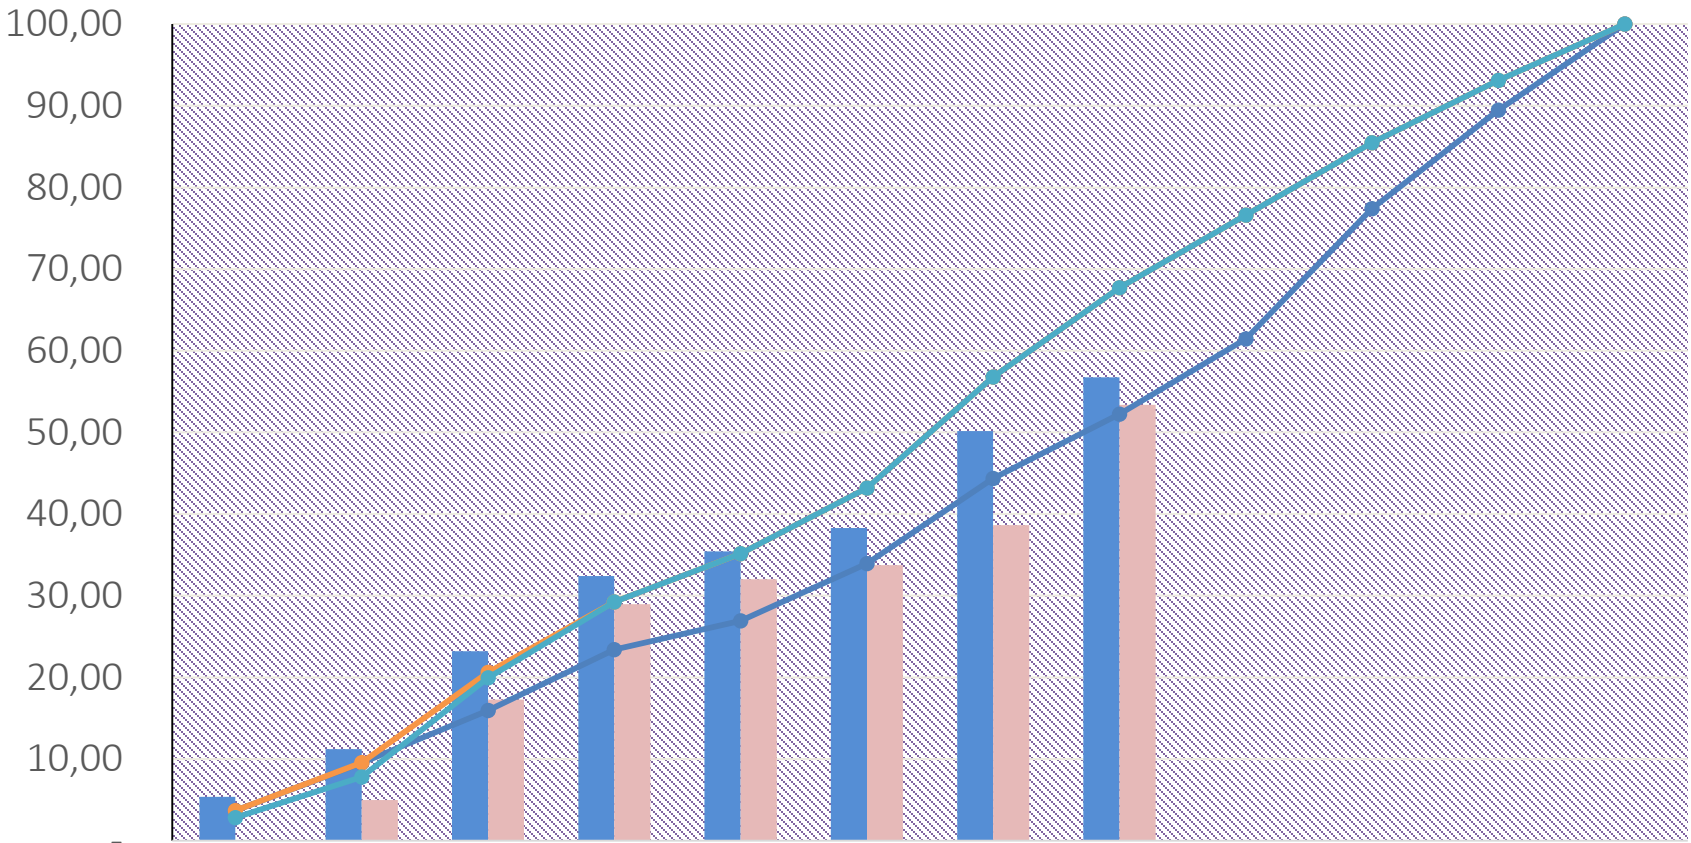


|                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK | 5,36 | 11,21 | 23,20 | 32,40 | 35,43 | 38,28 | 50,15 | 56,73 |       |       |       |        |
| REALISASI KEU   | -    | 4,96  | 17,28 | 28,94 | 32,01 | 33,75 | 38,65 | 53,39 |       |       |       |        |
| TARGET F/K-2    | 3,66 | 9,50  | 15,93 | 23,41 | 26,91 | 33,95 | 44,37 | 52,22 | 61,45 | 77,38 | 89,47 | 100,0  |
| TARGET F/K-1    | 3,66 | 9,54  | 20,59 | 29,23 | 35,15 | 43,17 | 56,78 | 67,71 | 76,63 | 85,47 | 93,12 | 100,00 |
| TARGET F/K-0    | 2,80 | 7,81  | 19,94 | 29,23 | 35,15 | 43,17 | 56,78 | 67,71 | 76,63 | 85,47 | 93,12 | 100,0  |

|             | Agus  | Sept  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 52,22 | 61,45 |
| Real. Fisik | 55,15 |       |
| Dev. Fisik  | 4,51  |       |
| Renc. Keu   | 52,22 | 61,45 |
| Real. Keu   | 53,39 |       |
| Dev. Keu    | 1,17  |       |




# PERUMAHAN

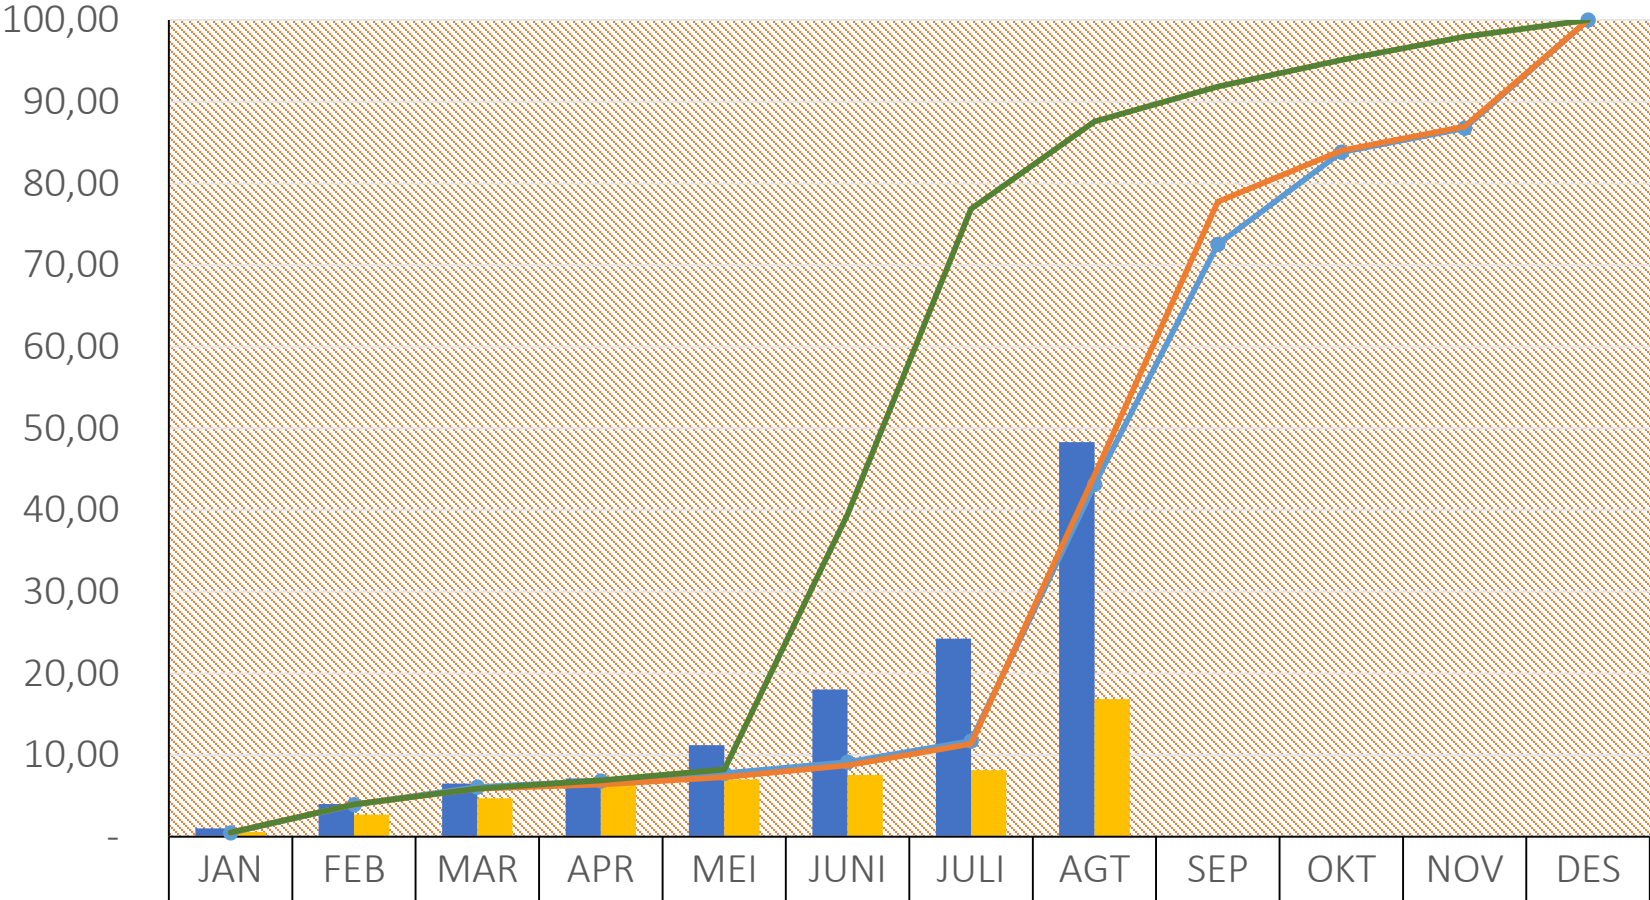

|             | Agus    | Sept  |
|-------------|---------|-------|
| Renc. Fisik | 43,16   | 72,53 |
| Real. Fisik | 48,31   |       |
| Dev. Fisik  | 5,15    |       |
| Renc. Keu   | 43,16   | 72,53 |
| Real. Keu   | 16,84   |       |
| Dev. Keu    | (26,32) |       |

|                 |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 1,01 | 3,99 | 6,49 | 7,12 | 11,22 | 18,03 | 24,26 | 48,31 |       |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 0,60 | 2,71 | 4,68 | 6,41 | 7,01  | 7,54  | 8,16  | 16,84 |       |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 0,48 | 3,91 | 6,07 | 6,82 | 7,77  | 9,11  | 11,73 | 43,16 | 72,53 | 83,81 | 86,76 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,38 | 7,30  | 8,73  | 11,36 | 44,28 | 77,76 | 84,00 | 86,97 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,88 | 8,24  | 39,46 | 76,87 | 87,58 | 91,86 | 95,11 | 97,98 | 100,0 |


# KAWASAN PERMUKIMAN

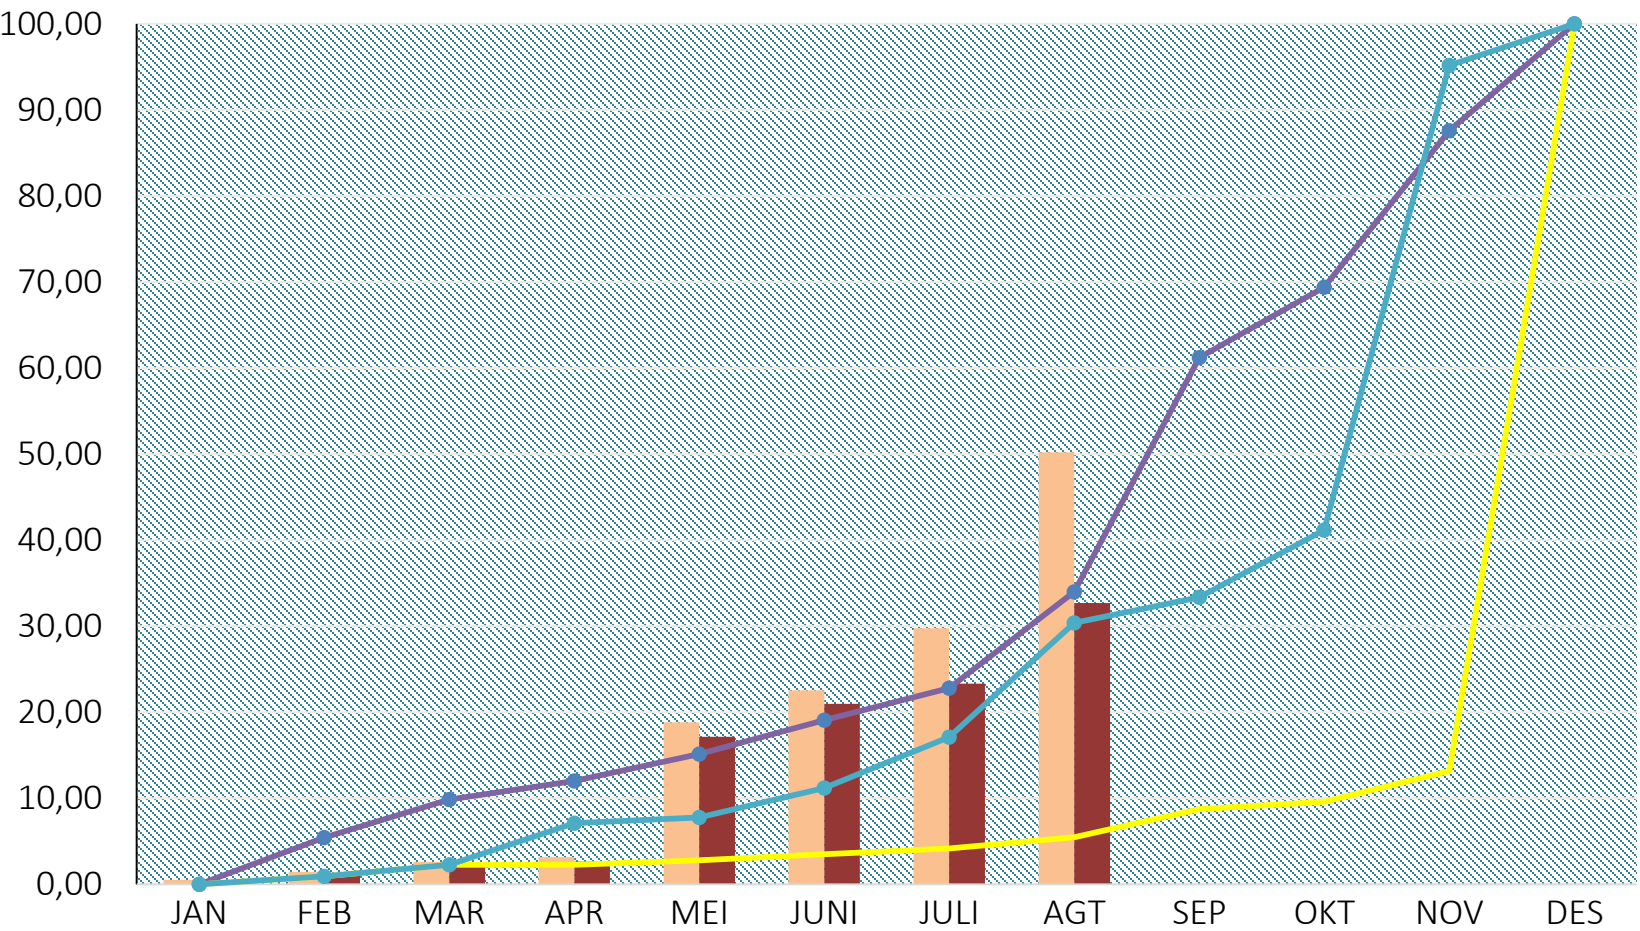

|             | Agus   | Sept  |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 33,99  | 61,21 |
| Real. Fisik | 50,21  |       |
| Dev. Fisik  | 16,22  |       |
| Renc. Keu   | 33,99  | 61,21 |
| Real. Keu   | 32,71  |       |
| Dev. Keu    | (1,28) |       |

|                 |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK | 0,54 | 1,47 | 2,61 | 3,18  | 18,81 | 22,56 | 29,75 | 50,21 |       |       |       |        |
| REALISASI KEU   | 0,00 | 1,28 | 2,11 | 2,64  | 17,14 | 20,99 | 23,31 | 32,71 |       |       |       |        |
| TARGET F/K-2    | 0,00 | 5,45 | 9,85 | 12,00 | 15,15 | 19,09 | 22,81 | 33,99 | 61,21 | 69,40 | 87,58 | 100,00 |
| TARGET F/K-1    | 0,00 | 0,94 | 2,29 | 2,27  | 2,81  | 3,50  | 4,19  | 5,47  | 8,73  | 9,61  | 13,16 | 100,00 |
| TARGET F/K-0    | 0,00 | 0,94 | 2,29 | 7,09  | 7,77  | 11,21 | 17,11 | 30,38 | 33,38 | 41,19 | 95,17 | 100,00 |


# KETERPADUAN PKPP

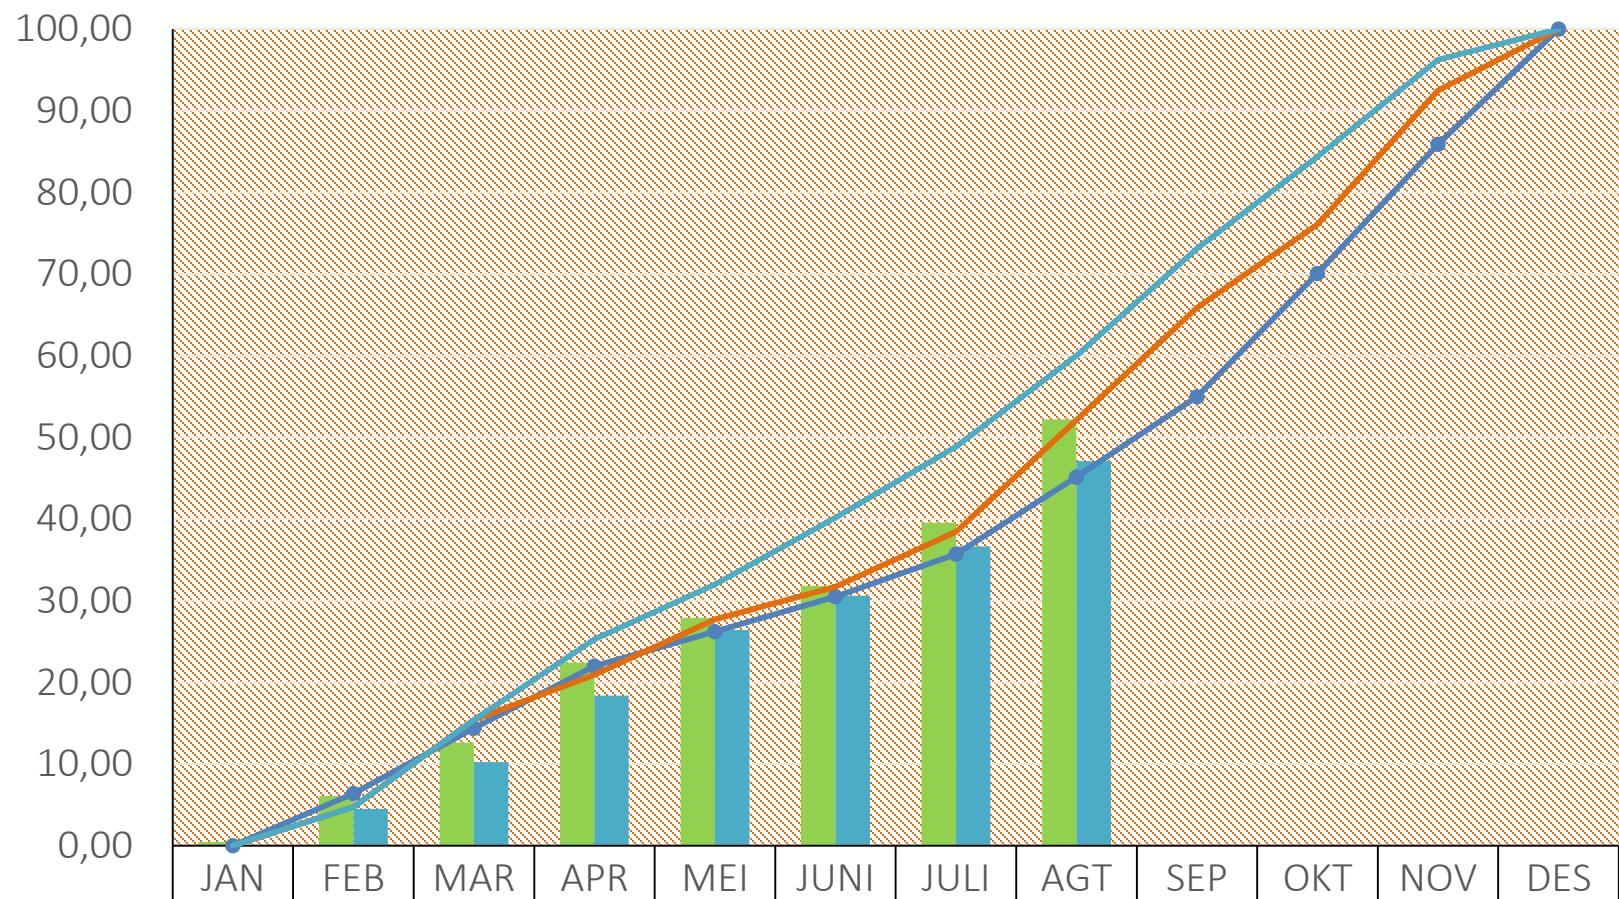

|                 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 0,48 | 6,06 | 12,60 | 22,40 | 27,90 | 31,80 | 39,54 | 52,18 |       |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 0,00 | 4,52 | 10,22 | 18,38 | 26,39 | 30,62 | 36,64 | 47,10 |       |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 0,00 | 6,38 | 14,38 | 21,98 | 26,23 | 30,48 | 35,70 | 45,13 | 54,96 | 70,07 | 85,89 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 20,94 | 27,72 | 31,71 | 38,44 | 52,10 | 65,86 | 76,06 | 92,47 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 25,26 | 31,96 | 40,15 | 48,88 | 59,98 | 73,14 | 84,37 | 96,26 | 100,0 |


|             | Agus  | Sept  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 45,13 | 54,96 |
| Real. Fisik | 52,18 |       |
| Dev. Fisik  | 7,05  |       |
| Renc. Keu   | 45,13 | 54,96 |
| Real. Keu   | 47,10 |       |
| Dev. Keu    | 1,97  |       |

# PERTANAHAN

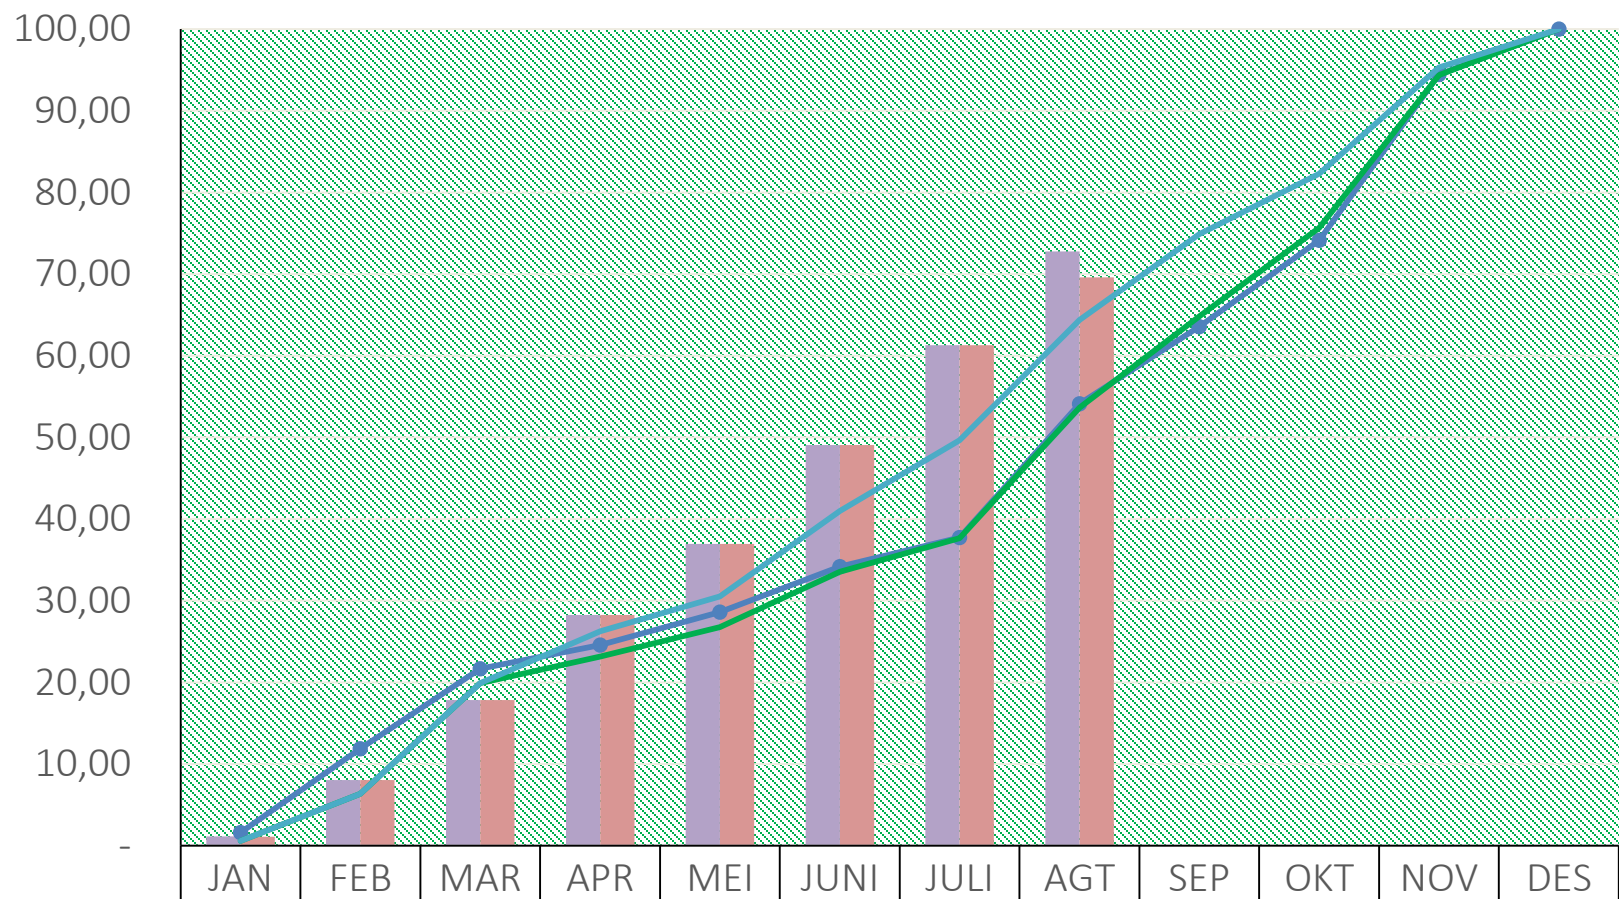

|                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 1,13 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 | 61,29 | 72,78 |       |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 1,11 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 | 61,29 | 69,58 |       |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 1,62 | 11,86 | 21,65 | 24,55 | 28,61 | 34,16 | 37,73 | 54,13 | 63,57 | 74,14 | 94,45 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,58 | 6,34  | 19,91 | 23,15 | 26,78 | 33,55 | 37,67 | 53,64 | 64,80 | 75,67 | 94,36 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,58 | 6,34  | 19,91 | 26,24 | 30,53 | 41,00 | 49,66 | 64,40 | 74,88 | 82,31 | 95,29 | 100,0 |

|             | Agus  | Sept  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 54,13 | 63,57 |
| Real. Fisik | 72,78 |       |
| Dev. Fisik  | 18,65 |       |
| Renc. Keu   | 54,13 | 63,57 |
| Real. Keu   | 69,58 |       |
| Dev. Keu    | 15,45 |       |




# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA


STATUS AKHIR AGUSTUS 2020

# REKAP PENGADAAN BARANG/JASA

**TOTAL PAKET : 303 PAKET**

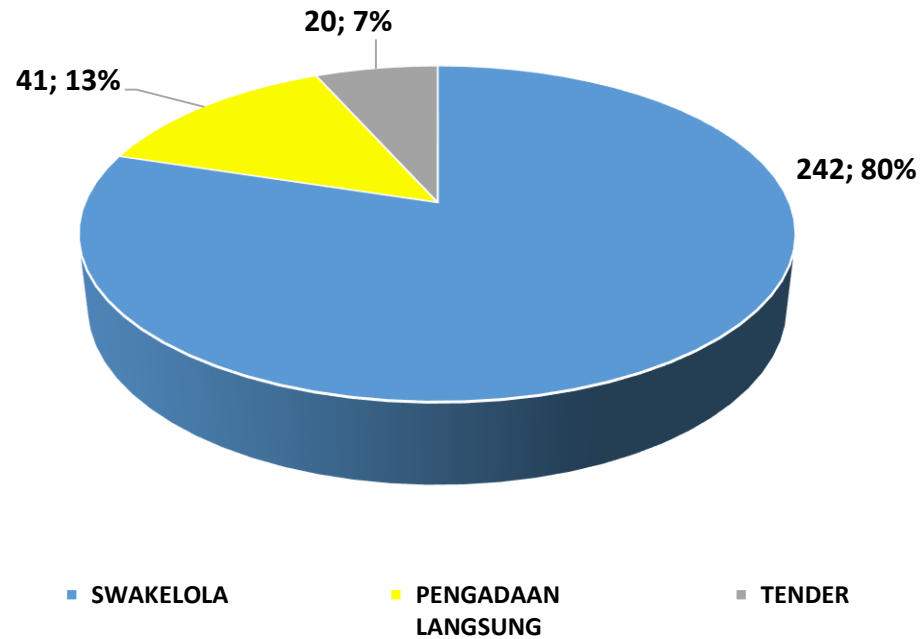


**TOTAL ANGGARAN : Rp. 22.311.773.000,-**

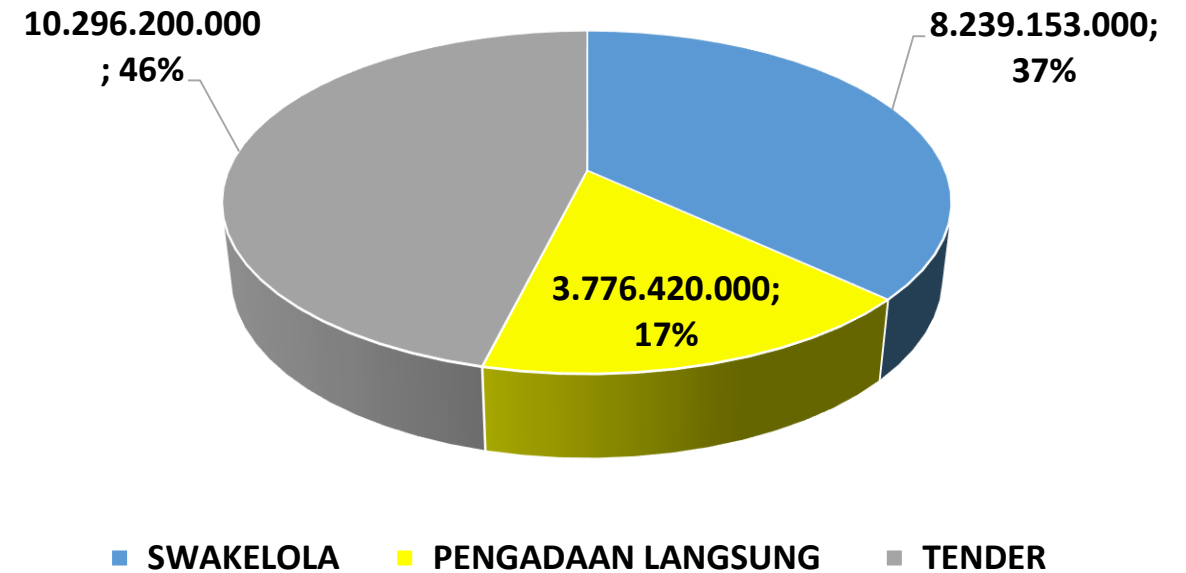

| NO | BIDANG             | PAGU                  | SWAKELOLA            |            | PENGADAAN LANGSUNG   |           | TENDER                |           | TOTAL PAKET           |            |
|----|--------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|
|    |                    |                       | Rp                   | Jml        | Rp                   | Jml       | Rp                    | Jml       | Rp                    | Jml        |
| 1  | SEKRETARIAT        | 5.419.533.000         | 3.627.773.000        | 63         | 1.115.560.000        | 13        | 676.200.000           | 2         | 5.419.533.000         | 78         |
| 2  | PERUMAHAN          | 13.716.562.000        | 2.192.562.000        | 52         | 2.064.000.000        | 16        | 9.460.000.000         | 17        | 13.716.562.000        | 85         |
| 3  | KAWASAN PERMUKIMAN | 862.902.000           | 702.902.000          | 42         | -                    | -         | 160.000.000           | 1         | 862.902.000           | 43         |
| 4  | KETERPADUAN PKPP   | 1.140.949.000         | 633.249.000          | 46         | 507.700.000          | 10        | -                     | -         | 1.140.949.000         | 56         |
| 5  | PERTANAHAN         | 1.171.827.000         | 1.106.667.000        | 39         | 89.160.000           | 2         | -                     | -         | 1.171.827.000         | 41         |
|    | <b>TOTAL</b>       | <b>22.311.773.000</b> | <b>8.239.153.000</b> | <b>242</b> | <b>3.776.420.000</b> | <b>41</b> | <b>10.296.200.000</b> | <b>20</b> | <b>22.311.773.000</b> | <b>303</b> |

# PROGRES PENGADAAN BARANG JASA

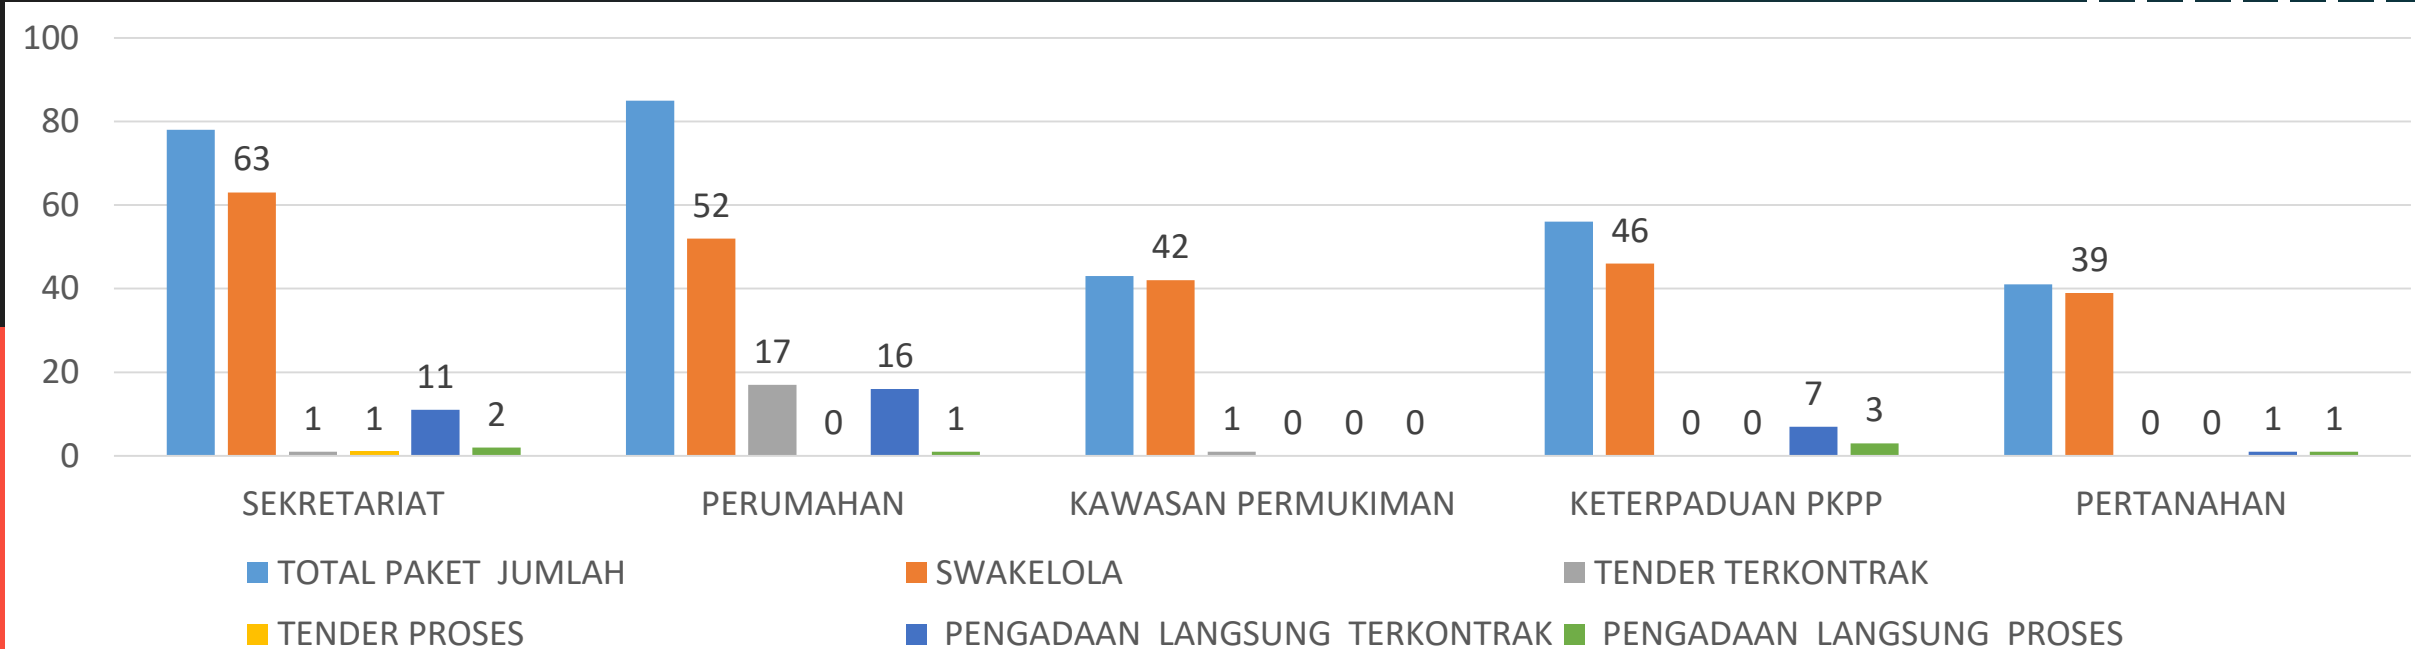

| NO          | BIDANG             | TOTAL PAKET | SWAKELOLA | TENDER     |        | PENGADAAN LANGSUNG |        |
|-------------|--------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------------------|--------|
|             |                    | JUMLAH      | JUMLAH    | TERKONTRAK | PROSES | TERKONTRAK         | PROSES |
| 1           | SEKRETARIAT        | 78          | 63        | 1          | 1      | 8                  | 5      |
| 2           | PERUMAHAN          | 85          | 52        | 17         | 0      | 15                 | 1      |
| 3           | KAWASAN PERMUKIMAN | 43          | 42        | 1          | 0      | 0                  | 0      |
| 4           | KETERPADUAN PKPP   | 56          | 46        | 0          | 0      | 7                  | 3      |
| 5           | PERTANAHAN         | 41          | 39        | 0          | 0      | 1                  | 1      |
| TOTAL PAKET |                    | 303         | 242       | 19         | 1      | 32                 | 10     |

RINGKASAN PAKET SUDAH TERKONTRAK : TENDER: 19 DARI 20 PAKET; PENGADAAN LANGSUNG: 32 DARI 41 PAKET



# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                        | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE       | PROGRES LELANG                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                                   |                     |              |                                       |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (7 bulan)                   | 271.200.000         | Tender Cepat | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Juni 2020  |
| 2                | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor                                      | 405.000.000         | Tender       | Persiapan lelang                      |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                                   |                     |              |                                       |
| 3                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan     | 525.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang      | 840.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak        | 735.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara       | 560.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 7                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati                   | 490.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 8                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes       | 840.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 13 Juli 2020 |
| 9                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemalang     | 840.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 10               |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara | 455.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 11               |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo     | 385.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 12  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung                                                                                              | 455.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 13  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen                                                                                                 | 770.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 13 Juli 2020 |
| 14  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten                                                                                                  | 420.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 13 Juli 2020 |
| 15  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen                                                                                                  | 385.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 13 Juli 2020 |
| 16  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo                                                                                               | 840.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 17  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 14 Juli 2020 |
| 18  |                                                                                                                                         | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000      | Seleksi | Sudah terkontrak 17 Juni 2020         |
| 19  |                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000      | Seleksi | Sudah terkontrak 17 Juni 2020         |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.                       | KEGIATAN                                                                  | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------|
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                           |                                      |                  |         |                               |
| 20                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Pemukiman | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 21                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 22                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 23                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 24                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 25                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 26                        |                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 160.000.000      | Seleksi | Sudah Terkontrak 20 Juli 2020 |
| 27                        | Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | -                | Seleksi | DIHENTIKAN                    |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 10 Juli 2020   |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020 |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020 |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 9 Maret 2020   |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 197.600.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 20 Juli 2020   |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       | Persiapan lelang                        |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 8   |                                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 21 Juli 2020   |
| 9   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 12  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020           |
| 13  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Belanja Sewa Hotel                                                                                        | 86.400.000       | Sudah terlaksana 6-7 Maret 2020         |

**BELUM TERKONTRAK: 5 PAKET**

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERUMAHAN**

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                 | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                              | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020 |
| 2  |                                                                                                                                          | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 15 Juli 2020        |
| 3  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 210.000.000      | Sudah terkontrak tanggal 10 Juli 2020        |
| 4  |                                                                                                                                          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru I                                                                      | 100.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 15 Juli 2020        |
| 5  |                                                                                                                                          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru II                                                                     | 100.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 15 Juli 2020        |
| 6  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      | Sudah terkontrak tanggal 3 April 2020        |
| 7  |                                                                                                                                          | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 64.800.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020   |
| 8  |                                                                                                                                          | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 31 Januari 2020     |
| 9  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan Akses Rusunawa Kota Semarang                                    | 50.000.000       | Rencana Pelaksanaan Bulan Oktober            |
| 10 |                                                                                                                                          | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 5 Agustus 2020      |
| 11 |                                                                                                                                          | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 5 Agustus 2020      |
| 12 |                                                                                                                                          | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Agustus 2020     |
| 13 |                                                                                                                                          | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Agustus 2020     |
| 14 |                                                                                                                                          | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 11 Agustus 2020     |
| 15 |                                                                                                                                          | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 11 Agustus 2020     |
| 16 |                                                                                                                                          | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 11 Agustus 2020     |

**BELUM TERKONTRAK: 1 PAKET**

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Sewa Hotel 1                                                                                                    | -                | <b>DIHENTIKAN</b>                   |
| 2   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel 2                                                                                                    | 56.700.000       | Rencana pelaksanaan bulan November  |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       | Terkontrak tanggal 21 Juli 2020     |
| 4   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Terkontrak tanggal 17 Februari 2020 |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Terkontrak Tanggal 12 Maret 2020    |
| 6   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 3 Februari 2020  |
| 7   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 |
| 8   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel Forum Pokja PKP Paket Fullboard Dalam Daerah                                                         | 5.000.000        | Akan dilaksanakan melalui zoom      |
| 9   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 |
| 10  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Belanja Sewa Hotel                                                                                                      | 30.000.000       |                                     |
| 11  |                                                                                                    | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                 | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 12 Februari 2020 |

**BELUM TERKONTRAK: 3 PAKET**

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KAW. PERMUKIMAN**

| NO. | KEGIATAN                                       | NAMA PAKET                          | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | -                | DIHENTIKAN     |
| 2   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | -                | DIHENTIKAN     |
| 3   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | -                | DIHENTIKAN     |


## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                          | NAMA PAKET                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | Sewa Hotel Paket Full board             | 24.160.000       | Pelaksanaan Bulan November.                             |
| 2   |                                                                                                   | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 65.000.000       | Tahap Pembukaan Dokumen Penawaran Status 3 Agustus 2020 |

**BELUM TERKONTRAK: 2 PAKET**



# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT



**Jumlah Laporan yang masuk pada bulan Agustus 2020 sebanyak 8 Laporan, dengan rincian :**

**a. TUNTAS DIJAWAB = 6 LAPORAN**

**b. MASIH DALAM PROSES BIDANG = 2 LAPORAN**

# Laporan Belum Tuntas:

## Mas Joko sragen 30-08-2020 08:51



Laporgub : [laporgub.jatengprov.go.id](http://laporgub.jatengprov.go.id)  
IMEI : 10.65.173.90  
Latitude : -1.0503036  
Longitude : 101.6296286  
Jenis : Infrastruktur  
Melalui : Ponsel  
Lokasi : Kabupaten/Kota : PATI  
Kecamatan : JAKENAN  
Kelurahan/Desa : JAKENAN  
Lampiran : [\(NULL\)](#)

### **Laporan**

Mohon untuk ditindak lanjuti terkait bantuan bedah rumah BSPS,kec.jakenan,khususnya kelurahan jakenan.Karena kordinator/pembimbing tidak bisa mengurus,kurang sosialisasi kepada masyarakat,bertindak sendiri tanpa ada rundingan dengan masyarakat terlebih dahulu.karna anggaran tambahan ibu mertua saya tidak cukup untuk memenuhi anggaran yang dibuat oleh kordinator,akhirnya saya disuruh mundur,dan sekarang dicabut bantuannya,padahal beliau sudah mengeluarkan uang untuk beli kekurangan matreal yang dibutuhkan,sekarang matreal yang beli sendiri sudah datang,yang dari pemerintah malah dicabut,saya tidak terima ibu mertua saya dipermainkan seperti ini,kalo memang dihentikan bantuannya,kenapa tidak dari dulu sebelum beliau membeli matreal.bantuan a/n bu muah dicabut pada hari Kamis 27 kemarin,dan saya cek nik beliau masih terdaftar,tetapi dilapangan bantuan tersebut sudah dialihkan keorang lain.mohon ditindak lanjuti masalah ini,karna kesannya pemerintah bukan membantu tapi malah menyulitkan gara-gara petugas yang tidak benar cara kerjanya. terima kasih


# Laporan Belum Tuntas: Jokolelono 29-08-2020 23:35

Laporgub : [laporgub.jatengprov.go.id](http://laporgub.jatengprov.go.id)  
IP : 120.188.77.121  
Latitude :  
Longitude :  
Jenis : Non Infrastruktur  
Melalui : Web  
Lokasi : Kabupaten/Kota : PATI  
Kecamatan : JAKENAN  
Kelurahan/Desa : JAKENAN  
Lampiran : Tidak ada.


## **Laporan**

Dukuh Ngalapan rt08/rw 01 kel.jakenan,kec.jakenan.kab.pati.Saya jokolelono dan ibu mertua saya Muah.ibu muah dapat bantuan BSPS(bedah rumah)awalnya progam berjalan,sampai akhirnya hari Kamis kemarin bantuan itu dihentikan,dikarnakan katanya bu muah tidak mengikuti aturan,gara gara membangun rumah memakai batu bata herbel,padahal dari pertama pertemuan hingga progam ini terealisasi tidak ada omongan bila ada aturan aturan yang harus dipatuhi,sekarang bu muah sudah jual ternak buat tambah beli matreal,dan sebagian matreal sudah dibelinya,malah bantuannya dicabut,dan bu muah tidak bisa melanjutkan pembangunan rumahnya,mohon untuk ditindak lanjuti untuk masalah ini.terima kasih

# LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




# LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS

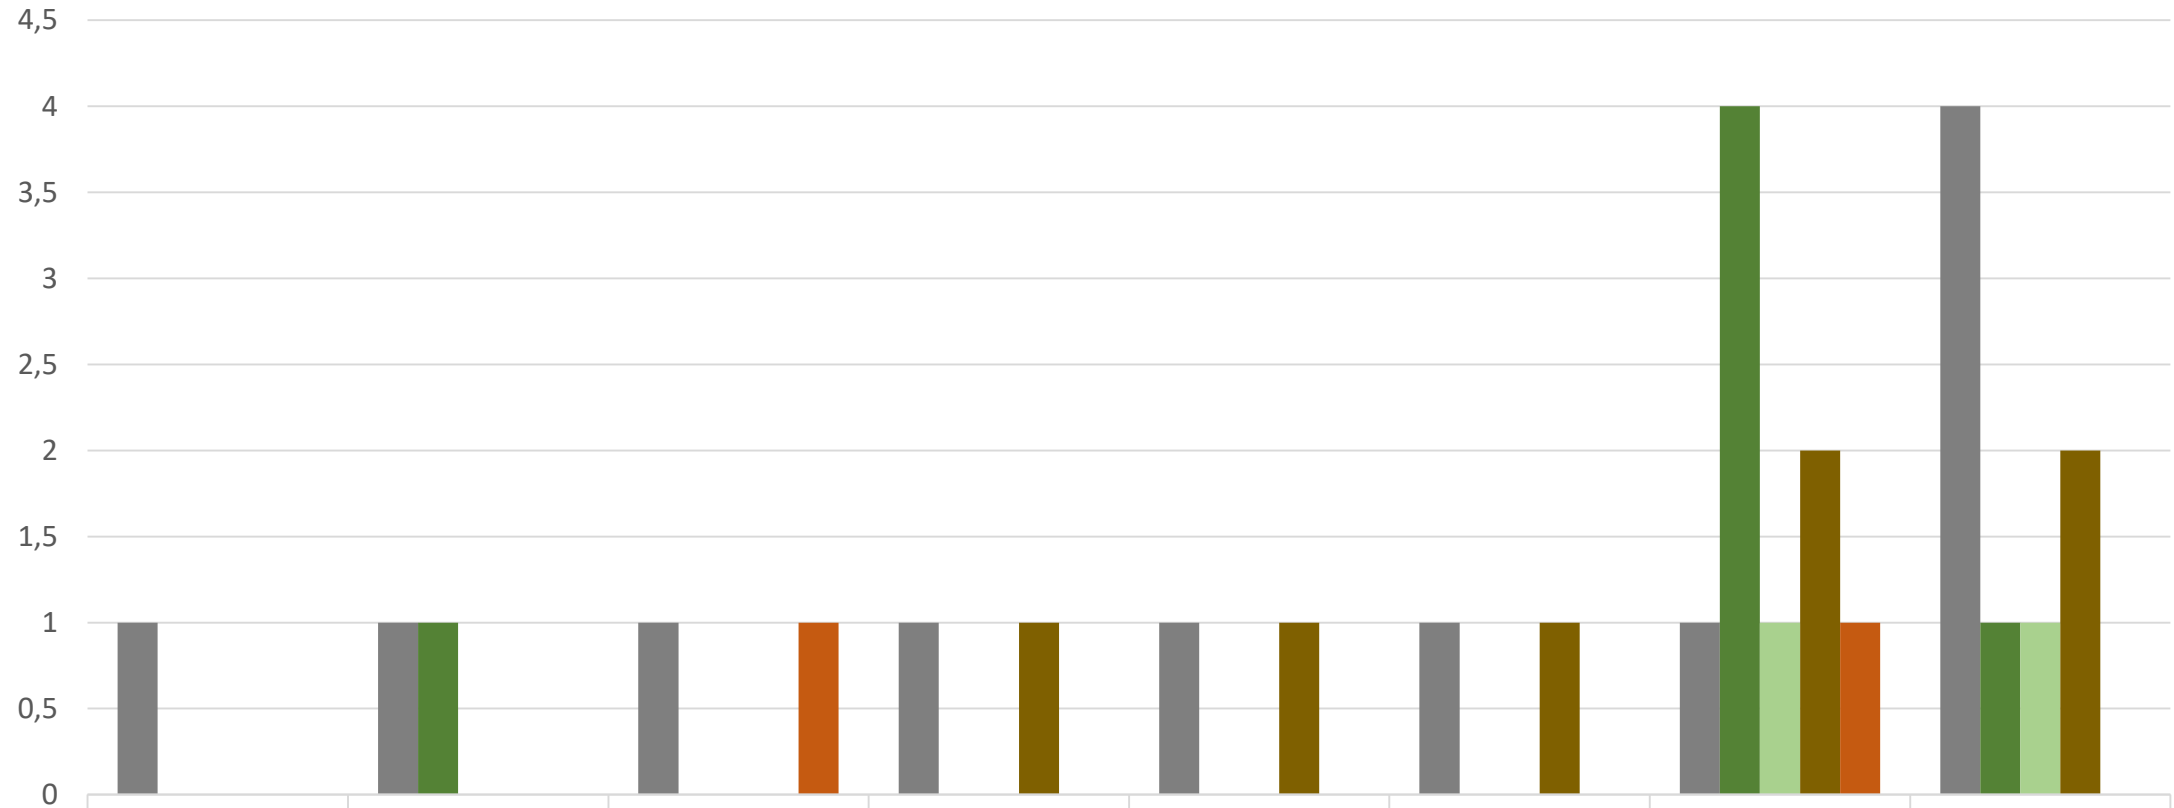

|               | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGST |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ■ Sekretariat | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 4    |
| ■ Perumahan   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 1    |
| ■ Kawasan     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1    |
| ■ Keterpaduan | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2    |
| ■ Pertanian   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0    |

# LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS



# PENEKANAN APBD

1. Setiap pejabat struktural yang dilantik tanggal 7 Agustus 2020 harus menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2020 dengan target kinerja sesuai dengan DPA 2020 (murni), dikarenakan DPPA 2020 belum disahkan. Dikumpulkan ke subbag program paling lambat **Jum'at, 11 September 2020** dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Format hardcopy dicetak pada kertas A4 yang sudah ditandatangani tertanggal **Senin, 10 Agustus 2020** sebanyak 2 (dua) rangkap (1 rangkap dikumpulkan ke subbag program dan 1 rangkap sebagai arsip ybs).
2. Setiap karyawan Disperakim diharap segera menandatangani daftar penerimaan gaji yang ada di Subbag Keuangan setelah menerima gaji yang telah ditransfer ke rekening masing-masing.
3. Untuk Sekretariat/Bidang di lingkungan Disperakim yang membutuhkan buku teknis/peraturan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, segera diinventarisasi (judul, pengarang, penerbit) dan disampaikan ke Subbag Keuangan, ditunggu s.d. hari Rabu, tanggal 9 September 2020.
4. Untuk ketertiban administrasi laporan pertanggungjawaban pengeluaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada di lingkungan Disperakim segera mengumpulkan SPJ (lampiran bukti pengeluaran) s.d. bulan Agustus 2020 ke Subbag Keuangan maksimal pada saat pengajuan SPP GU/TU.




**APBN**



# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

## PAGU – Rp 489.155.168.000

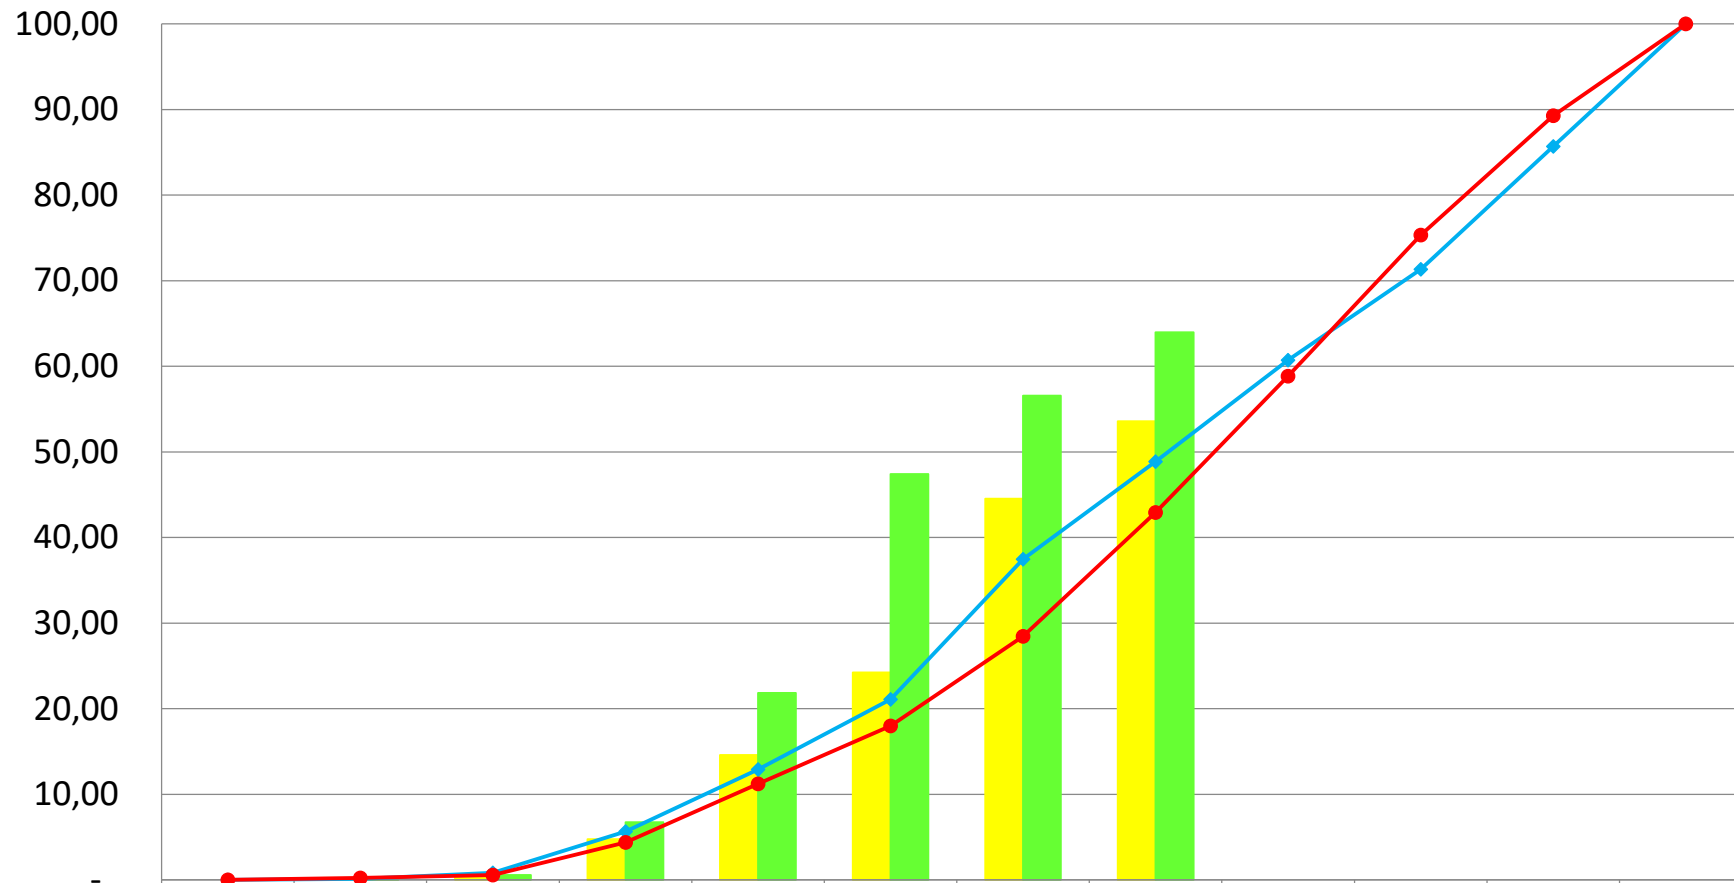


|             | Agus  | Sept  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 48,86 | 60,70 |
| Real. Fisik | 53,59 |       |
| Dev. Fisik  | 4,73  |       |
| Renc. Keu   | 42,90 | 58,83 |
| Real. Keu   | 63,98 |       |
| Dev. Keu    | 21,08 |       |

|    | JAN | FEB  | MAR  | APR  | MEI   | JUN   | JUL   | AGU   | SEP   | OKT   | NOV   | DES    |
|----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RF | -   | 0,22 | 0,55 | 4,76 | 14,60 | 24,22 | 44,53 | 53,59 |       |       |       |        |
| RK | -   | 0,13 | 0,56 | 6,73 | 21,85 | 47,40 | 56,56 | 63,98 |       |       |       |        |
| TF | -   | 0,12 | 0,83 | 5,65 | 12,90 | 21,09 | 37,47 | 48,86 | 60,70 | 71,31 | 85,68 | 100,00 |
| TK | -   | 0,21 | 0,57 | 4,38 | 11,20 | 17,97 | 28,47 | 42,90 | 58,83 | 75,32 | 89,29 | 100,00 |

# BPPW JATENG

## PAGU – Rp 1.063.678.321

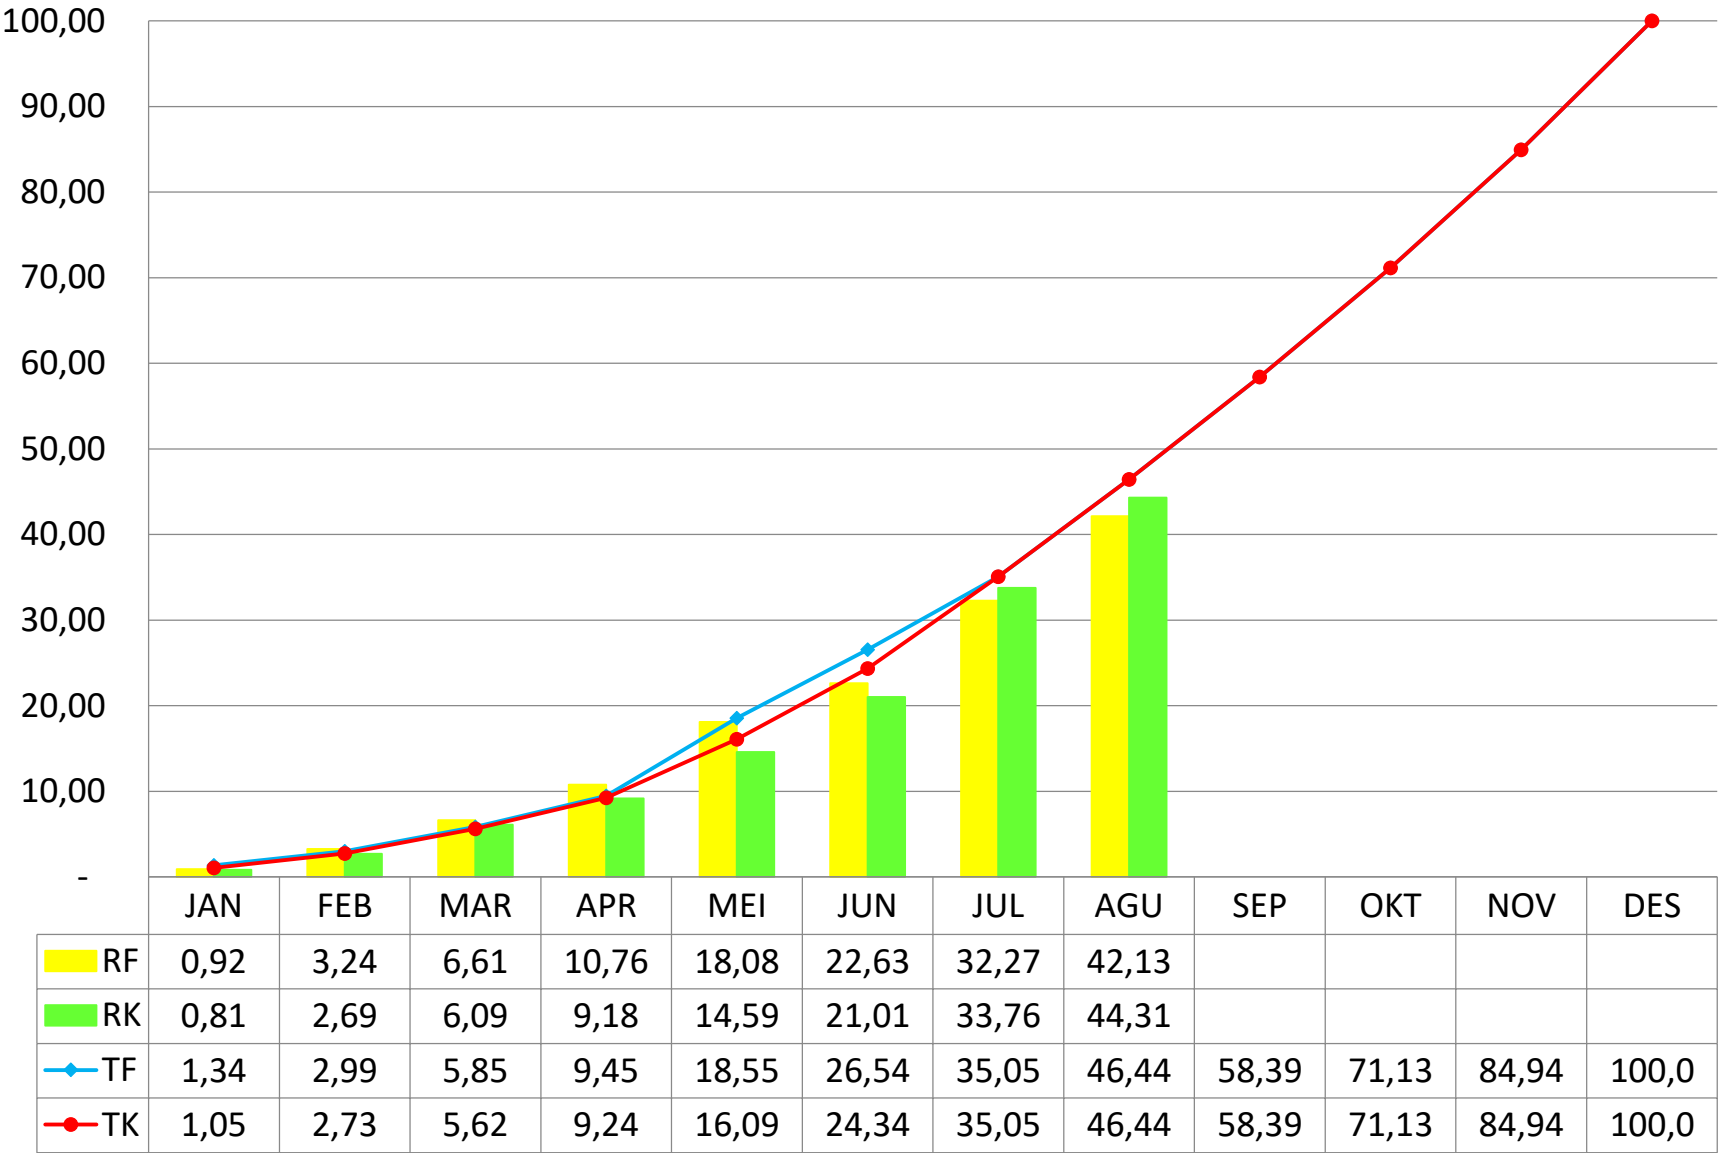

|             | Agus   | Sept  |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 46,44  | 58,39 |
| Real. Fisik | 42,13  |       |
| Dev. Fisik  | (4,31) |       |
| Renc. Keu   | 46,44  | 58,39 |
| Real. Keu   | 44,31  |       |
| Dev. Keu    | (2,13) |       |

A solid red square is positioned on the left side of the image. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**

# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JULI 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH






# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PENEKANAN APBD
7. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN


# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020

## PAGU AWAL

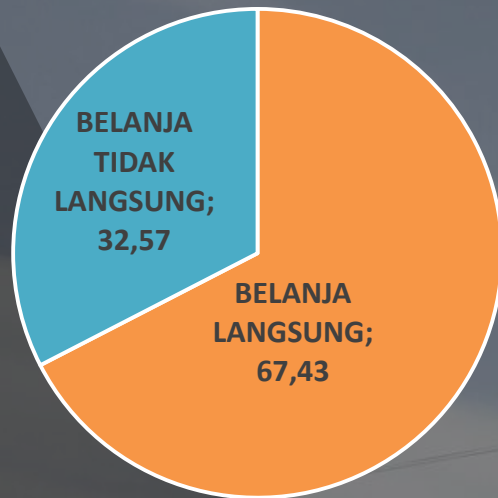


| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>44.612.807.000</b> |

## PAGU RASIONALISASI TAHAP 1

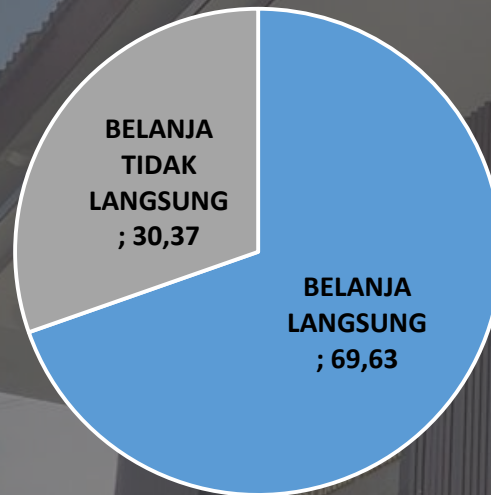

| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 26.855.467.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>38.567.858.000</b> |

## PAGU RASIONALISASI TAHAP 2

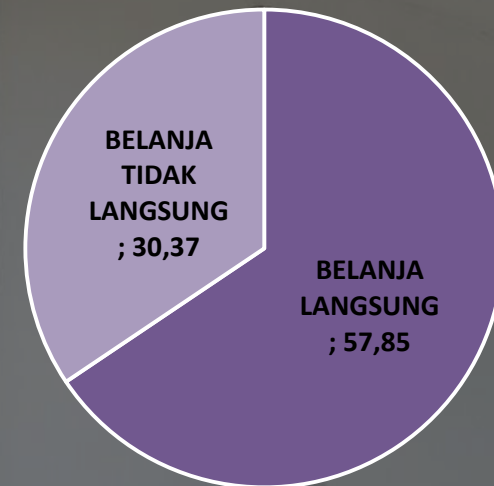


| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 22.311.773.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>34.024.164.000</b> |




# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020


**PAGU AWAL**

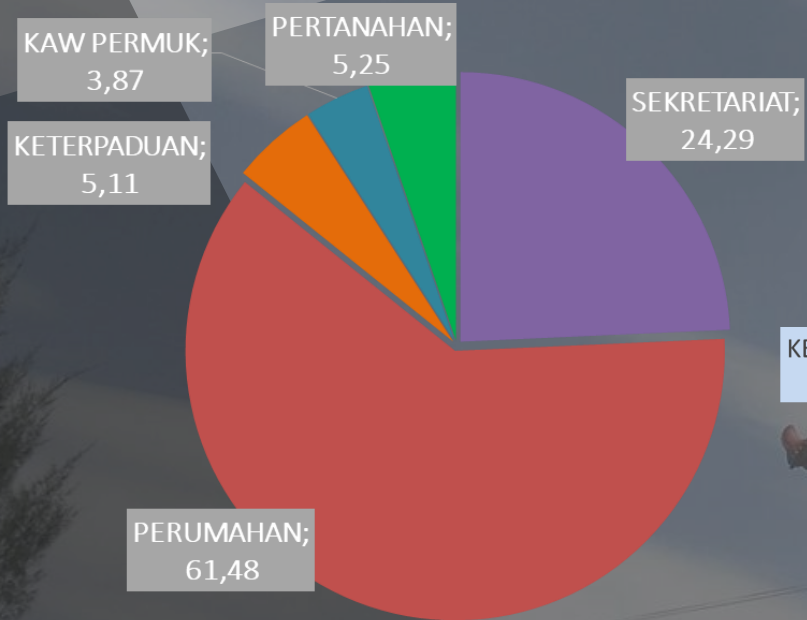

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 1**

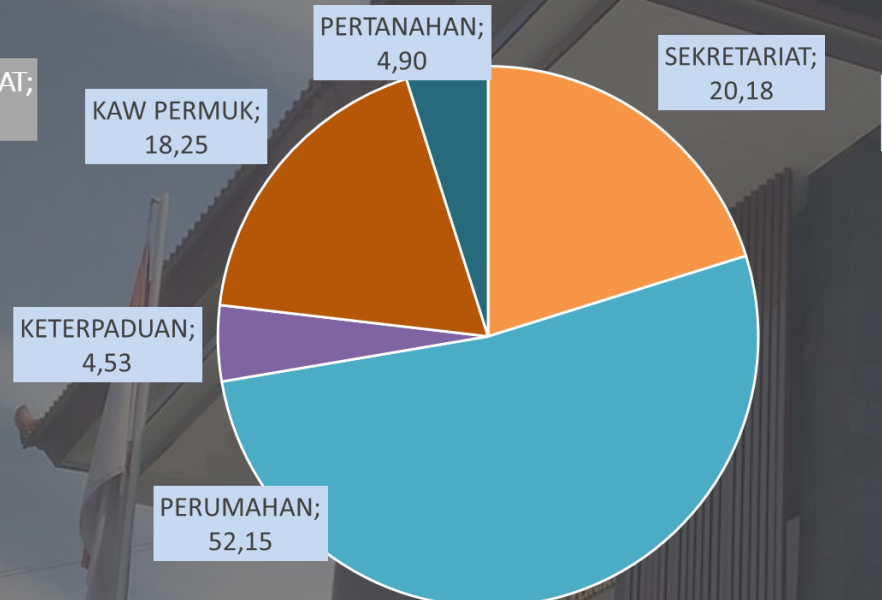

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 2**

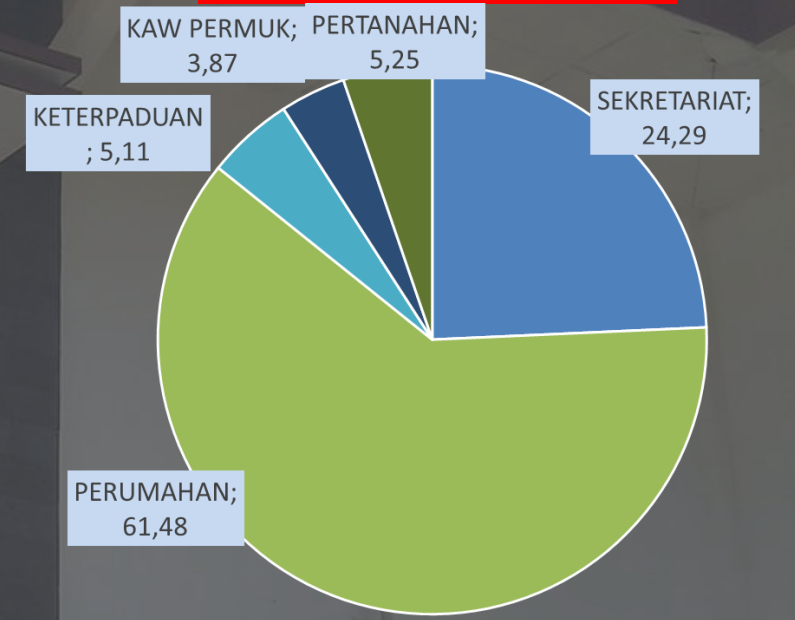

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 20,18  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.004.532.000 | 52,15  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.215.949.000  | 4,53   |
| 4     | KAW PERMUK  | 4.900.626.000  | 18,25  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.314.827.000  | 4,90   |
| TOTAL |             | 26.855.467.000 | 100,00 |


| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 24,29  |
| 2     | PERUMAHAN   | 13.716.562.000 | 61,48  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.140.949.000  | 5,11   |
| 4     | KAW PERMUK  | 862.902.000    | 3,87   |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.171.827.000  | 5,25   |
| TOTAL |             | 22.311.773.000 | 100,00 |



# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

STATUS AKHIR JULI 2020


# DISPERAKIM

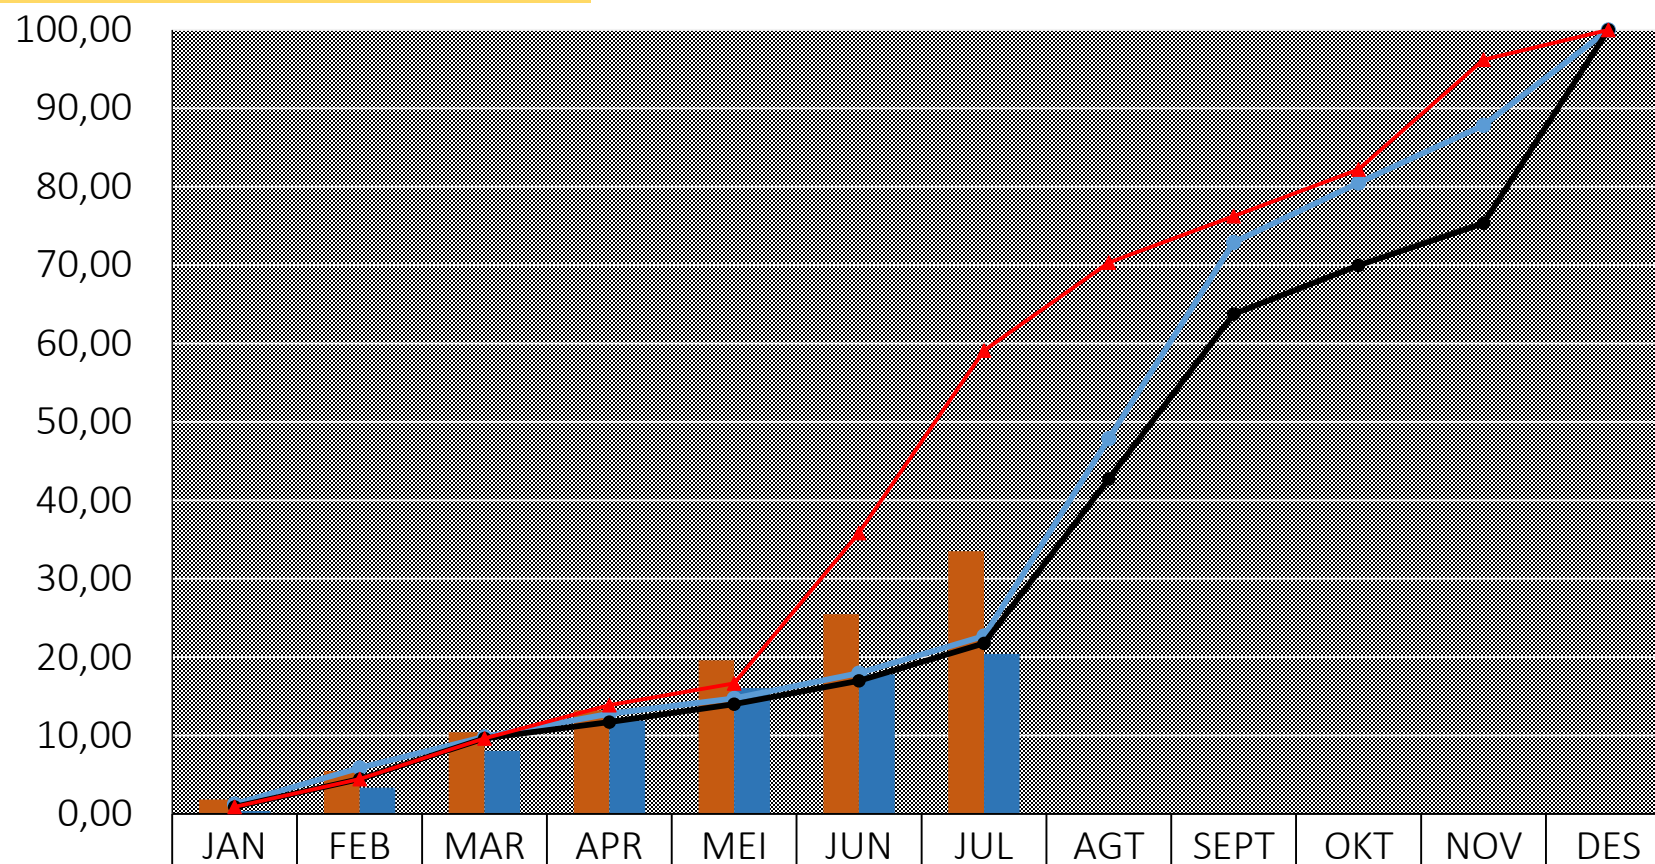

|            |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REAL FISIK | 1,84 | 5,46 | 10,41 | 13,23 | 19,60 | 25,46 | 33,49 |       |       |       |       |       |
| REAL KEU   | 0,36 | 3,35 | 8,05  | 11,88 | 16,04 | 17,79 | 20,40 |       |       |       |       |       |
| TF/K RAS 2 | 1,27 | 5,87 | 9,85  | 12,76 | 14,74 | 17,94 | 22,68 | 47,87 | 72,87 | 80,48 | 87,81 | 100,0 |
| TF/K RAS 1 | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 11,72 | 13,98 | 16,98 | 21,73 | 42,74 | 63,76 | 69,95 | 75,35 | 100,0 |
| TF/K AWAL  | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,0 |

|             | Juli   | Agus  |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 22,68  | 47,87 |
| Real. Fisik | 33,49  |       |
| Dev. Fisik  | 10,81  |       |
| Renc. Keu   | 22,68  | 47,87 |
| Real. Keu   | 20,40  |       |
| Dev. Keu    | (2,28) |       |


# SEKRETARIAT

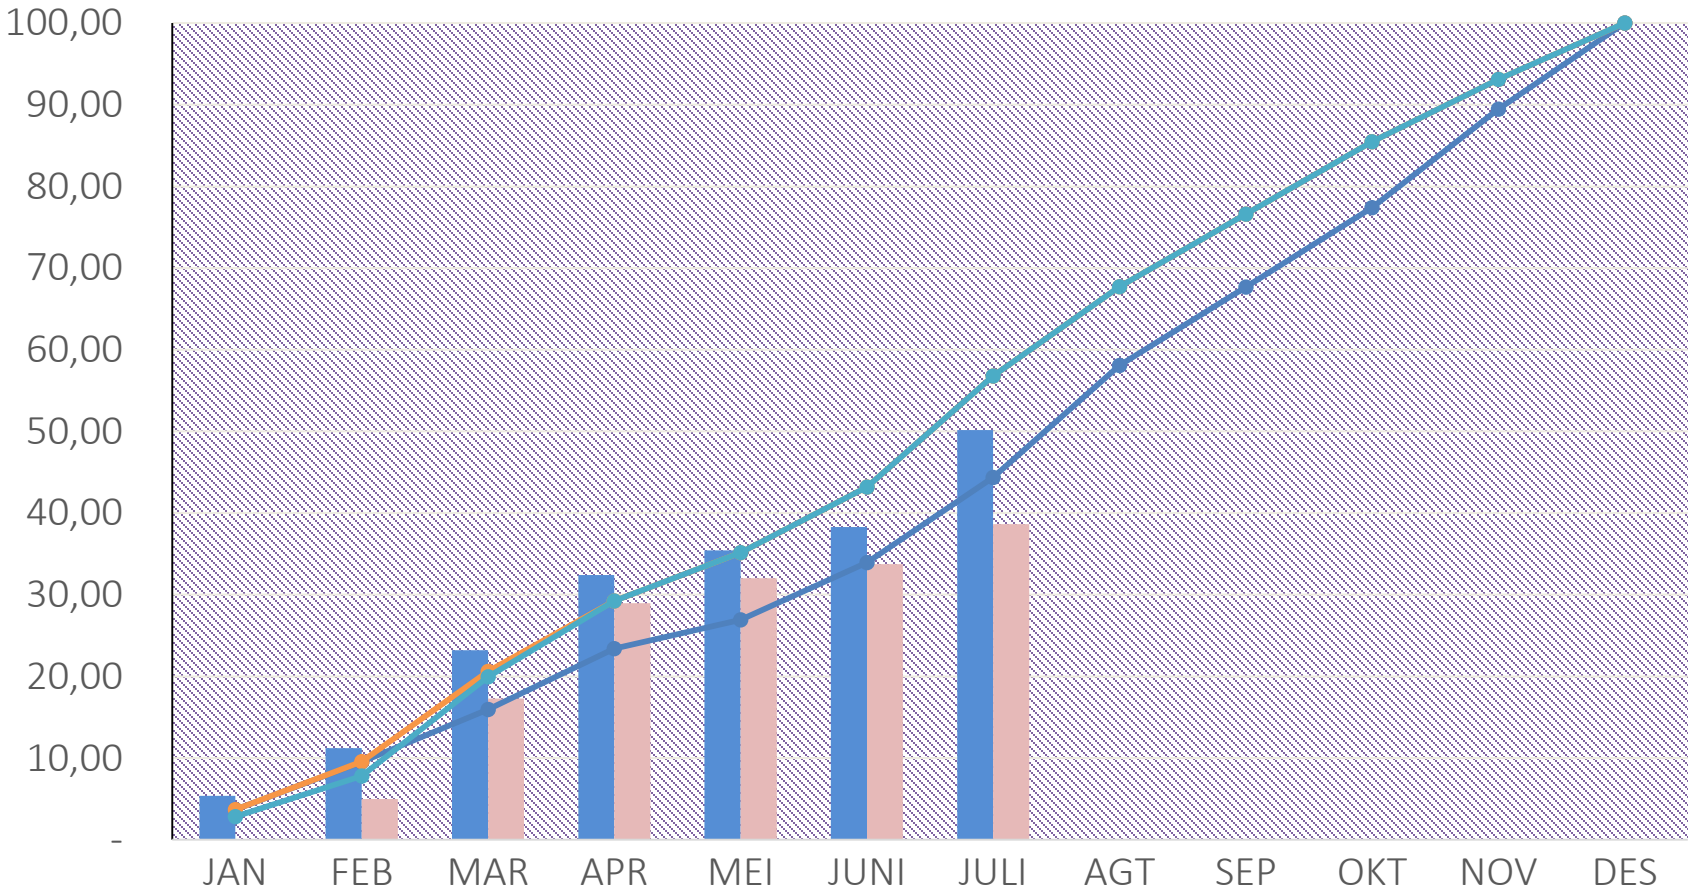

|                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK | 5,36 | 11,21 | 23,20 | 32,40 | 35,43 | 38,28 | 50,15 |       |       |       |       |        |
| REALISASI KEU   | -    | 4,96  | 17,28 | 28,94 | 32,01 | 33,75 | 38,65 |       |       |       |       |        |
| TARGET F/K-2    | 3,66 | 9,50  | 15,93 | 23,41 | 26,91 | 33,95 | 44,37 | 58,06 | 67,67 | 77,38 | 89,47 | 100,0  |
| TARGET F/K-1    | 3,66 | 9,54  | 20,59 | 29,23 | 35,15 | 43,17 | 56,78 | 67,71 | 76,63 | 85,47 | 93,12 | 100,00 |
| TARGET F/K-0    | 2,80 | 7,81  | 19,94 | 29,23 | 35,15 | 43,17 | 56,78 | 67,71 | 76,63 | 85,47 | 93,12 | 100,0  |

|             | Juli   | Agus  |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 44,37  | 58,06 |
| Real. Fisik | 50,15  |       |
| Dev. Fisik  | 5,78   |       |
| Renc. Keu   | 44,37  | 58,06 |
| Real. Keu   | 38,65  |       |
| Dev. Keu    | (5,72) |       |

# PERUMAHAN

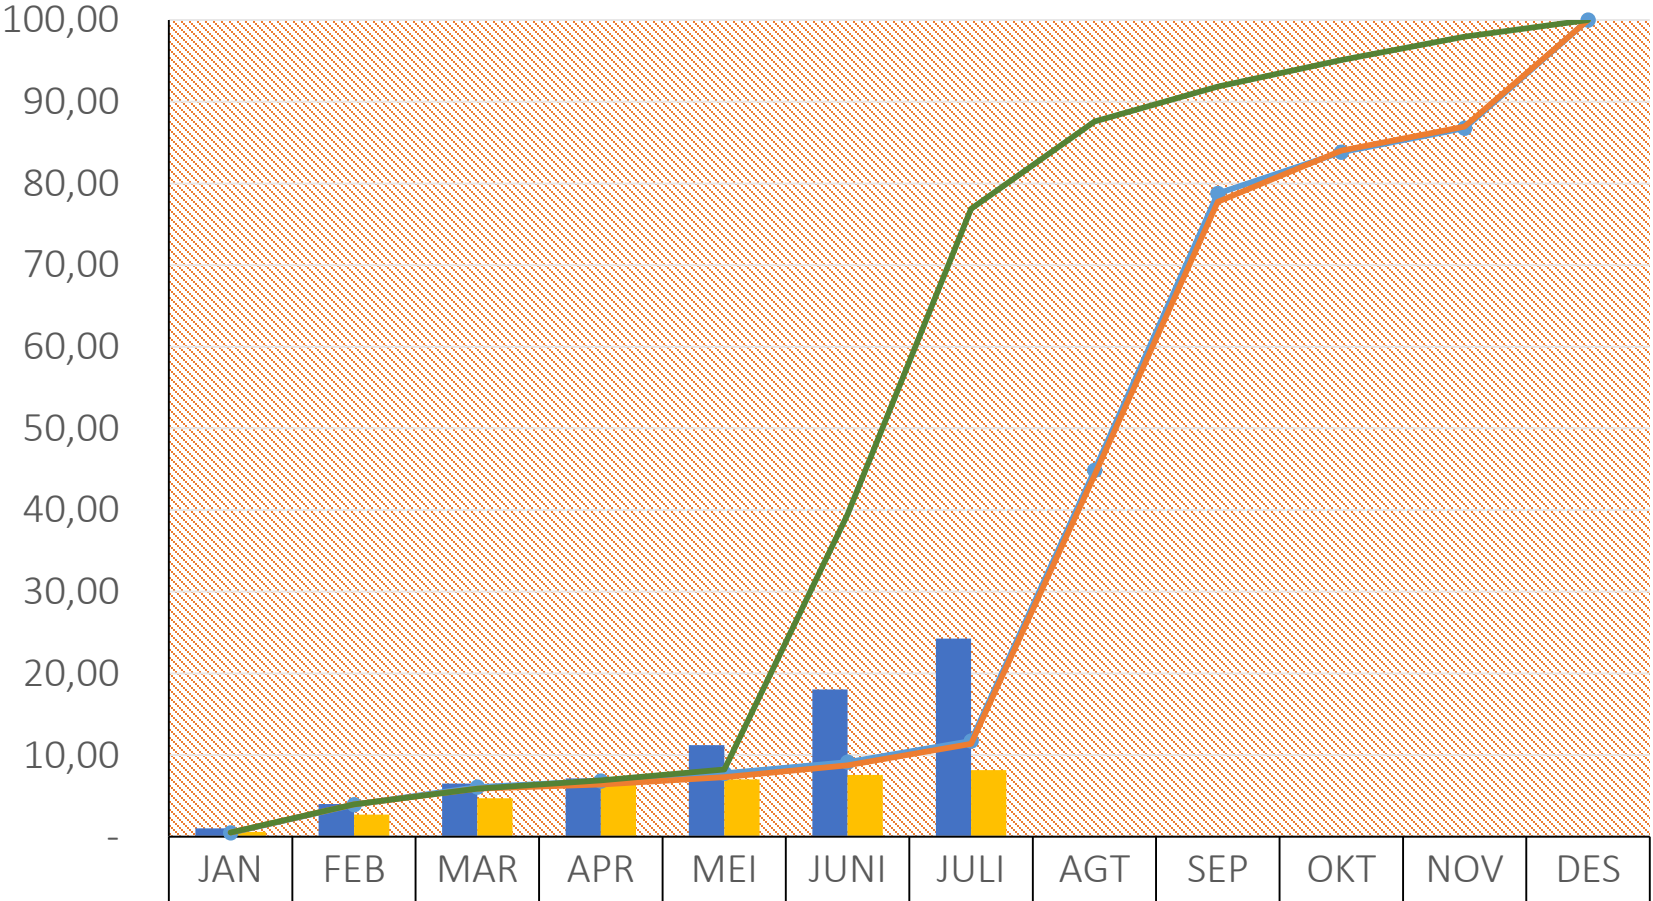


|             | Juli   | Agus  |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 11,73  | 44,86 |
| Real. Fisik | 24,26  |       |
| Dev. Fisik  | 12,53  |       |
| Renc. Keu   | 11,73  | 44,86 |
| Real. Keu   | 8,16   |       |
| Dev. Keu    | (3,57) |       |

|                   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ REALISASI FISIK | 1,01 | 3,99 | 6,49 | 7,12 | 11,22 | 18,03 | 24,26 |       |       |       |       |       |
| ■ REALISASI KEU   | 0,60 | 2,71 | 4,68 | 6,41 | 7,01  | 7,54  | 8,16  |       |       |       |       |       |
| ● TARGET F/K-2    | 0,48 | 3,91 | 6,07 | 6,82 | 7,77  | 9,11  | 11,73 | 44,86 | 78,78 | 83,81 | 86,76 | 100,0 |
| — TARGET F/K-1    | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,38 | 7,30  | 8,73  | 11,36 | 44,28 | 77,76 | 84,00 | 86,97 | 100,0 |
| — TARGET F/K-0    | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,88 | 8,24  | 39,46 | 76,87 | 87,58 | 91,86 | 95,11 | 97,98 | 100,0 |




# KAWASAN PERMUKIMAN

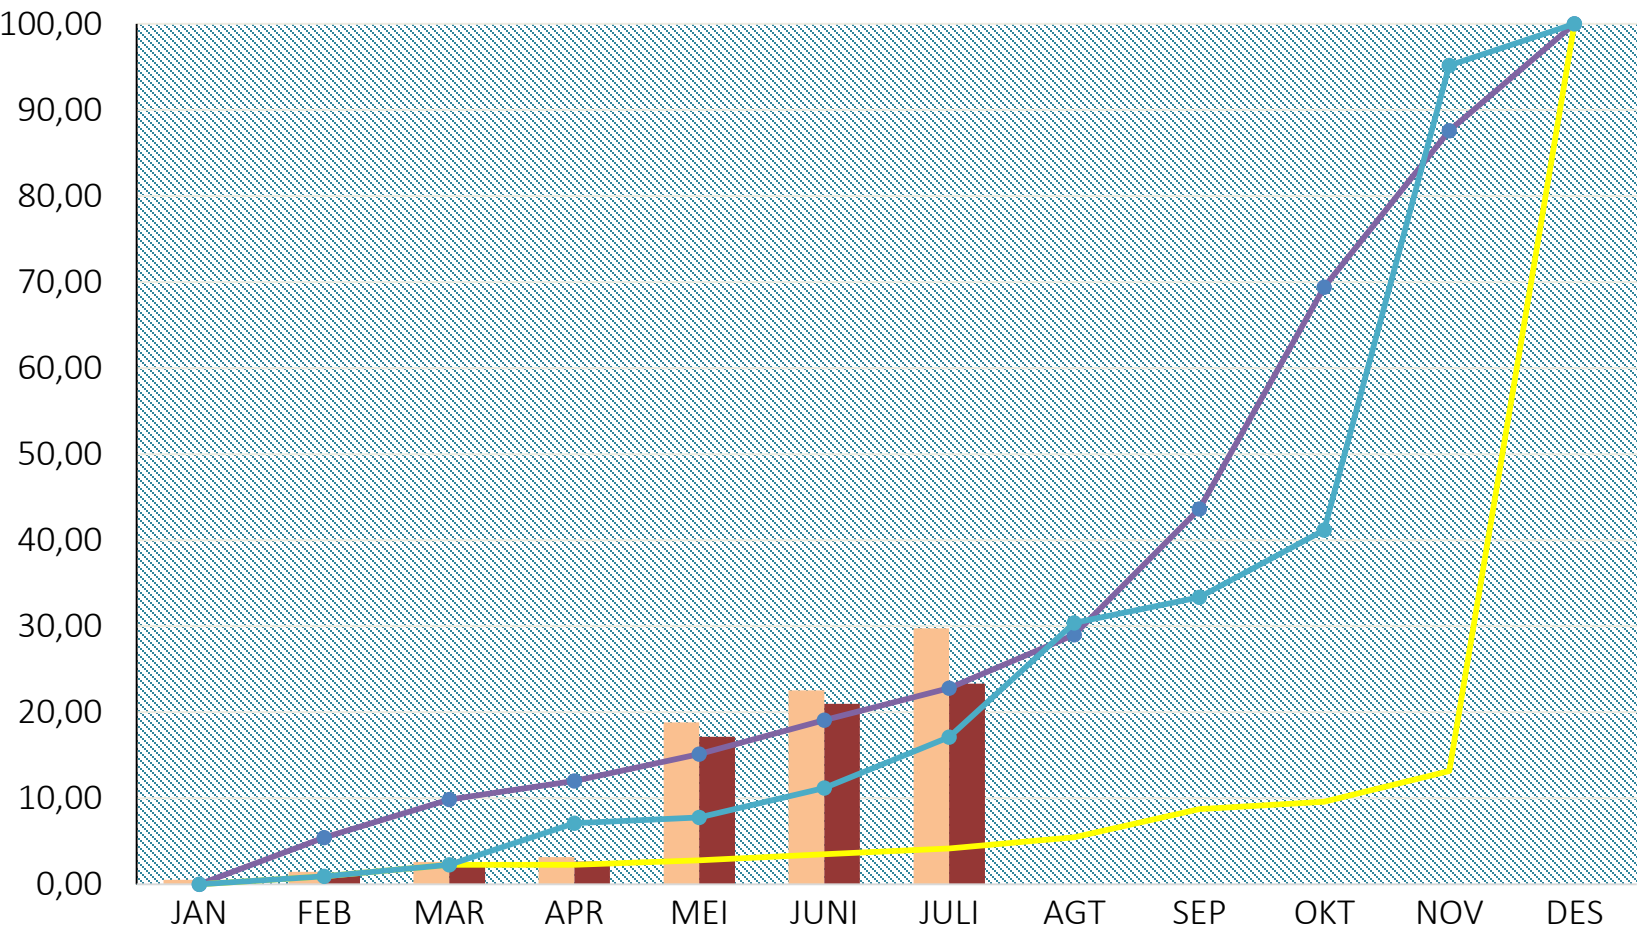

|             | Juli  | Agus  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 22,81 | 29,01 |
| Real. Fisik | 29,75 |       |
| Dev. Fisik  | 6,94  |       |
| Renc. Keu   | 22,81 | 29,01 |
| Real. Keu   | 23,31 |       |
| Dev. Keu    | 0,50  |       |

|                 |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK | 0,54 | 1,47 | 2,61 | 3,18  | 18,81 | 22,56 | 29,75 |       |       |       |       |        |
| REALISASI KEU   | 0,00 | 1,28 | 2,11 | 2,64  | 17,14 | 20,99 | 23,31 |       |       |       |       |        |
| TARGET F/K-2    | 0,00 | 5,45 | 9,85 | 12,00 | 15,15 | 19,09 | 22,81 | 29,01 | 43,64 | 69,40 | 87,58 | 100,00 |
| TARGET F/K-1    | 0,00 | 0,94 | 2,29 | 2,27  | 2,81  | 3,50  | 4,19  | 5,47  | 8,73  | 9,61  | 13,16 | 100,00 |
| TARGET F/K-0    | 0,00 | 0,94 | 2,29 | 7,09  | 7,77  | 11,21 | 17,11 | 30,38 | 33,38 | 41,19 | 95,17 | 100,00 |

# KETERPADUAN PKPP

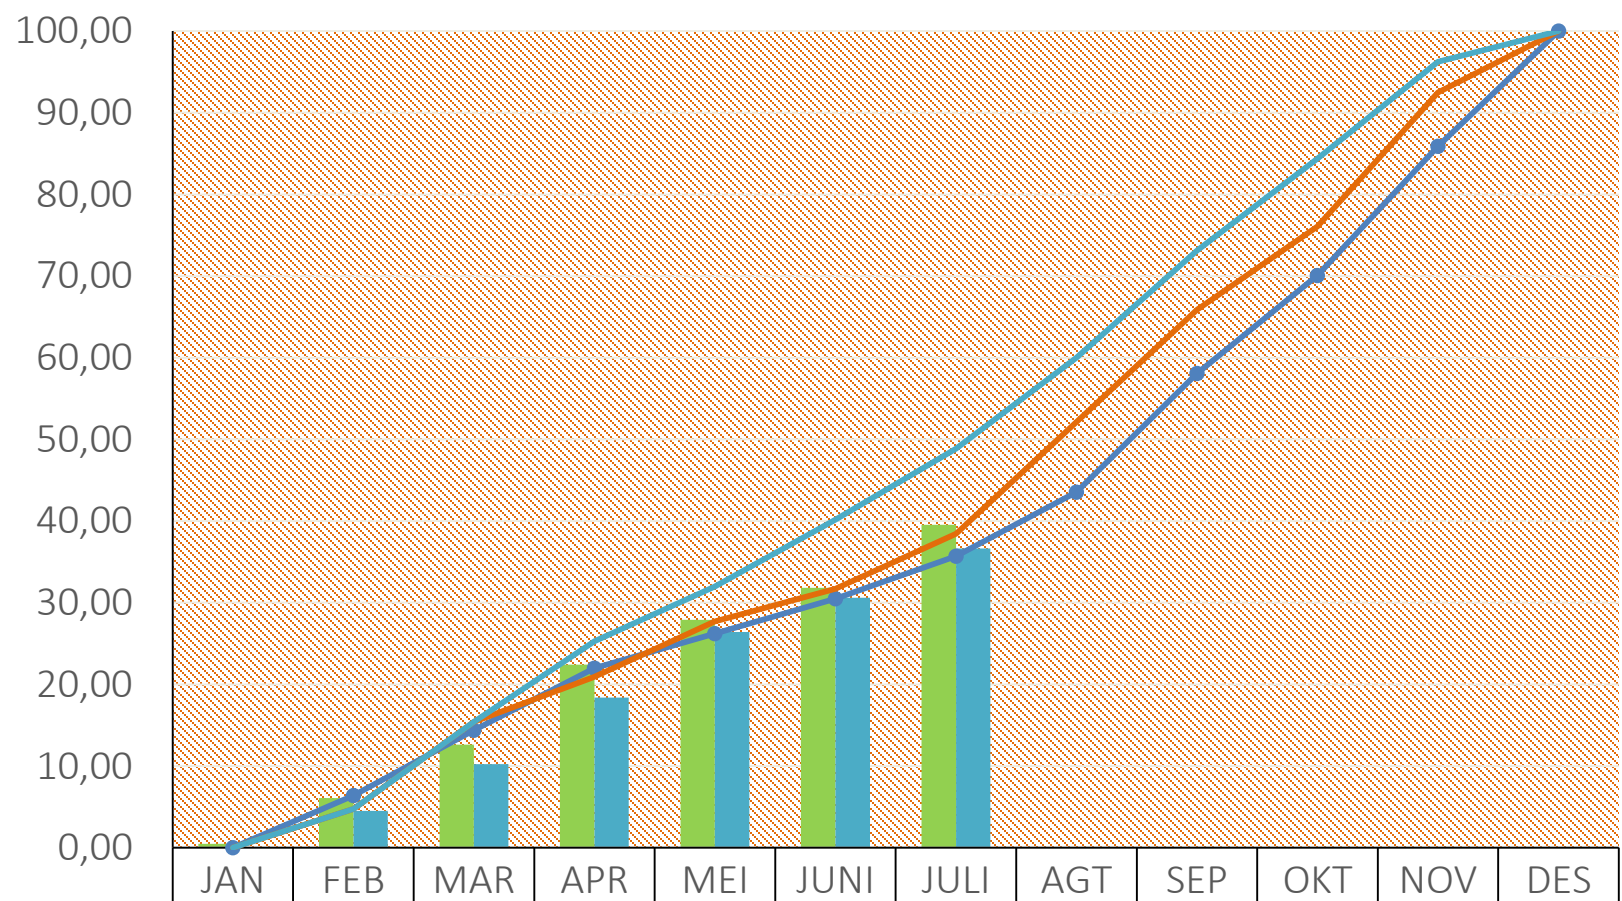


|                 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 0,48 | 6,06 | 12,60 | 22,40 | 27,90 | 31,80 | 39,54 |       |       |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 0,00 | 4,52 | 10,22 | 18,38 | 26,39 | 30,62 | 36,64 |       |       |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 0,00 | 6,38 | 14,38 | 21,98 | 26,23 | 30,48 | 35,70 | 43,53 | 58,08 | 70,07 | 85,89 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 20,94 | 27,72 | 31,71 | 38,44 | 52,10 | 65,86 | 76,06 | 92,47 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 25,26 | 31,96 | 40,15 | 48,88 | 59,98 | 73,14 | 84,37 | 96,26 | 100,0 |

|             | Juli  | Agus  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 35,70 | 43,53 |
| Real. Fisik | 39,54 |       |
| Dev. Fisik  | 3,84  |       |
| Renc. Keu   | 35,70 | 43,53 |
| Real. Keu   | 36,64 |       |
| Dev. Keu    | 0,94  |       |



# PERTANAHAN

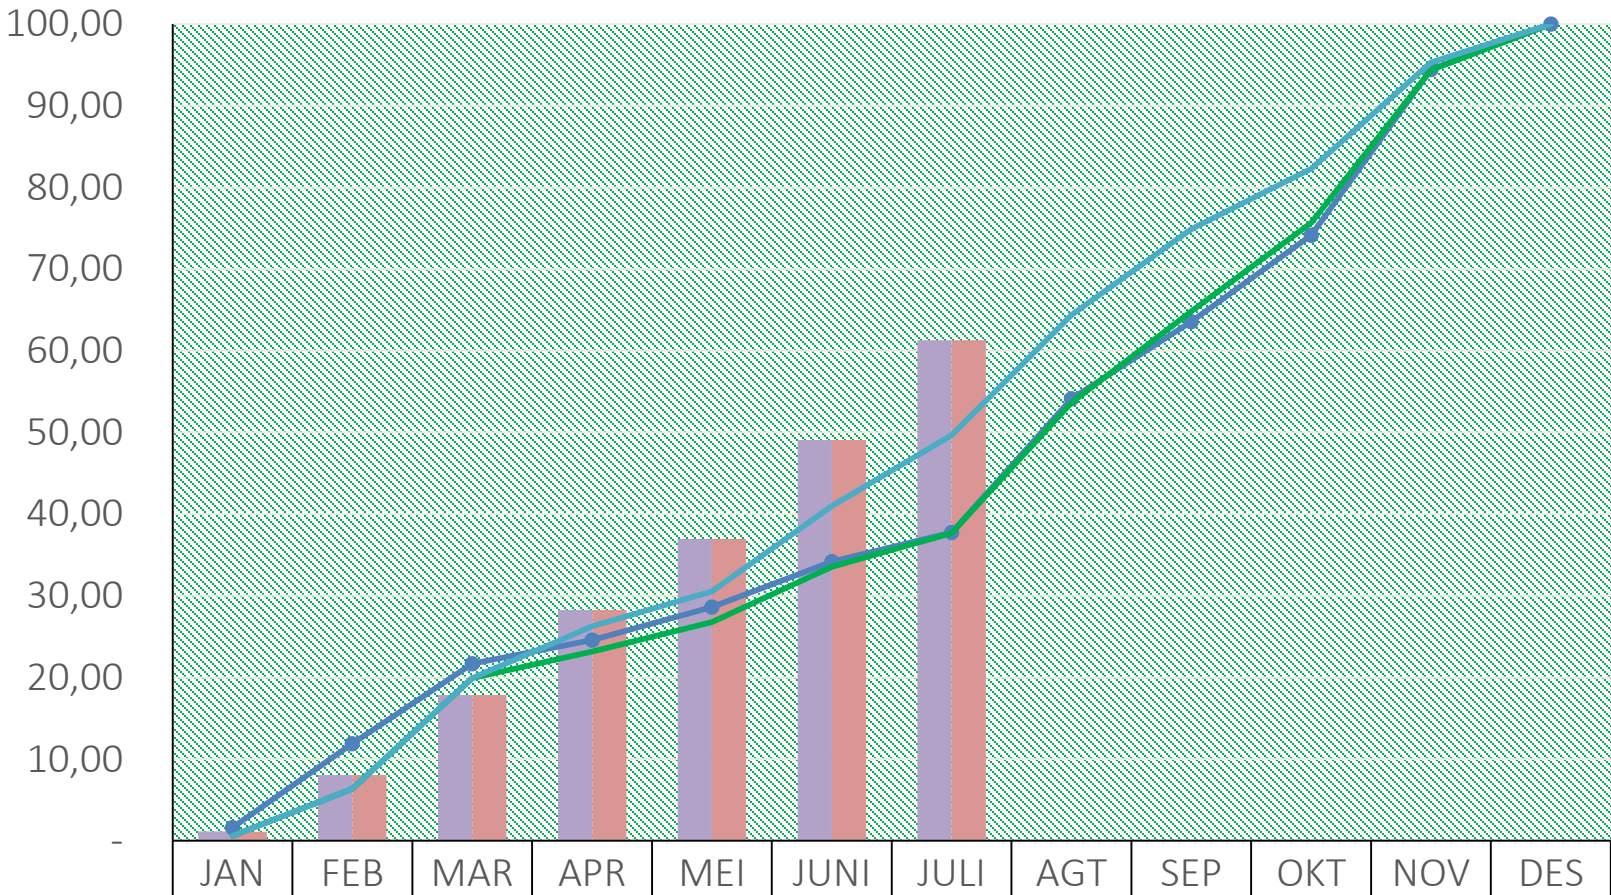

|                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 1,13 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 | 61,29 |       |       |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 1,11 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 | 61,29 |       |       |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 1,62 | 11,86 | 21,65 | 24,55 | 28,61 | 34,16 | 37,73 | 54,13 | 63,57 | 74,14 | 94,45 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,58 | 6,34  | 19,91 | 23,15 | 26,78 | 33,55 | 37,67 | 53,64 | 64,80 | 75,67 | 94,36 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,58 | 6,34  | 19,91 | 26,24 | 30,53 | 41,00 | 49,66 | 64,40 | 74,88 | 82,31 | 95,29 | 100,0 |

|             | Juli  | Agus  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 37,73 | 54,13 |
| Real. Fisik | 61,29 |       |
| Dev. Fisik  | 23,56 |       |
| Renc. Keu   | 37,73 | 54,13 |
| Real. Keu   | 61,29 |       |
| Dev. Keu    | 23,56 |       |



# **PENJELASAN KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**


STATUS AKHIR JULI 2020

# SEKRETARIAT

| NO | KEGIATAN                                                                            | DEVIASI |         | KETERANGAN                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     | FISIK   | KEU     |                                                                          |
| 1  | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                           | -       | -0,06   | Menyesuaikan Kebutuhan                                                   |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah               | -       | -7,80   | Menyesuaikan Kebutuhan (efisiensi)                                       |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah      | -       | -8,33   | Sisa lelang                                                              |
| 4  | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah     | -10,72  | -20,96  | Adanya pembatasan perjalanan dinas untuk menghindari penyebaran COVID-19 |
| 5  | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                     | -       | -20,24  | Proses pengajuan pembayaran                                              |
| 6  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                                    | -       | -0,49   | Sisa lelang                                                              |
| 7  | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah                                       | -       | -0,22   | Menyesuaikan kebutuhan                                                   |
| 8  | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                     | -       | -100,00 | Proses pengajuan pembayaran                                              |
| 9  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | -       | -0,54   | Menyesuaikan kebutuhan                                                   |
| 10 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal                                            | -       | -0,24   | Menyesuaikan kebutuhan                                                   |

# BIDANG PERUMAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                | DEVIASI |       | KETERANGAN                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         | FISIK   | KEU   |                                                         |
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | -       | -1,63 | Silpa (efisiensi) dan belum melakukan pembayaran termin |
| 2  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | -       | -5,76 | Silpa (efisiensi) dan belum melakukan pembayaran termin |
| 3  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | -       | -9,59 | Belum melakukan pembayaran termin                       |




# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

STATUS AKHIR JULI 2020




# REKAP PENGADAAN BARANG/JASA

**TOTAL PAKET : 303 PAKET**

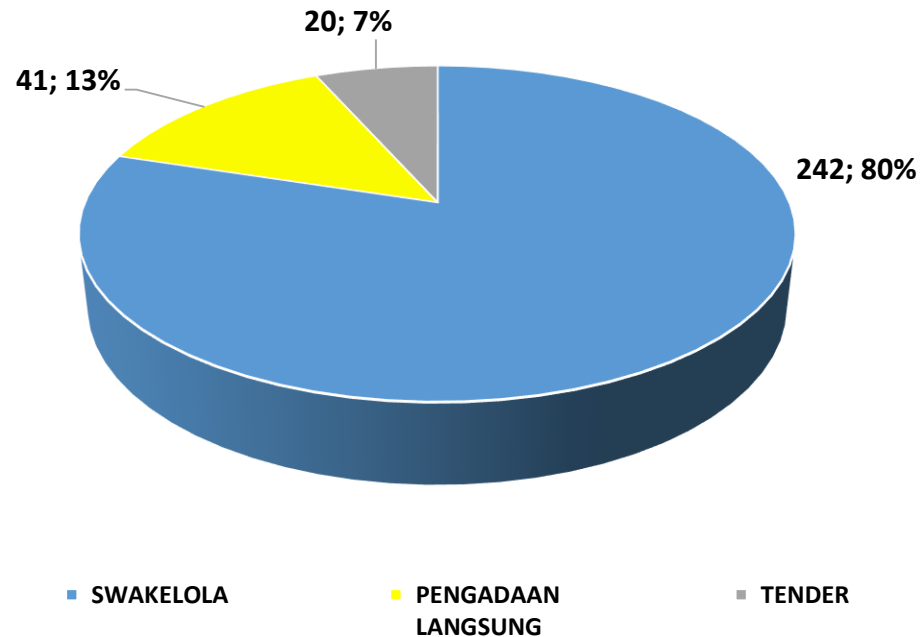


**TOTAL ANGGARAN : Rp. 22.311.773.000,-**

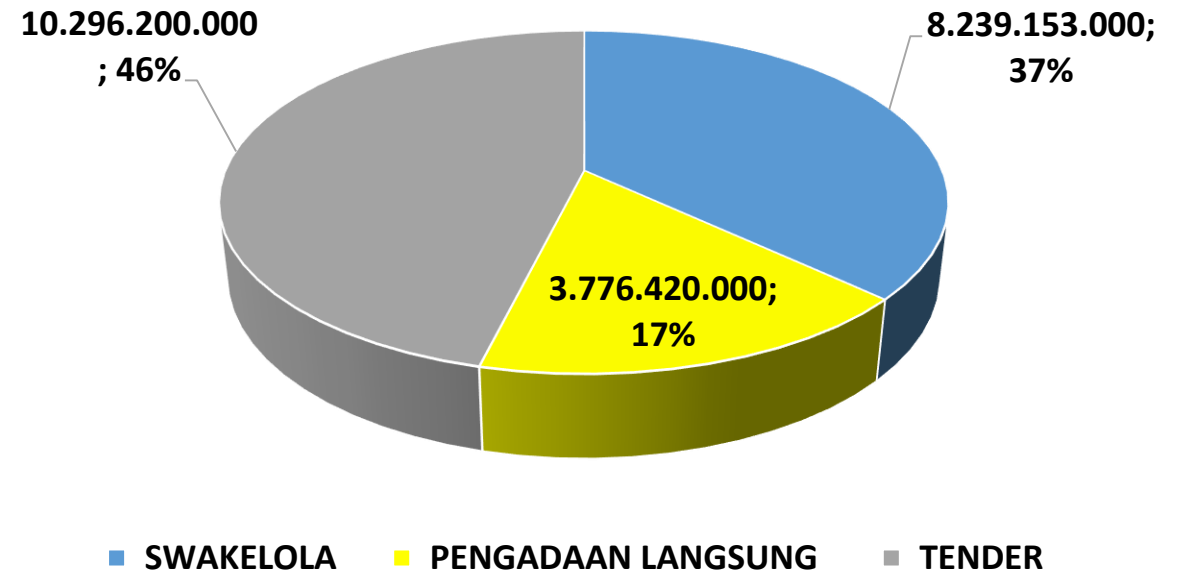

| NO    | BIDANG             | PAGU           | SWAKELOLA     |     | PENGADAAN LANGSUNG |     | TENDER         |     | TOTAL PAKET    |     |
|-------|--------------------|----------------|---------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
|       |                    |                | Rp            | Jml | Rp                 | Jml | Rp             | Jml | Rp             | Jml |
| 1     | SEKRETARIAT        | 5.419.533.000  | 3.627.773.000 | 63  | 1.115.560.000      | 13  | 676.200.000    | 2   | 5.419.533.000  | 78  |
| 2     | PERUMAHAN          | 13.716.562.000 | 2.192.562.000 | 52  | 2.064.000.000      | 16  | 9.460.000.000  | 17  | 13.716.562.000 | 85  |
| 3     | KAWASAN PERMUKIMAN | 862.902.000    | 702.902.000   | 42  | -                  | -   | 160.000.000    | 1   | 862.902.000    | 43  |
| 4     | KETERPADUAN PKPP   | 1.140.949.000  | 633.249.000   | 46  | 507.700.000        | 10  | -              | -   | 1.140.949.000  | 56  |
| 5     | PERTANAHAN         | 1.171.827.000  | 1.106.667.000 | 39  | 89.160.000         | 2   | -              | -   | 1.171.827.000  | 41  |
| TOTAL |                    | 22.311.773.000 | 8.239.153.000 | 242 | 3.776.420.000      | 41  | 10.296.200.000 | 20  | 22.311.773.000 | 303 |

**RINGKASAN PAKET SUDAH TERKONTRAK : TENDER: 19 DARI 20 PAKET; PENGADAAN LANGSUNG: 26 DARI 41 PAKET**

# PROGRES PENGADAAN BARANG JASA

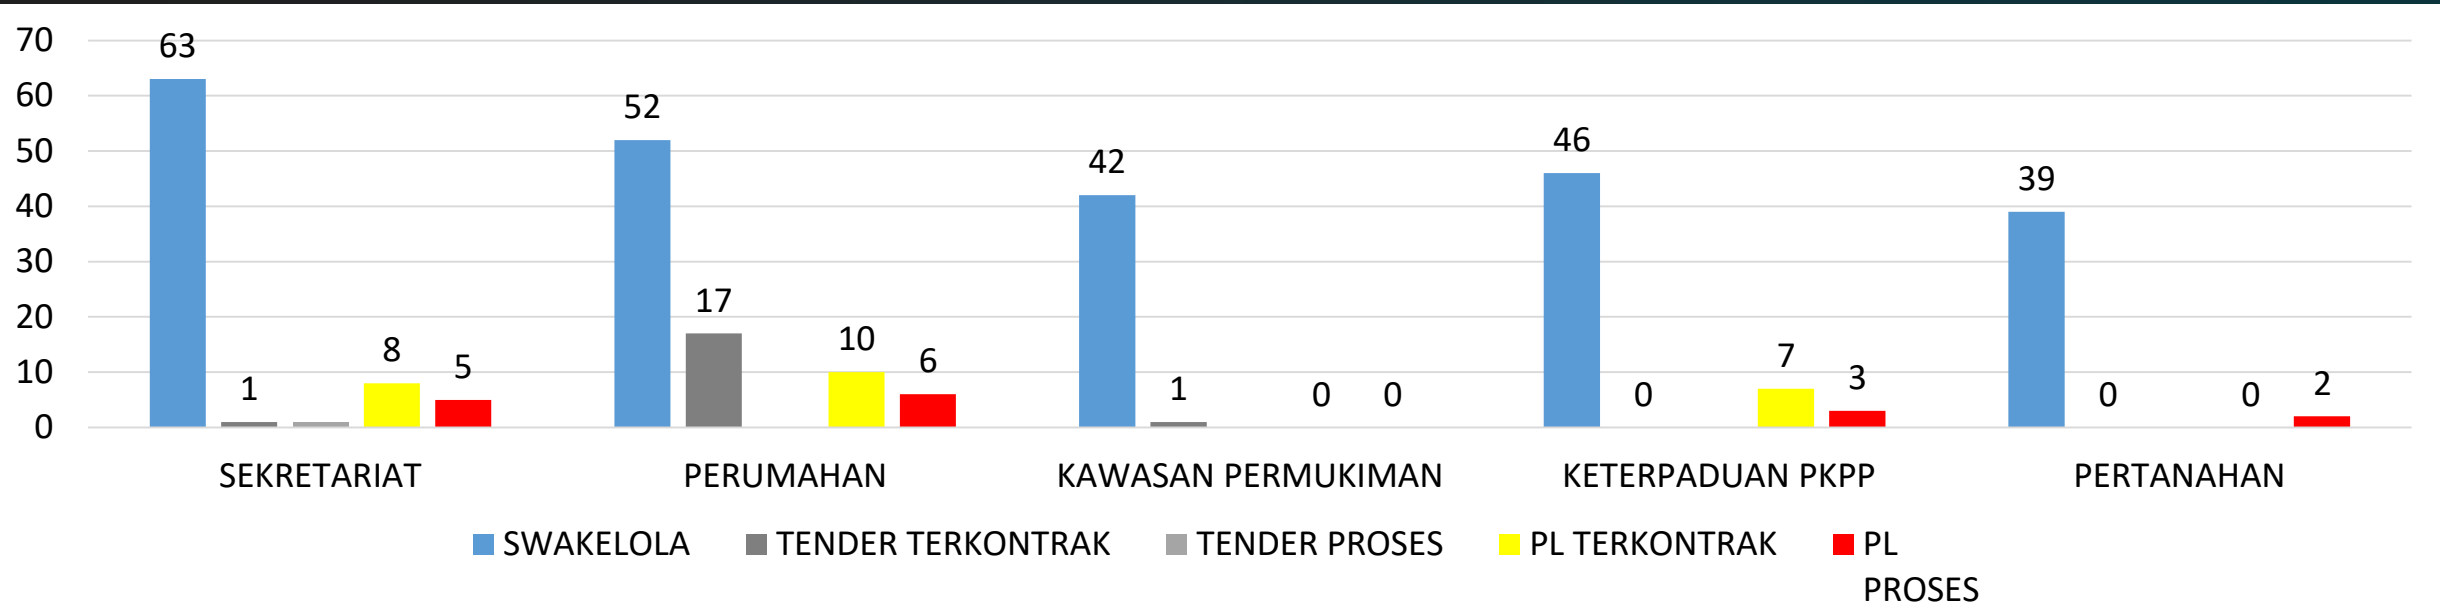

| NO             | BIDANG             | TOTAL PAKET    | SWAKELOLA     | TENDER        |             | PENGADAAN LANGSUNG |               |
|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
|                |                    | JUMLAH         | JUMLAH        | TERKONTRAK    | PROSES      | TERKONTRAK         | PROSES        |
| 1              | SEKRETARIAT        | 78             | 63            | 1             | 1           | 8                  | 5             |
| 2              | PERUMAHAN          | 85             | 52            | 17            | 0           | 10                 | 6             |
| 3              | KAWASAN PERMUKIMAN | 43             | 42            | 1             | 0           | 0                  | 0             |
| 4              | KETERPADUAN PKPP   | 56             | 46            | 0             | 0           | 7                  | 3             |
| 5              | PERTANAHAN         | 41             | 39            | 0             | 0           | 0                  | 2             |
| TOTAL PAKET    |                    | 303            | 242           | 19            | 1           | 25                 | 16            |
| TOTAL ANGGARAN |                    | 22.311.773.000 | 8.239.153.000 | 9.891.200.000 | 405.000.000 | 2.385.260.000      | 1.391.160.000 |



# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                        | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE       | PROGRES LELANG                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                                   |                     |              |                                       |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (7 bulan)                   | 271.200.000         | Tender Cepat | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Juni 2020  |
| 2                | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor                                      | 405.000.000         | Tender       | Persiapan lelang                      |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                                   |                     |              |                                       |
| 3                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan     | 525.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang      | 840.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak        | 735.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara       | 560.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 7                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati                   | 490.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 8                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes       | 840.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 13 Juli 2020 |
| 9                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemalang     | 840.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 10               |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara | 455.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 11               |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo     | 385.000.000         | Tender       | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 12  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung                                                                                              | 455.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 13  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen                                                                                                 | 770.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 13 Juli 2020 |
| 14  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten                                                                                                  | 420.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 13 Juli 2020 |
| 15  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen                                                                                                  | 385.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 13 Juli 2020 |
| 16  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo                                                                                               | 840.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 12 Juni 2020 |
| 17  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000      | Tender  | Sudah Terkontrak Tanggal 14 Juli 2020 |
| 18  |                                                                                                                                         | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000      | Seleksi | Sudah terkontrak 17 Juni 2020         |
| 19  |                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000      | Seleksi | Sudah terkontrak 17 Juni 2020         |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.                       | KEGIATAN                                                                  | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------|
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                           |                                      |                  |         |                               |
| 20                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Pemukiman | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 21                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 22                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 23                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 24                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 25                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | -                | Tender  | DIHENTIKAN                    |
| 26                        |                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 160.000.000      | Seleksi | Sudah Terkontrak 20 Juli 2020 |
| 27                        | Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | -                | Seleksi | DIHENTIKAN                    |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 10 Juli 2020   |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020 |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020 |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 9 Maret 2020   |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 197.600.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 20 Juli 2020   |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       | Persiapan lelang                        |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 8   |                                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 21 Juli 2020   |
| 9   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       |                                         |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 12  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020           |
| 13  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Belanja Sewa Hotel                                                                                        | 86.400.000       | Sudah terlaksana 6-7 Maret 2020         |

**BELUM TERKONTRAK: 5 PAKET**

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERUMAHAN**

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                 | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                              | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020 |
| 2  |                                                                                                                                          | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 15 Juli 2020        |
| 3  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 210.000.000      | Sudah terkontrak tanggal 10 Juli 2020        |
| 4  |                                                                                                                                          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru I                                                                      | 100.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 15 Juli 2020        |
| 5  |                                                                                                                                          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru II                                                                     | 100.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 15 Juli 2020        |
| 6  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      | Sudah terkontrak tanggal 3 April 2020        |
| 7  |                                                                                                                                          | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 64.800.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020   |
| 8  |                                                                                                                                          | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 31 Januari 2020     |
| 9  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan Akses Rusunawa Kota Semarang                                    | 50.000.000       | Rencana Pelaksanaan Bulan Oktober            |
| 10 |                                                                                                                                          | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 5 Agustus 2020      |
| 11 |                                                                                                                                          | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 5 Agustus 2020      |
| 12 |                                                                                                                                          | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      | Evaluasi Penawaran                           |
| 13 |                                                                                                                                          | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      | Evaluasi Penawaran                           |
| 14 |                                                                                                                                          | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      | Pembukaan Dokumen Penawaran                  |
| 15 |                                                                                                                                          | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      | Pembukaan Dokumen Penawaran                  |
| 16 |                                                                                                                                          | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      | Pembukaan Dokumen Penawaran                  |

**BELUM TERKONTRAK: 6 PAKET**

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Sewa Hotel 1                                                                                                    | -                | <b>DIHENTIKAN</b>                   |
| 2   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel 2                                                                                                    | 56.700.000       | Rencana pelaksanaan bulan November  |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       | Terkontrak tanggal 21 Juli 2020     |
| 4   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Terkontrak tanggal 17 Februari 2020 |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Terkontrak Tanggal 12 Maret 2020    |
| 6   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 3 Februari 2020  |
| 7   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 |
| 8   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel Forum Pokja PKP Paket Fullboard Dalam Daerah                                                         | 5.000.000        | Akan dilaksanakan melalui zoom      |
| 9   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 |
| 10  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Belanja Sewa Hotel                                                                                                      | 30.000.000       |                                     |
| 11  |                                                                                                    | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                 | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 12 Februari 2020 |

**BELUM TERKONTRAK: 3 PAKET**

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KAW. PERMUKIMAN**

| NO. | KEGIATAN                                       | NAMA PAKET                          | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | -                | DIHENTIKAN     |
| 2   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | -                | DIHENTIKAN     |
| 3   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | -                | DIHENTIKAN     |


## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                         | NAMA PAKET                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi                                                                 | Sewa Hotel Paket Full board             | 24.160.000       | Rencana Pelaksanaan Bulan November.                     |
| 2   | Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 65.000.000       | Tahap Pembukaan Dokumen Penawaran Status 3 Agustus 2020 |

**BELUM TERKONTRAK: 2 PAKET**



# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT




Jumlah Laporan yang masuk pada bulan JULI 2020 sebanyak 8 Laporan, dengan rincian :


a. TUNTAS DIJAWAB = 8 LAPORAN

b. MASIH DALAM PROSES BIDANG = 0 LAPORAN

# LAPORAN KONTEN MEDIA SOSIAL DISPERAKIM




# LAPORAN KONTEN BERITA WEB DINAS

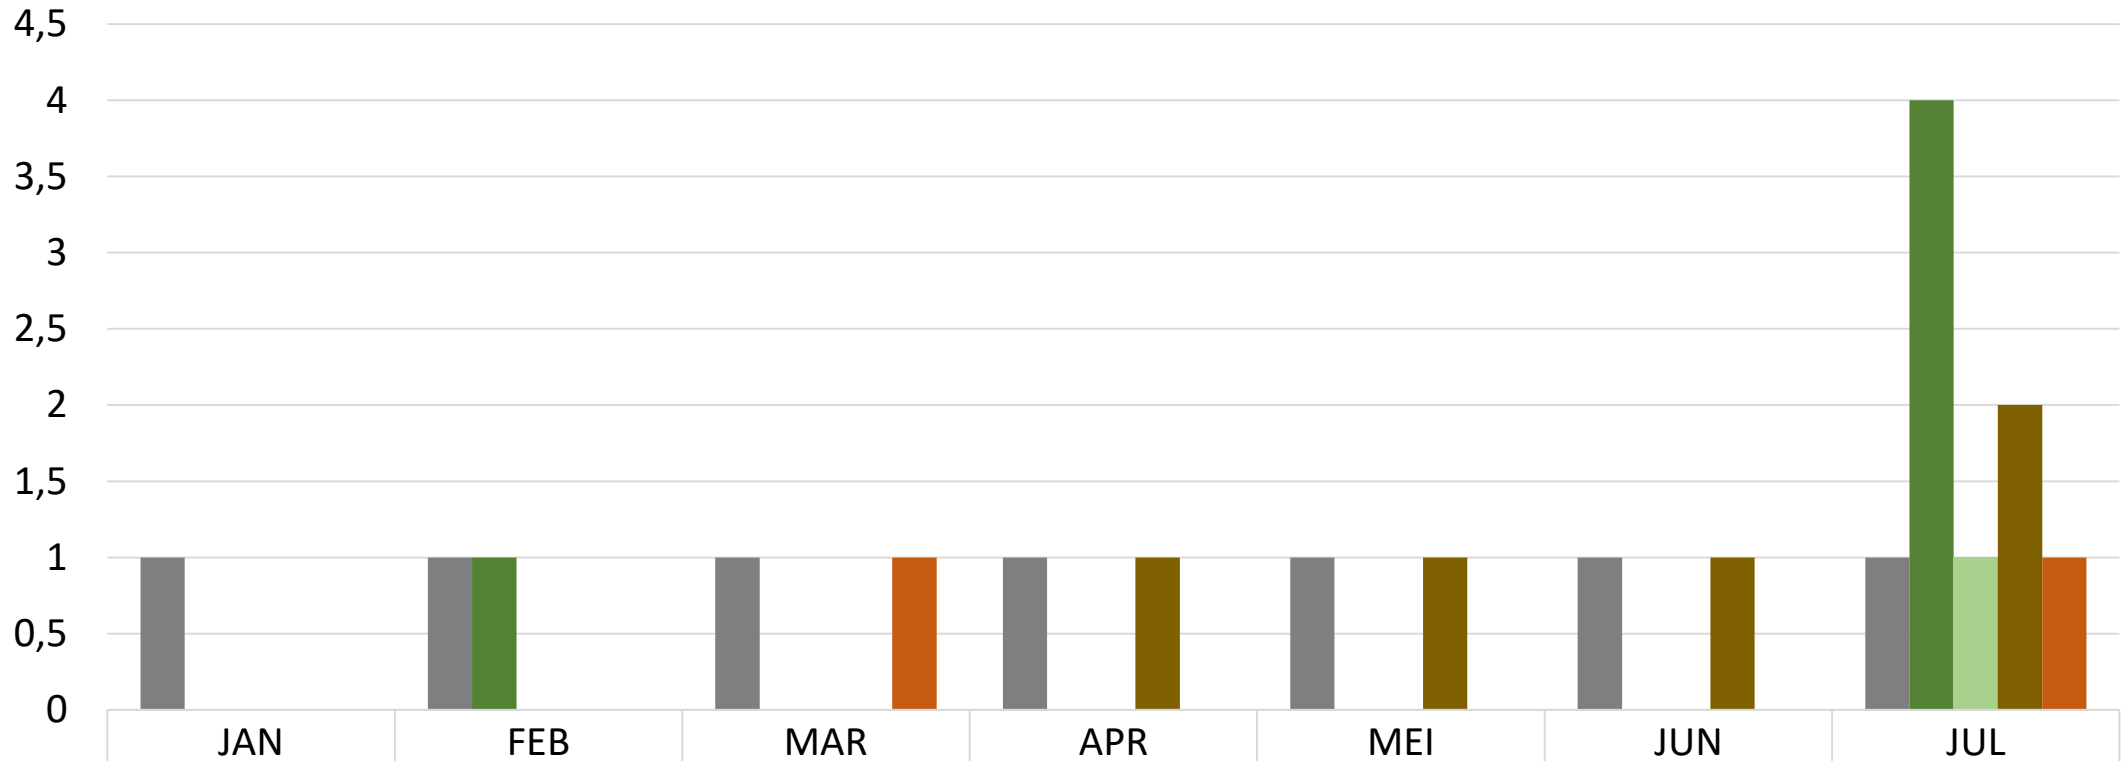

|               |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Sekretariat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ■ Perumahan   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ■ Kawasan     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ■ Keterpaduan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ■ Pertanian   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

# LAPORAN FOLLOWERS DAN SUBSCRIBERS MEDSOS



# PENEKANAN APBD


1. Mengingat masih tingginya angka Covid-19 di Jawa Tengah, maka setiap karyawan Disperakim wajib melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 seperti menjaga jarak, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dll.
2. Senin, 17 Agustus 2020 akan dilaksanakan UPACARA BENDERA dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-75. Seluruh karyawan Disperakim diwajibkan hadir dan menggunakan masker merah putih yang telah dibagikan.
3. Diharapkan Seluruh ASN dan Non-ASN di Lingkungan Disperakim Prov.Jateng aktif memberikan LIKE/LOVE, Subscribe/Comment Medsos Disperakim Guna Menunjukkan Keaktifan Media Sosial Disperakim
4. Guna Meningkatkan Grafik Konten Media Sosial Disperakim (Twitter, FB, IG) maka perlu disepakati jumlah konten yang perlu di-upload setiap harinya, serta peran serta seluruh bidang untuk berkontribusi dalam bentuk dokumentasi setiap kegiatan yang perlu di publikasikan.
5. Guna meningkatkan keaktifan kanal YouTube Disperakim, perlu disepakati jumlah konten YouTube yang akan diunggah setiap bulannya, serta kesanggupan bidang untuk berkontribusi dalam penyiapan konten.
6. Terkait dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan dengan sistem Vidcon, maka perlu dibuat TIM Persiapan pada masing-masing bidang sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Vidcon.
7. Guna Peningkatan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) di lingkungan Disperakim Prov.Jateng, maka setiap penyelenggara kegiatan berbentuk Rakor/Sosialisasi/Bimtek/Workshop diharapkan menghimbau pesertanya untuk mengisi Elektronik Survey Kepuasan Masyarakat (ESKM) Disperakim yang dilakukan secara Online Melalui <https://bit.ly/KUESIONERDISPERAKIM>
8. Sesuai dengan Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 109/KI-JTG/VII/2020 perihal Penyampaian Hasil Penilaian dan Sosialisasi Monev PPID Masa Pandemi COVID-19, maka disampaikan bahwa pada Penilaian Tahap I/Informasi Wajib Berkala Disperakim memperoleh nilai 100. Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari seluruh lingkup Disperakim Prov. Jateng. Selanjutnya akan dilakukan Penilaian Tahap ke-2 / Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang kemungkinan akan jatuh di bulan Agustus-September 2020.

**APBN**



# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

## PAGU – Rp 413.433.074.000

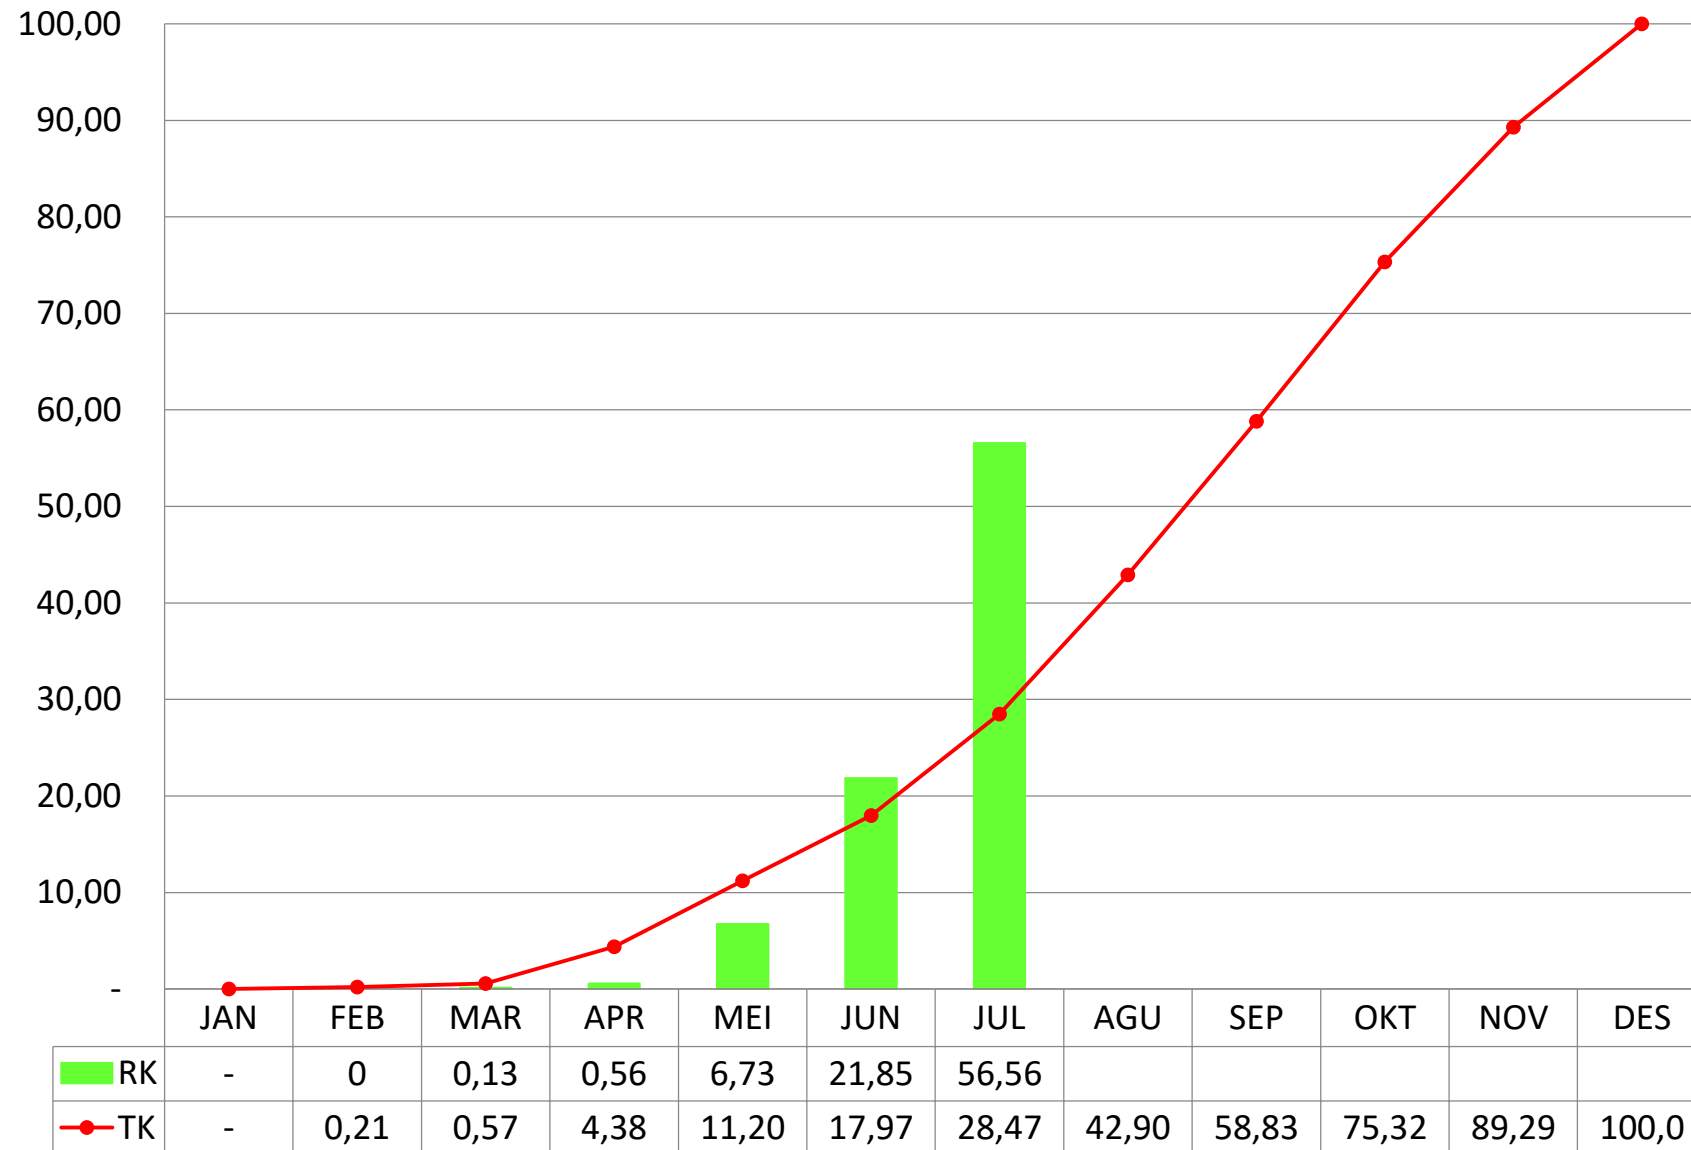


|           | Juli  | Agus  |
|-----------|-------|-------|
| Renc. Keu | 28,47 | 42,90 |
| Real. Keu | 56,56 |       |
| Dev. Keu  | 28,09 |       |

**Real. Fisik: 44,53%**



# BPPW JATENG

## PAGU – Rp 982.844.909

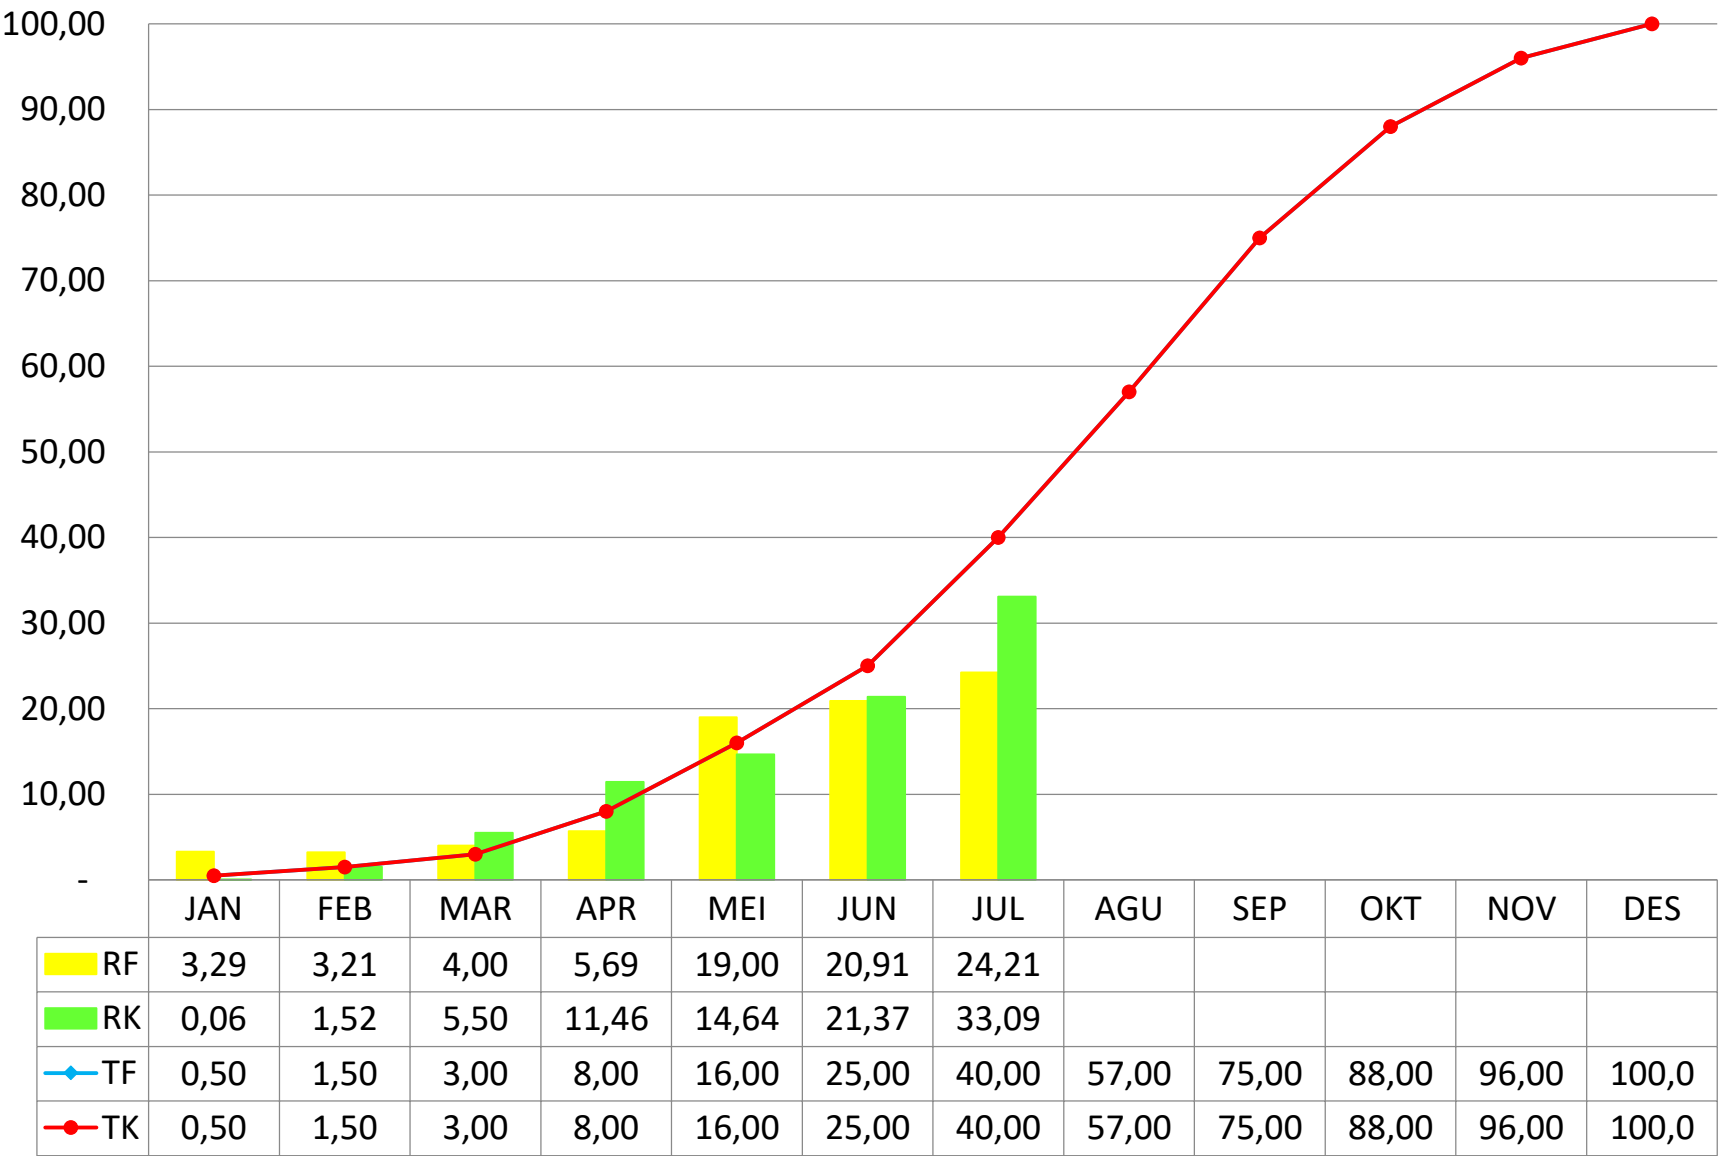

|             | Juli    | Agus  |
|-------------|---------|-------|
| Renc. Fisik | 40,00   | 57,00 |
| Real. Fisik | 24,21   |       |
| Dev. Fisik  | (15,79) |       |
| Renc. Keu   | 40,00   | 57,00 |
| Real. Keu   | 33,09   |       |
| Dev. Keu    | (6,91)  |       |

A solid red square is positioned on the left side of the image. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**

# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JUNI 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH




# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PENEKANAN APBD
7. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN




# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020

## PAGU AWAL

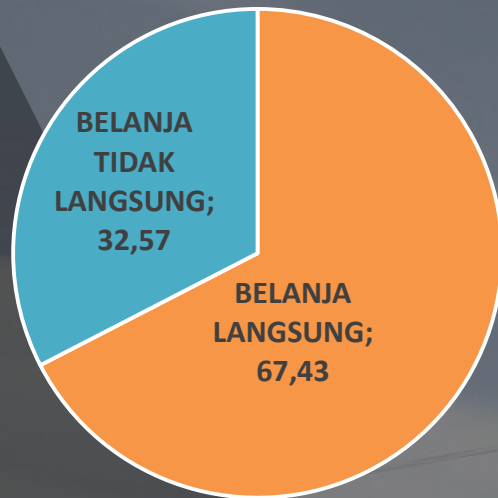


| BELANJA                | PAGU           |
|------------------------|----------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000 |
| TOTAL                  | 44.612.807.000 |

## PAGU RASIONALISASI TAHAP 1

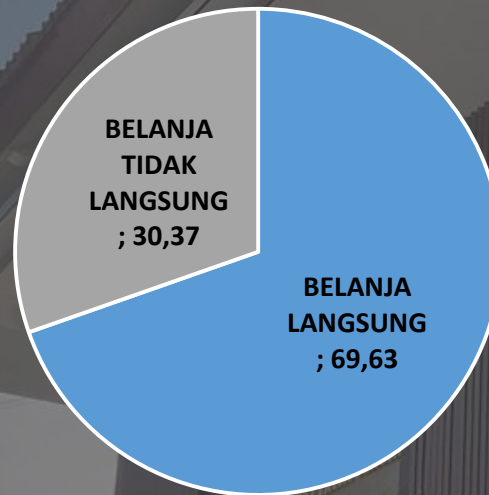

| BELANJA                | PAGU           |
|------------------------|----------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 26.855.467.000 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000 |
| TOTAL                  | 38.567.858.000 |


## PAGU RASIONALISASI TAHAP 2

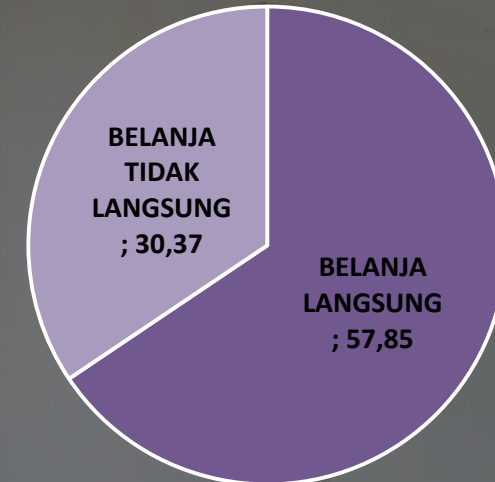


| BELANJA                | PAGU           |
|------------------------|----------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 22.311.773.000 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000 |
| TOTAL                  | 34.024.164.000 |

# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020


**PAGU AWAL**

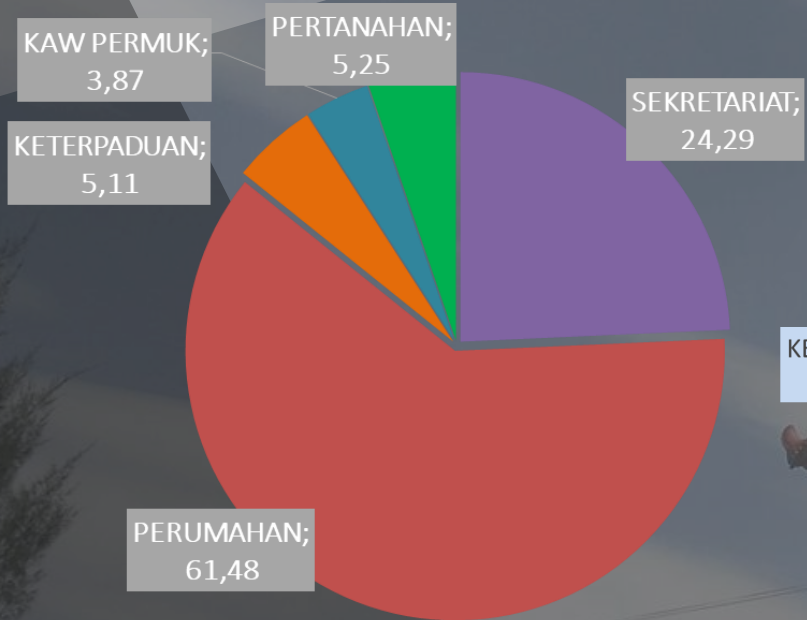

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 1**

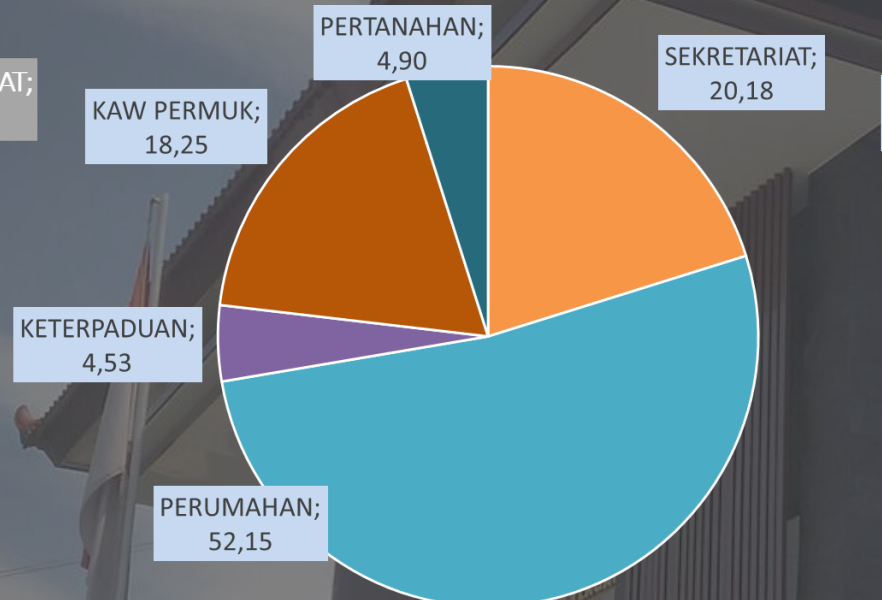

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 2**

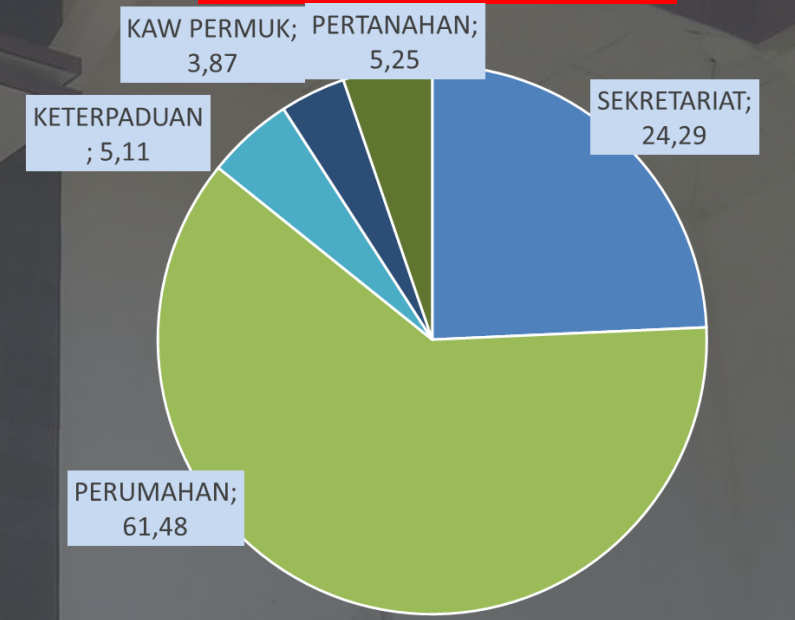

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 20,18  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.004.532.000 | 52,15  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.215.949.000  | 4,53   |
| 4     | KAW PERMUK  | 4.900.626.000  | 18,25  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.314.827.000  | 4,90   |
| TOTAL |             | 26.855.467.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 24,29  |
| 2     | PERUMAHAN   | 13.716.562.000 | 61,48  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.140.949.000  | 5,11   |
| 4     | KAW PERMUK  | 862.902.000    | 3,87   |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.171.827.000  | 5,25   |
| TOTAL |             | 22.311.773.000 | 100,00 |






# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

STATUS AKHIR JUNI 2020




# DISPERAKIM

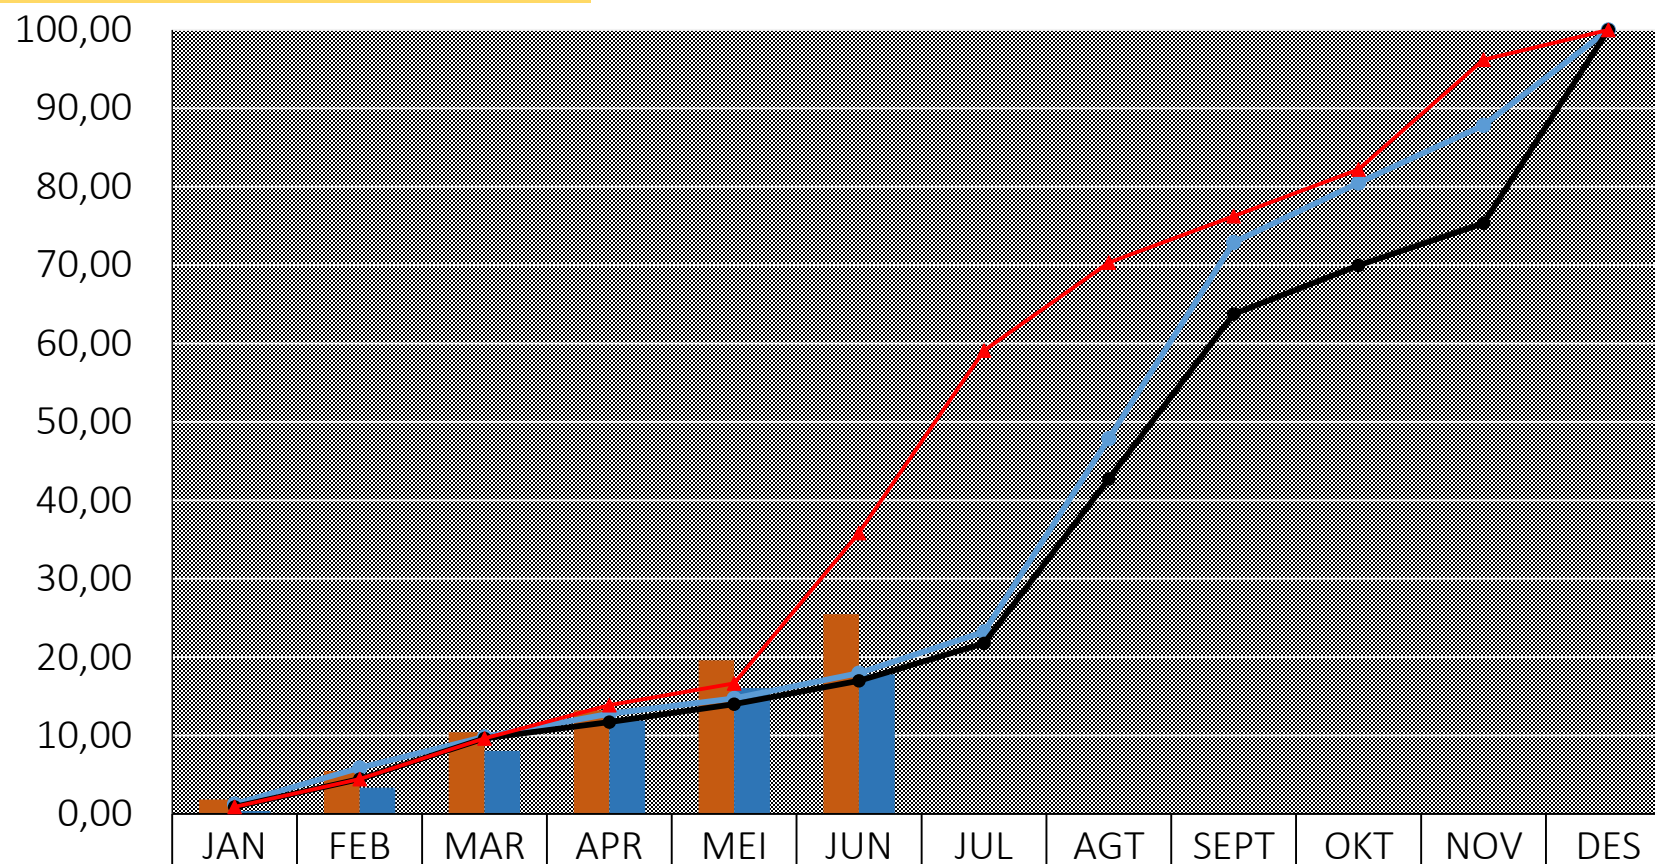

|            |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REAL FISIK | 1,84 | 5,46 | 10,41 | 13,23 | 19,60 | 25,46 |       |       |       |       |       |       |
| REAL KEU   | 0,36 | 3,35 | 8,05  | 11,88 | 16,04 | 17,79 |       |       |       |       |       |       |
| TF/K RAS 2 | 1,27 | 5,87 | 9,85  | 12,76 | 14,74 | 17,94 | 23,23 | 47,87 | 72,87 | 80,48 | 87,81 | 100,0 |
| TF/K RAS 1 | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 11,72 | 13,98 | 16,98 | 21,73 | 42,74 | 63,76 | 69,95 | 75,35 | 100,0 |
| TF/K AWAL  | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,0 |

|             | Juni   | Juli  |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 17,94  | 23,23 |
| Real. Fisik | 25,46  |       |
| Dev. Fisik  | 7,52   |       |
| Renc. Keu   | 17,94  | 23,23 |
| Real. Keu   | 17,79  |       |
| Dev. Keu    | (0,15) |       |


# SEKRETARIAT

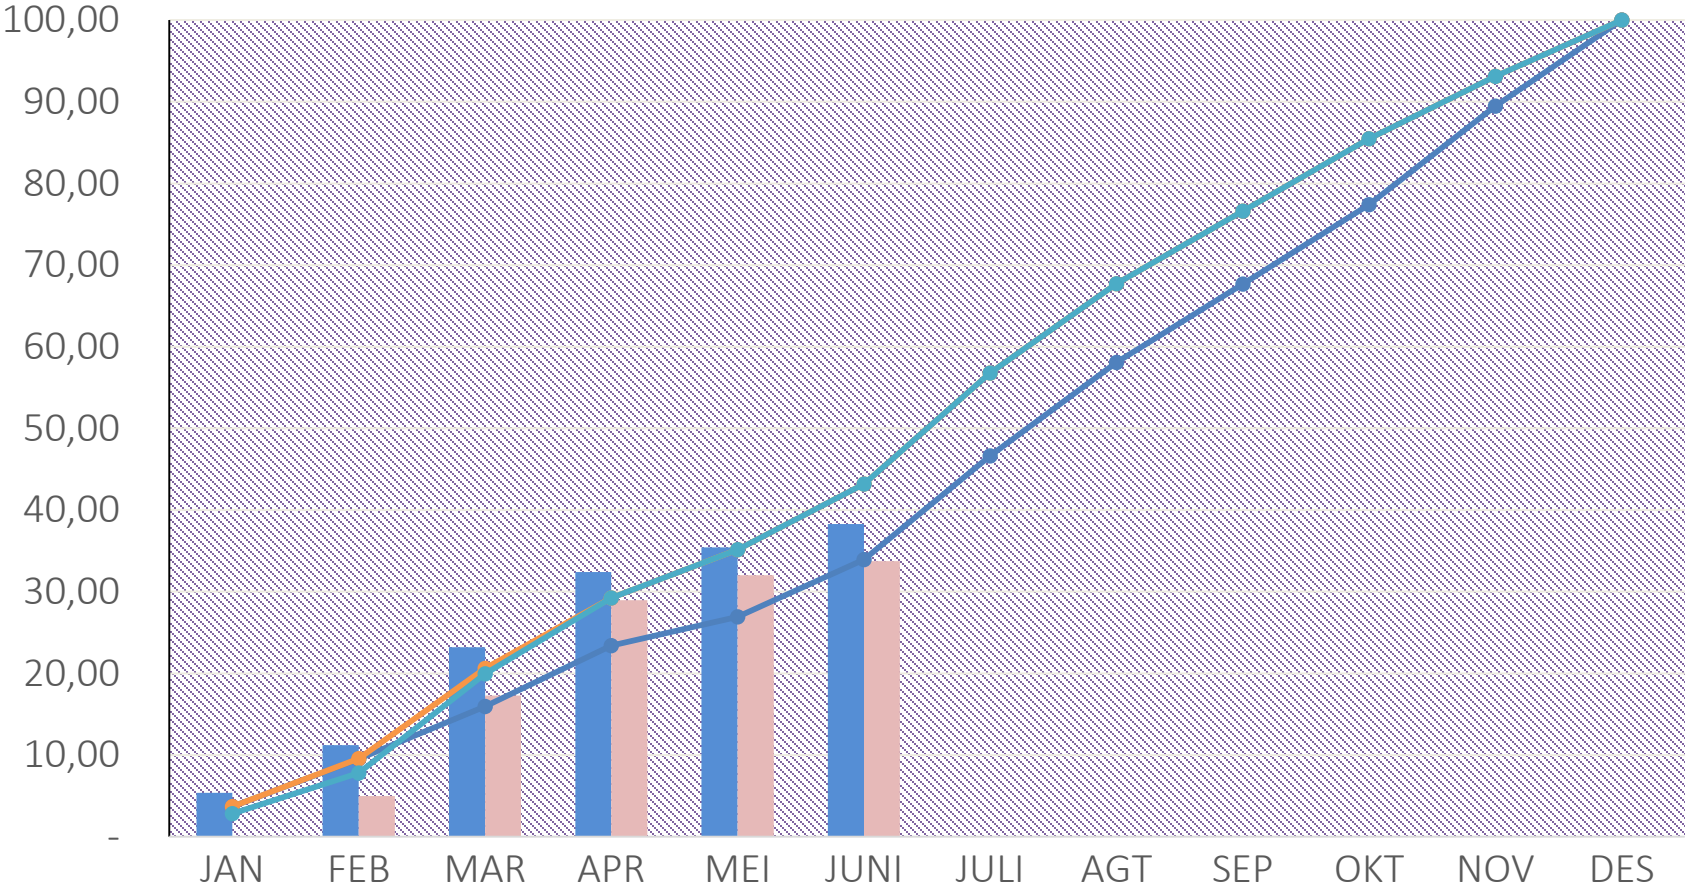

|                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK | 5,36 | 11,21 | 23,20 | 32,40 | 35,43 | 38,28 |       |       |       |       |       |        |
| REALISASI KEU   | -    | 4,96  | 17,28 | 28,94 | 32,01 | 33,75 |       |       |       |       |       |        |
| TARGET F/K-2    | 3,66 | 9,50  | 15,93 | 23,41 | 26,91 | 33,95 | 46,63 | 58,06 | 67,67 | 77,38 | 89,47 | 100,0  |
| TARGET F/K-1    | 3,66 | 9,54  | 20,59 | 29,23 | 35,15 | 43,17 | 56,78 | 67,71 | 76,63 | 85,47 | 93,12 | 100,00 |
| TARGET F/K-0    | 2,80 | 7,81  | 19,94 | 29,23 | 35,15 | 43,17 | 56,78 | 67,71 | 76,63 | 85,47 | 93,12 | 100,0  |

|             | Juni  | Juli  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 33,95 | 46,63 |
| Real. Fisik | 38,28 |       |
| Dev. Fisik  | 4,33  |       |
| Renc. Keu   | 33,95 | 46,63 |
| Real. Keu   | 33,75 |       |
| Dev. Keu    | 0,20  |       |


# PERUMAHAN

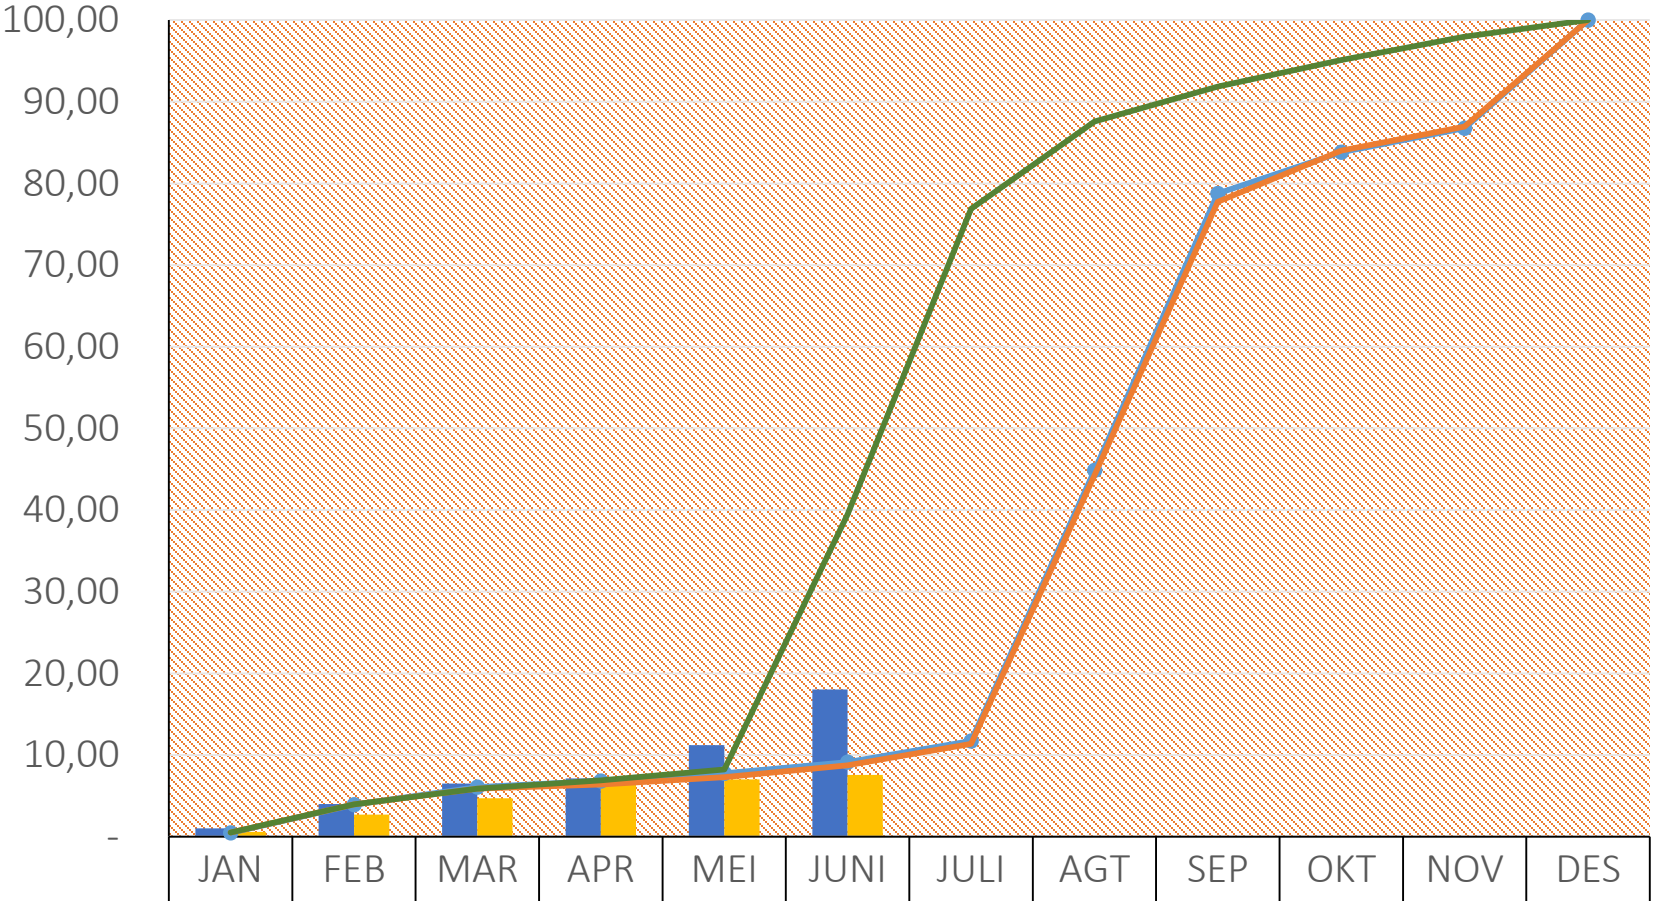

|             | Juni   | Juli  |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 9,11   | 11,73 |
| Real. Fisik | 18,03  |       |
| Dev. Fisik  | 8,92   |       |
| Renc. Keu   | 9,11   | 11,73 |
| Real. Keu   | 7,54   |       |
| Dev. Keu    | (1,57) |       |

|                 |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 1,01 | 3,99 | 6,49 | 7,12 | 11,22 | 18,03 |       |       |       |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 0,60 | 2,71 | 4,68 | 6,41 | 7,01  | 7,54  |       |       |       |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 0,48 | 3,91 | 6,07 | 6,82 | 7,77  | 9,11  | 11,73 | 44,86 | 78,78 | 83,81 | 86,76 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,38 | 7,30  | 8,73  | 11,36 | 44,28 | 77,76 | 84,00 | 86,97 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,51 | 3,97 | 5,89 | 6,88 | 8,24  | 39,46 | 76,87 | 87,58 | 91,86 | 95,11 | 97,98 | 100,0 |


# KAWASAN PERMUKIMAN

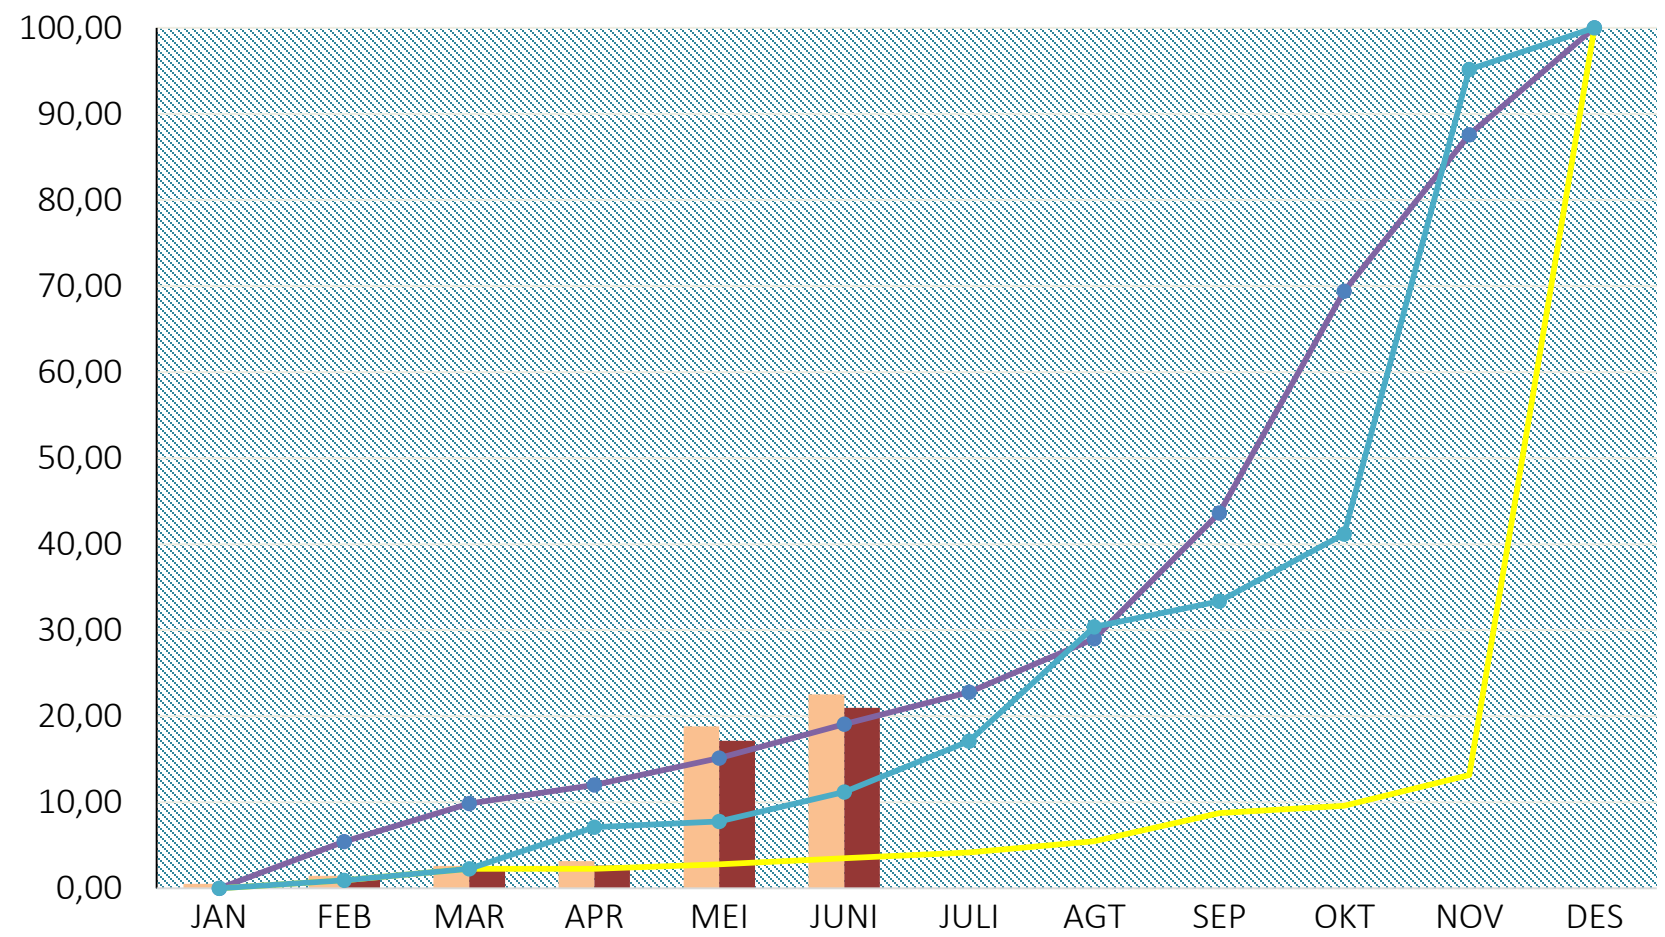

|                 |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REALISASI FISIK | 0,54 | 1,47 | 2,61 | 3,18  | 18,81 | 22,56 |       |       |       |       |       |        |
| REALISASI KEU   | 0,00 | 1,28 | 2,11 | 2,64  | 17,14 | 20,99 |       |       |       |       |       |        |
| TARGET F/K-2    | 0,00 | 5,45 | 9,85 | 12,00 | 15,15 | 19,09 | 22,81 | 29,01 | 43,64 | 69,40 | 87,58 | 100,00 |
| TARGET F/K-1    | 0,00 | 0,94 | 2,29 | 2,27  | 2,81  | 3,50  | 4,19  | 5,47  | 8,73  | 9,61  | 13,16 | 100,00 |
| TARGET F/K-0    | 0,00 | 0,94 | 2,29 | 7,09  | 7,77  | 11,21 | 17,11 | 30,38 | 33,38 | 41,19 | 95,17 | 100,00 |

|             | Juni  | Juli  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 19,09 | 22,81 |
| Real. Fisik | 22,56 |       |
| Dev. Fisik  | 3,47  |       |
| Renc. Keu   | 19,09 | 22,81 |
| Real. Keu   | 20,99 |       |
| Dev. Keu    | 1,90  |       |


# KETERPADUAN PKPP

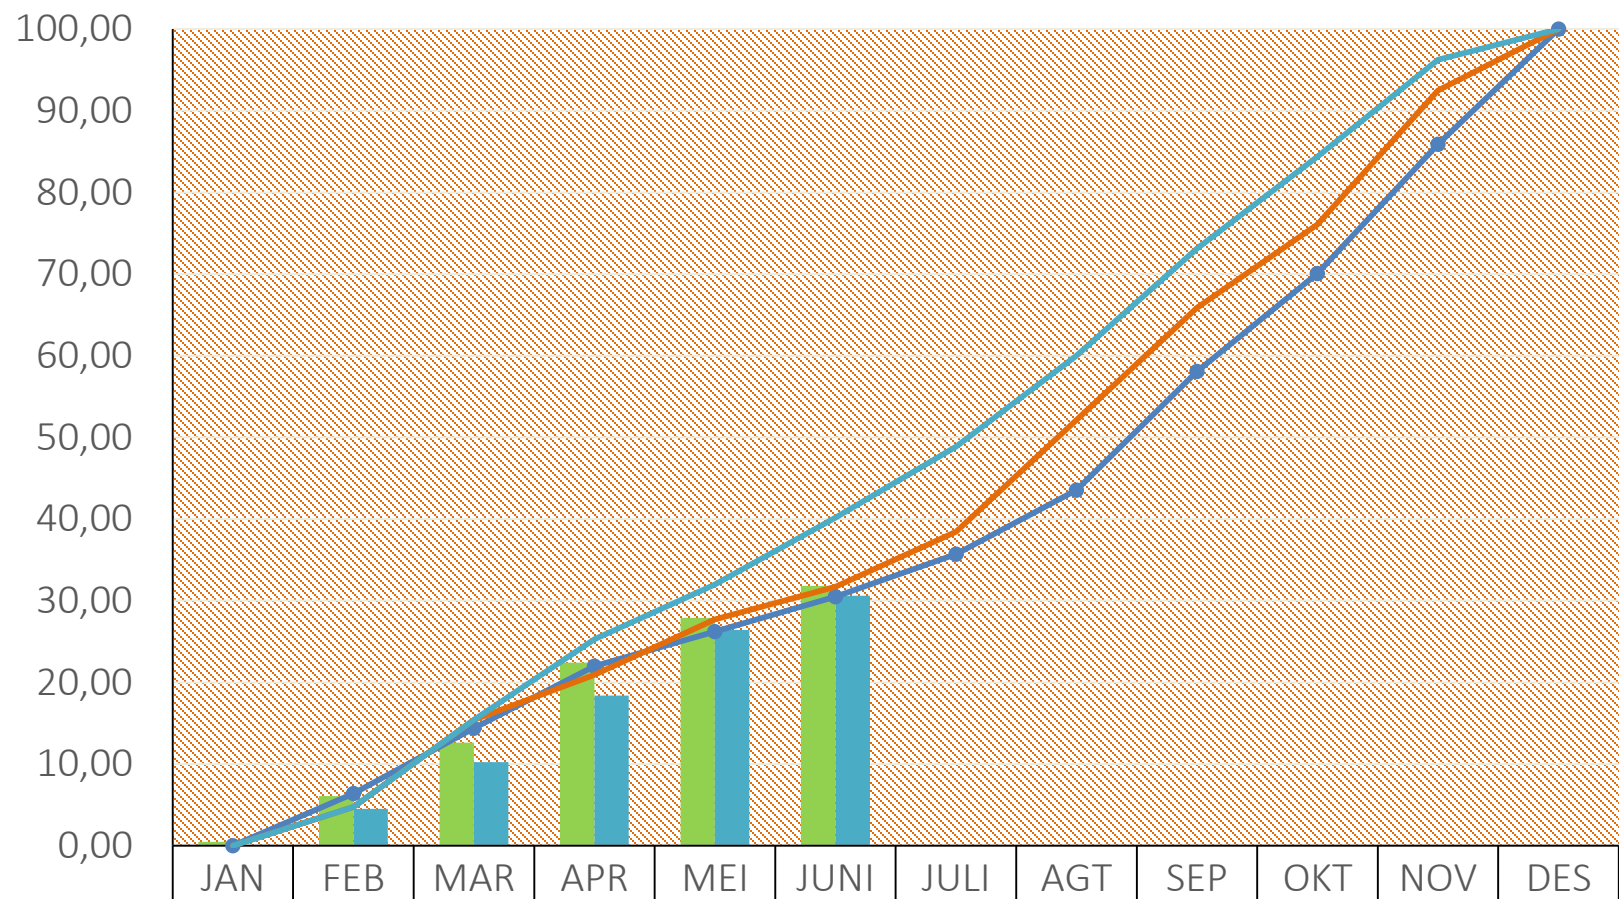

|                 | JAN  | FEB  | MAR   | APR   | MEI   | JUNI  | JULI  | AGT   | SEP   | OKT   | NOV   | DES   |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 0,48 | 6,06 | 12,60 | 22,40 | 27,90 | 31,80 |       |       |       |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 0,00 | 4,52 | 10,22 | 18,38 | 26,39 | 30,62 |       |       |       |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 0,00 | 6,38 | 14,38 | 21,98 | 26,23 | 30,48 | 35,70 | 43,53 | 58,08 | 70,07 | 85,89 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 20,94 | 27,72 | 31,71 | 38,44 | 52,10 | 65,86 | 76,06 | 92,47 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,00 | 4,72 | 15,41 | 25,26 | 31,96 | 40,15 | 48,88 | 59,98 | 73,14 | 84,37 | 96,26 | 100,0 |

|             | Mei   | Juni  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 30,48 | 35,70 |
| Real. Fisik | 31,80 |       |
| Dev. Fisik  | 1,32  |       |
| Renc. Keu   | 30,48 | 35,70 |
| Real. Keu   | 30,62 |       |
| Dev. Keu    | 0,14  |       |

# PERTANAHAN

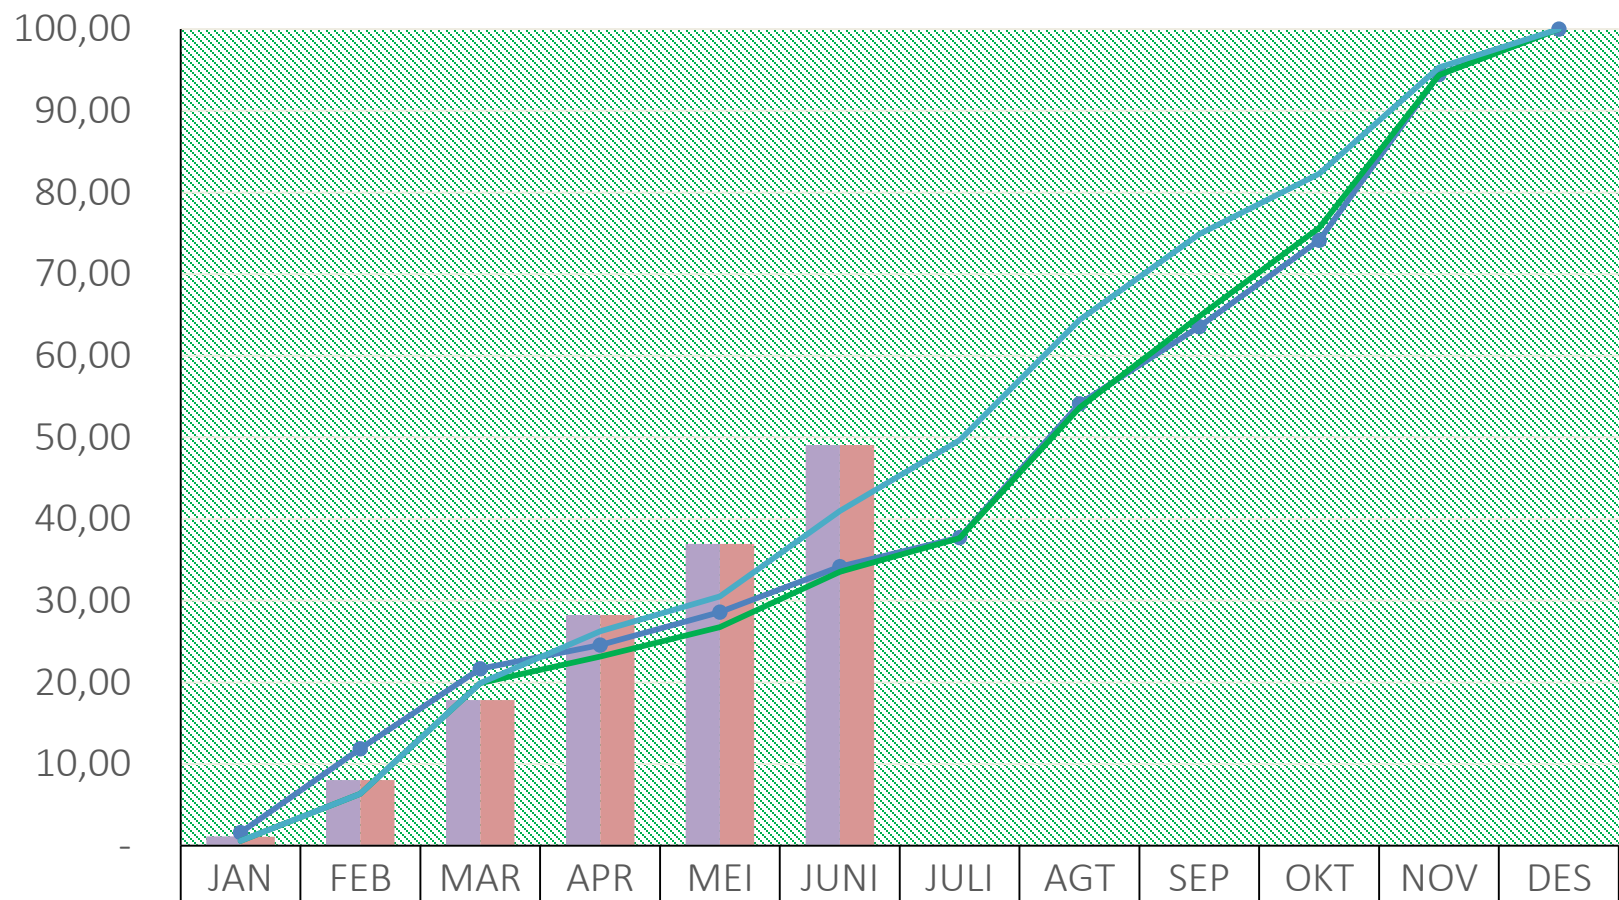

|                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REALISASI FISIK | 1,13 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 |       |       |       |       |       |       |
| REALISASI KEU   | 1,11 | 8,02  | 17,81 | 28,27 | 36,95 | 49,06 |       |       |       |       |       |       |
| TARGET F/K-2    | 1,62 | 11,86 | 21,65 | 24,55 | 28,61 | 34,16 | 37,73 | 54,13 | 63,57 | 74,14 | 94,45 | 100,0 |
| TARGET F/K-1    | 0,58 | 6,34  | 19,91 | 23,15 | 26,78 | 33,55 | 37,67 | 53,64 | 64,80 | 75,67 | 94,36 | 100,0 |
| TARGET F/K-0    | 0,58 | 6,34  | 19,91 | 26,24 | 30,53 | 41,00 | 49,66 | 64,40 | 74,88 | 82,31 | 95,29 | 100,0 |

|             | Juni  | Juli  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 34,16 | 37,73 |
| Real. Fisik | 49,06 |       |
| Dev. Fisik  | 14,90 |       |
| Renc. Keu   | 34,16 | 37,73 |
| Real. Keu   | 49,06 |       |
| Dev. Keu    | 14,90 |       |



# **PENJELASAN KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**

STATUS AKHIR JUNI 2020



# SEKRETARIAT


| NO | KEGIATAN                                                                        | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 | FISIK   | KEU    |                                                                          |
| 1  | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                       | -       | -0,06  | Menyesuaikan Kebutuhan                                                   |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah           | -       | -6,66  | Menyesuaikan Kebutuhan (efisiensi)                                       |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah  | -       | -10,66 | Sisa lelang                                                              |
| 4  | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | -0,20   | -10,44 | Adanya pembatasan perjalanan dinas untuk menghindari penyebaran COVID-19 |
| 5  | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                 | -       | -0,07  | Menyesuaikan Kebutuhan                                                   |
| 6  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                                | -       | -0,49  | Sisa lelang                                                              |
| 7  | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah                                   | -       | -1,18  | Menyesuaikan kebutuhan                                                   |

# BIDANG PERUMAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                | DEVIASI |       | KETERANGAN                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         | FISIK   | KEU   |                                                         |
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | -       | -1,12 | Silpa (efisiensi) dan belum melakukan pembayaran termin |
| 2  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | -       | -4,40 | Silpa (efisiensi) dan belum melakukan pembayaran termin |
| 3  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | -       | -2,00 | Belum melakukan pembayaran termin                       |

# BIDANG KETERPADUAN PKPP

| NO | KEGIATAN                                                                               | DEVIASI |       | KETERANGAN   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|
|    |                                                                                        | FISIK   | KEU   |              |
| 1  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan | -       | -0,07 | Sisa kontrak |



# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

STATUS AKHIR JUNI 2020

# REKAP PENGADAAN BARANG/JASA

| NO | BIDANG             | PAGU           | SWAKELOLA     |     | PENGADAAN LANGSUNG |     | TENDER         |     | TENDER CEPAT |     | TOTAL PAKET    |     |
|----|--------------------|----------------|---------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|
|    |                    |                | Rp            | Jml | Rp                 | Jml | Rp             | Jml | Rp           | Jml | Rp             | Jml |
| 1  | SEKRETARIAT        | 5.419.533.000  | 3.697.373.000 | 64  | 1.045.960.000      | 10  | 405.000.000    | 1   | 271.200.000  | 1   | 5.419.533.000  | 76  |
| 2  | PERUMAHAN          | 13.716.562.000 | 2.192.562.000 | 53  | 2.064.000.000      | 17  | 9.460.000.000  | 17  | -            | -   | 13.716.562.000 | 87  |
| 3  | KAWASAN PERMUKIMAN | 862.902.000    | 702.902.000   | 48  | -                  | -   | 160.000.000    | .1  | -            | -   | 862.902.000    | 49  |
| 4  | KETERPADUAN PKPP   | 1.140.949.000  | 633.249.000   | 48  | 507.700.000        | 10  | -              | -   | -            | -   | 1.140.949.000  | 58  |
| 5  | PERTANAHAN         | 1.171.827.000  | 1.106.827.000 | 41  | 65.000.000         | 1   | -              | -   | -            | -   | 1.171.827.000  | 42  |
|    | TOTAL              | 22.311.773.000 | 8.332.913.000 | 254 | 3.682.660.000      | 38  | 10.025.000.000 | 19  | 271.200.000  | 1   | 22.311.773.000 | 312 |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                    | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE       | PROGRES LELANG                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                                                                                    |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (7 bulan)               | 345.100.000         | Tender Cepat | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Juni 2020                                                                                               |
| 2                | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor                                  | 405.000.000         | Tender       | Persiapan lelang                                                                                                                   |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                                                                                    |
| 3                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan | 525.000.000         | Tender       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang  | 840.000.000         | Tender       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak    | 735.000.000         | Tender       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara   | 560.000.000         | Tender       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO. | KEGIATAN | NAMA PAKET                                                        | NILAI PAKET (Rp) | METODE | PROGRES LELANG                                                                                                                     |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati                   | 490.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |
| 8   |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes       | 840.000.000      | Tender | Masa Sanggah                                                                                                                       |
| 9   |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemalang     | 840.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |
| 10  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara | 455.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |
| 11  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo     | 385.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |
| 12  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung   | 455.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |
| 13  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen      | 770.000.000      | Tender | Masa Sanggah                                                                                                                       |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten                                                                                                  | 420.000.000      | Tender  | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa                                                                                                                         |
| 15  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen                                                                                                  | 385.000.000      | Tender  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li> <li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li> </ul> |
| 16  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo                                                                                               | 840.000.000      | Tender  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li> <li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li> </ul>                         |
| 17  |                                                                                                                                         | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru                                                                                                                     | 200.000.000      | Seleksi | Persiapan Lelang                                                                                                                                              |
| 18  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000      | Tender  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li> <li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li> </ul>                         |
| 19  |                                                                                                                                         | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000      | Seleksi | Sudah terkontrak 17 Juni 2020                                                                                                                                 |
| 20  |                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000      | Seleksi | Sudah terkontrak 17 Juni 2020                                                                                                                                 |



# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.                       | KEGIATAN                                                                  | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                           |                                      |                  |         |                                                                                                                                    |
| 21                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Pemukiman | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 1.000.000.000    | Tender  | DIHENTIKAN                                                                                                                         |
| 22                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 750.000.000      | Tender  | DIHENTIKAN                                                                                                                         |
| 23                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 500.000.000      | Tender  | DIHENTIKAN                                                                                                                         |
| 24                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000      | Tender  | DIHENTIKAN                                                                                                                         |
| 25                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000      | Tender  | DIHENTIKAN                                                                                                                         |
| 26                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000      | Tender  | DIHENTIKAN                                                                                                                         |
| 27                        | Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 160.000.000      | Seleksi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Rencana Penandatanganan kontrak 6 Juli 2020</li></ul> |
| 28                        |                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 550.000.000      | Seleksi | DIHENTIKAN                                                                                                                         |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      | Proses lelang                           |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020 |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020 |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Terkontrak 9 Maret 2020                 |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 197.600.000      | Persiapan lelang                        |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       | Persiapan lelang                        |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 8   |                                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      | Persiapan lelang                        |
| 9   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       |                                         |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 12  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020           |
| 13  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Belanja Sewa Hotel                                                                                        | 86.400.000       | Sudah terlaksana 6-7 Maret 2020         |

| REKAP PENGADAAN LANGSUNG BIDANG PERUMAHAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                  |                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| NO                                        | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                               |
| 1                                         | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020 |
| 2                                         |                                                                                                                                         | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       | Evaluasi Penawaran                           |
| 3                                         |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 175.000.000      | Proses Persiapan Lelang                      |
| 4                                         | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      | Sudah terkontrak tanggal 3 April 2020        |
| 5                                         |                                                                                                                                         | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 64.800.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020   |
| 6                                         |                                                                                                                                         | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 31 Januari 2020     |
| 7                                         | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan Akses Rusunawa Kota Semarang                                    | 50.000.000       | Rencana Pelaksanaan Bulan Oktober            |
| 8                                         |                                                                                                                                         | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      | Proses Penyusunan HPS                        |
| 9                                         |                                                                                                                                         | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      | Proses Penyusunan HPS                        |
| 10                                        |                                                                                                                                         | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      | Proses Penyusunan HPS                        |
| 11                                        |                                                                                                                                         | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      | Proses Penyusunan HPS                        |
| 12                                        |                                                                                                                                         | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      | Proses Penyusunan HPS                        |
| 13                                        |                                                                                                                                         | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      | Proses Penyusunan HPS                        |
| 14                                        |                                                                                                                                         | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      | Proses Penyusunan HPS                        |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Sewa Hotel 1                                                                                                    | 56.700.000       | <b>DIHENTIKAN</b>                                       |
| 2   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel 2                                                                                                    | 56.700.000       | Rencana pelaksanaan bulan November                      |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       | Akan mulai proses pengadaan awal Juli                   |
| 4   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Terkontrak tanggal 17 Februari 2020                     |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Terkontrak Tanggal 12 Maret 2020                        |
| 6   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 3 Februari 2020                      |
| 7   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020                     |
| 8   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel Forum Pokja PKP Paket Fullboard Dalam Daerah                                                         | 5.000.000        | Kemungkinan batal dilaksanakan (anggaran tdk mencukupi) |
| 9   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020                     |
| 10  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Belanja Sewa Hotel                                                                                                      | 30.000.000       |                                                         |
| 11  |                                                                                                    | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                 | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 12 Februari 2020                     |

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KAW. PERMUKIMAN**

| NO. | KEGIATAN                                       | NAMA PAKET                          | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 60.000.000       | DIHENTIKAN     |
| 2   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 60.000.000       | DIHENTIKAN     |
| 3   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 50.000.000       | DIHENTIKAN     |

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                          | NAMA PAKET                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | Sewa Hotel Paket Full board             | 42.500.000       | Ditunda terkait larangan perjalanan dinas dan berkumpul secara massal karena wabah COVID-19. Realokasi anggaran penanganan COVID-19, perencanaan kembali bulan November. |
| 2   |                                                                                                   | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 65.000.000       |                                                                                                                                                                          |

# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

| MEDIA        | JAN       | FEB       | MAR       | APR       | MEI       | JUN       | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Facebook     | 1         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         |     |     |     |     |     |     |
| Instagram    | 2         | 1         | 1         | 0         | 3         | 1         |     |     |     |     |     |     |
| Ponsel/SMS   | 7         | 5         | 7         | 0         | 0         | 0         |     |     |     |     |     |     |
| Web          | 11        | 10        | 4         | 2         | 6         | 6         |     |     |     |     |     |     |
| Whatsapp     | 10        | 5         | 4         | 11        | 1         | 6         |     |     |     |     |     |     |
| <b>TOTAL</b> | <b>31</b> | <b>24</b> | <b>17</b> | <b>13</b> | <b>10</b> | <b>13</b> |     |     |     |     |     |     |

**Jumlah Laporan yang masuk pada bulan JUNI 2020 sebanyak 13 Laporan, dengan rincian :**

a. TUNTAS DIJAWAB = 13 LAPORAN

b. MASIH DALAM PROSES BIDANG = 0 LAPORAN

# REKAP KONTEN BERITA WEBSITE DINAS STATUS

## JANUARI 2020 S.D JUNI 2020

| BULAN    | TANGGAL<br>UPLOAD KONTEN | JUDUL KONTEN                                                                                   | BIDANG YANG<br>BERKONTRIBUTSI | JUMLAH<br>KONTEN |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| FEBRUARI | 4 Februari 2020          | Sosialisasi Kegiatan Bidang Infrastruktur TA 2020                                              | Sekretariat                   | 1                |
| MARET    | 6 Maret 2020             | Mewujudkan DISPERAKIM yang Aman dan Terkendali Melalui Kegiatan FGD SPIP                       | Sekretariat                   | 2                |
|          | 16 Maret 2020            | Rapat Persiapan Pelaksanaan Rakor Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Prov.Jateng TA.2020 | Pertanahan                    |                  |
| APRIL    | 8 April 2020             | Vidcon Menjadi Salah Satu Solusi                                                               | Sekretariat                   | 2                |
|          | 23 April 2020            | Rapat Pembahasan Rencana Kerja POKJA PKP Tahun 2020                                            | Keterpaduan                   |                  |
| MEI      | 6 Mei 2020               | Koordinasi Tingkat OPD ditengah Pandemi COVID-19                                               | sekretariat                   | 2                |
|          | 18 Mei 2020              | Rapat Pembahasan Materi Bahan KKN Tematik Rumah Sehat dan Pertanahan                           | Keterpaduan                   |                  |
| JUNI     | 9 Juni 2020              | Kegiatan Perakim Difokuskan untuk Penanganan COVID-19                                          | Sekretariat                   | 2                |
|          | 16 Juni 2020             | Rapat Pembahasan Baseline dan Target Perumahan Tahun 2020-2024                                 | Keterpaduan                   |                  |
| TOTAL    |                          |                                                                                                |                               | 9                |



# REKAP DOKUMENTASI KEGIATAN DI WEBSITE DINAS


| BIDANG          | JAN      | FEB      | MAR       | APR      | MEI      | JUN       | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sekretariat     | 1        | 1        | 1         | -        | 4        | 6         |     |     |     |     |     |     |
| Perumahan       | -        | 5        | 12        | -        | -        | 16        |     |     |     |     |     |     |
| Kaw. Permukiman | -        | -        | -         | -        | -        | -         |     |     |     |     |     |     |
| Keterpaduan PKP | -        | -        | -         | 1        | 1        | 3         |     |     |     |     |     |     |
| Pertanahan      | -        | -        | -         | -        | -        | 1         |     |     |     |     |     |     |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>13</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>26</b> |     |     |     |     |     |     |

## RINGKASAN MEDIA SOSIAL DINAS

| MEDSOS    | USERNAME/ALAMAT                 | FOLLOWERS/SUBSCRIBERS | JUMLAH KONTEN |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| TWITTER   | Disperakimjtg                   | 1.650                 | 118           |
| FACEBOOK  | Disperakim Provinsi Jawa Tengah | 775                   | 73            |
| INSTAGRAM | disperakimprovjateng            | 529                   | 58            |
| YOUTUBE   | Program disperakim              | 11                    | 27            |

# PENEKANAN APBD

1. Mulai 6 Juli 2020, Presensi android sudah tidak uji coba dan akan digunakan dalam perhitungan TPP bulan September 2020
2. Setiap ASN menyusun sasaran kinerja pegawai baik secara online/manual guna pengaturan produktivitas kerja. Ketentuan tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan sistem kerja WFH dapat dilaksanakan apabila terpenuhi sarana dan prasarana baik di kantor maupun di rumah. Pelaksanaan WFH agar mempedomani aturan yang ada seperti laporan kinerja yang harus dilaporkan saat melakukan WFH.
3. Pelaksanaan apel pagi setiap senin dan senam hari Jum'at kembali dilaksanakan secara efektif mulai 6 Juli 2020.
4. Bidang yang belum mengumpulkan revisi KAK dan Proposal Tahun 2021 harap segera mengumpulkan ke subbag program
5. Bidang Kawasan Permukiman dan Keterpaduan PKP (kasi dan staff terkait) diharapkan untuk menghadiri Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ 2019 perihal data kawasan kumuh berbasis GIS dari DPRD Prov. Jateng setelah rapat POK (Jam 13.00 di R. Rapat Lt. 2).
6. Sehubungan dengan adanya Surat Pj. Sekda Jateng No. 030/0009572 tentang Penyusunan RKPD Perubahan Prov. Jateng TA 2020, Bidang harap untuk mempersiapkan penyesuaian target kinerja bulanan berdasarkan target kinerja perubahan 2020 yang telah diusulkan pasca refocusing anggaran tahap 2 sebagaimana format berikut:



# PENEKANAN APBD

## FORMAT PERUBAHAN TARGET CAPAIAN KINERJA PASCA REFOCUSING TAHAP 2 TAHUN 2020

| NO  | TUJUAN/ SASARAN /URUSAN/<br>PROGRAM PEMBANGUNAN/<br>KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM (OUTCOME) DAN<br>KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>RFJMD 2023 | REALISASI<br>PENCAPAIAN<br>KINERJA RFJMD<br>s/d TAHUN 2019 | TARGET<br>KINERJA<br>Tahun 2020 | PERUBAHAN<br>TARGET<br>KINERJA Tahun<br>2020<br>(PASCA<br>REFOCUSING<br>THP II) | TARGET REALISASI KINERJA TAHUN 2020 |                 |                 |                 |                 |                 | TARGET PERUBAHAN 2020 PASCA REFOCUSING TAHAP II |                     |                 |                     |                 |                     |       |                 |                     |                 | REALISASI<br>CAPAIAN<br>KINERJA<br>TAHUN 2020 |                     |                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                               |                                                            |                                 |                                                                                 | JAN                                 | FEB             | MARET           | APRIL           | MEI             | JUN             | JUL                                             |                     | AGST            |                     | SEPT            |                     | OKT   | NOV             |                     | DES             |                                               |                     |                       |
|     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                               |                                                            |                                 |                                                                                 | TARGET<br>MURNI                     | TARGET<br>MURNI | TARGET<br>MURNI | TARGET<br>MURNI | TARGET<br>MURNI | TARGET<br>MURNI | TARGET<br>MURNI                                 | TARGET<br>PERUBAHAN | TARGET<br>MURNI | TARGET<br>PERUBAHAN | TARGET<br>MURNI | TARGET<br>PERUBAHAN |       | TARGET<br>MURNI | TARGET<br>PERUBAHAN | TARGET<br>MURNI |                                               | TARGET<br>PERUBAHAN |                       |
| 1   | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                | 4                             | 5                                                          | 6                               | 6                                                                               | 7                                   | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              |                                                 | 13                  |                 | 14                  |                 | 15                  |       | 16              |                     | 17              |                                               | 18                  | 19= Total 7<br>s/d 18 |
| 4.  | Urusan Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Permukiman                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                               |                                                            |                                 |                                                                                 |                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                                                 |                     |                 |                     |                 |                     |       |                 |                     |                 |                                               |                     |                       |
|     | Tujuan : Meningkatkan<br>ketersediaan rumah layak huni<br>dan kawasan permukiman yang<br>berkualitas                                                                | 1). Persentase rumah<br>tangga yang memiliki<br>akses terhadap hunian<br>yang layak                                                              | 89,28%                        | 84,34%                                                     | 84,24%                          | 84,24%                                                                          |                                     |                 | 84,34%          |                 |                 | 84,34%          |                                                 |                     |                 | 84,34%              |                 |                     |       |                 |                     |                 | 84,24%                                        |                     |                       |
|     | Sasaran : Meningkatkan jumlah<br>rumah layak huni bagi<br>masyarakat dan masyarakat yang<br>memiliki keterbatasan akses<br>pembinaan perumahan                      | Persentase peningkatan<br>jumlah Rumah Layak<br>Huni                                                                                             | 34,16%                        | 5,04%                                                      | 5,95%                           | 5,95%                                                                           |                                     |                 | 5,04%           |                 |                 | 5,04%           |                                                 |                     |                 | 5,04%               |                 |                     |       |                 |                     |                 | 5,95%                                         |                     |                       |
| 1.  | Program Pembangunan<br>Perumahan 6)                                                                                                                                 | a). Persentase Rumah<br>Layak Huni yang<br>Disediakan                                                                                            | 12,50%                        | 0,00%                                                      | 4,57%                           | 1,92%                                                                           | 0,00%                               | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%                                           |                     | 0,00%           | 0,00%               |                 | 0,00%               |       | 0,00%           | 0,00%               |                 | 4,57%                                         |                     |                       |
|     |                                                                                                                                                                     | b). Persentase Rumah<br>tidak Layak Huni yang<br>tertangani                                                                                      | 37,24%                        | 4,89%                                                      | 10,35%                          | 6,58%                                                                           | 4,89%                               | 4,89%           | 4,89%           | 4,89%           | 5,13%           | 5,13%           |                                                 | 5,13%               |                 | 6,22%               | 6,22%           |                     | 6,22% |                 | 6,22%               |                 | 10,35%                                        |                     |                       |
| 1.a | Kegiatan Peningkatan dan<br>Pembangunan Perumahan<br>Swadaya                                                                                                        | Jumlah rumah yang<br>ditangani                                                                                                                   | 176.755                       | 68.304                                                     | 11.292                          | 7.904                                                                           | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 1.128           |                                                 |                     |                 | 5.082               |                 |                     |       |                 |                     | 5.082           |                                               | 11.292              |                       |
| 1.b | Kegiatan Penyediaan dan<br>Rehabilitasi Rumah<br>Terdampak Bencana,<br>Facilitasi Relokasi Program<br>Pemerintah, Rumah Umum<br>dan Rumah Khusus beserta<br>PSU nya | Jumlah rumah<br>terdampak bencana,<br>facilitasi relokasi<br>Program Pemerintah,<br>Rumah Umum dan<br>Rumah Khusus beserta<br>PSU nya tertangani | 1124                          | 150                                                        | 120                             | 116                                                                             | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                   | 0               | 116                 |                 |                     |       |                 |                     | 4               |                                               | 120                 |                       |
| 1.c | Kegiatan Perencanaan<br>Teknis dan Pembiayaan<br>Perumahan                                                                                                          | Jumlah dokumen yang<br>disusun                                                                                                                   | 10                            | 2                                                          | 2                               | 2                                                                               | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 1               | 0                                               | 0                   | 0               | 1                   | 0               | 0                   | 0     | 0               | 0                   | 0               | 0                                             | 2                   |                       |
|     |                                                                                                                                                                     | Jumlah unit rumah<br>yang dibangun                                                                                                               | 8.500                         | 0                                                          | 250                             | 205                                                                             | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 61              | 0                                               | 0                   | 0               | 189                 | 0               | 0                   | 0     | 0               | 0                   | 0               |                                               | 250                 |                       |

Target dan realisasi Jan-Juni  
tetap (tidak bisa diubah)


Target Juli-Des perubahan pasca refocusing tahap 2 dimasukkan  
di sebelah kolom target murni

**APBN**



# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


## PAGU – Rp 413.433.074.000

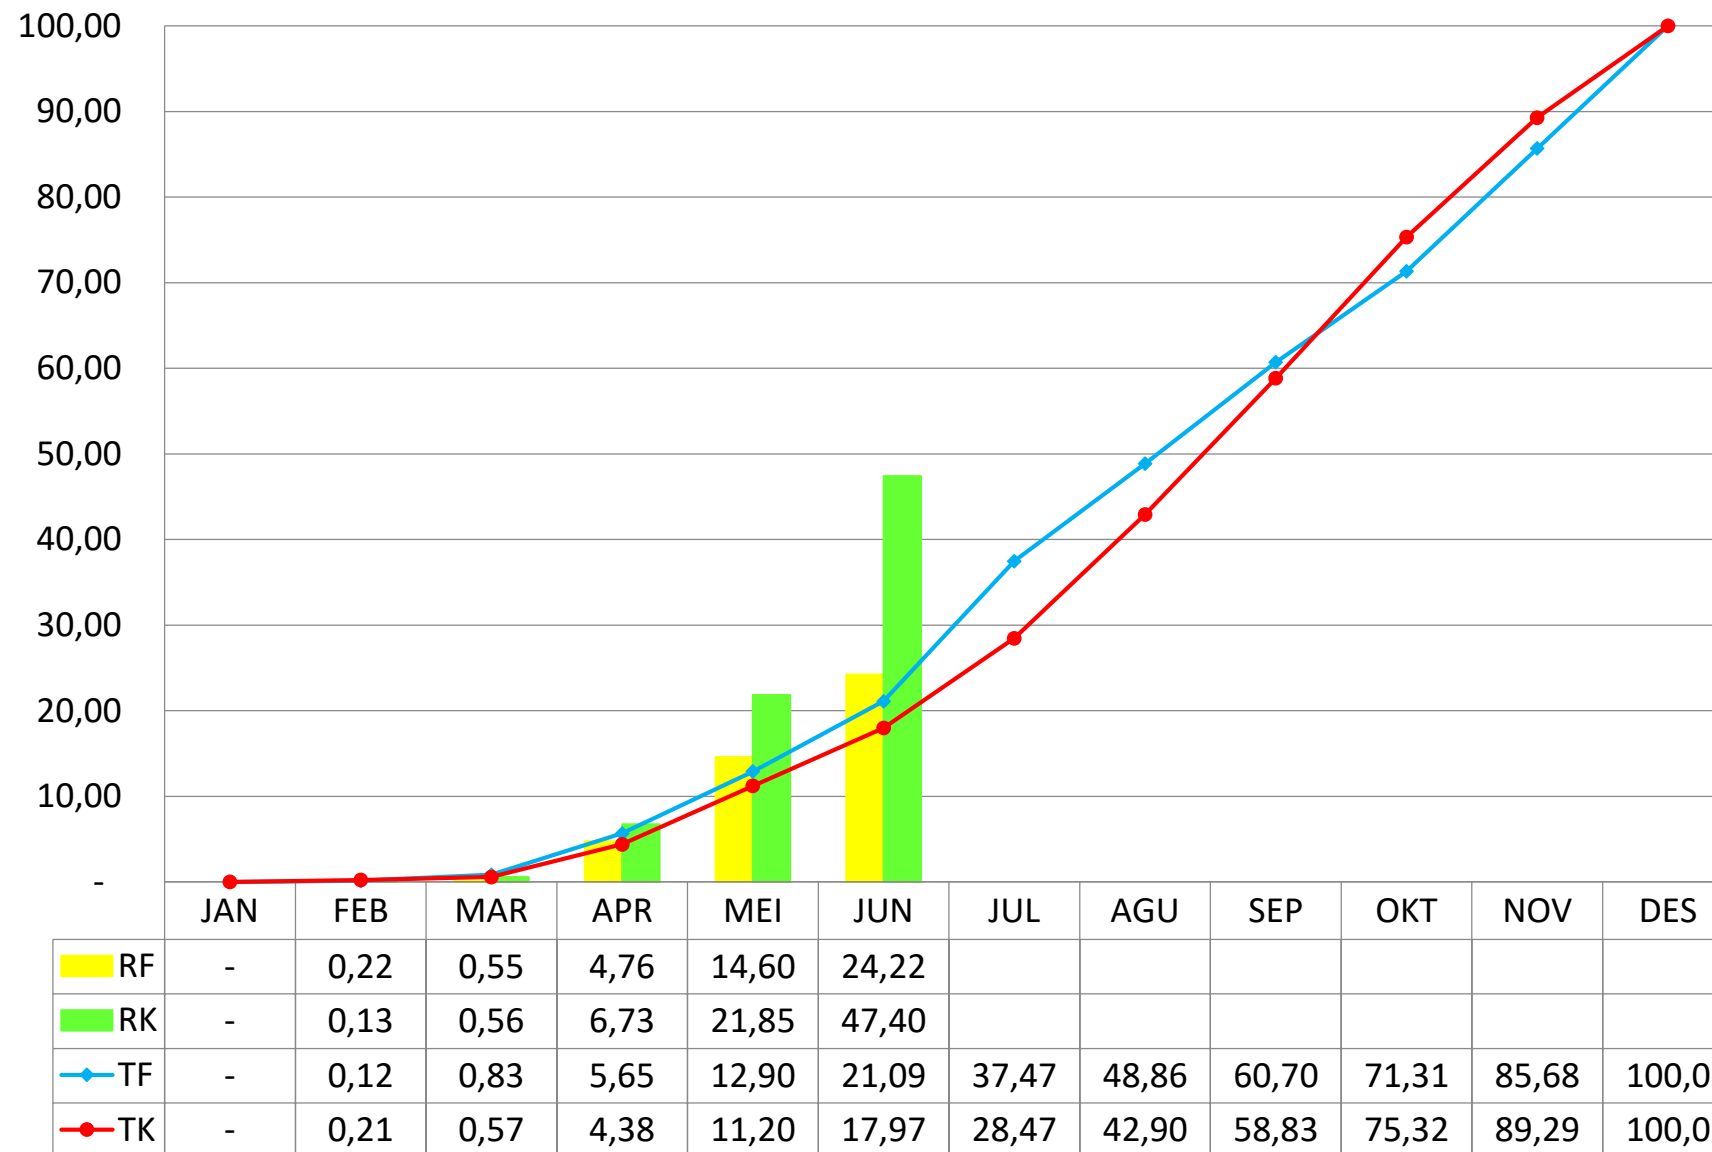

|             | Juni   | Juli  |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 24,52  | 37,47 |
| Real. Fisik | 24,22  |       |
| Dev. Fisik  | (0,30) |       |
| Renc. Keu   | 17,97  | 28,47 |
| Real. Keu   | 47,40  |       |
| Dev. Keu    | 29,43  |       |

# BPPW WILAYAH 1

## PAGU – Rp 362.683.900.000

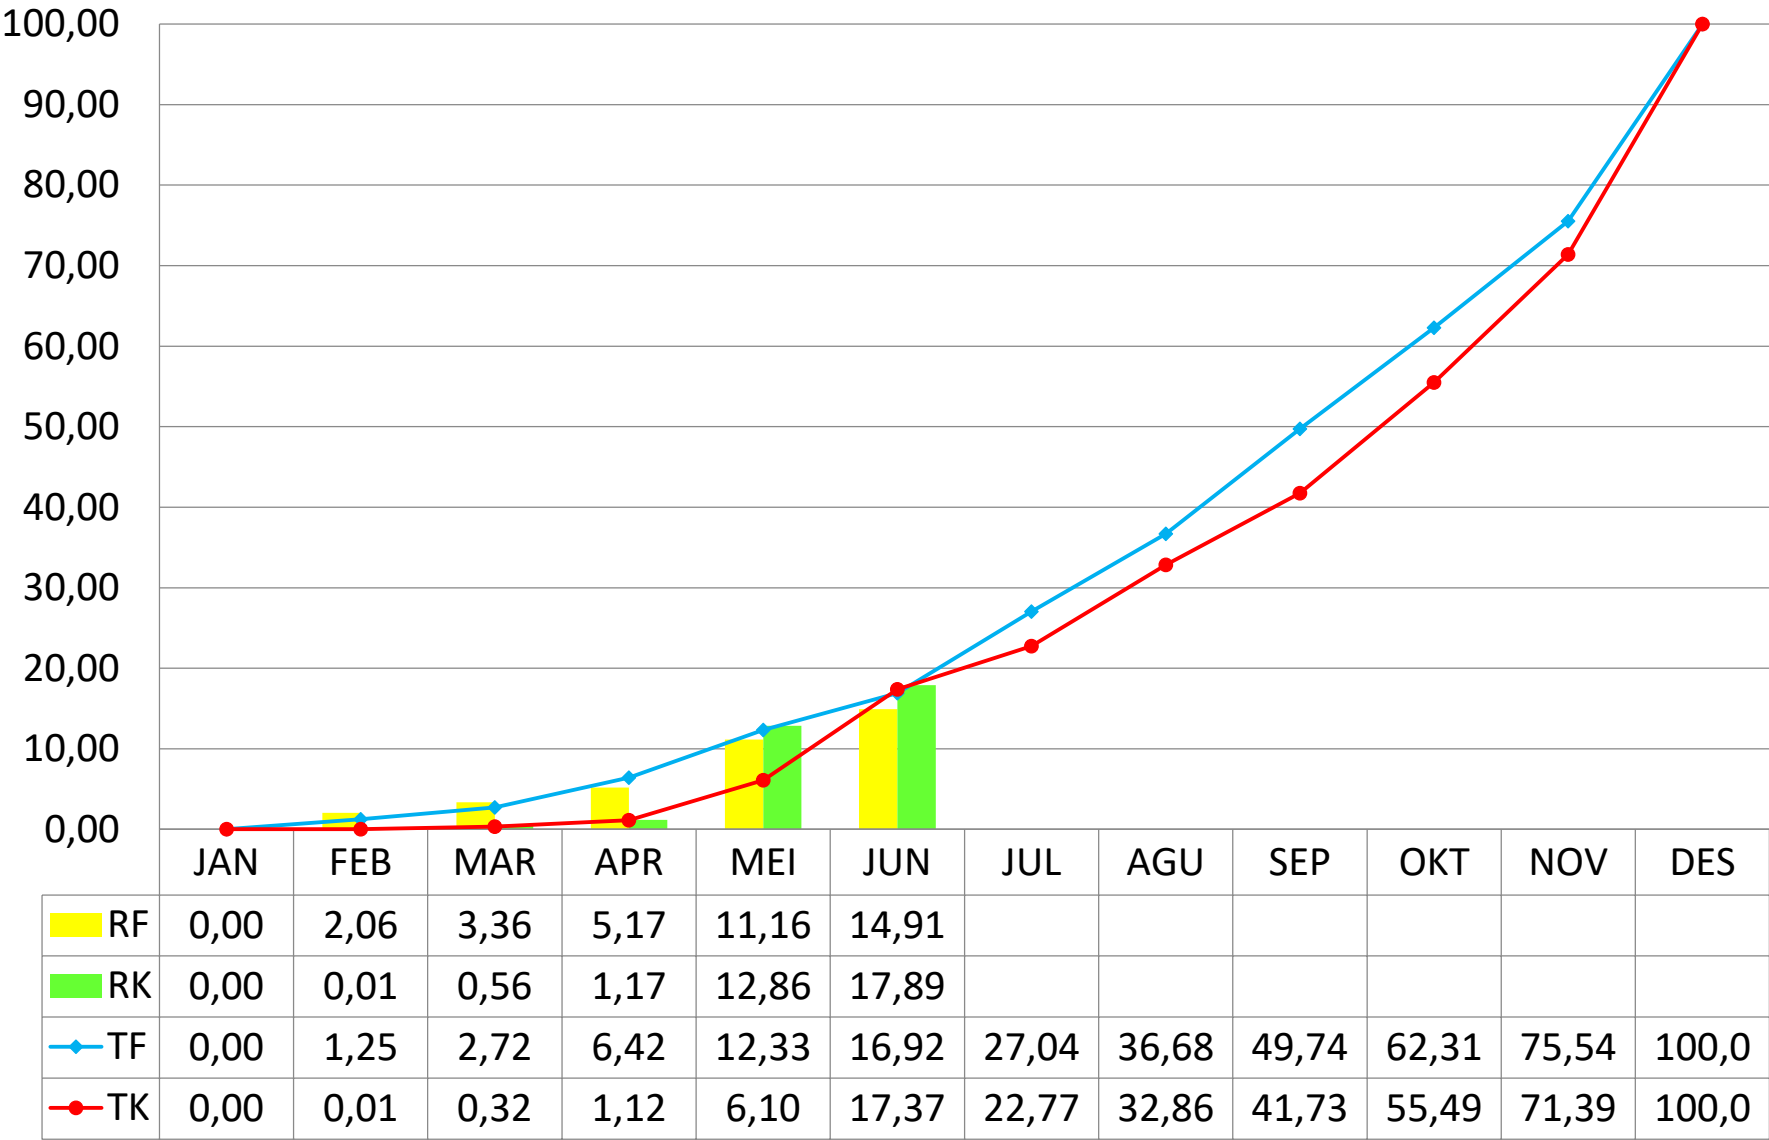

|             | Juni  | Juli  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 12,90 | 24,52 |
| Real. Fisik | 14,60 |       |
| Dev. Fisik  | 1,70  |       |
| Renc. Keu   | 12,95 | 24,81 |
| Real. Keu   | 21,92 |       |
| Dev. Keu    | 8,97  |       |

# BPPW WILAYAH 2

## PAGU – Rp 498.481.336.000

| NO.    | PROGRAM KEGIATAN | TOTAL PAKET | PAKET KEGIATAN |                  |                  |             |     |            |       | STATUS LELANG |               |              |
|--------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-----|------------|-------|---------------|---------------|--------------|
|        |                  |             | KONTRAKTUAL    |                  |                  |             | IBM | PL         |       | TERKONTRAK    | PROSES LELANG | BELUM LELANG |
|        |                  |             | JUMLAH         | MYC<br>2019-2020 | MYC<br>2020-2021 | SYC<br>2020 |     | Terkontrak | Belum |               |               |              |
|        |                  |             |                |                  |                  |             |     |            |       |               |               |              |
| 1      | PKP              | 63          | 6              |                  | 4                | 2           | 57  |            |       |               | 2             | 4            |
| 2      | PBL              | 20          | 6              |                  |                  | 6           |     | 8          | 6     |               | 6             |              |
| 3      | PSPLP            | 99          | 12             |                  | 2                | 10          | 87  |            |       | 2             | 7             | 3            |
| 4      | PSPAM            | 131         | 9              | 2                | 5                | 2           | 122 |            |       | 4             | 2             | 3            |
| 5      | PSPOP 1          | 17          | 10             | 2                | 6                | 2           |     | 1          | 6     | 2             | 1             | 6            |
| 6      | PSPOP 2          | 12          | 8              |                  | 2                | 6           |     |            | 4     | 1             | 6             | 2            |
| JUMLAH |                  | 342         | 51             | 4                | 19               | 28          | 266 | 9          | 16    | 9             | 24            | 18           |

| PAGU            | REALISASI KEUANGAN |       | REALISASI FISIK |
|-----------------|--------------------|-------|-----------------|
| (Rp.)           | (Rp.)              | (%)   | (%)             |
| 498.481.336.000 | 102.225.790.000    | 20,51 | 15,82           |



A solid red square is positioned on the left side of the image. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**

# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR MEI 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH


# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PENEKANAN APBD
7. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN




# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020

## PAGU AWAL




| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>44.612.807.000</b> |

## PAGU RASIONALISASI TAHAP 1

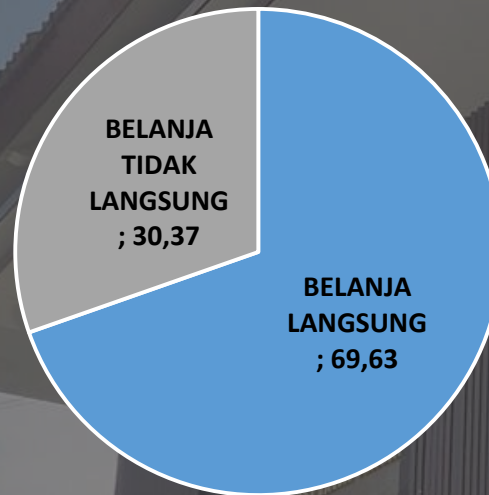

| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 26.855.467.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>38.567.858.000</b> |


## PAGU RASIONALISASI TAHAP 2




| BELANJA                | PAGU                  |
|------------------------|-----------------------|
| BELANJA LANGSUNG       | 22.311.773.000        |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>34.024.164.000</b> |

# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020


**PAGU AWAL**

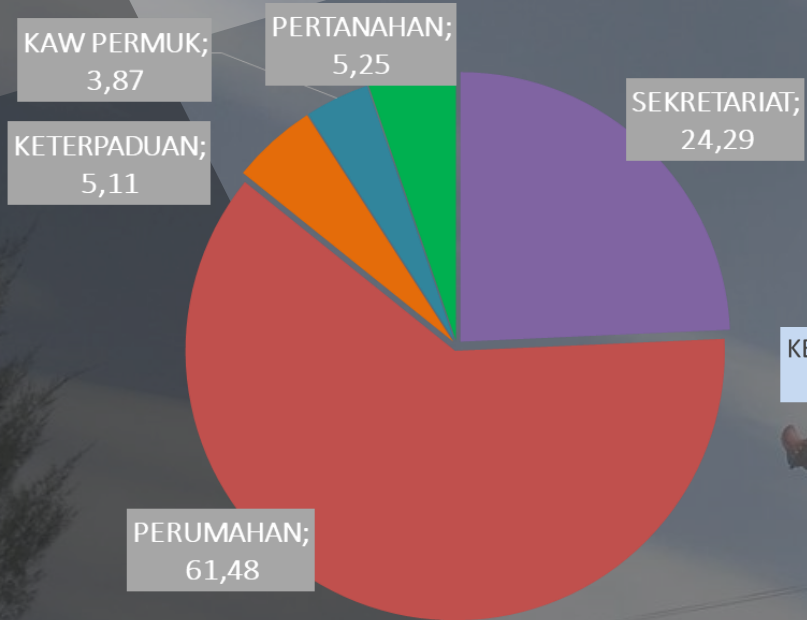

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 1**

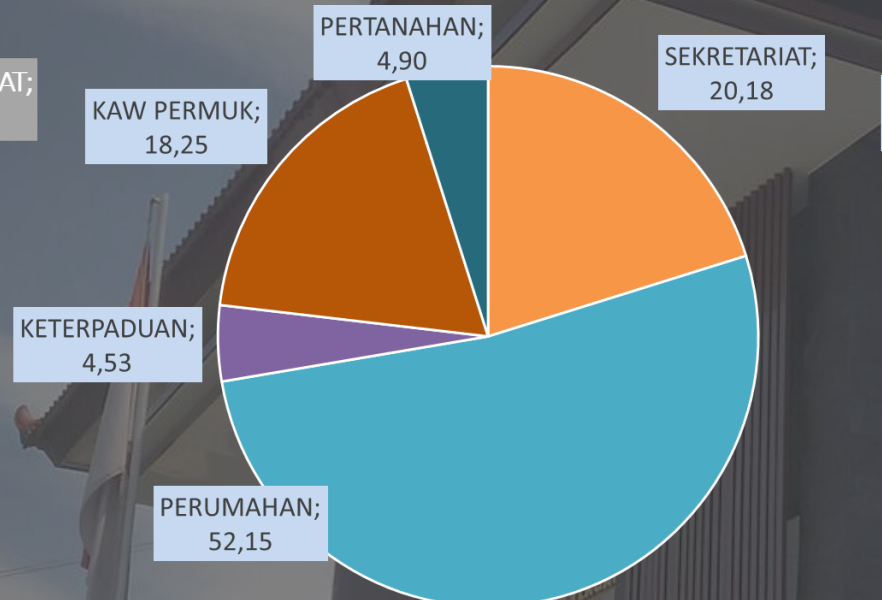

**PAGU RASIONALISASI  
TAHAP 2**

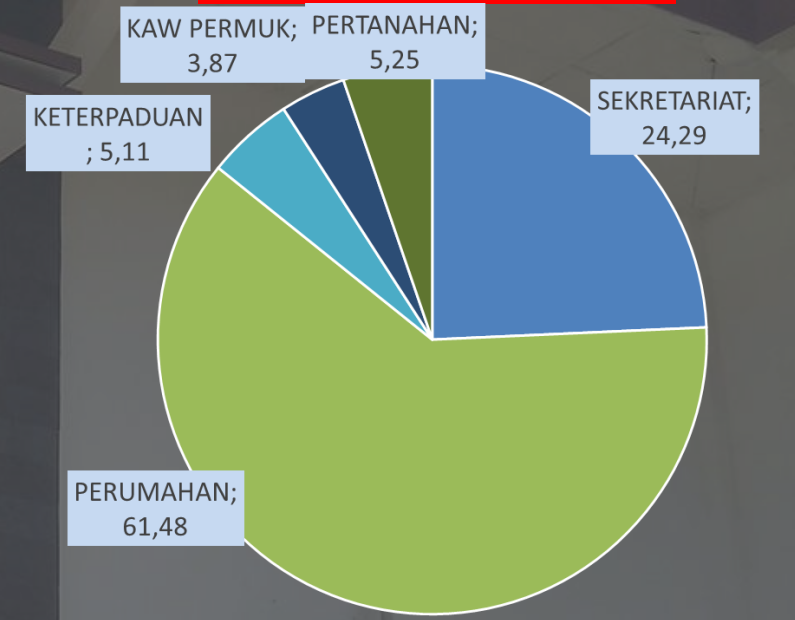

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 20,18  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.004.532.000 | 52,15  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.215.949.000  | 4,53   |
| 4     | KAW PERMUK  | 4.900.626.000  | 18,25  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.314.827.000  | 4,90   |
| TOTAL |             | 26.855.467.000 | 100,00 |

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 24,29  |
| 2     | PERUMAHAN   | 13.716.562.000 | 61,48  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.140.949.000  | 5,11   |
| 4     | KAW PERMUK  | 862.902.000    | 3,87   |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.171.827.000  | 5,25   |
| TOTAL |             | 22.311.773.000 | 100,00 |






# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

STATUS AKHIR MEI 2020

# DISPERAKIM

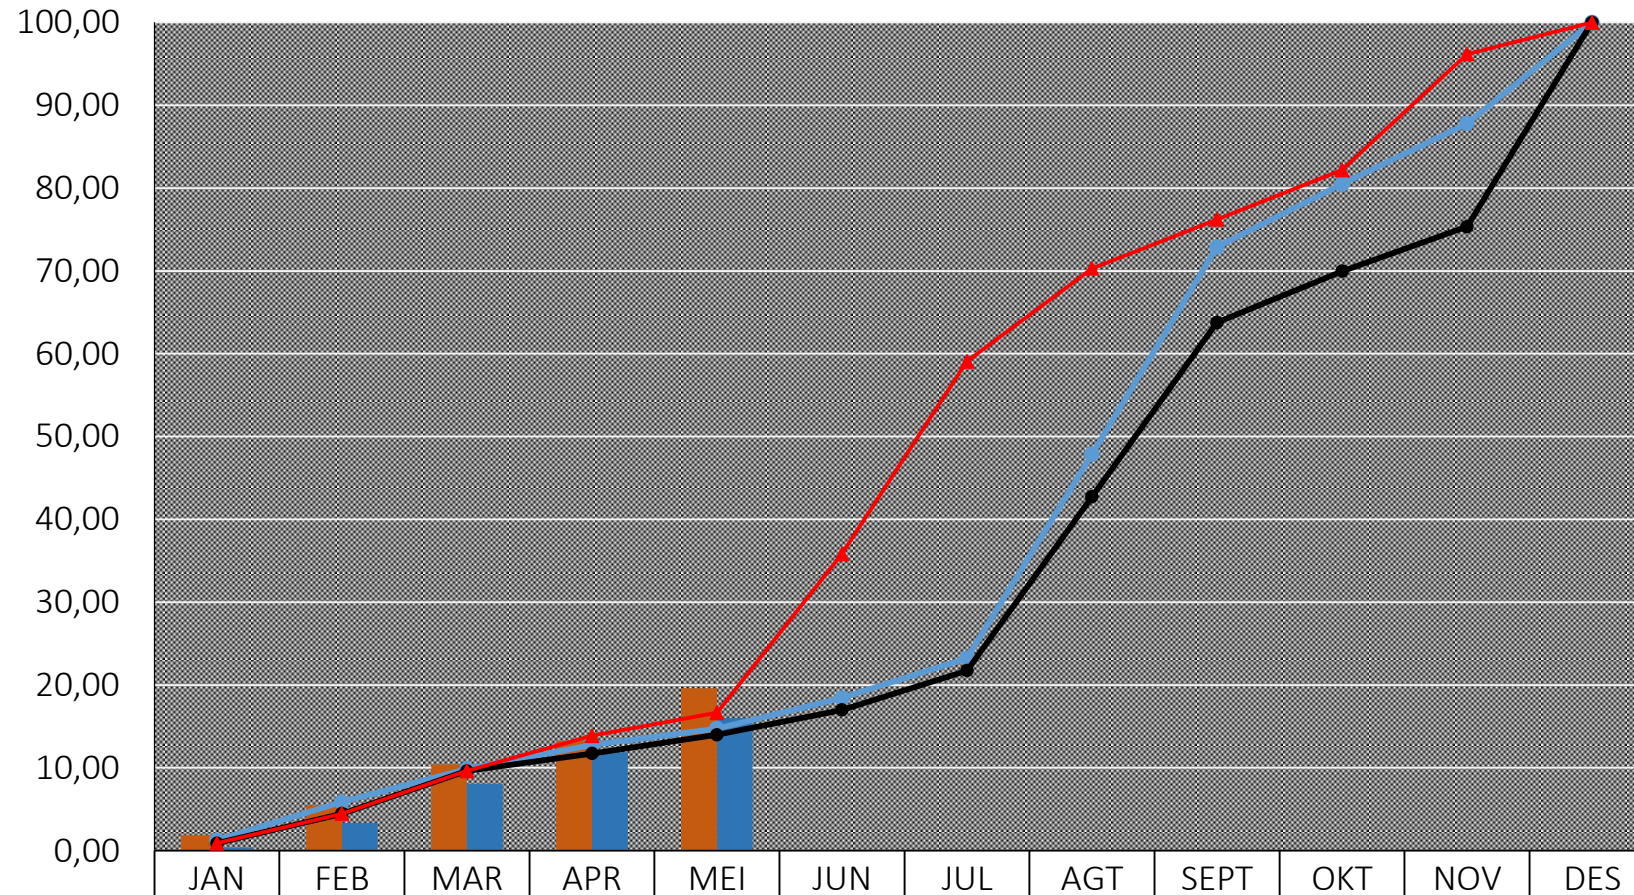


|             | Mei   | Juni  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 14,74 | 18,43 |
| Real. Fisik | 19,60 |       |
| Dev. Fisik  | 4,86  |       |
| Renc. Keu   | 14,74 | 18,43 |
| Real. Keu   | 16,04 |       |
| Dev. Keu    | 1,30  |       |

|            | JAN  | FEB  | MAR   | APR   | MEI   | JUN   | JUL   | AGT   | SEPT  | OKT   | NOV   | DES    |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REAL FISIK | 1,84 | 5,46 | 10,41 | 13,23 | 19,60 |       |       |       |       |       |       |        |
| REAL KEU   | 0,36 | 3,35 | 8,05  | 11,88 | 16,04 |       |       |       |       |       |       |        |
| TF/K RAS 2 | 1,27 | 5,87 | 9,85  | 12,76 | 14,74 | 18,43 | 23,23 | 47,87 | 72,87 | 80,48 | 87,81 | 100,00 |
| TF/K RAS 1 | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 11,72 | 13,98 | 16,98 | 21,73 | 42,74 | 63,76 | 69,95 | 75,35 | 100,00 |
| TF/K AWAL  | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,00 |




# SEKRETARIAT

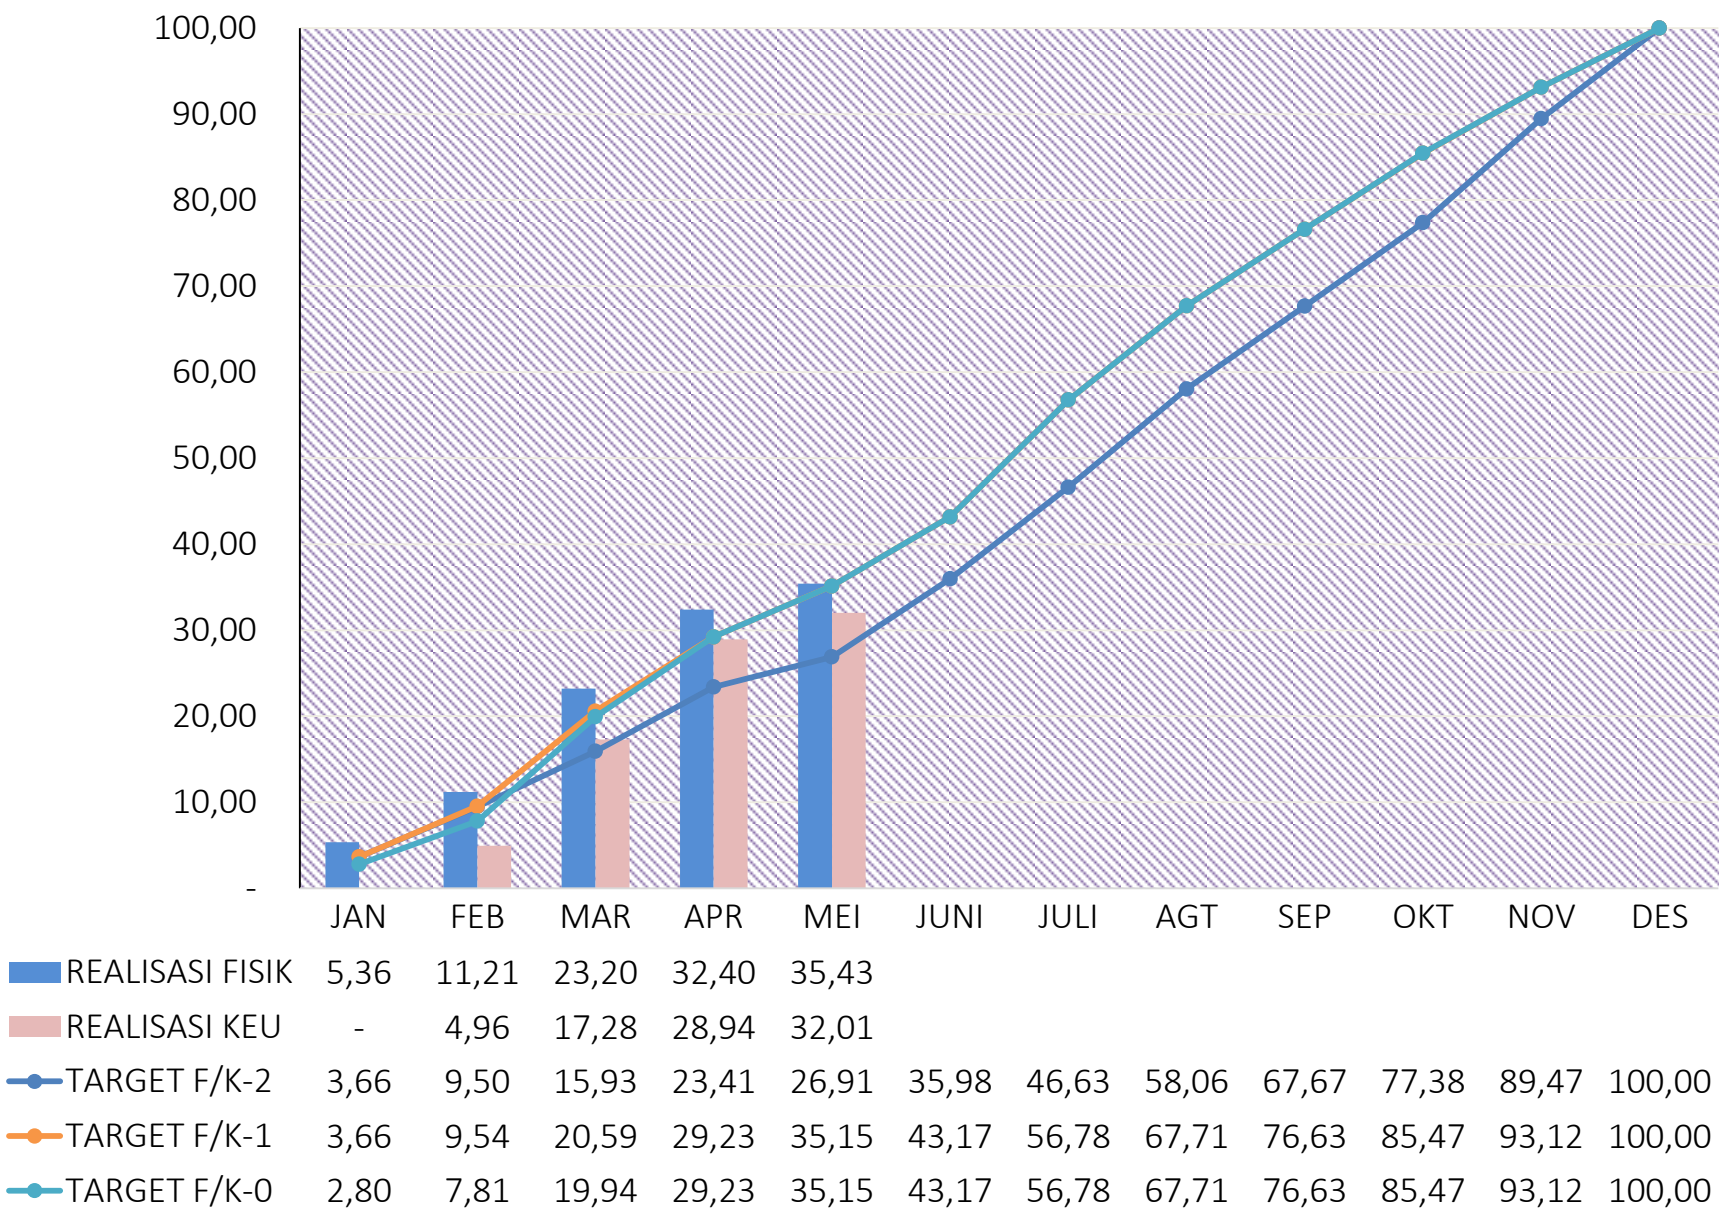


|             | Mei   | Juni  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 26,91 | 35,98 |
| Real. Fisik | 35,43 |       |
| Dev. Fisik  | 8,52  |       |
| Renc. Keu   | 26,91 | 35,98 |
| Real. Keu   | 32,01 |       |
| Dev. Keu    | 5,10  |       |

# PERUMAHAN

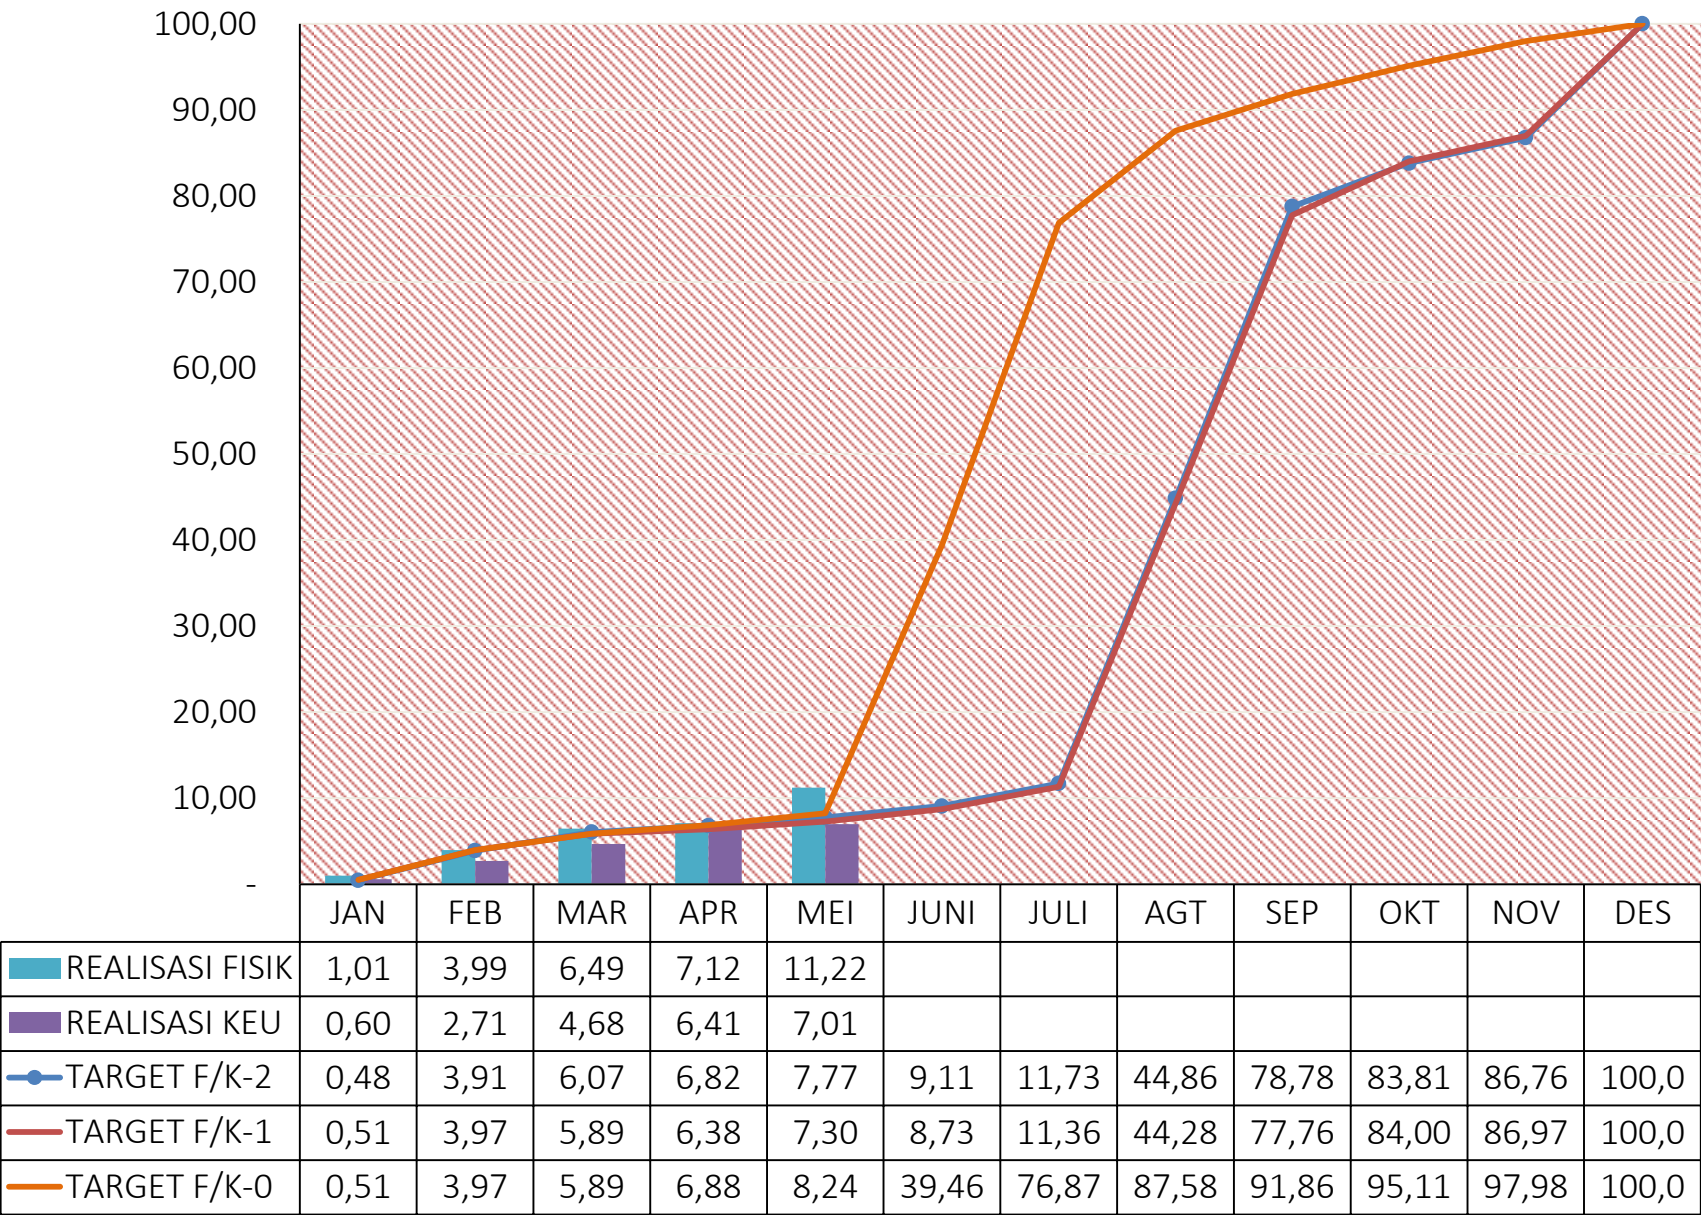


|             | Mei    | Juni |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 7,77   | 9,11 |
| Real. Fisik | 11,22  |      |
| Dev. Fisik  | 3,45   |      |
| Renc. Keu   | 7,77   | 9,11 |
| Real. Keu   | 7,01   |      |
| Dev. Keu    | (0,76) |      |

# KAWASAN PERMUKIMAN

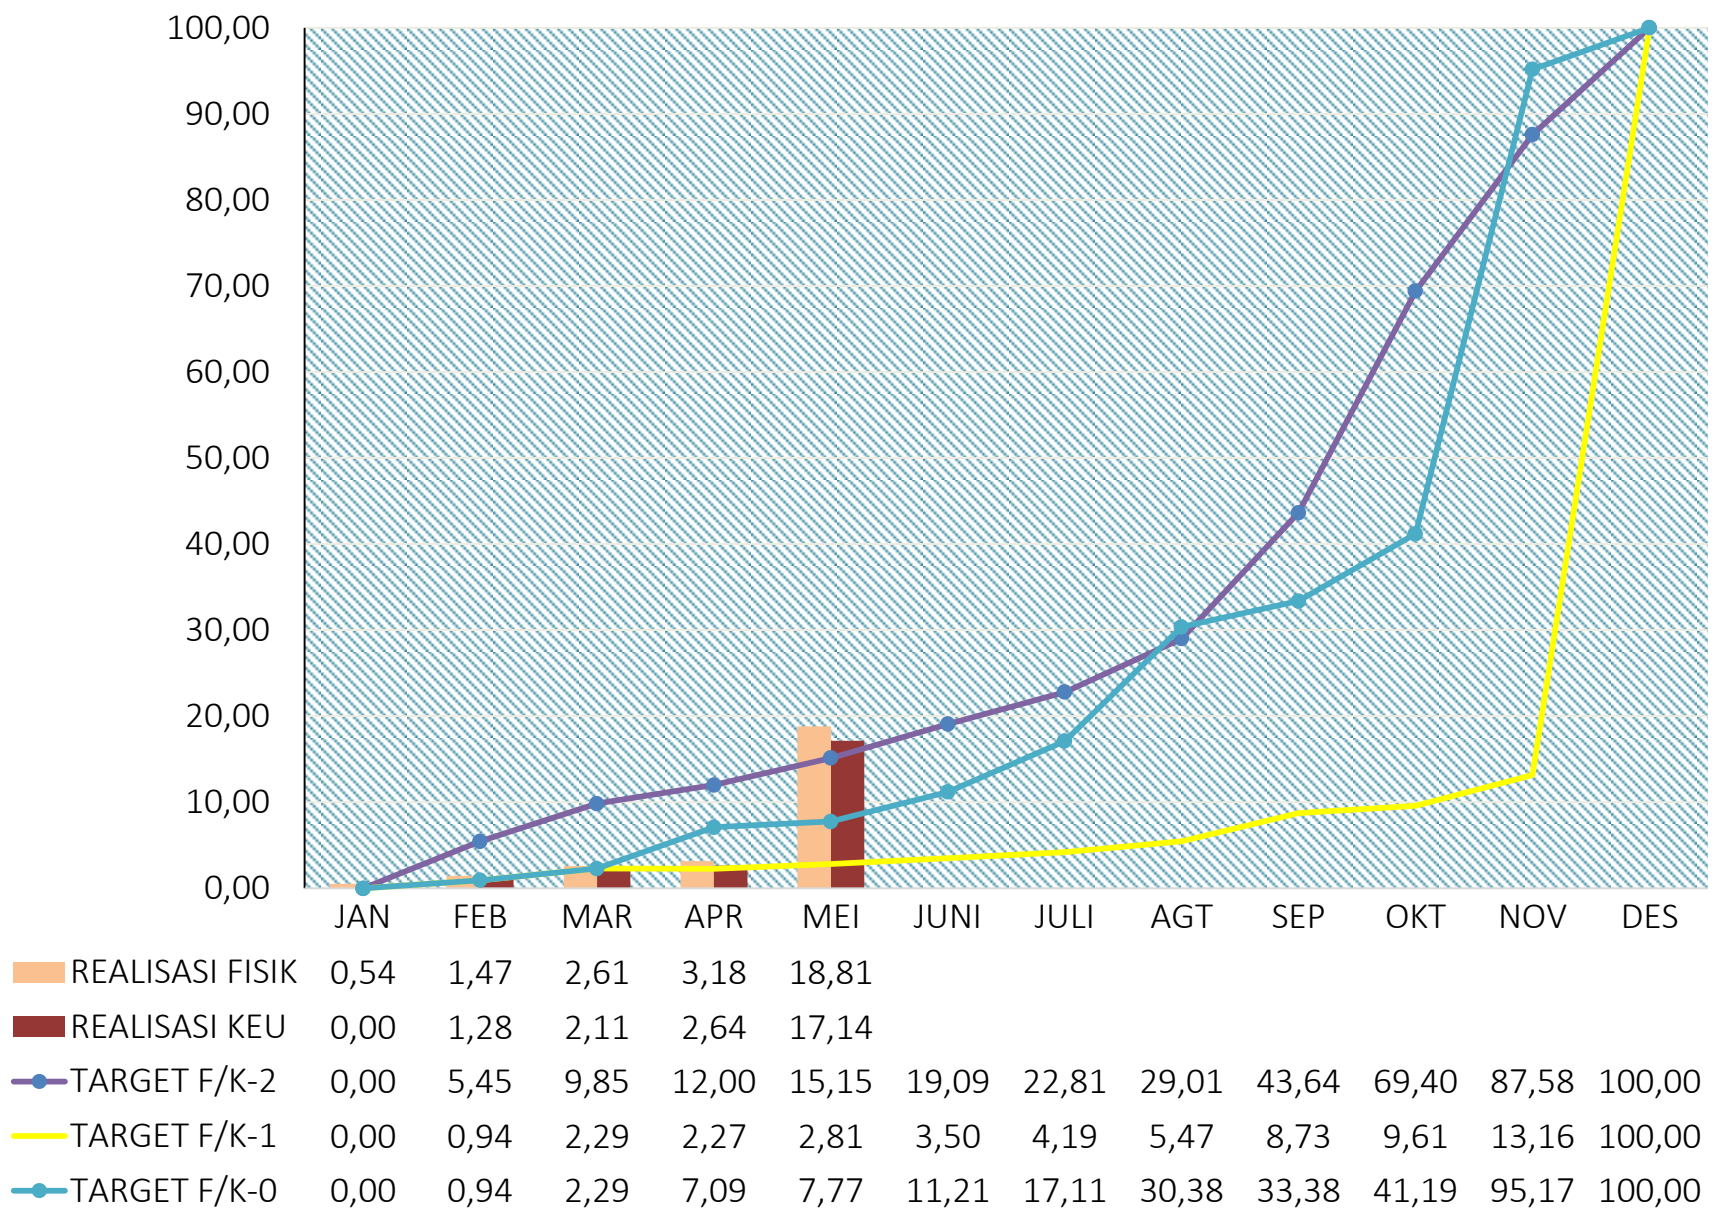


|             | Mei   | Juni  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 15,15 | 19,09 |
| Real. Fisik | 18,81 |       |
| Dev. Fisik  | 3,66  |       |
| Renc. Keu   | 15,15 | 19,09 |
| Real. Keu   | 17,14 |       |
| Dev. Keu    | 1,99  |       |

# KETERPADUAN PKPP

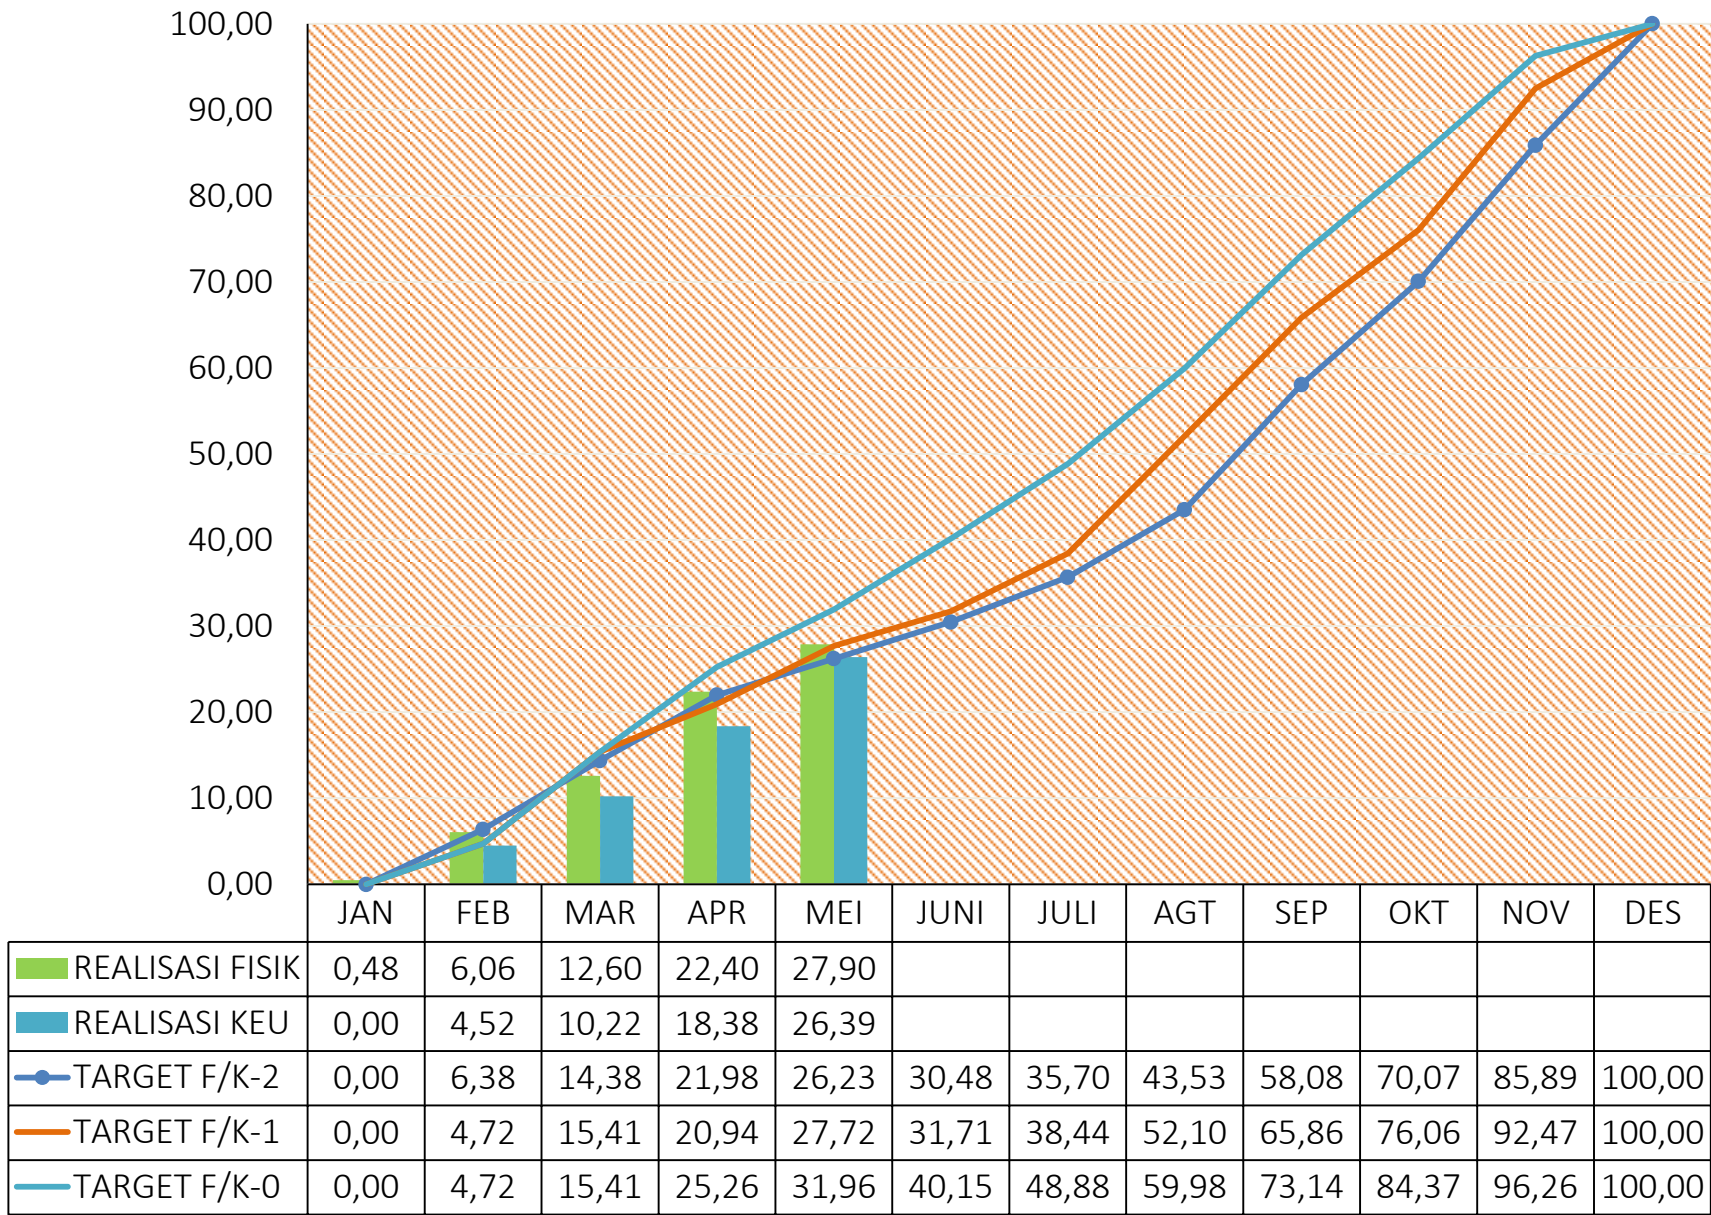

|             | Mei   | Juni  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 26,23 | 30,48 |
| Real. Fisik | 27,90 |       |
| Dev. Fisik  | 1,67  |       |
| Renc. Keu   | 26,23 | 30,48 |
| Real. Keu   | 26,39 |       |
| Dev. Keu    | 0,16  |       |

# PERTANAHAN

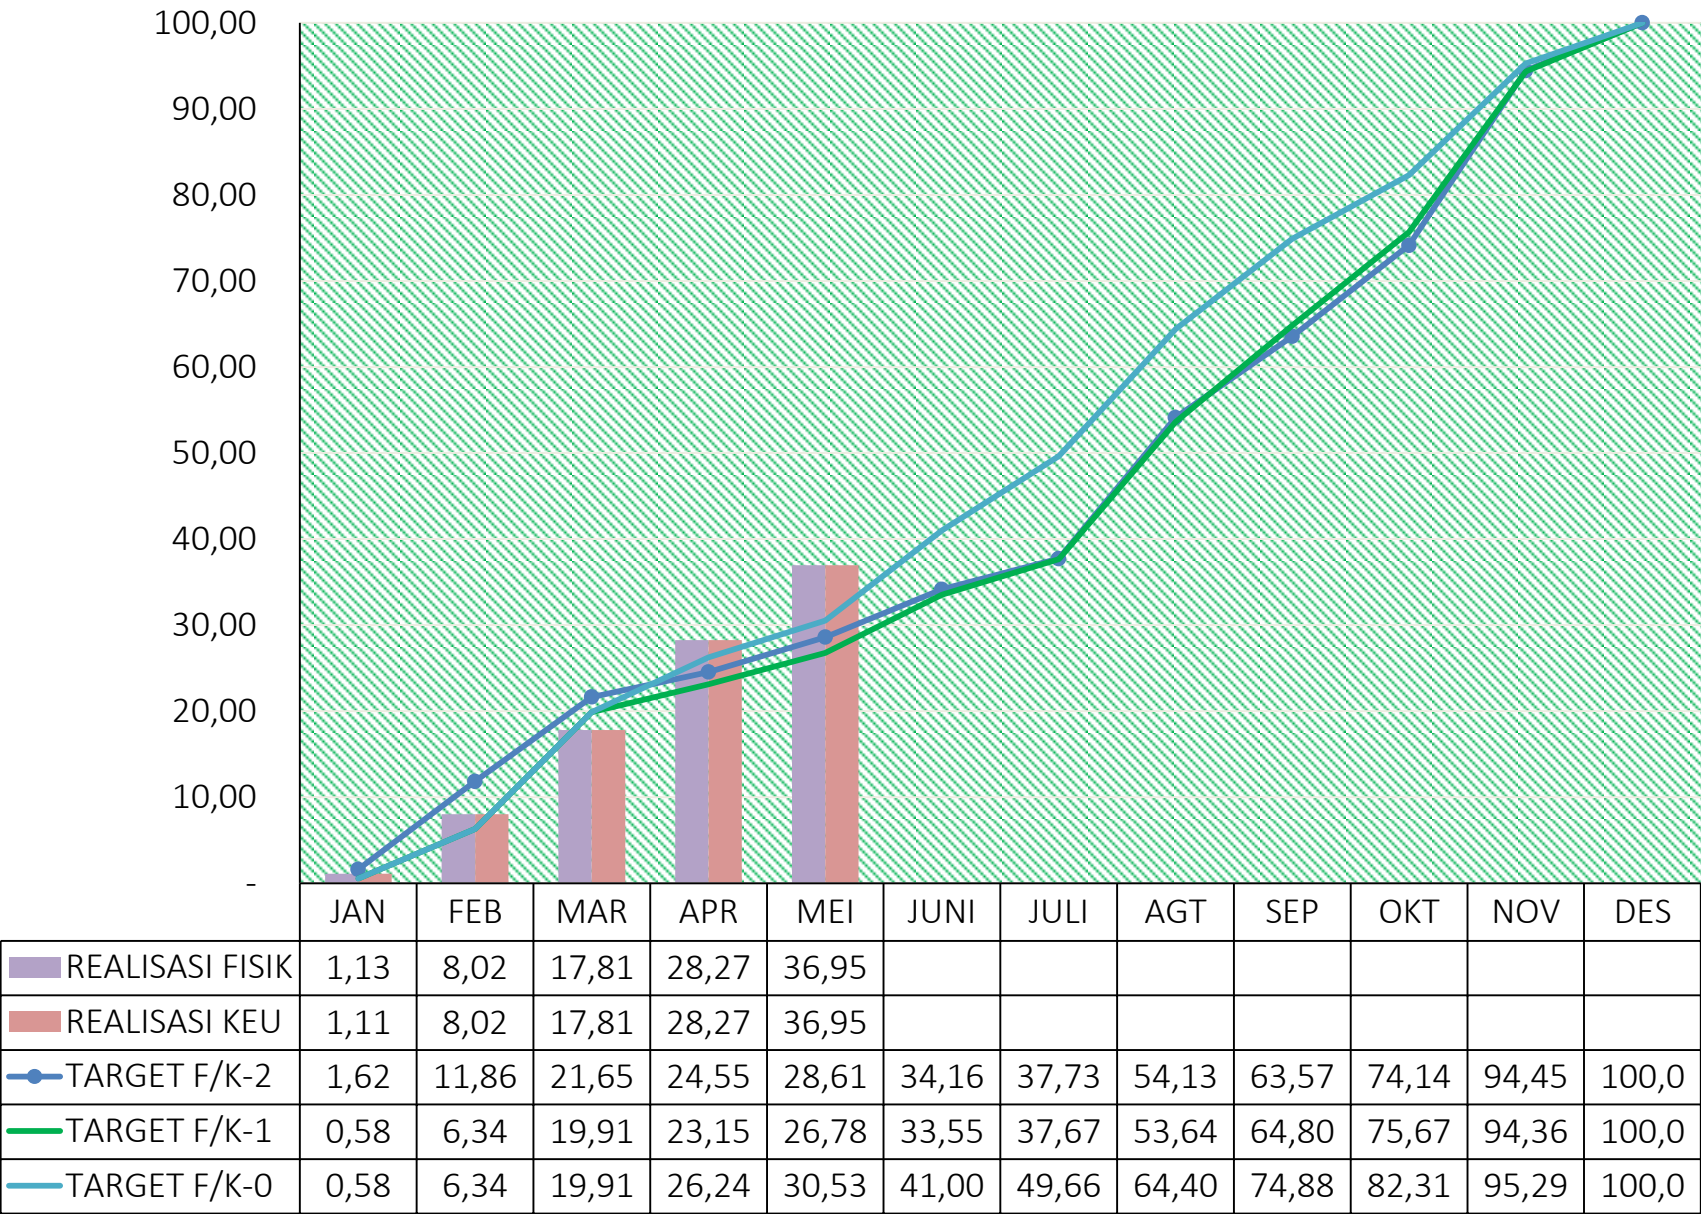

|             | Mei   | Juni  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 28,61 | 34,16 |
| Real. Fisik | 36,95 |       |
| Dev. Fisik  | 8,34  |       |
| Renc. Keu   | 28,61 | 34,16 |
| Real. Keu   | 36,95 |       |
| Dev. Keu    | 8,34  |       |



# **PENJELASAN KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**

STATUS AKHIR MEI 2020

# SEKRETARIAT


| NO | KEGIATAN                                                                        | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 | FISIK   | KEU   |                                                                        |
| 1  | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                       | -       | -0,06 | Menyesuaikan Kebutuhan                                                 |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                 | -       | -0,07 | Menyesuaikan Kebutuhan                                                 |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah           | -       | -4,92 | Menyesuaikan Kebutuhan (efisiensi)                                     |
| 4  | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | -       | -0,03 | Adanya larangan perjalanan dinas untuk menghindari penyebaran COVID-19 |
| 5  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah  | -       | -1,31 | Sisa Lelang                                                            |



# BIDANG PERUMAHAN


| NO | KEGIATAN                                                                                                                                 | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          | FISIK   | KEU   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                              | -       | -0,60 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | -       | -4,00 | 1. Efisiensi pada biaya dekorasi, dokumentasi<br>2. Silpa Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni<br>3. Beberapa paket masih belum dibayarkan, antara lain Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH yang akan dibayarkan di bulan Nopember / Desember |
| 3  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | -       | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# BIDANG KETERPADUAN PKPP



| NO | KEGIATAN                                                                               | DEVIASI |       | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|
|    |                                                                                        | FISIK   | KEU   |            |
| 1  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan | -       | -0,06 |            |





# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

STATUS AKHIR MEI 2020

# REKAP PENGADAAN BARANG/JASA

| NO | BIDANG             | PAGU           | SWAKELOLA     |     | PENGADAAN LANGSUNG |     | TENDER         |     | TENDER CEPAT |     | TOTAL PAKET    |     |
|----|--------------------|----------------|---------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|
|    |                    |                | Rp            | Jml | Rp                 | Jml | Rp             | Jml | Rp           | Jml | Rp             | Jml |
| 1  | SEKRETARIAT        | 5.419.533.000  | 3.697.373.000 | 64  | 1.045.960.000      | 10  | 405.000.000    | 1   | 271.200.000  | 1   | 5.419.533.000  | 78  |
| 2  | PERUMAHAN          | 13.716.562.000 | 2.192.562.000 | 53  | 2.064.000.000      | 17  | 9.460.000.000  | 17  | -            | -   | 13.716.562.000 | 85  |
| 3  | KAWASAN PERMUKIMAN | 862.902.000    | 702.902.000   | 48  | -                  | -   | 160.000.000    | .1  | -            | -   | 862.902.000    | 48  |
| 4  | KETERPADUAN PKPP   | 1.140.949.000  | 633.249.000   | 48  | 507.700.000        | 10  | -              | -   | -            | -   | 1.140.949.000  | 58  |
| 5  | PERTANAHAN         | 1.171.827.000  | 1.106.827.000 | 41  | 65.000.000         | 1   | -              | -   | -            | -   | 1.171.827.000  | 42  |
|    | TOTAL              | 22.311.773.000 | 8.332.913.000 | 254 | 3.682.660.000      | 38  | 10.025.000.000 | 18  | 271.200.000  | 1   | 22.311.773.000 | 311 |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                    | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE       | PROGRES LELANG                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                                                                                                            |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (7 bulan)               | 345.100.000         | Tender Cepat | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Juni 2020                                                                                                                       |
| 2                | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor                                  | 405.000.000         | Tender       | Persiapan lelang                                                                                                                                           |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                                                                                                            |
| 3                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan | 525.000.000         | Tender       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang  | 840.000.000         | Tender       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak    | 735.000.000         | Tender       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara   | 560.000.000         | Tender       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO. | KEGIATAN | NAMA PAKET                                                        | NILAI PAKET (Rp) | METODE | PROGRES LELANG                                                                                                                                             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati                   | 490.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 8   |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes       | 840.000.000      | Tender | Masa Sanggah                                                                                                                                               |
| 9   |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemalang     | 840.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 10  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara | 455.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 11  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo     | 385.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 12  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung   | 455.000.000      | Tender | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 13  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen      | 770.000.000      | Tender | Masa Sanggah                                                                                                                                               |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten                                                                                                  | 420.000.000      | Tender  | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga                                                                                                      |
| 15  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen                                                                                                  | 385.000.000      | Tender  | Masa Sanggah                                                                                                                                               |
| 16  |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo                                                                                               | 840.000.000      | Tender  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 17  |                                                                                                                                         | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru                                                                                                                     | 200.000.000      | Seleksi | Persiapan Lelang                                                                                                                                           |
| 18  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000      | Tender  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 19  |                                                                                                                                         | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000      | Seleksi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 20  |                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000      | Seleksi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |



# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.                       | KEGIATAN                                                                  | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                           |                                      |                  |         |                                                                                                                                                            |
| 21                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Pemukiman | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 1.000.000.000    | Tender  | DIRASIONALISASI                                                                                                                                            |
| 22                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 750.000.000      | Tender  | DIRASIONALISASI                                                                                                                                            |
| 23                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 500.000.000      | Tender  | DIRASIONALISASI                                                                                                                                            |
| 24                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000      | Tender  | DIRASIONALISASI                                                                                                                                            |
| 25                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000      | Tender  | DIRASIONALISASI                                                                                                                                            |
| 26                        |                                                                           | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000      | Tender  | DIRASIONALISASI                                                                                                                                            |
| 27                        | Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 160.000.000      | Seleksi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengumuman Pemenang Lelang</li><li>• Penandatanganan kontrak menunggu kepastian anggaran (rasionalisasi)</li></ul> |
| 28                        |                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 550.000.000      | Seleksi | DIRASIONALISASI                                                                                                                                            |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      |                                         |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020 |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020 |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Terkontrak 9 Maret 2020                 |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 197.600.000      | Persiapan lelang                        |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       | Persiapan lelang                        |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 8   |                                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      | Persiapan lelang                        |
| 9   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Persiapan lelang                        |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       |                                         |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       |                                         |
| 12  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020           |
| 13  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Belanja Sewa Hotel                                                                                        | 86.400.000       | Sudah terlaksana 6-7 Maret 2020         |

| REKAP PENGADAAN LANGSUNG BIDANG PERUMAHAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                  |                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| NO                                        | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                               |
| 1                                         | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020 |
| 2                                         |                                                                                                                                         | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       | Proses Persiapan Lelang                      |
| 3                                         |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 175.000.000      | Penyusunan HPS                               |
| 4                                         | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      | Sudah terkontrak tanggal 3 April 2020        |
| 5                                         |                                                                                                                                         | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 64.800.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020   |
| 6                                         |                                                                                                                                         | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 31 Januari 2020     |
| 7                                         | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan Akses Rusunawa Kota Semarang                                    | 50.000.000       |                                              |
| 8                                         |                                                                                                                                         | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 9                                         |                                                                                                                                         | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 10                                        |                                                                                                                                         | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 11                                        |                                                                                                                                         | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 12                                        |                                                                                                                                         | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 13                                        |                                                                                                                                         | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 14                                        |                                                                                                                                         | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      | proses penyusunan HPS                        |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Sewa Hotel 1                                                                                                    | 56.700.000       | <b>DIRASIONALISASI</b>                                        |
| 2   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel 2                                                                                                    | 56.700.000       | Rencana pelaksanaan bulan November                            |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       | Ditunda                                                       |
| 4   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Terkontrak tanggal 17 Februari 2020 (Masa kontrak 2 bulan)    |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Terkontrak Tanggal 12 Maret 2020                              |
| 6   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 3 Februari 2020 (Masa kontrak 11 bulan)    |
| 7   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 (Masa kontrak 10 bulan)   |
| 8   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel Forum Pokja PKP Paket Fullboard Dalam Daerah                                                         | 5.000.000        | Kemungkinan batal dilaksanakan (anggaran tdk mencukupi)       |
| 9   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 (Masa kontrak 10 bulan)   |
| 10  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Belanja Sewa Hotel                                                                                                      | 30.000.000       |                                                               |
| 11  |                                                                                                    | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                 | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 12 Februari 2020 (Masa kontrak 10,5 bulan) |

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KAW. PERMUKIMAN**

| NO. | KEGIATAN                                       | NAMA PAKET                          | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG  |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 60.000.000       | DIRASIONALISASI |
| 2   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 60.000.000       | DIRASIONALISASI |
| 3   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 50.000.000       | DIRASIONALISASI |

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                          | NAMA PAKET                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | Sewa Hotel Paket Full board             | 42.500.000       | Ditunda terkait larangan perjalanan dinas dan berkumpul secara massal karena wabah COVID-19. Realokasi anggaran penanganan COVID-19, perencanaan kembali bulan November. |
| 2   |                                                                                                   | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 65.000.000       |                                                                                                                                                                          |

# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

| MEDIA        | JAN       | FEB       | MAR       | APR       | MEI       | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Facebook     | 1         | 3         | 1         | 0         | 0         |     |     |     |     |     |     |     |
| Instagram    | 2         | 1         | 1         | 0         | 3         |     |     |     |     |     |     |     |
| Ponsel/SMS   | 7         | 5         | 7         | 0         | 0         |     |     |     |     |     |     |     |
| Web          | 11        | 10        | 4         | 2         | 6         |     |     |     |     |     |     |     |
| Whatsapp     | 10        | 5         | 4         | 11        | 1         |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>TOTAL</b> | <b>31</b> | <b>24</b> | <b>17</b> | <b>13</b> | <b>10</b> |     |     |     |     |     |     |     |

**Jumlah Laporan yang masuk pada bulan MEI 2020 sebanyak 10 Laporan, dengan rincian :**

a. TUNTAS DIJAWAB = 10 LAPORAN

b. MASIH DALAM PROSES BIDANG = 0 LAPORAN

# PENEKANAN APBD

1. Berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jateng tanggal 29 Mei 2020 No. 900/0004371 tentang Pencairan Setelah Rasionalisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, disampaikan bahwa **pengajuan pencairan harap berdasarkan pada hasil penyesuaian pada aplikasi e-budgeting dan e-project planning yang telah diinput oleh masing-masing bidang pada 30 Mei s.d. 4 Juni lalu.**
2. Berdasarkan informasi dari Biro APBJ, paket kontraktual boleh berjalan dengan berkoordinasi dengan Biro APBJ terlebih dahulu.
3. Berdasarkan SE No. 800/1292 tanggal 20 Mei 2020 tentang Pembatasan Perjalanan dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka:
  - Kriteria pengecualian pembatasan perjalanan bagi ASN keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum antara lain bagi Perjalanan Dinas ASN yang bekerja pada Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Pelayanan percepatan penanganan COVID-19, Pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, Pelayanan kesehatan, Pelayanan kebutuhan dasar, Pelayanan pendukung layanan dasar dan Pelayanan fungsi ekonomi penting.
  - Persyaratan perjalanan dinas bagi ASN: menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan SKPD/Pejabat setingkat eselon II, menunjukkan identitas diri, menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR test/Rapid test atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan, Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan) kepada pimpinan.




**APBN**



# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

## PAGU – Rp 584.342.908.000

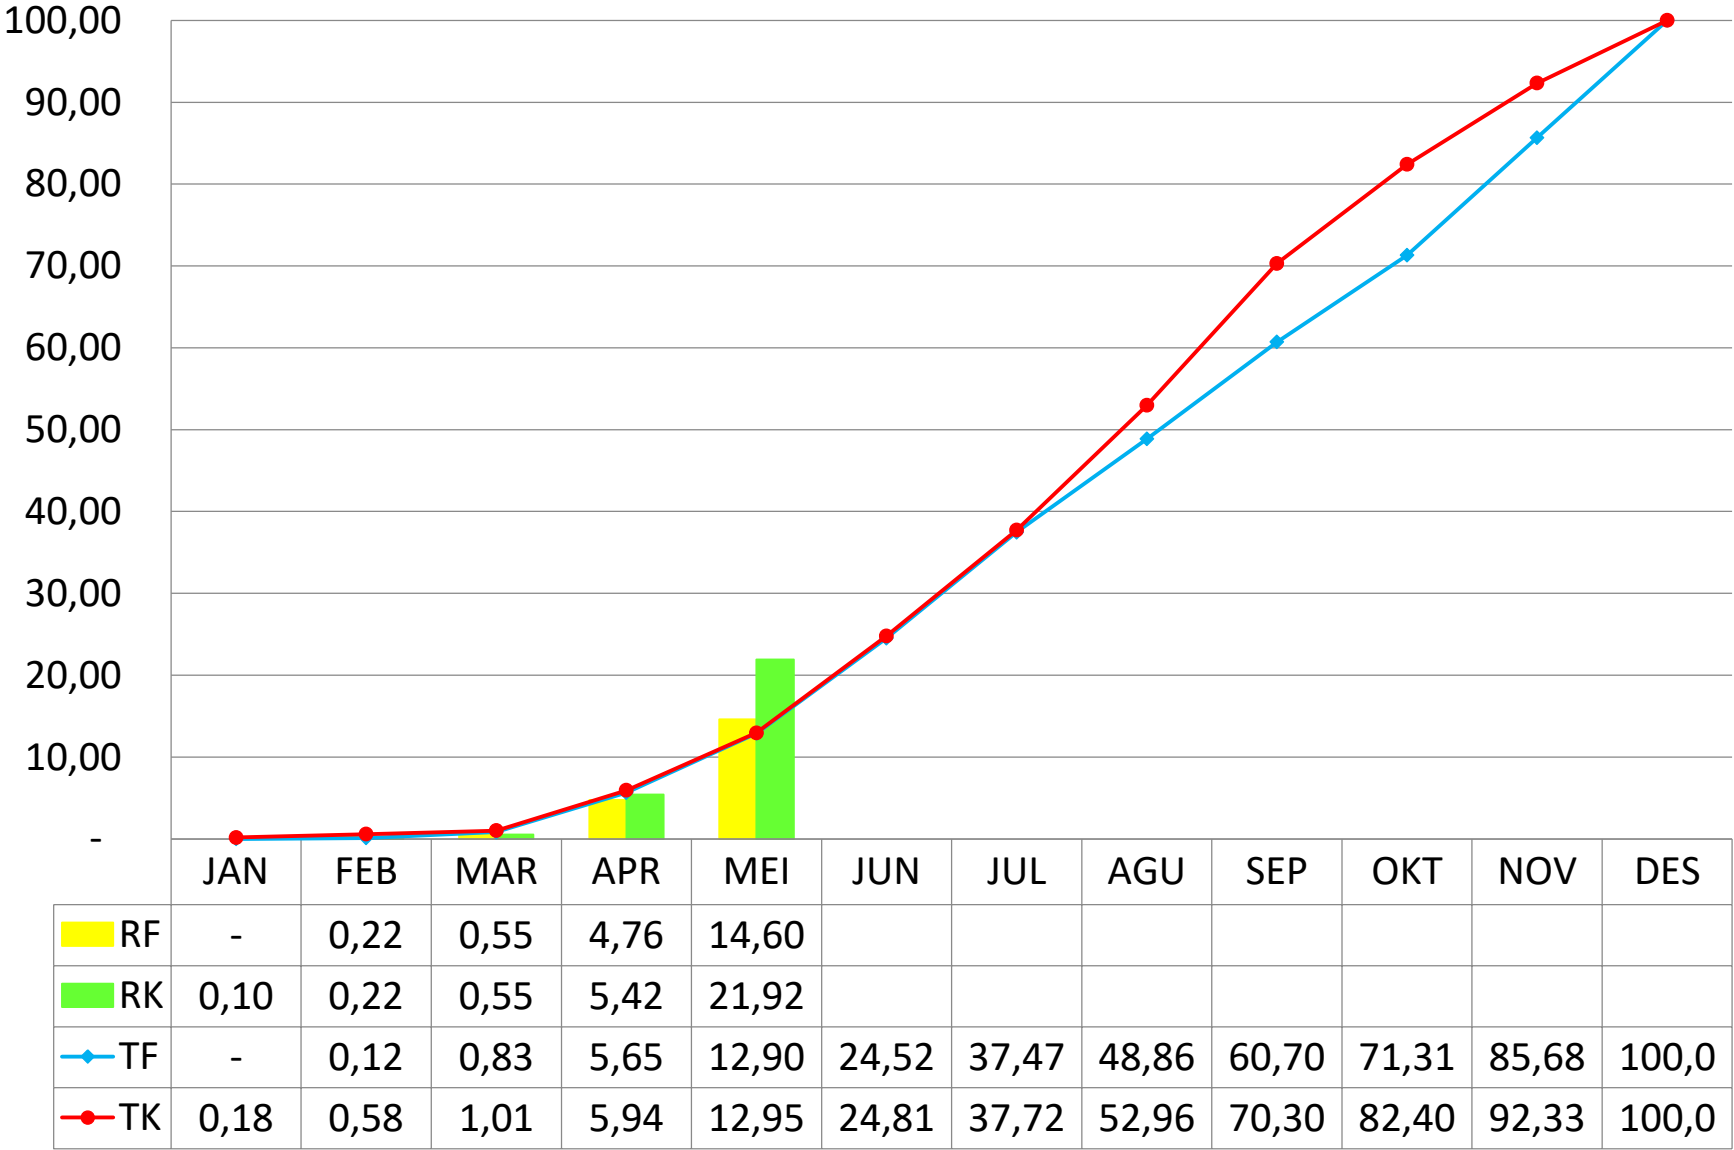


|             | Mei   | Juni  |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 12,90 | 24,52 |
| Real. Fisik | 14,60 |       |
| Dev. Fisik  | 1,70  |       |
| Renc. Keu   | 12,95 | 24,81 |
| Real. Keu   | 21,92 |       |
| Dev. Keu    | 8,97  |       |

# BPPW WILAYAH 1

## PAGU – Rp 362.683.900.000


Grafik Rencana dan Realisasi Keuangan

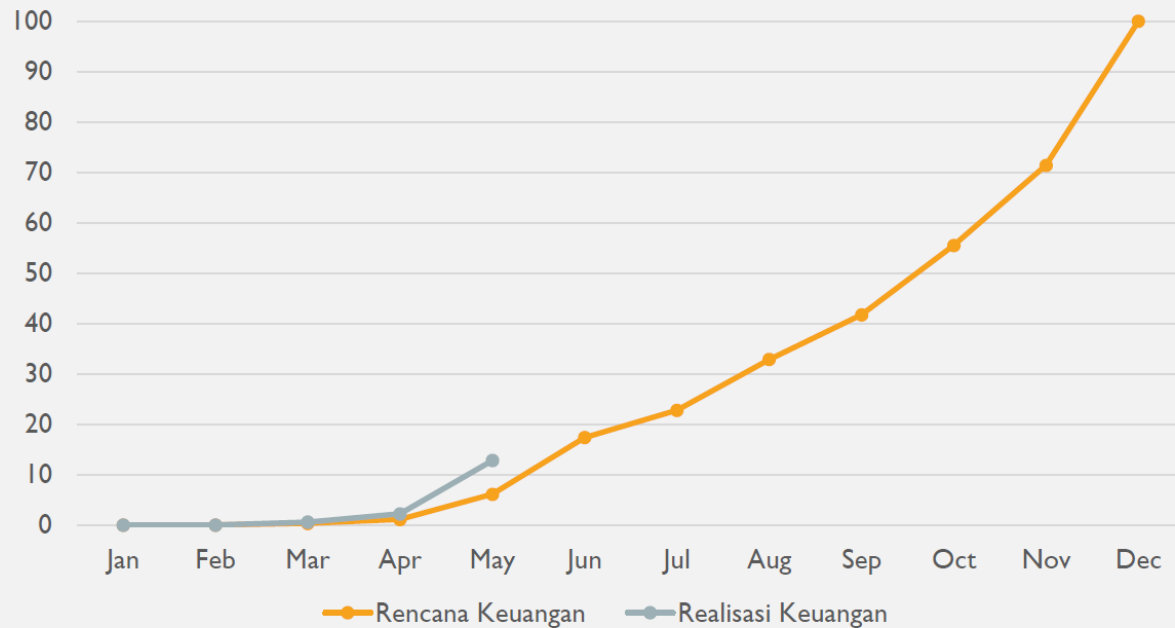

### Progres Keuangan

Rencana : 6,1 %  
Realisasi : 12,81 %

Grafik Rencana dan Realisasi Fisik

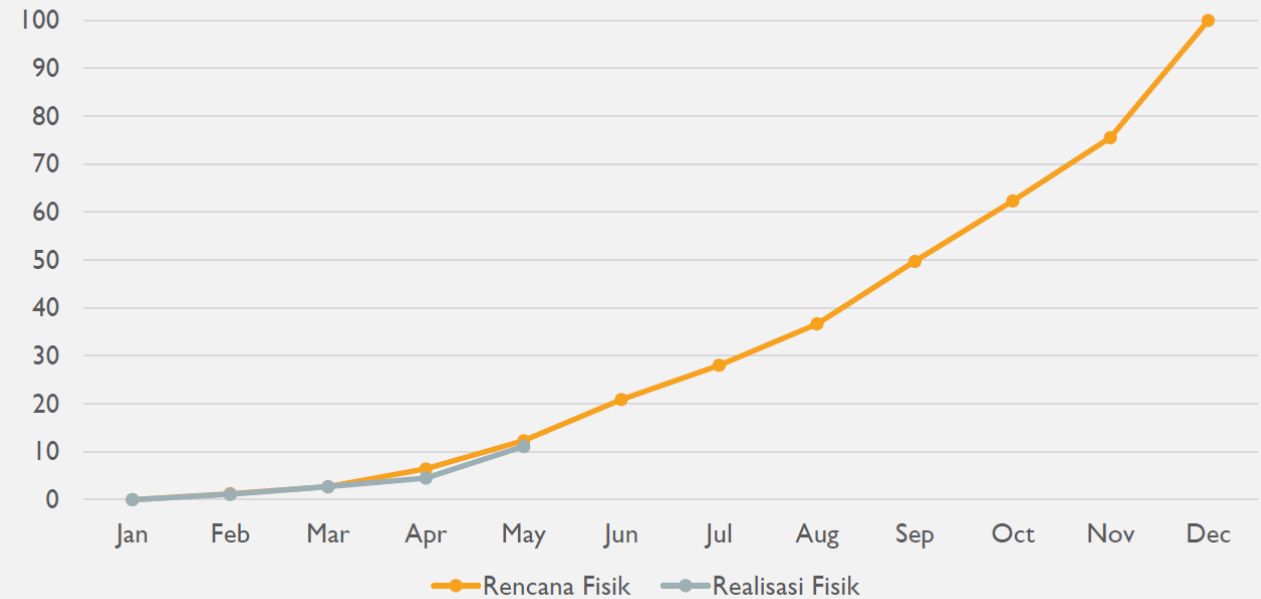

### Progres fisik

Rencana : 12,33 %  
Realisasi : 11,11 %

# BPPW WILAYAH 2

## PAGU – Rp 442.156.181.000

| NO.    | PROGRAM KEGIATAN | TOTAL PAKET | PAKET KEGIATAN |           |           |         |         |            |         | STATUS LELANG |               |              |
|--------|------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
|        |                  |             | KONTRAKTUAL    |           |           |         | IBM     | PL         |         | TERKONTRAK    | PROSES LELANG | BELUM LELANG |
|        |                  |             | JUMLAH         | MYC       | MYC       | SYC     |         | Terkontrak | Belum   |               |               |              |
|        |                  |             |                | 2019-2020 | 2020-2021 | 2020    |         |            |         |               |               |              |
|        |                  |             | (Paket)        | (Paket)   | (Paket)   | (Paket) | (Paket) | (Paket)    | (Paket) | (Paket)       | (Paket)       | (Paket)      |
| 1      | PKP              | 63          | 6              |           | 4         | 2       | 57      |            |         |               | 2             | 4            |
| 2      | PBL              | 20          | 6              |           |           | 6       |         | 8          | 6       |               | 6             |              |
| 3      | PSPLP            | 99          | 12             |           | 2         | 10      | 87      |            |         | 2             | 7             | 3            |
| 4      | PSPAM            | 131         | 9              | 2         | 5         | 2       | 122     |            |         | 4             | 2             | 3            |
| 5      | PSPOP 1          | 17          | 10             | 2         | 6         | 2       |         | 1          | 6       | 2             | 1             | 6            |
| 6      | PSPOP 2          | 12          | 8              |           | 2         | 6       |         |            | 4       | 1             | 6             | 2            |
| JUMLAH |                  | 342         | 51             | 4         | 19        | 28      | 266     | 9          | 16      | 9             | 24            | 18           |

|   |                              |   |                 |     |       |
|---|------------------------------|---|-----------------|-----|-------|
| * | Kontraktual                  | : | 307.159.303.000 | 51  | Paket |
|   | Adm Kontraktual              | : | 16.388.624.000  |     |       |
| * | PMK Demak & Grobogan (PSPOP) | : | 726.580.000     | 2   | Paket |
| * | PL                           | : | 2.816.687.000   | 25  | Paket |
| * | IBM                          |   |                 |     |       |
|   | - Fisik IBM                  | : | 103.289.060.000 | 263 | Paket |
|   | - Administrasi IBM           | : | 10.446.147.000  |     |       |
| * | Administrasi Umum            | : | 1.329.780.000   |     |       |
|   | TOTAL PAGU                   | : | 442.156.181.000 |     |       |

| REALISASI KEUANGAN |       | REALISASI FISIK |
|--------------------|-------|-----------------|
| (Rp.)              | (%)   | (%)             |
| 62.802.244         | 14,20 | 13,63           |

A solid red square is positioned on the left side of the image. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**

# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR APRIL 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH




# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PENEKANAN APBD
7. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN




# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020

## PAGU AWAL

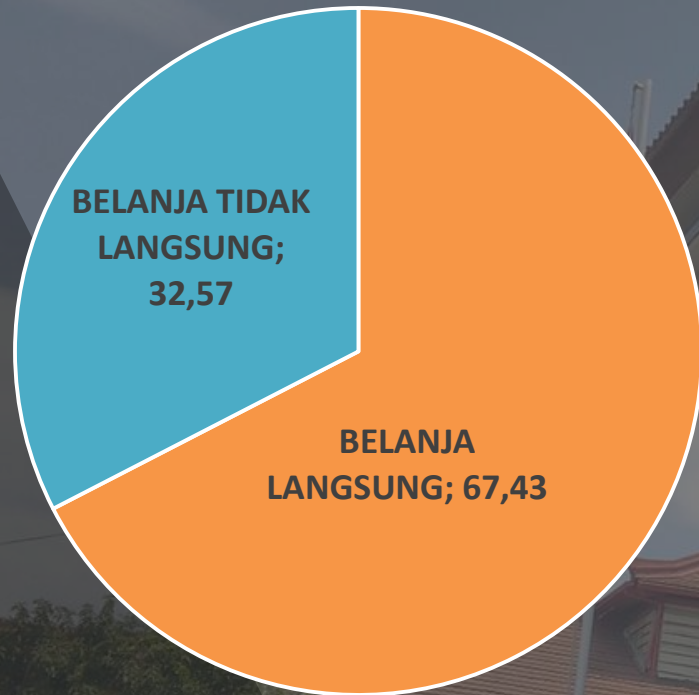

## SESUDAH RASIONALISASI REFOCUSING PENANGANAN DAMPAK COVID-19

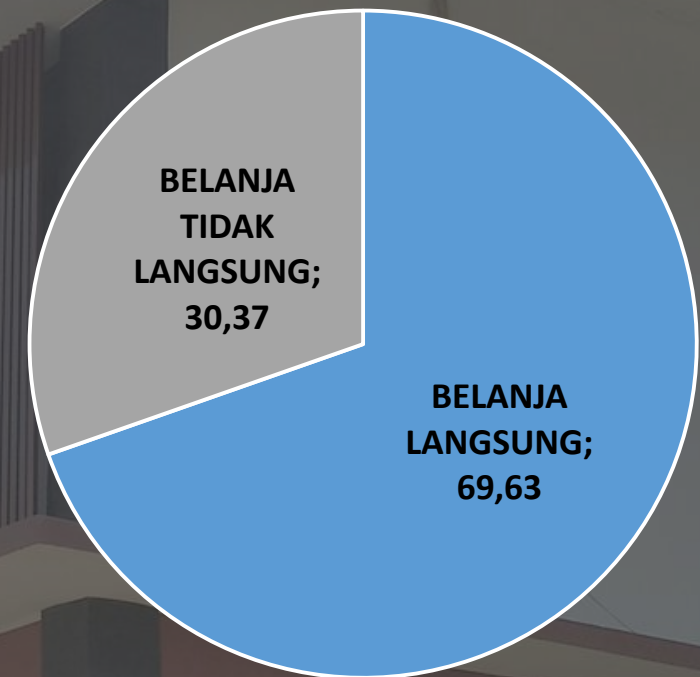


| NO | BELANJA                | PAGU           | %     |
|----|------------------------|----------------|-------|
| 1  | BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000 | 67,43 |
| 2  | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000 | 32,57 |
|    | TOTAL                  | 44.612.807.000 |       |

| NO | BELANJA                | PAGU           | %      |
|----|------------------------|----------------|--------|
| 1  | BELANJA LANGSUNG       | 26.855.467.000 | 69,63  |
| 2  | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 11.712.391.000 | 30,37  |
|    | TOTAL                  | 38.567.858.000 | 100,00 |


# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020

## PAGU AWAL

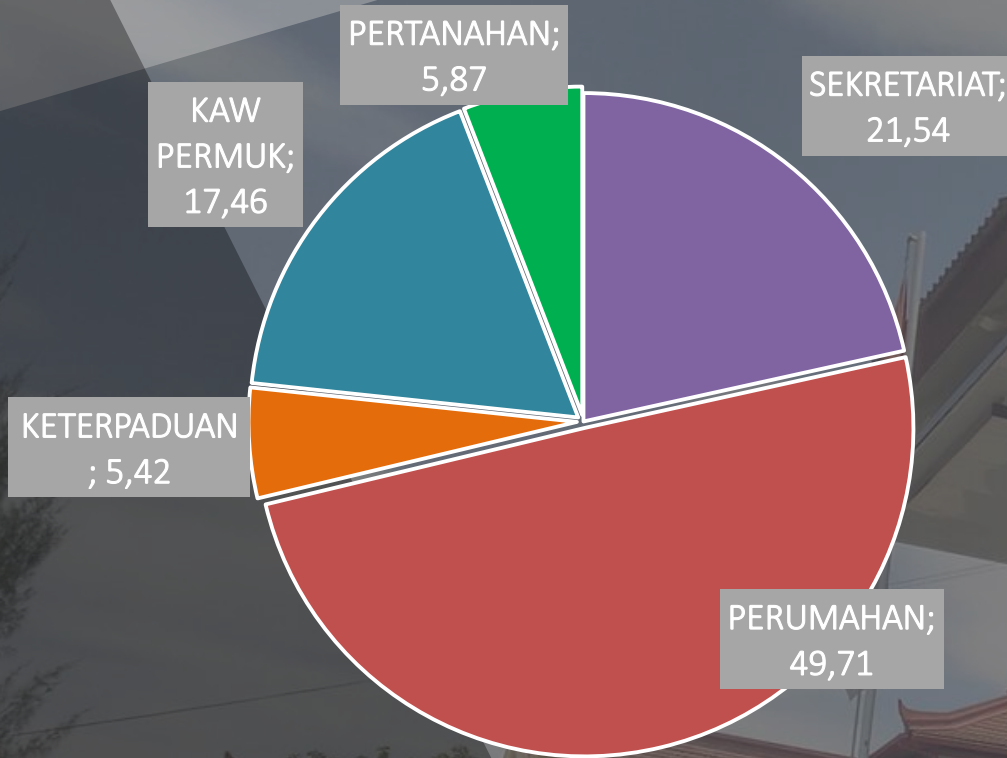

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |

## SESUDAH RASIONALISASI REFOCUSING PENANGANAN DAMPAK COVID-19

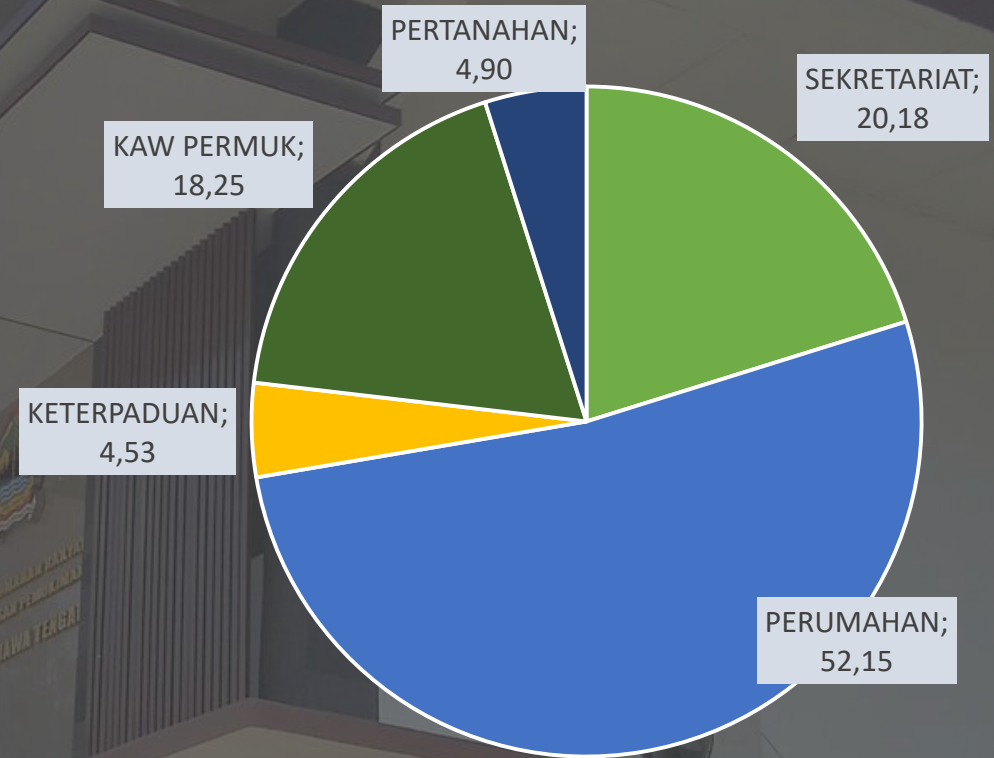

| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 5.419.533.000  | 20,18  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.004.532.000 | 52,15  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.215.949.000  | 4,53   |
| 4     | KAW PERMUK  | 4.900.626.000  | 18,25  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.314.827.000  | 4,90   |
| TOTAL |             | 26.855.467.000 | 100,00 |






# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN


STATUS AKHIR APRIL 2020

# DISPERAKIM

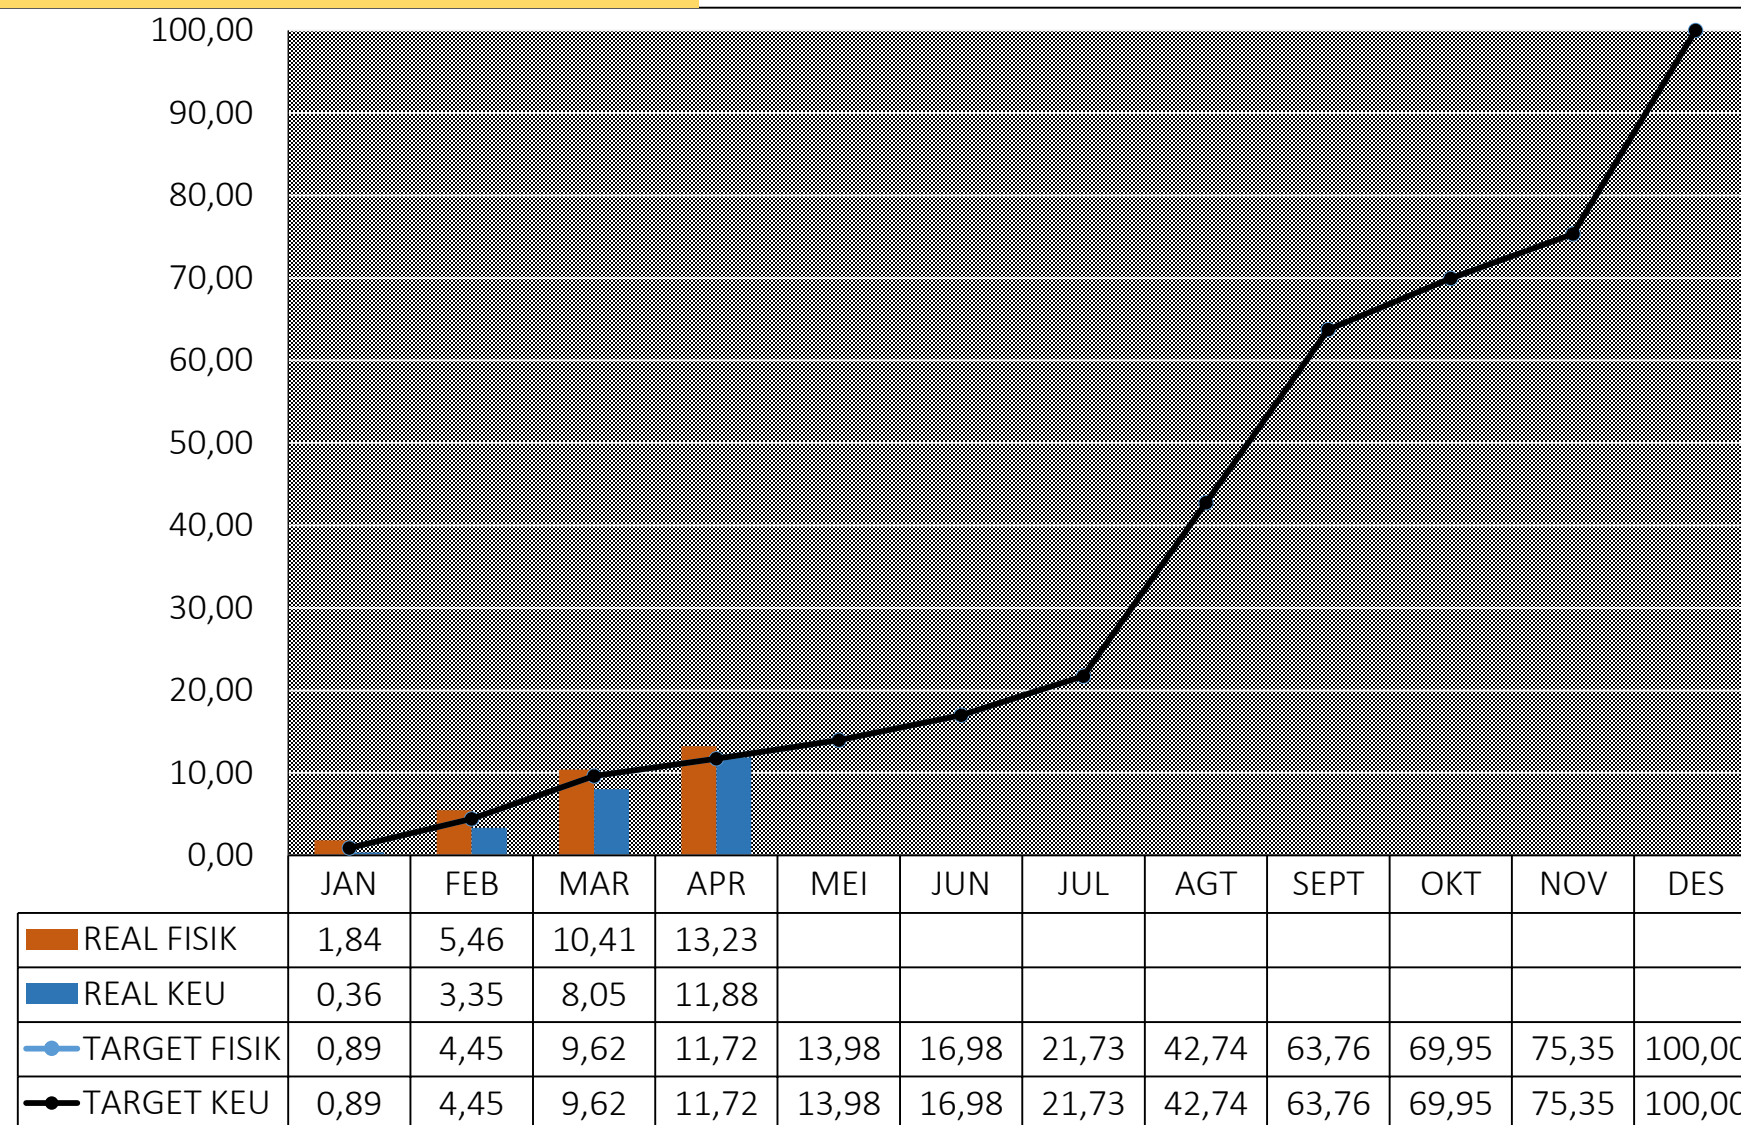


|             | Apr   | Mei   |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 11,72 | 16,65 |
| Real. Fisik | 13,23 |       |
| Dev. Fisik  | 1,51  |       |
| Renc. Keu   | 11,72 | 16,65 |
| Real. Keu   | 11,88 |       |
| Dev. Keu    | 0,16  |       |

# SEKRETARIAT

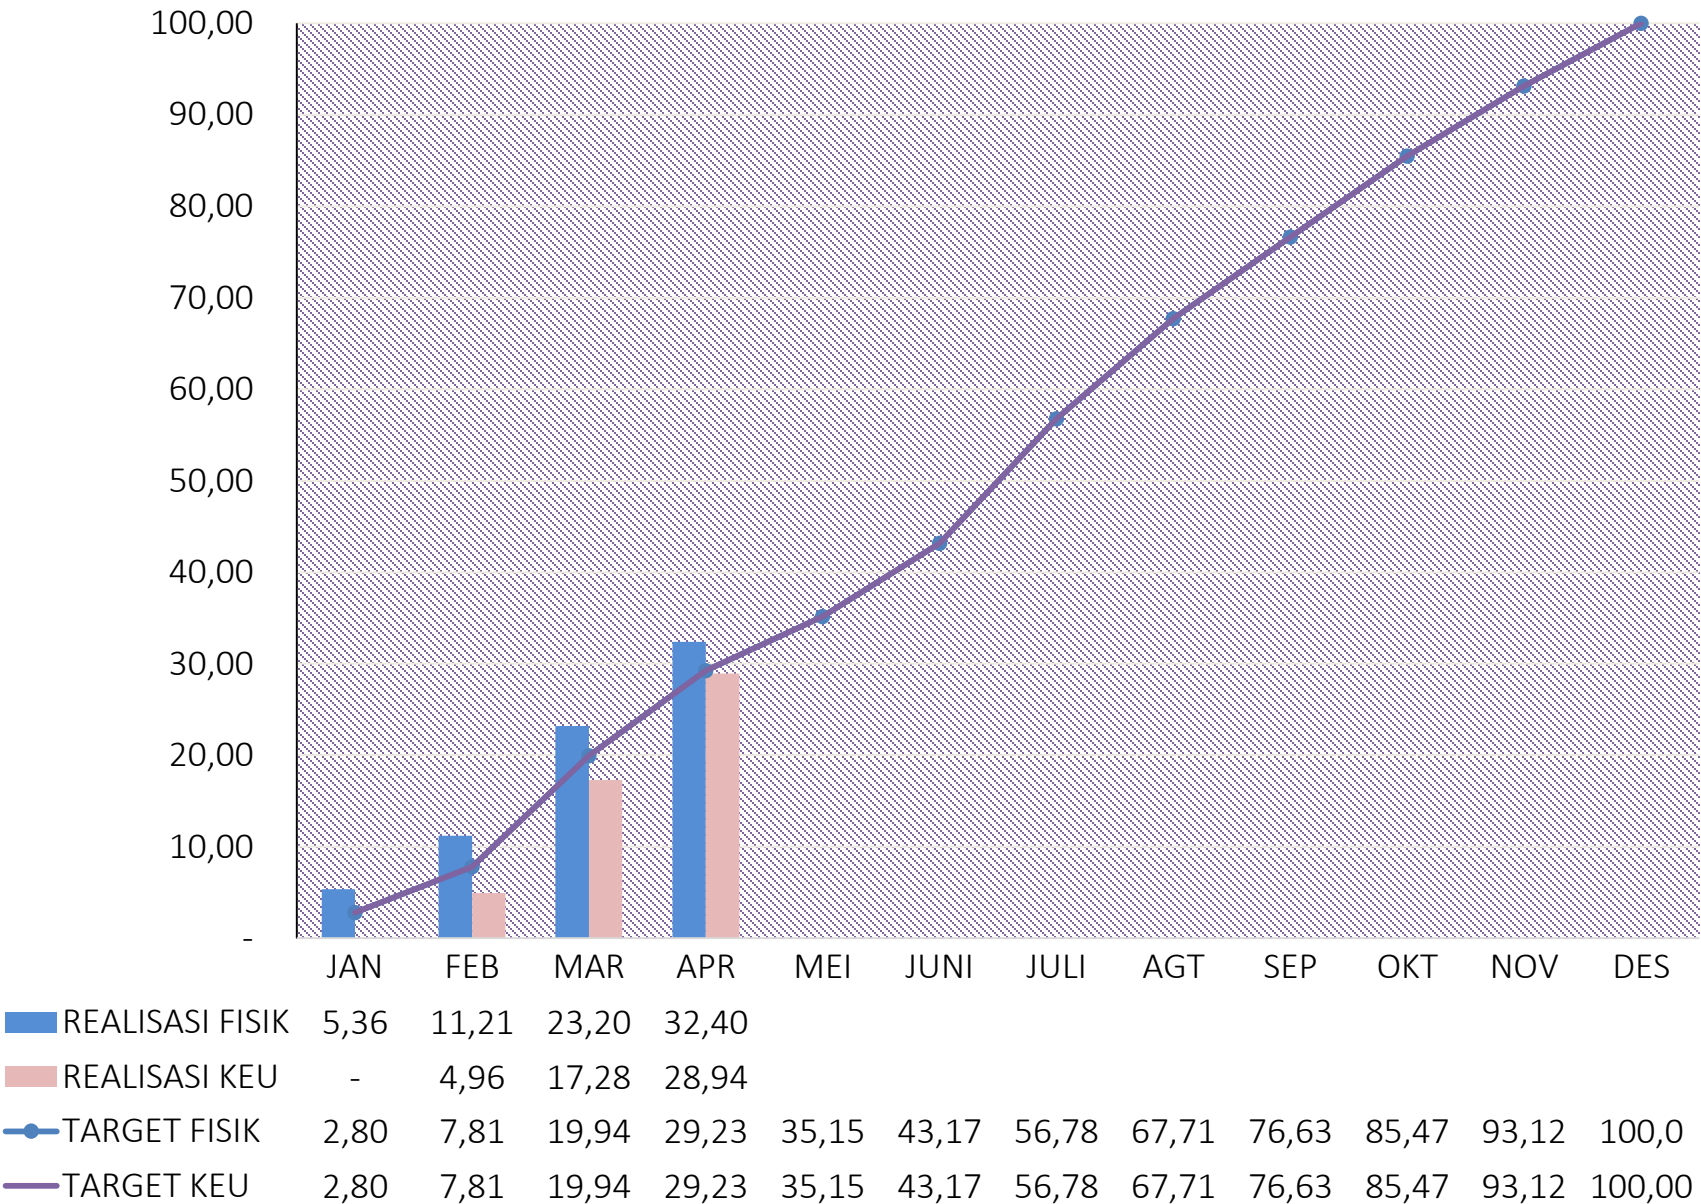


|             | Apr    | Mei   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 29,23  | 35,15 |
| Real. Fisik | 32,40  |       |
| Dev. Fisik  | 3,17   |       |
| Renc. Keu   | 29,23  | 35,15 |
| Real. Keu   | 28,94  |       |
| Dev. Keu    | (0,29) |       |

# PERUMAHAN

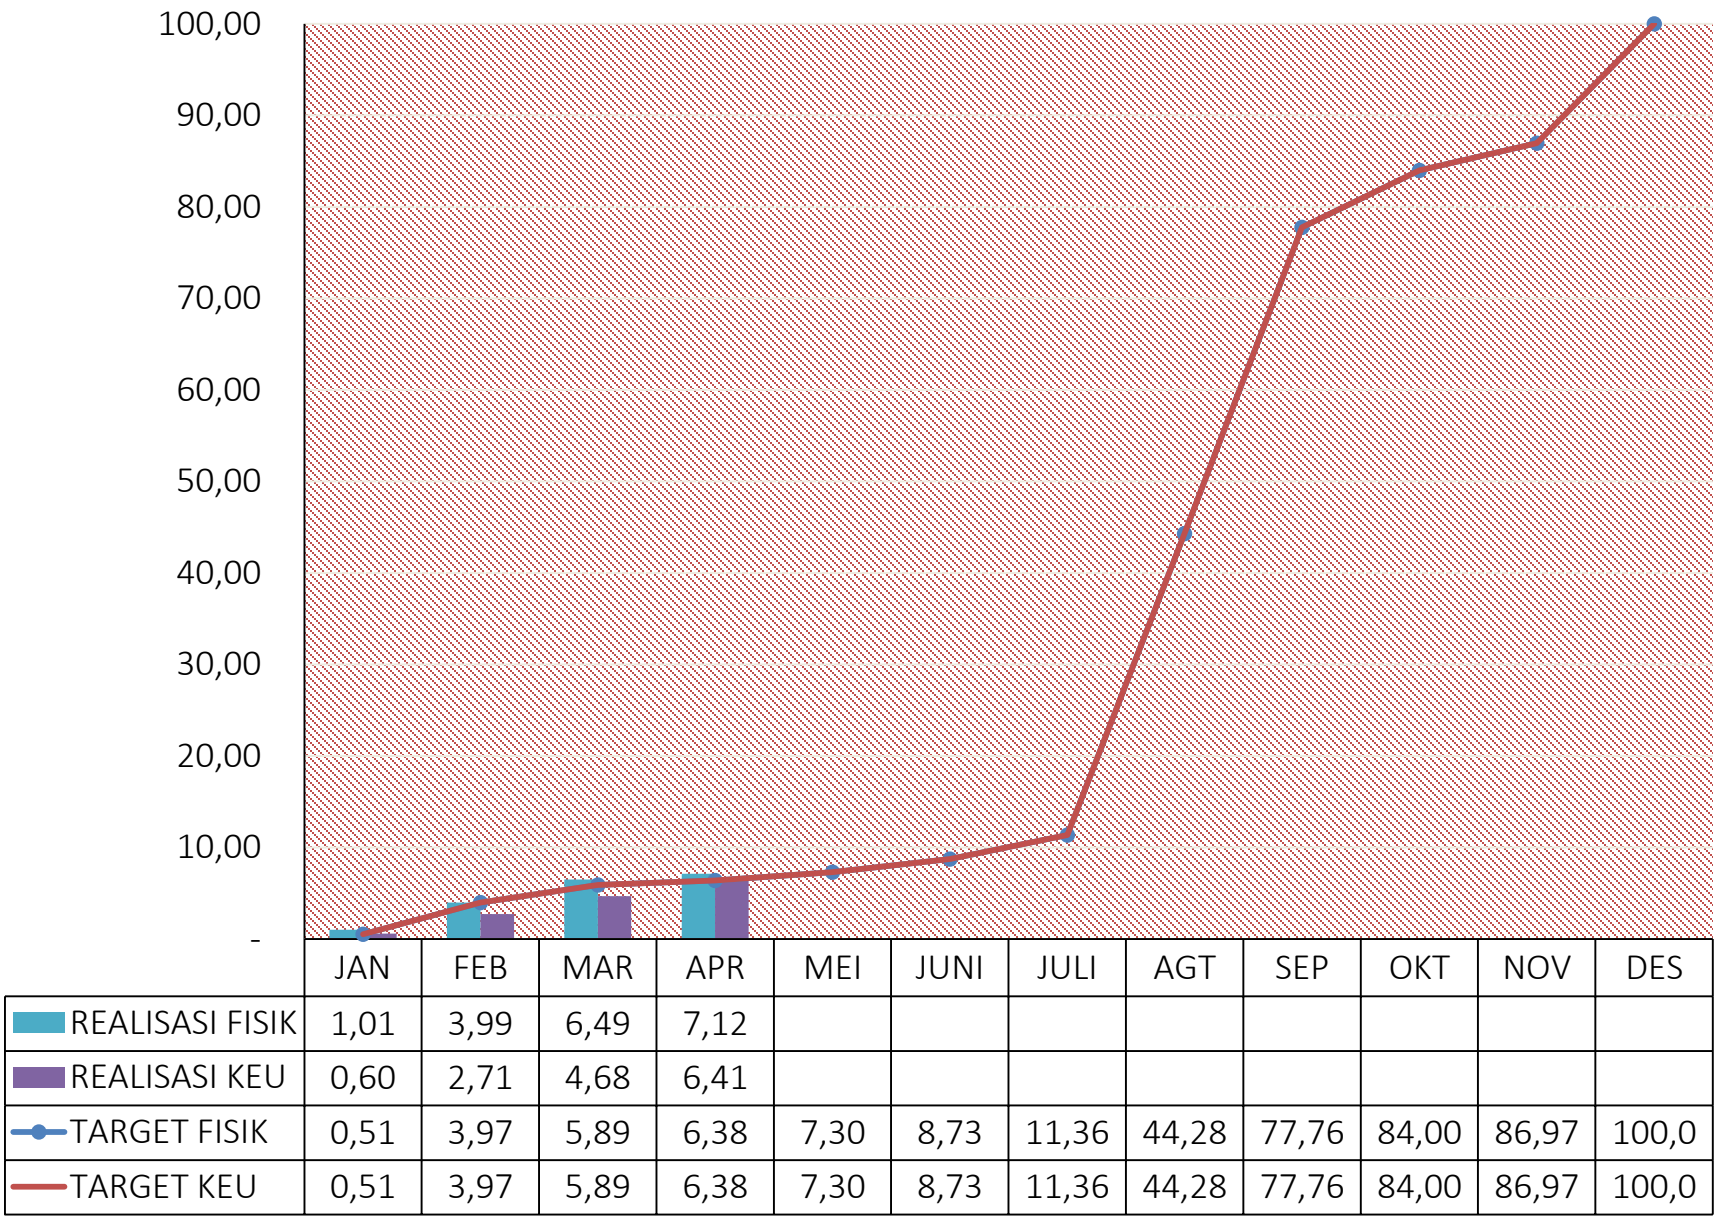

|             | Apr  | Mei  |
|-------------|------|------|
| Renc. Fisik | 6,38 | 7,30 |
| Real. Fisik | 7,12 |      |
| Dev. Fisik  | 0,74 |      |
| Renc. Keu   | 6,38 | 7,30 |
| Real. Keu   | 6,41 |      |
| Dev. Keu    | 0,03 |      |


# KAWASAN PERMUKIMAN

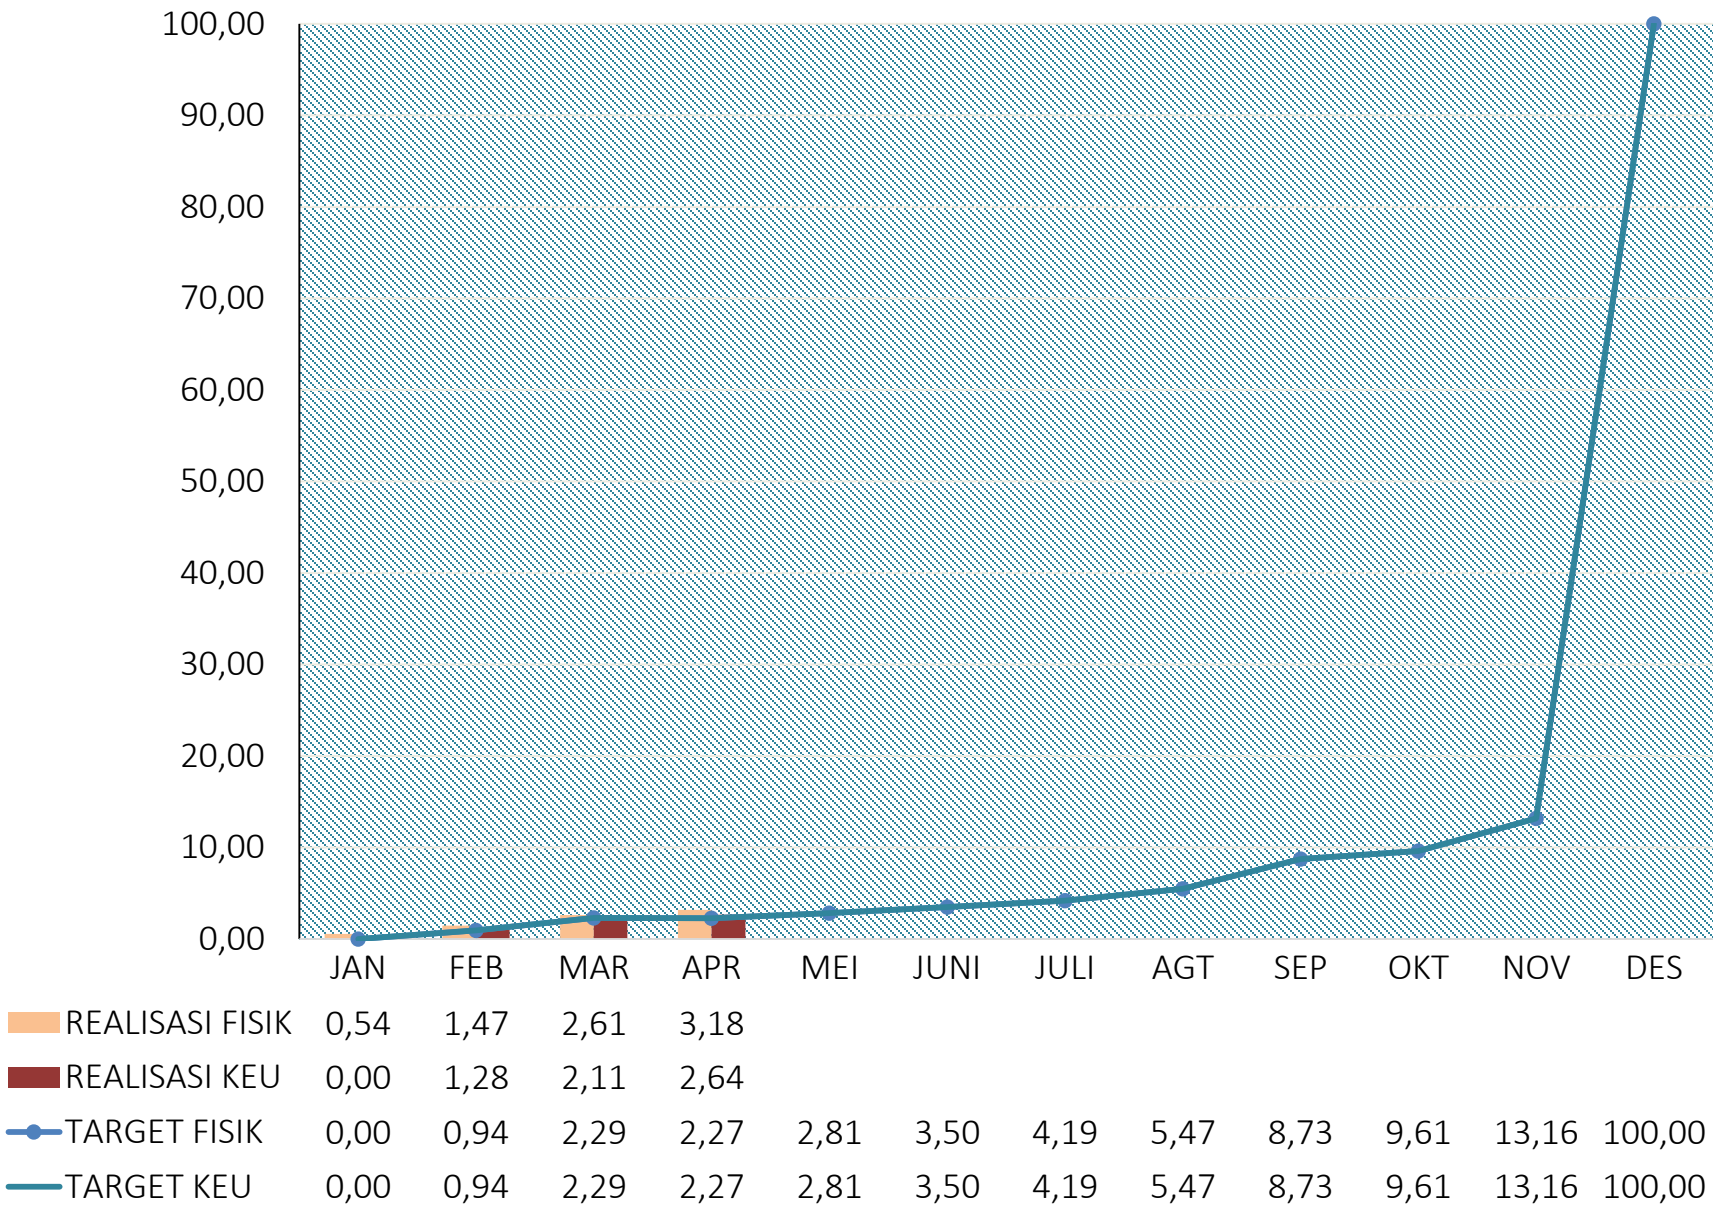

|             | Apr  | Mei  |
|-------------|------|------|
| Renc. Fisik | 2,27 | 2,81 |
| Real. Fisik | 3,18 |      |
| Dev. Fisik  | 0,91 |      |
| Renc. Keu   | 2,27 | 2,81 |
| Real. Keu   | 2,64 |      |
| Dev. Keu    | 0,37 |      |




# KETERPADUAN PKPP

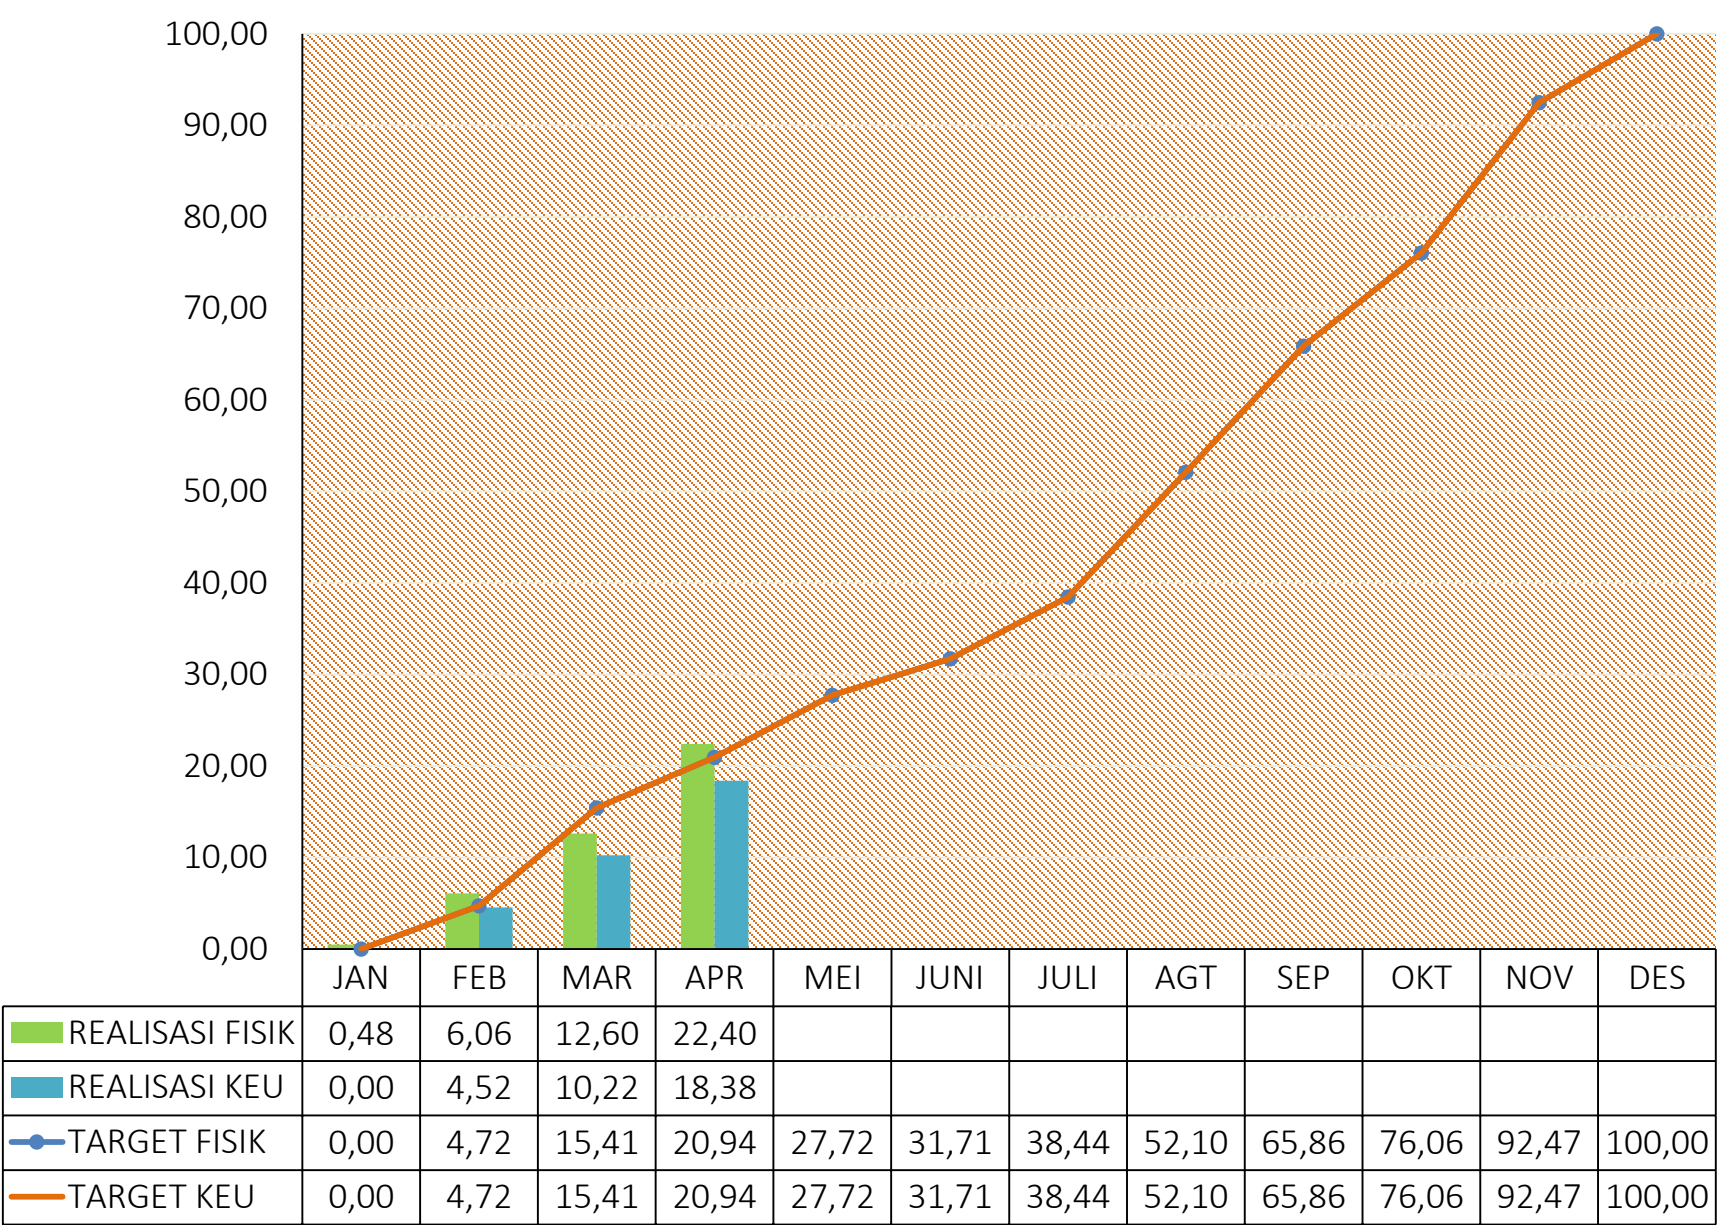

|             | Apr    | Mei   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 20,94  | 27,72 |
| Real. Fisik | 22,40  |       |
| Dev. Fisik  | 1,46   |       |
| Renc. Keu   | 20,94  | 27,72 |
| Real. Keu   | 18,38  |       |
| Dev. Keu    | (2,56) |       |

# PERTANAHAN

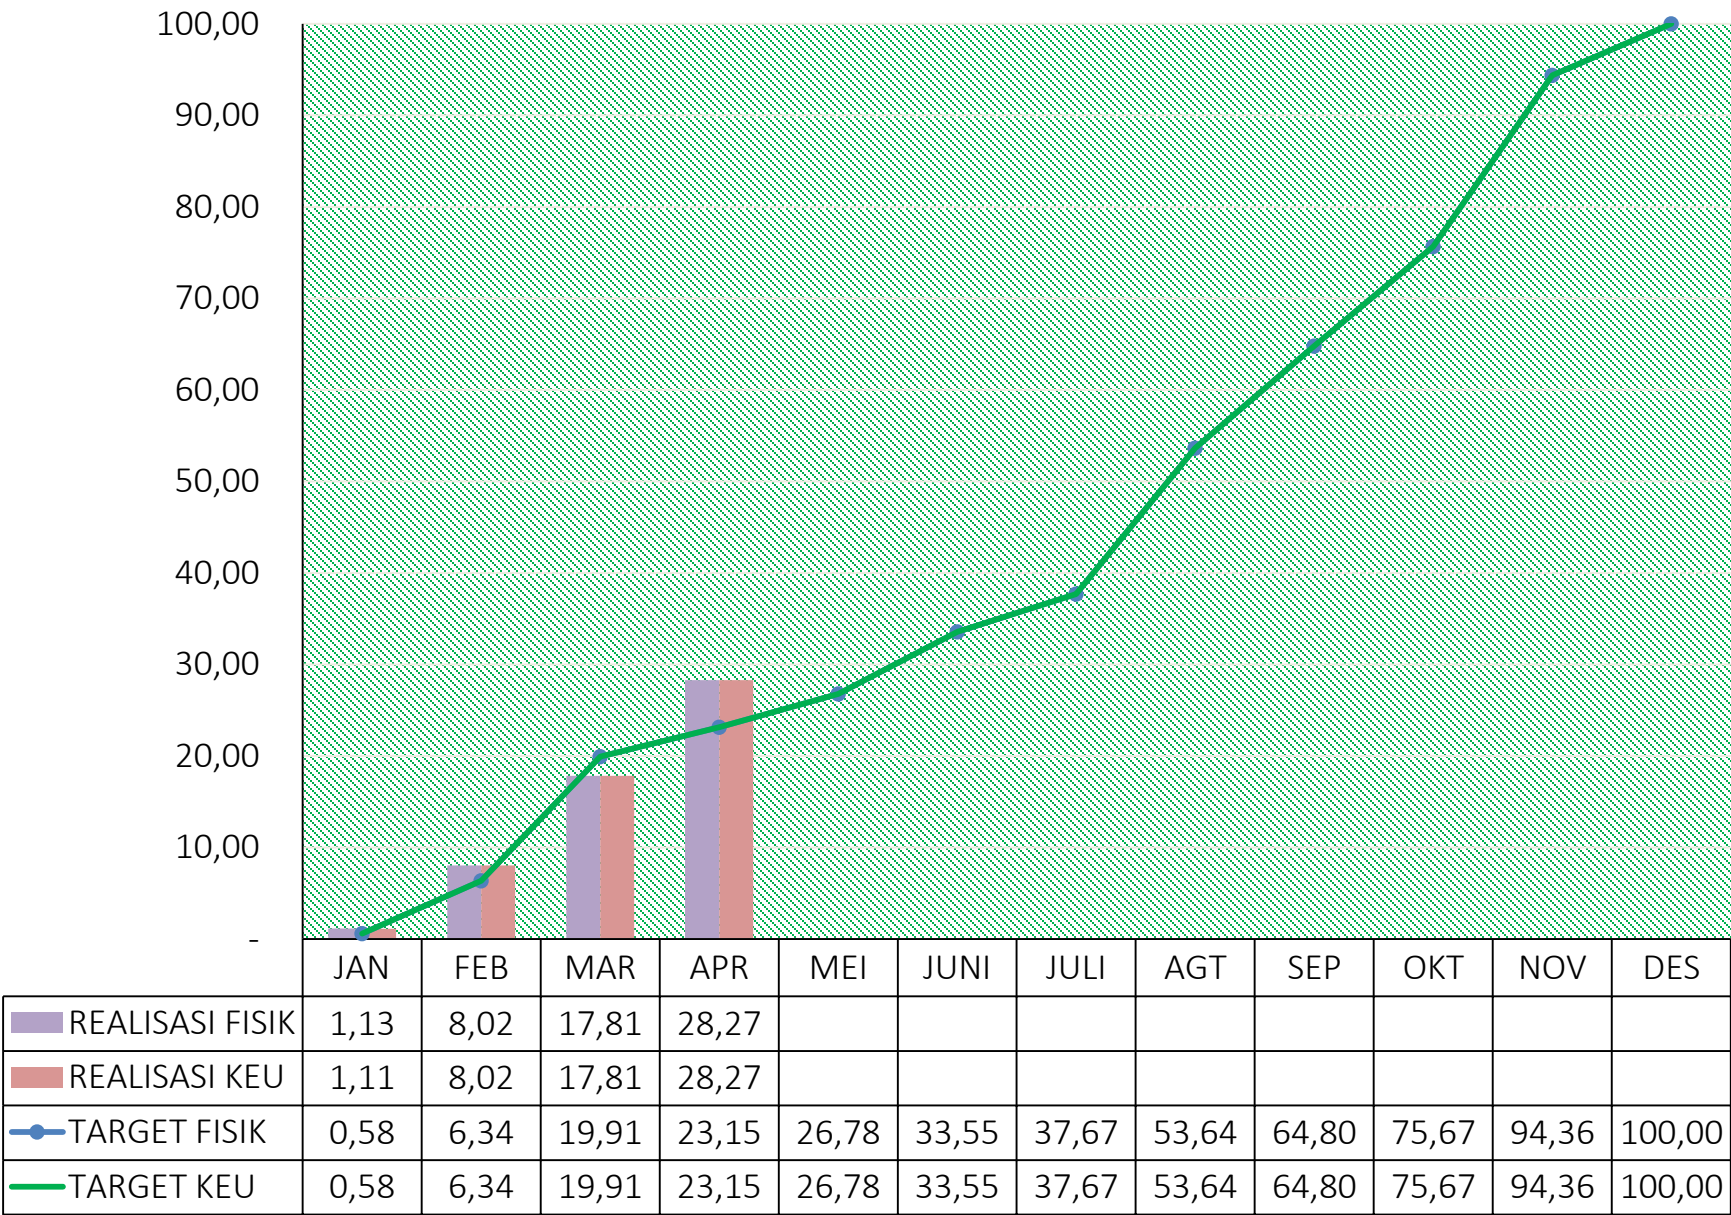

|             | Apr   | Mei   |
|-------------|-------|-------|
| Renc. Fisik | 23,15 | 26,78 |
| Real. Fisik | 28,27 |       |
| Dev. Fisik  | 5,12  |       |
| Renc. Keu   | 23,15 | 26,78 |
| Real. Keu   | 28,27 |       |
| Dev. Keu    | 5,12  |       |



# **PENJELASAN KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**

STATUS AKHIR APRIL 2020

# SEKRETARIAT

| NO | KEGIATAN                                                                        | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 | FISIK   | KEU    |                                                                                                   |
| 1  | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                       | -       | -0,06  |                                                                                                   |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                 | -52,48  | -52,55 | Proses pengadaan sedang berlangsung namun terkendala adanya pandemik COVID-19 serta rasionalisasi |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah           | -       | -12,82 | Menyesuaikan Kebutuhan (efisiensi)                                                                |
| 4  | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal                                        | -5,48   | -5,48  | Menyesuaikan kebutuhan/undangan yang ada                                                          |
| 5  | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | -       | -0,03  | Adanya larangan perjalanan dinas untuk menghindari penyebaran COVID-19                            |
| 6  | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah                                   | -2,95   | -2,95  | Menyesuaikan dengan event yang ada                                                                |


# BIDANG PERUMAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                 | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          | FISIK   | KEU   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                              | -       | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | -       | -2,84 | 1. Efisiensi pada biaya dekorasi, dokumentasi<br>2. Silpa Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni<br>3. Beberapa paket masih belum dibayarkan, antara lain Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH yang akan dibayarkan di bulan Nopember / Desember |
| 3  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | -       | -0,14 | 1. Efisiensi pada biaya penginapan dalam maupun luar daerah.<br>2. Beberapa paket masih belum dibayarkan, antara lain ATK dan penggandaan                                                                                                                                                                                        |

# BIDANG PERTANAHAN


| NO | KEGIATAN                                                                                          | DEVIASI |       |                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                   | FISIK   | KEU   |                                                                      |
| 1  | Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | -4,42   | -4,42 | Kegiatan Zonasi Nilai Tanah oleh Kanwil BPN belum dapat dilaksanakan |

# BIDANG KETERPADUAN PKPP



| NO | KEGIATAN                                                                                           | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    | FISIK   | KEU   |                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | -       | -4,96 | Adanya paket yang ditunda akibat COVID-19, dan keterlambatan pengadaan Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                              |
| 2  | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | -       | -1,05 | Beberapa agenda kegiatan ditunda karena adanya wabah COVID-19, yaitu:<br>1. Penundaan koordinasi dengan pusat yang meliputi belanja transportasi luar daerah<br>2. Belanja transportasi dalam daerah |





# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

STATUS AKHIR APRIL 2020

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                    | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE       | PROGRES LELANG                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                   |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (7 bulan)               | 345.100.000         | Tender Cepat | Upload Dokumen Penawaran                                          |
| 2                | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor                                  | 405.000.000         | Tender       | Persiapan Lelang                                                  |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                               |                     |              |                                                                   |
| 3                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan | 525.000.000         | Tender       | Tender sudah selesai, penandatanganan kontrak terkendala COVID-19 |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang  | 840.000.000         | Tender       | Tender sudah selesai, penandatanganan kontrak terkendala COVID-19 |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak    | 735.000.000         | Tender       | Tender sudah selesai, penandatanganan kontrak terkendala COVID-19 |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara   | 560.000.000         | Tender       | Penetapan Pemenang                                                |
| 7                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati               | 490.000.000         | Tender       | Pembuktian Kualifikasi                                            |
| 8                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes   | 840.000.000         | Tender       | Pembuktian Kualifikasi                                            |
| 9                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemalang | 840.000.000         | Tender       | Tender sudah selesai, penandatanganan kontrak terkendala COVID-19 |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO. | KEGIATAN | NAMA PAKET                                                        | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                                    |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 10  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara | 455.000.000         | Tender  | Masa Sanggah                                                      |
| 11  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo     | 385.000.000         | Tender  | Masa Sanggah                                                      |
| 12  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung   | 455.000.000         | Tender  | Tender sudah selesai, penandatanganan kontrak terkendala COVID-19 |
| 13  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen      | 770.000.000         | Tender  | Pembuktian Kualifikasi                                            |
| 14  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten       | 420.000.000         | Tender  | Masa Sanggah                                                      |
| 16  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen       | 385.000.000         | Tender  | Pembuktian Kualifikasi                                            |
| 17  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo    | 840.000.000         | Tender  | Pembuktian Kualifikasi                                            |
| 18  |          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru                          | 200.000.000         | Seleksi | Persiapan Lelang                                                  |

# REKAP TENDER/SELEKSI

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES<br>LELANG          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
| 19  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000         | Tender  | Download Dokumen Pemilihan |
| 20  |                                                                                                                                         | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000         | Seleksi | Masa Sanggah               |
| 21  |                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000         | Seleksi | Masa Sanggah               |

# REKAP TENDER/SELEKSI



| NO.                       | KEGIATAN                                                                     | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES<br>LELANG                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                              |                                      |                     |         |                                                                           |
| 22                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman -<br>Bidang Kawasan Pemukiman | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 1.000.000.000       | Tender  |                                                                           |
| 23                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 750.000.000         | Tender  |                                                                           |
| 24                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 500.000.000         | Tender  |                                                                           |
| 25                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  |                                                                           |
| 26                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  |                                                                           |
| 27                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  |                                                                           |
| 28                        | Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman                              | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 160.000.000         | Seleksi | Pembukaan dan<br>Evaluasi Penawaran<br>File I: Administrasi<br>dan Teknis |
| 29                        |                                                                              | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 550.000.000         | Seleksi | Proses Lelang<br>Ditunda/dibatalkan                                       |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      |                                                                                                           |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020                                                                   |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020                                                                   |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Terkontrak 9 Maret 2020                                                                                   |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 197.600.000      | Persiapan lelang                                                                                          |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       | Persiapan lelang                                                                                          |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       | Persiapan lelang                                                                                          |
| 8   |                                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      | Persiapan lelang                                                                                          |
| 9   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Sudah melakukan koordinasi dengan konsultan, namun secara administratif bergantian dg paket kegiatan lain |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       |                                                                                                           |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       |                                                                                                           |
| 12  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020                                                                             |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                 | NAMA PAKET         | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                  |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 13  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Belanja Sewa Hotel | 86.400.000       | Sudah terlaksana 6-7 Maret 2020 |



| REKAP PENGADAAN LANGSUNG BIDANG PERUMAHAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                  |                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| NO                                        | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                               |
| 1                                         | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020 |
| 2                                         |                                                                                                                                         | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       | Proses Persiapan Lelang                      |
| 3                                         |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 175.000.000      | Penyusunan HPS                               |
| 4                                         | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      | Sudah terkontrak tanggal 3 April 2020        |
| 5                                         |                                                                                                                                         | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 64.800.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020   |
| 6                                         |                                                                                                                                         | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 31 Januari 2020     |
| 7                                         | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan Akses Rusunawa Kota Semarang                                    | 50.000.000       |                                              |
| 8                                         |                                                                                                                                         | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 9                                         |                                                                                                                                         | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 10                                        |                                                                                                                                         | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 11                                        |                                                                                                                                         | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 12                                        |                                                                                                                                         | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 13                                        |                                                                                                                                         | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      | proses penyusunan HPS                        |
| 14                                        |                                                                                                                                         | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      | proses penyusunan HPS                        |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Sewa Hotel 1                                                                                                    | 56.700.000       | DIRASIONALISASI                                               |
| 2   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel 2                                                                                                    | 56.700.000       | DIRASIONALISASI                                               |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       | DITUNDA (sampai batas waktu yg tdk ditentukan)                |
| 4   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Terkontrak tanggal 17 Februari 2020 (Masa kontrak 2 bulan)    |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Terkontrak Tanggal 12 Maret 2020                              |
| 6   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 3 Februari 2020 (Masa kontrak 11 bulan)    |
| 7   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       |                                                               |
| 8   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel Forum Pokja PKP Paket Fullboard Dalam Daerah                                                         | 54.000.000       | Kemungkinan batal dilaksanakan (anggaran tdk mencukupi)       |
| 9   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 (Masa kontrak 10 bulan)   |
| 10  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Belanja Sewa Hotel                                                                                                      | 54.000.000       | DIRASIONALISASI                                               |
| 11  |                                                                                                    | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                 | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 12 Februari 2020 (Masa kontrak 10,5 bulan) |

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KAW. PERMUKIMAN**

| NO. | KEGIATAN                                       | NAMA PAKET                          | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 60.000.000       |                |
| 2   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 60.000.000       |                |
| 3   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 50.000.000       |                |

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                          | NAMA PAKET                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | Sewa Hotel Paket Full board             | 42.500.000       | Ditunda terkait larangan perjalanan dinas dan berkumpul secara massal karena wabah COVID-19. Realokasi anggaran penanganan COVID-19, perencanaan kembali bulan November. |
| 2   |                                                                                                   | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 65.000.000       |                                                                                                                                                                          |

# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

| MEDIA        | JAN       | FEB       | MAR       | APR       | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Facebook     | 1         | 3         | 1         | 0         |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Instagram    | 2         | 1         | 1         | 0         |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ponsel/SMS   | 7         | 5         | 7         | 0         |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Web          | 11        | 10        | 4         | 2         |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Whatsapp     | 10        | 5         | 4         | 11        |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>TOTAL</b> | <b>31</b> | <b>24</b> | <b>17</b> | <b>13</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Jumlah Laporan yang masuk pada bulan April 2020 sebanyak 13 Laporan, dengan rincian :**

a. TUNTAS DIJAWAB = 13 LAPORAN

b. MASIH DALAM PROSES BIDANG = 0 LAPORAN

# PENEKANAN APBD

Berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jateng tanggal 21 April 2020 tentang Realisasi Pertanggungjawaban, **Pertanggungjawaban Uang Persediaan di Bendahara setelah 24 April 2020 hanya dapat digunakan untuk:**


- 1. Belanja yang sifatnya langganan, seperti listrik, PAM, telekomunikasi, dll.**
- 2. Belanja pegawai Non-ASN**
- 3. Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan**
4. Belanja GTT/PTT
5. Belanja BPJS PBI
6. Belanja Operasional Panti
7. Belanja Obat.

**APBN**



# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN

## PAGU – Rp 584.342.908.000

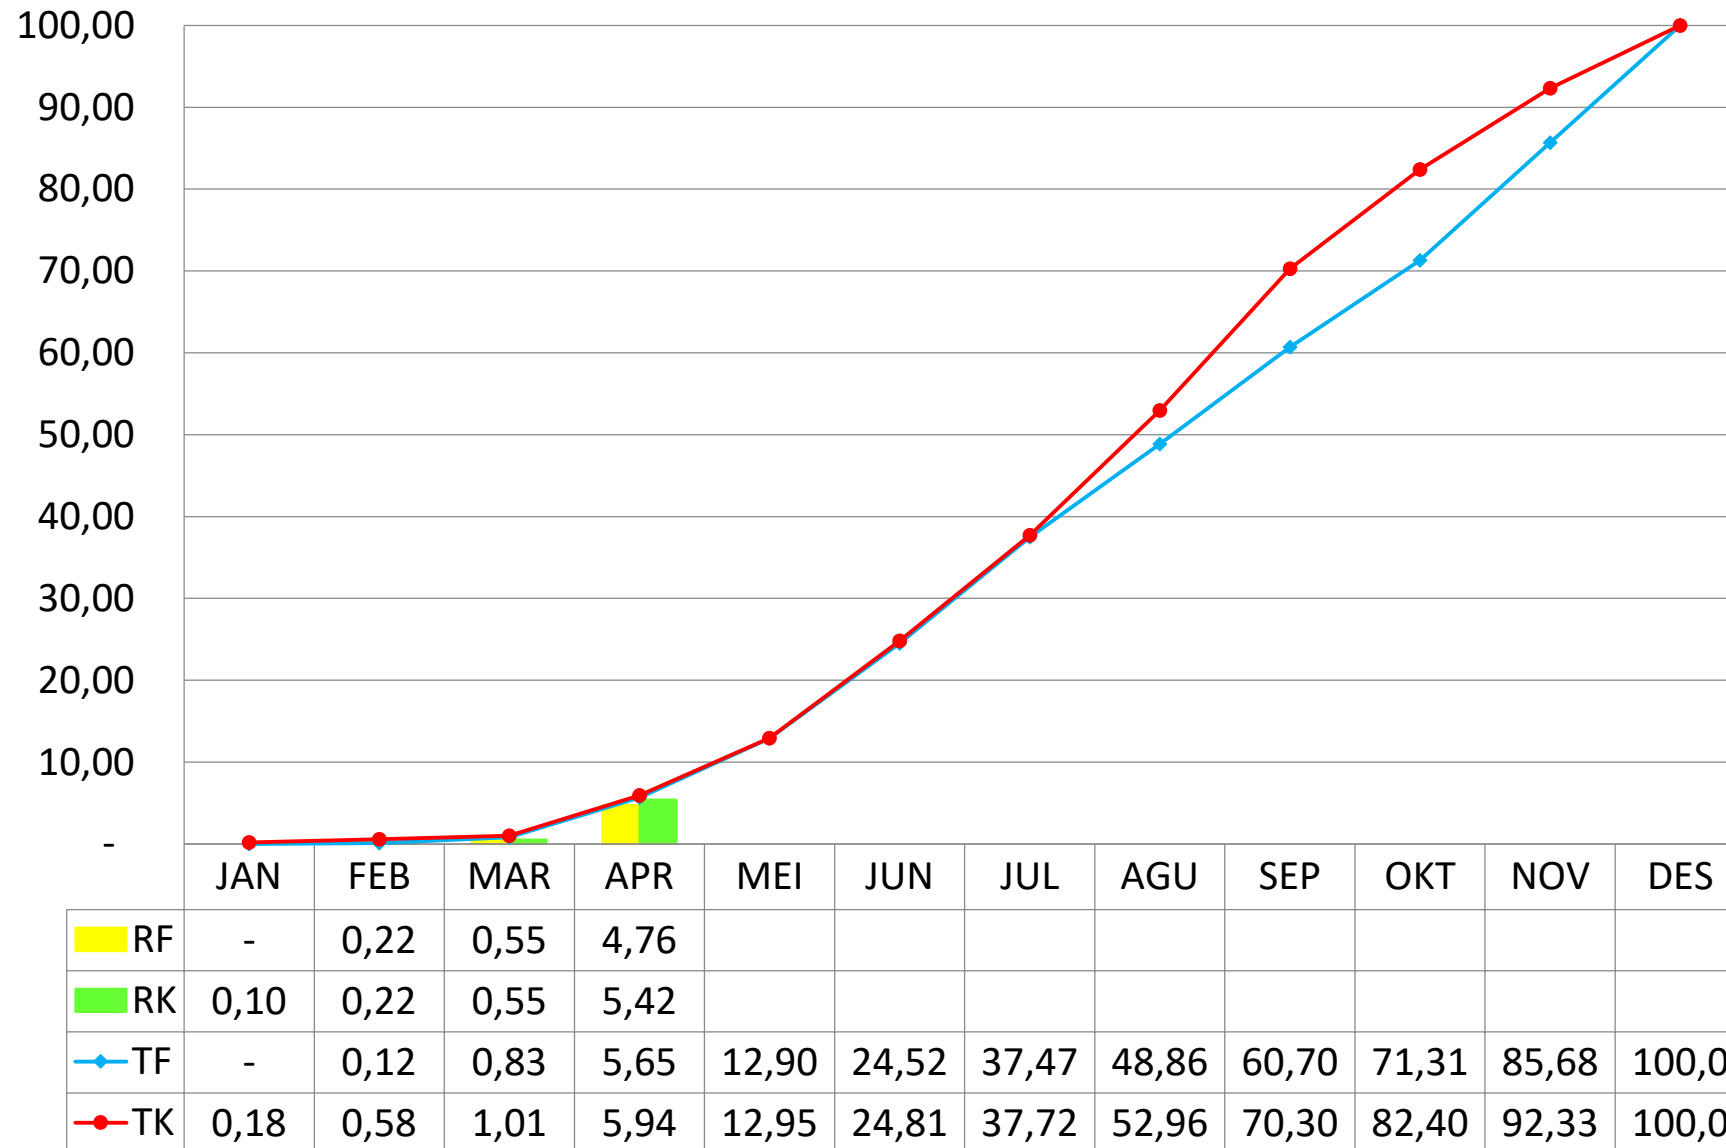


|             | Apr    | Mei |
|-------------|--------|-----|
| Renc. Fisik | 5,65   |     |
| Real. Fisik | 4,76   |     |
| Dev. Fisik  | (0,89) |     |
| Renc. Keu   | 5,94   |     |
| Real. Keu   | 5,42   |     |
| Dev. Keu    | (0,52) |     |



# BPPW WILAYAH 1

## PAGU – Rp 728.391.867.000

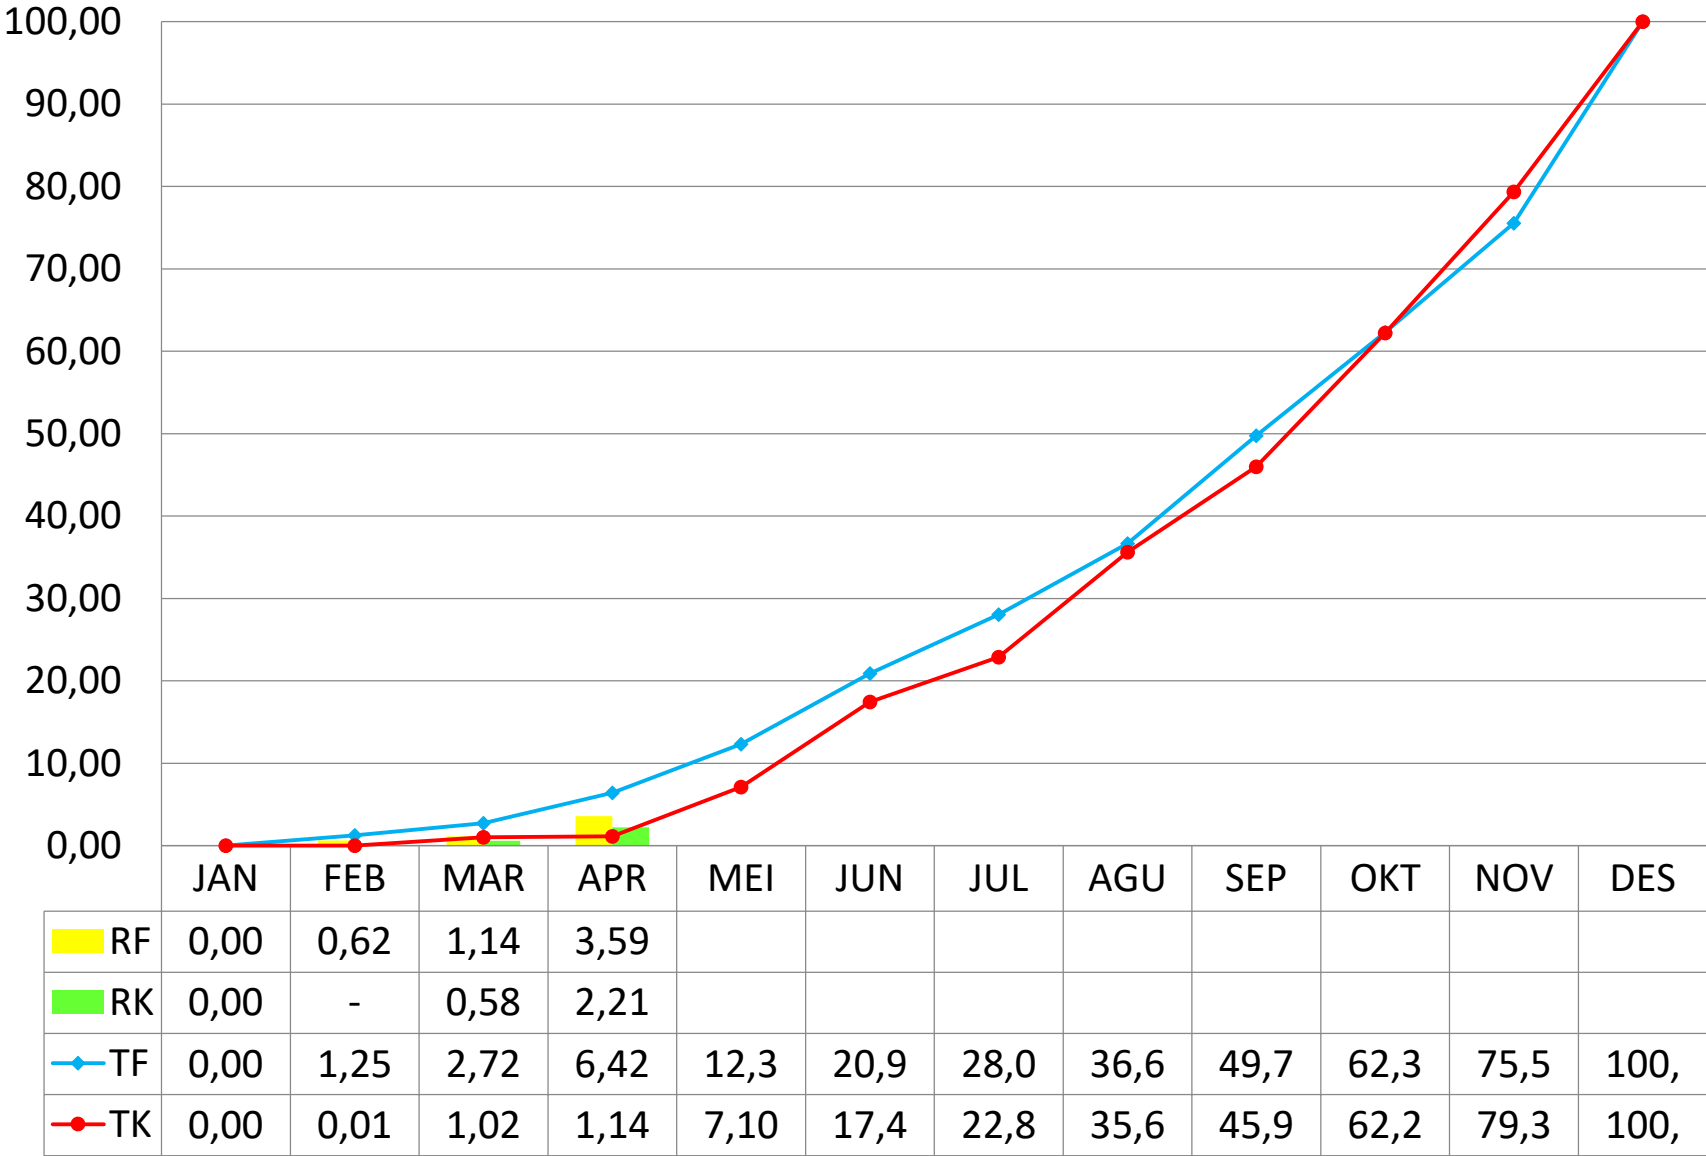

|             | Apr    | Mei   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 6,42   | 12,30 |
| Real. Fisik | 3,59   |       |
| Dev. Fisik  | (2,83) |       |
| Renc. Keu   | 1,14   | 7,10  |
| Real. Keu   | 2,21   |       |
| Dev. Keu    | 1,07   |       |

A solid red square is positioned on the left side of the slide. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**


# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR MARET 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH


# DISPERAKIM

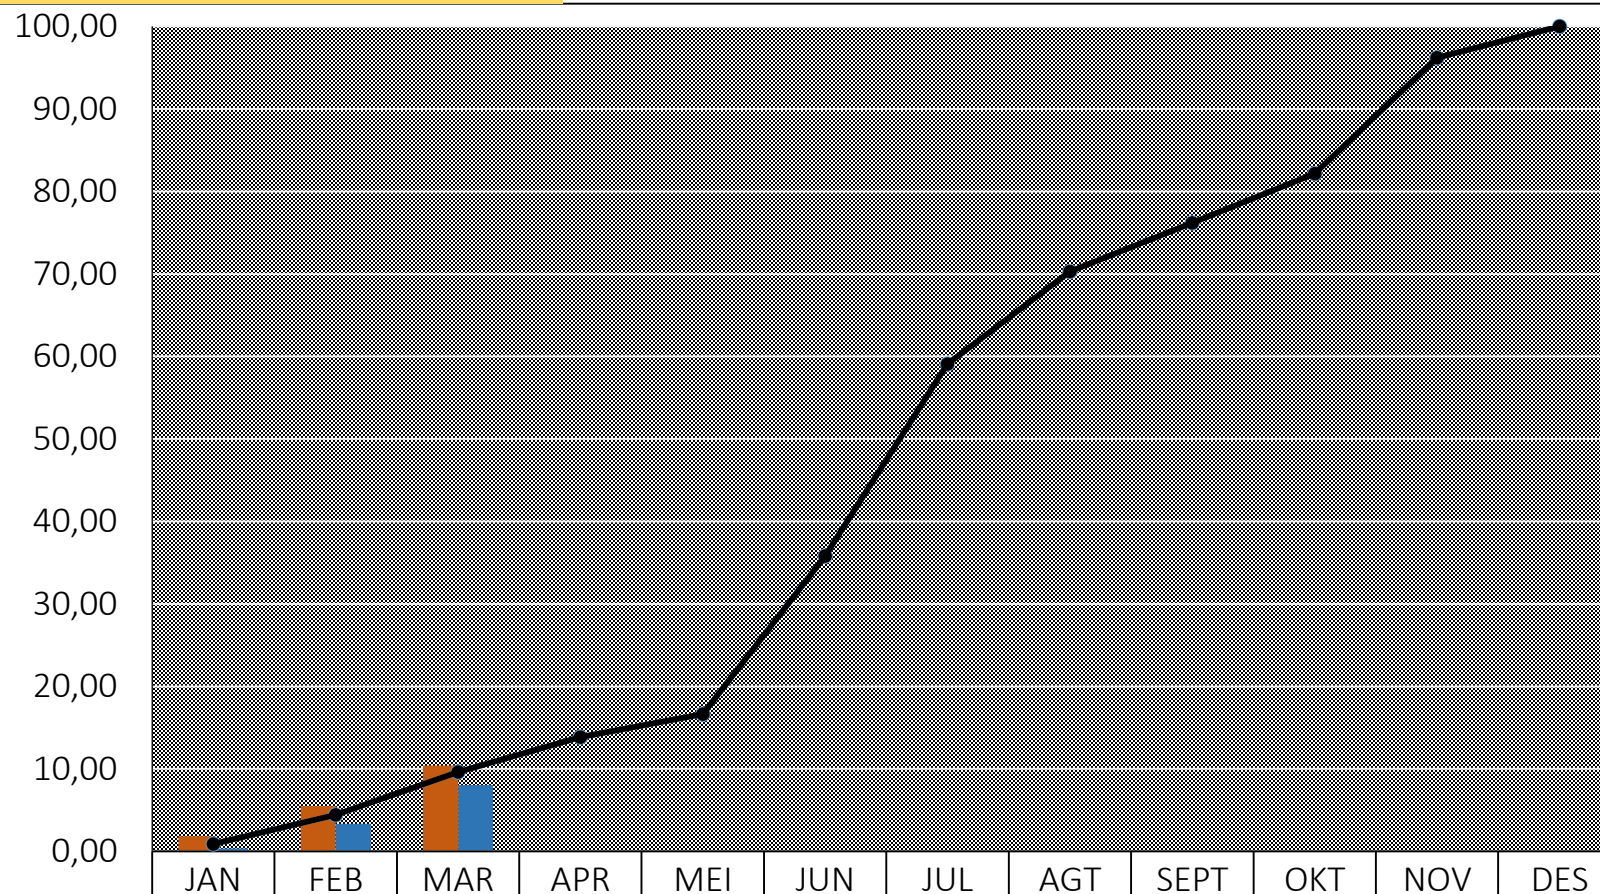

|              |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REAL FISIK   | 1,84 | 5,46 | 10,41 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| REAL KEU     | 0,36 | 3,35 | 8,02  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| TARGET FISIK | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,00 |
| TARGET KEU   | 0,89 | 4,45 | 9,62  | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,00 |


|             | Mar    | Apr   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 9,62   | 13,87 |
| Real. Fisik | 10,41  |       |
| Dev. Fisik  | 0,79   |       |
| Renc. Keu   | 9,62   | 13,87 |
| Real. Keu   | 8,02   |       |
| Dev. Keu    | (1,60) |       |

# SEKRETARIAT

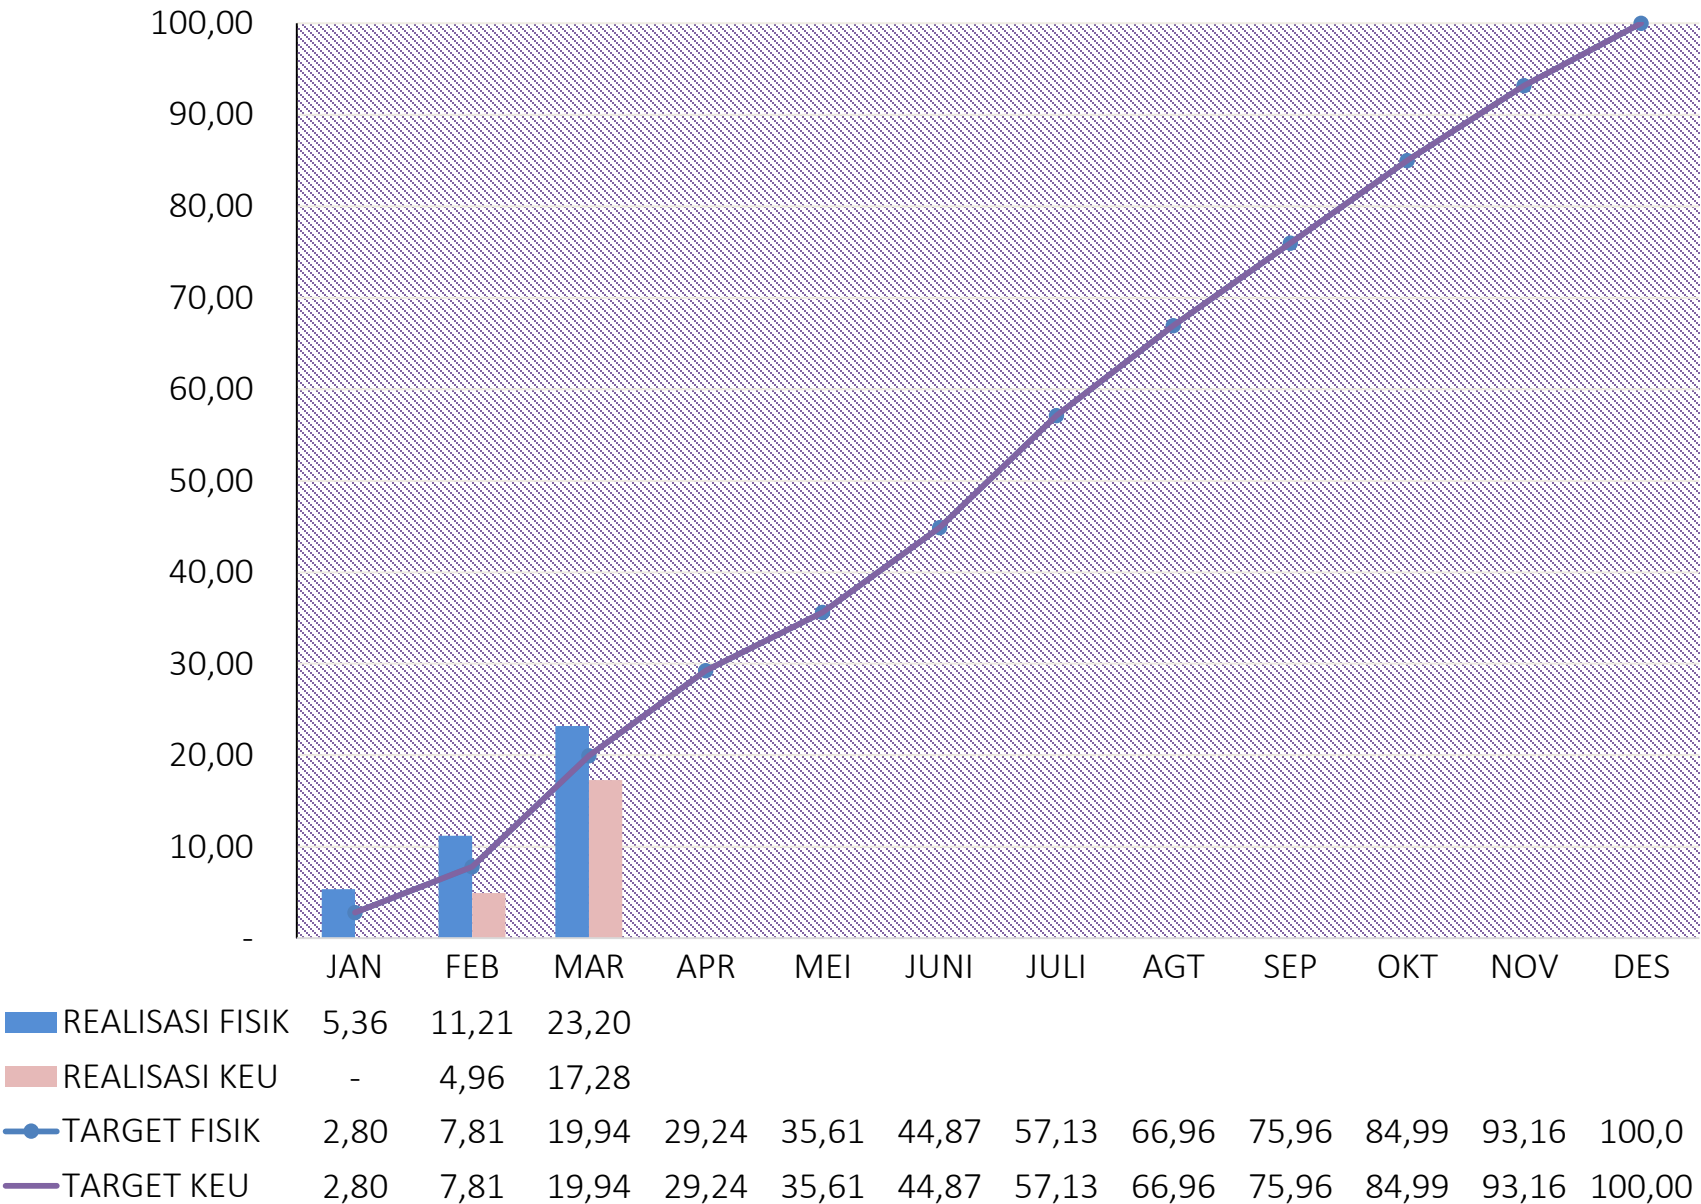


|             | Mar    | Apr   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 19,94  | 29,24 |
| Real. Fisik | 23,20  |       |
| Dev. Fisik  | 3,26   |       |
| Renc. Keu   | 19,94  | 29,24 |
| Real. Keu   | 17,28  |       |
| Dev. Keu    | (2,66) |       |

# PERUMAHAN

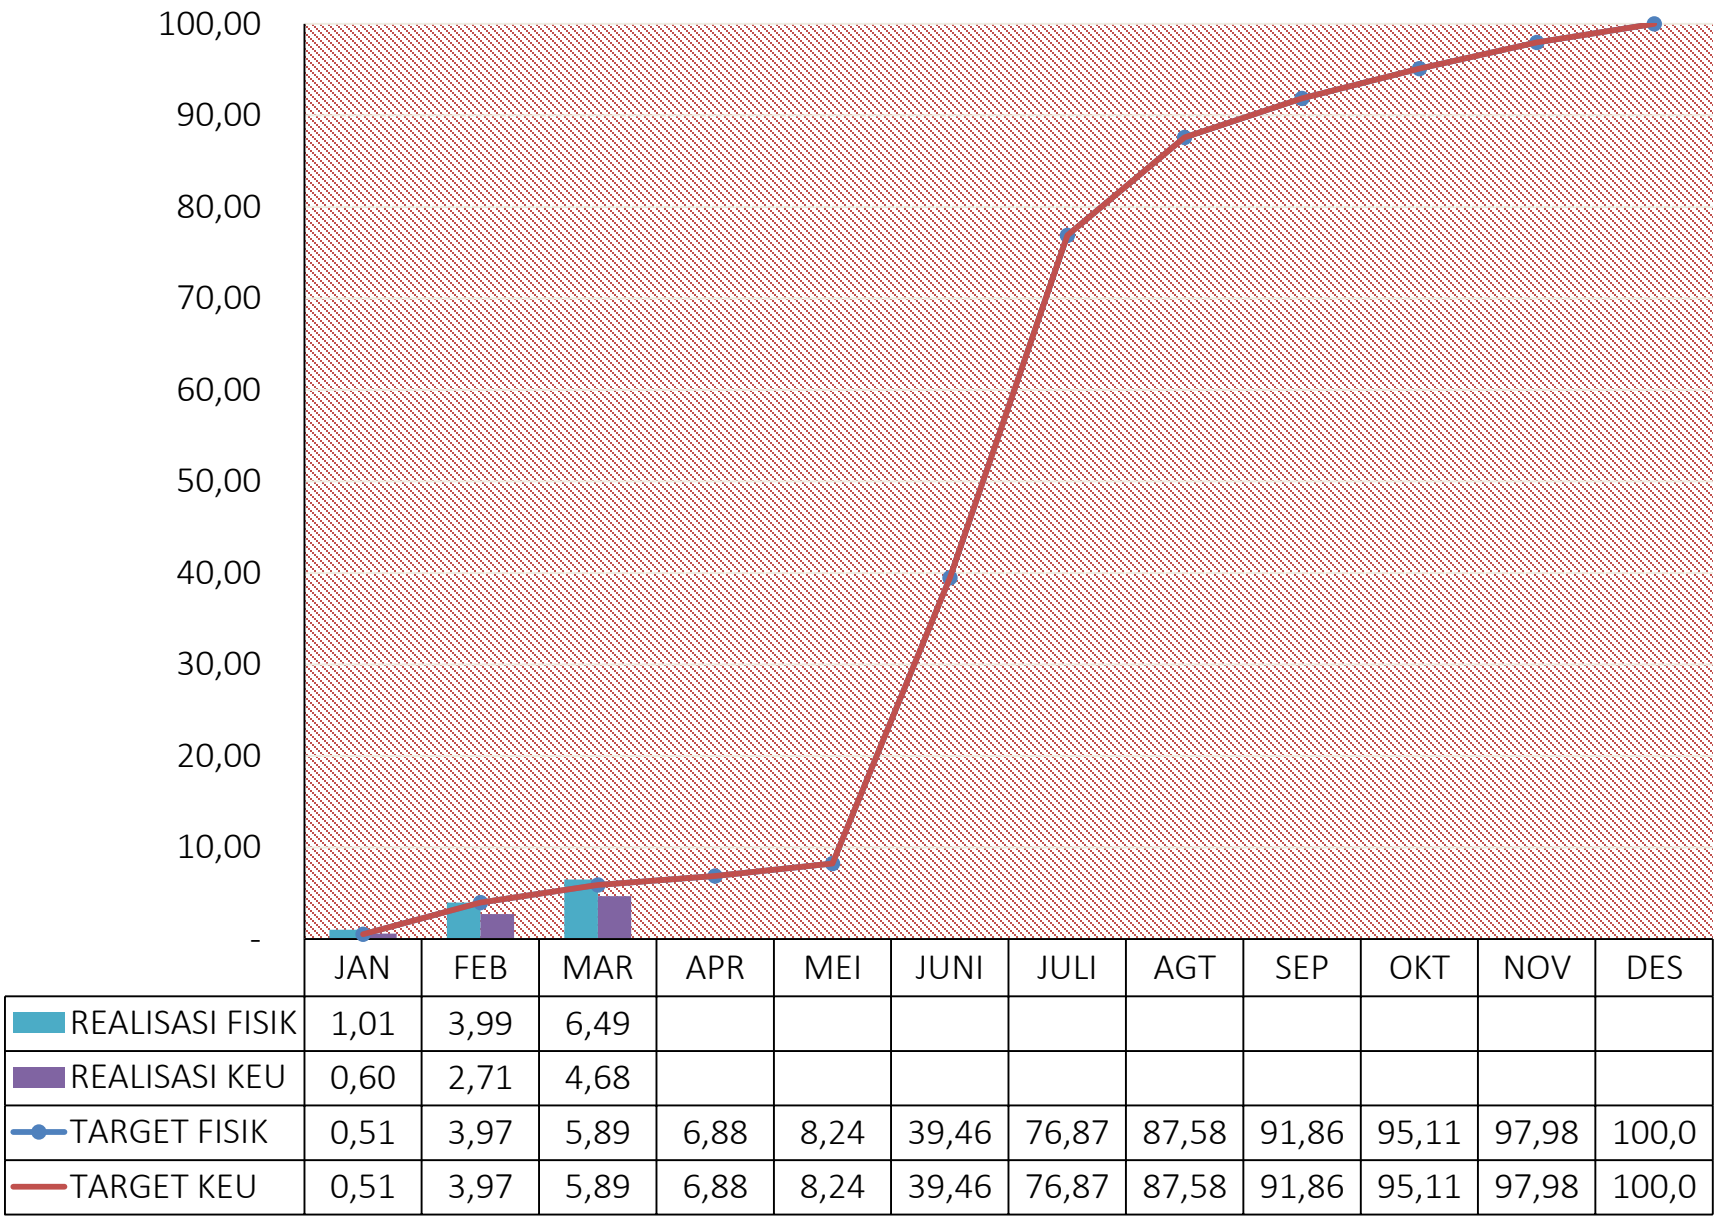

|             | Mar    | Apr  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 5,89   | 6,88 |
| Real. Fisik | 6,49   |      |
| Dev. Fisik  | 0,60   |      |
| Renc. Keu   | 5,89   | 6,88 |
| Real. Keu   | 4,68   |      |
| Dev. Keu    | (1,21) |      |


# KAWASAN PERMUKIMAN

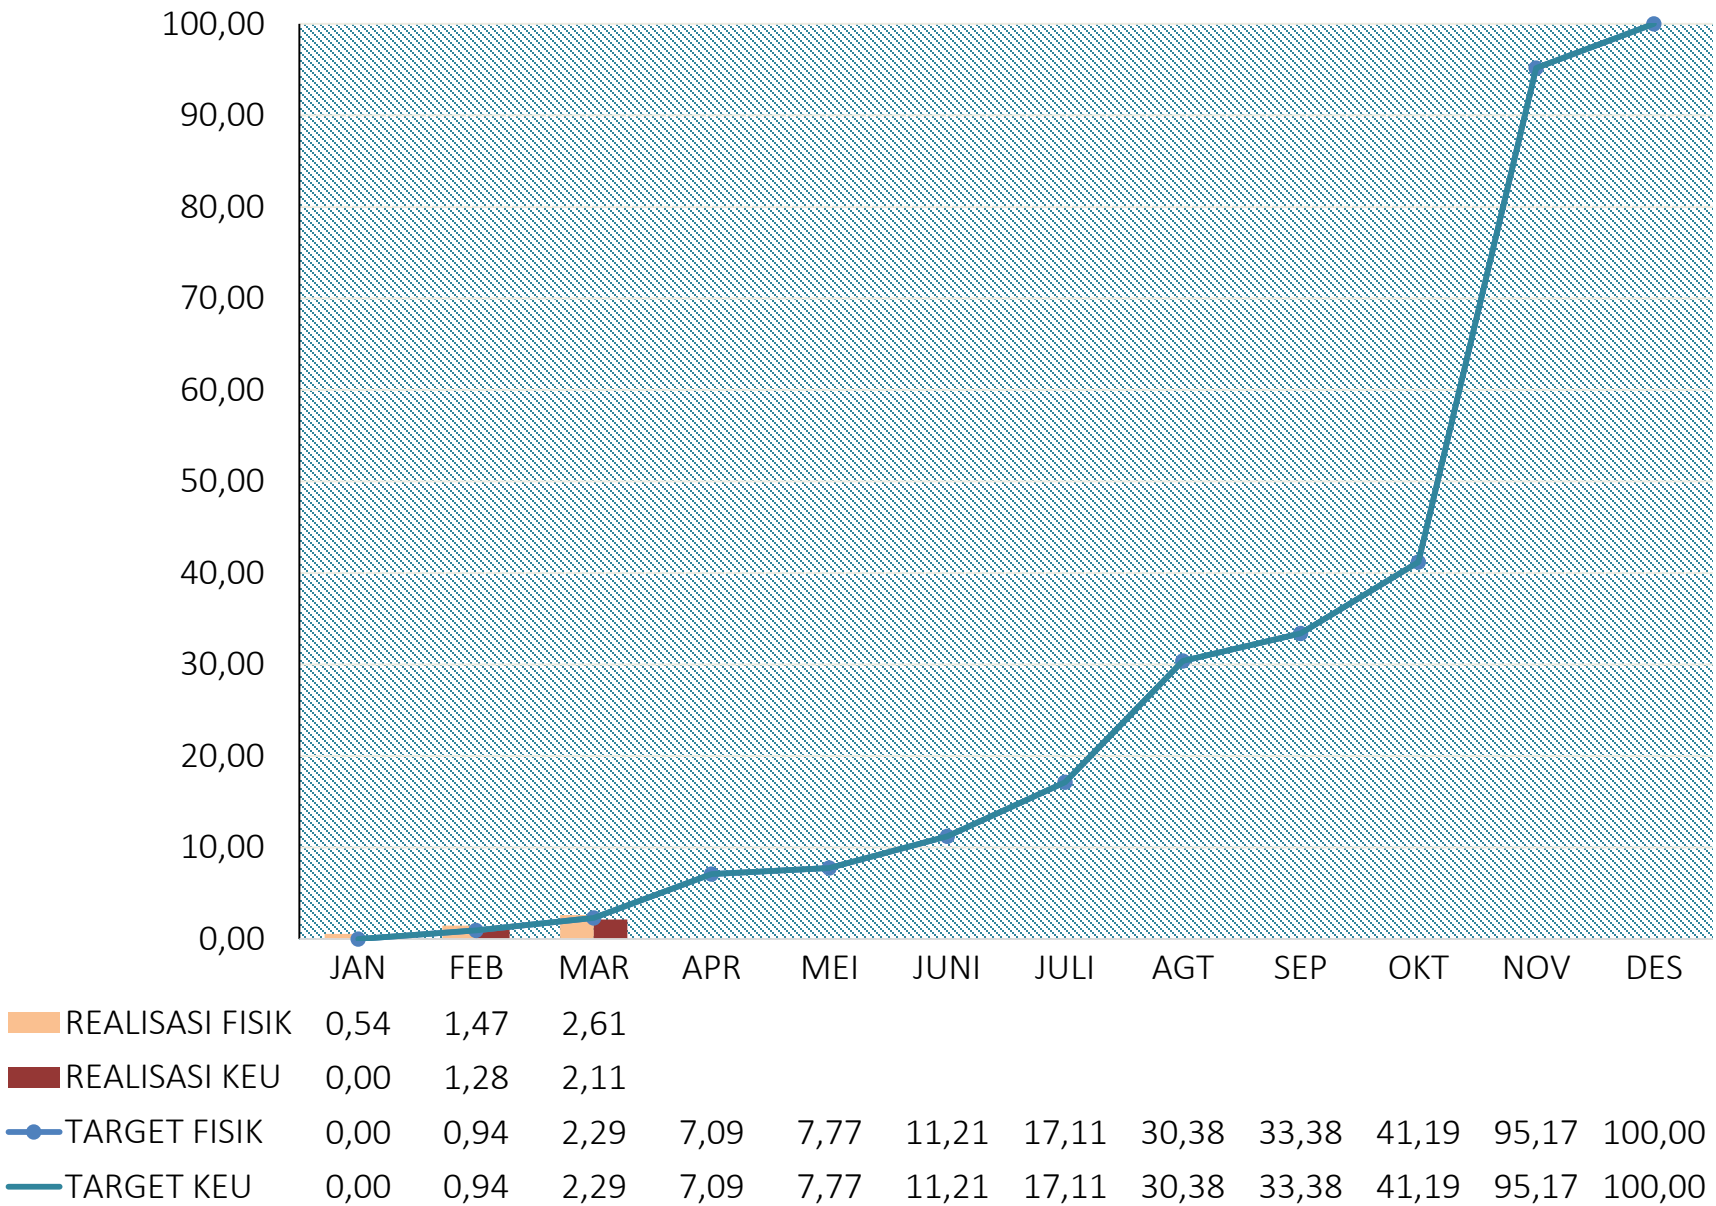

|             | Mar    | Apr  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 2,29   | 7,09 |
| Real. Fisik | 2,61   |      |
| Dev. Fisik  | 0,32   |      |
| Renc. Keu   | 2,29   | 7,09 |
| Real. Keu   | 2,11   |      |
| Dev. Keu    | (0,18) |      |




# KETERPADUAN PKPP

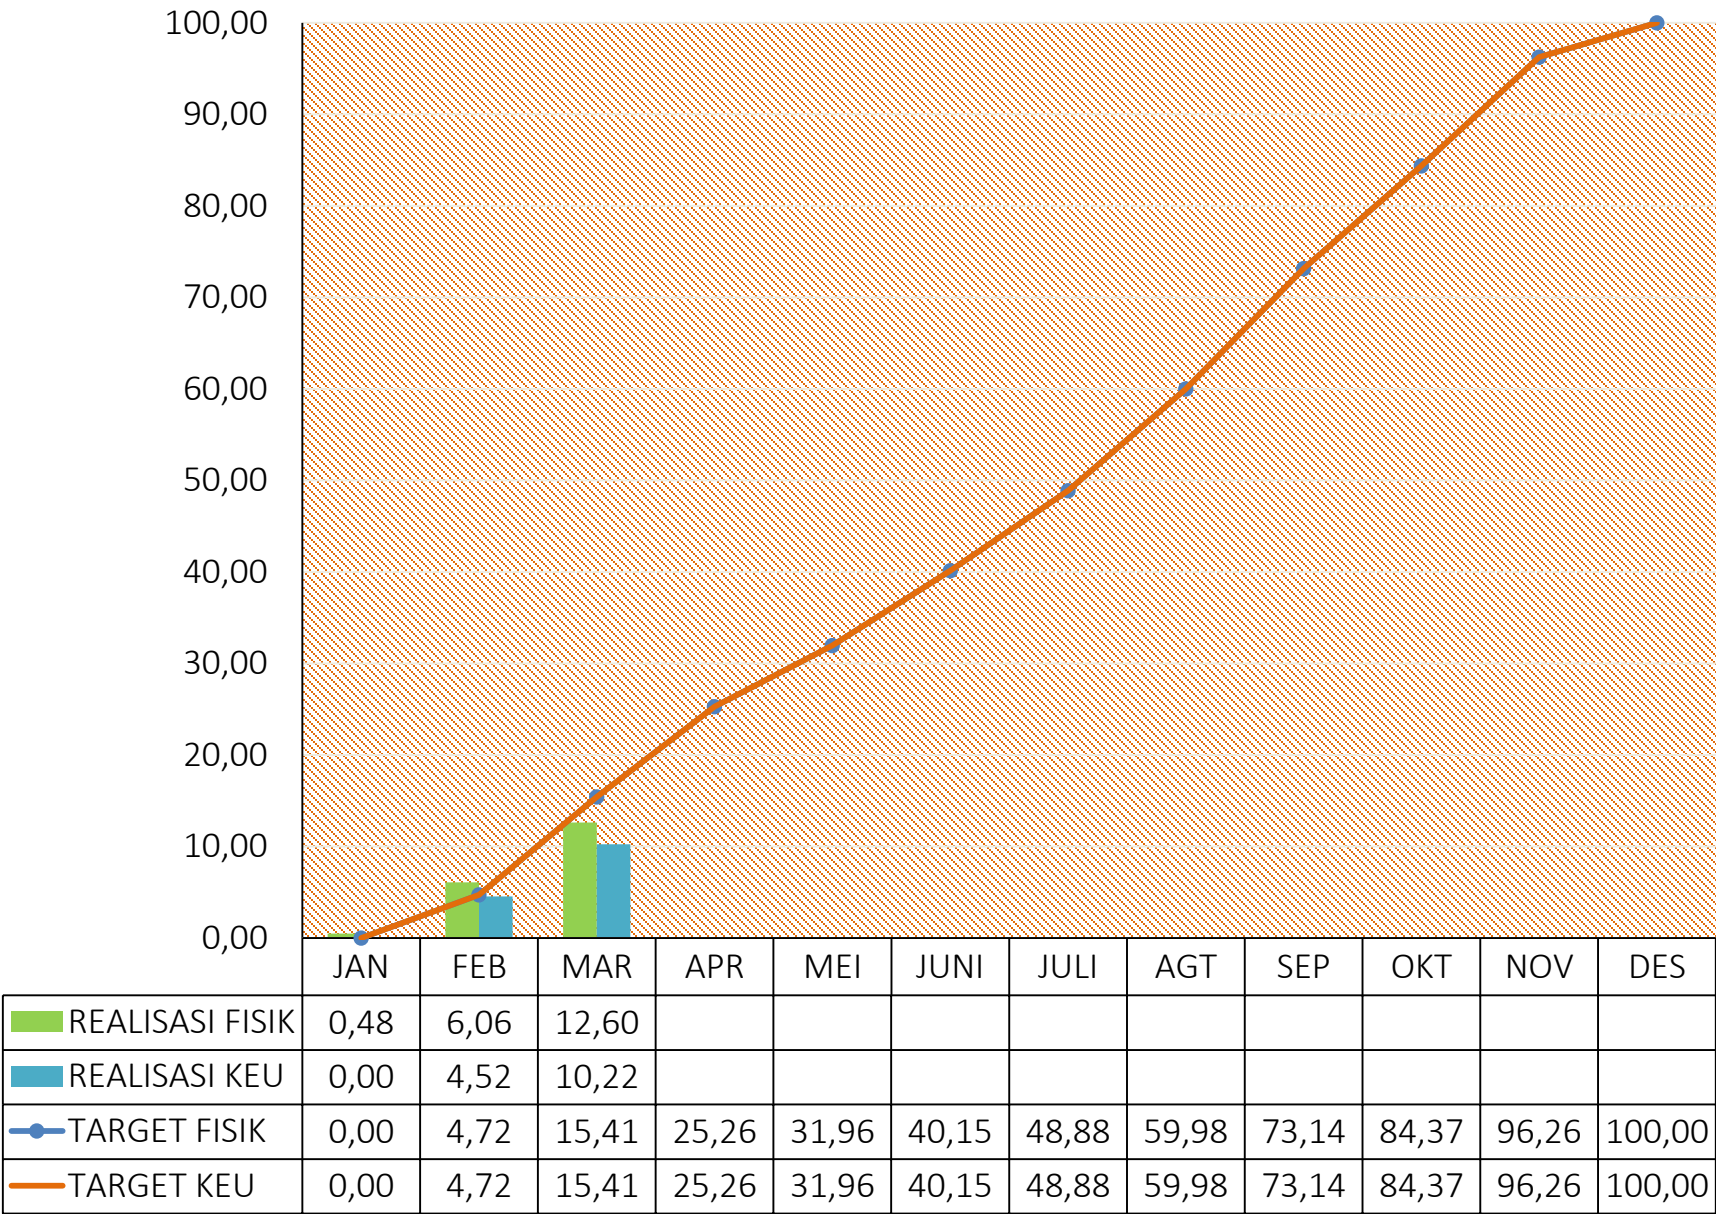

|             | Mar    | Apr   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 15,41  | 25,26 |
| Real. Fisik | 12,60  |       |
| Dev. Fisik  | (2,81) |       |
| Renc. Keu   | 15,41  | 25,26 |
| Real. Keu   | 10,22  |       |
| Dev. Keu    | (5,19) |       |

# PERTANAHAN

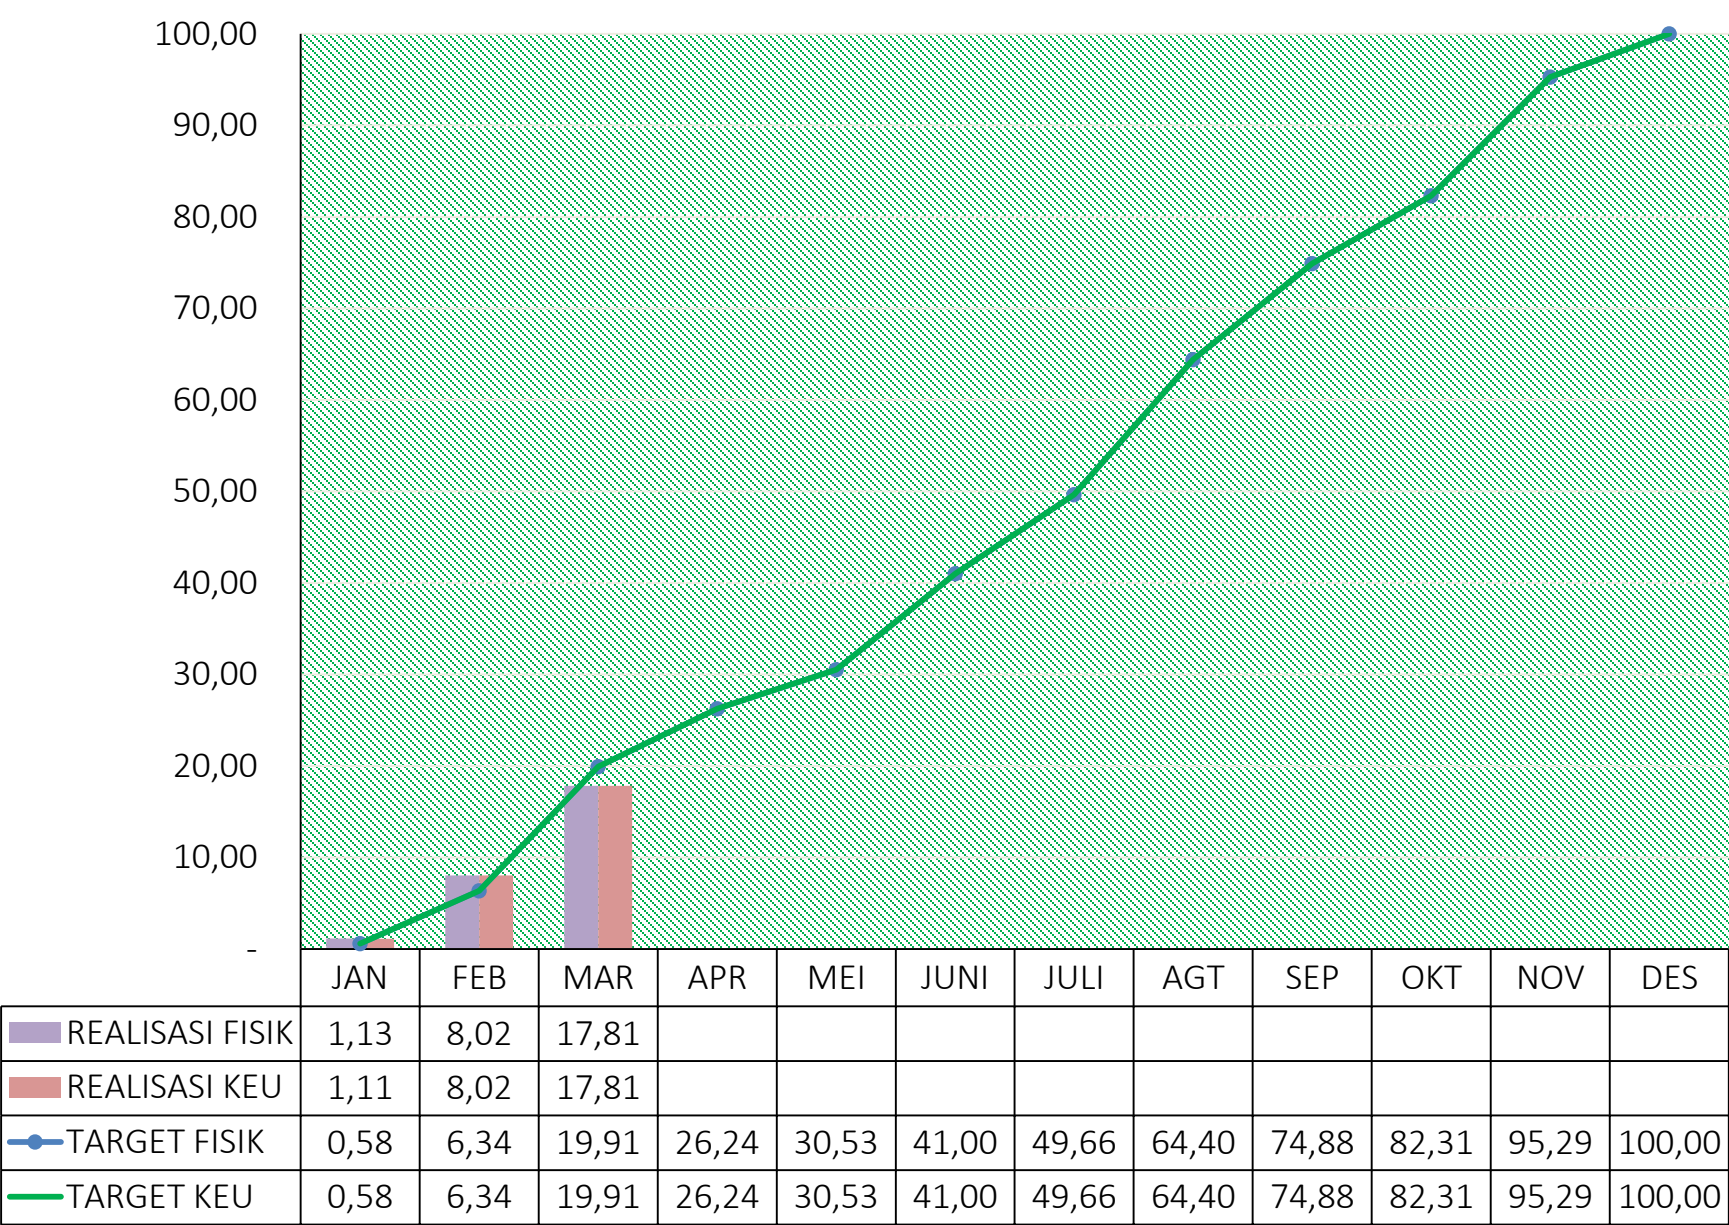

|             | Mar    | Apr |
|-------------|--------|-----|
| Renc. Fisik | 19,91  |     |
| Real. Fisik | 17,81  |     |
| Dev. Fisik  | (2,10) |     |
| Renc. Keu   | 19,91  |     |
| Real. Keu   | 17,81  |     |
| Dev. Keu    | (2,10) |     |



# **PENJELASAN KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**

STATUS AKHIR MARET 2020

# SEKRETARIAT

| NO | KEGIATAN                                                                        | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 | FISIK   | KEU    |                                                                                                 |
| 1  | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                 | -63,64  | -73,18 | Proses pengadaan sedang berlangsung secara berlangsung, dan terkendala adanya pandemik COVID-19 |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah           | -       | -9,59  | Menyesuaikan Kebutuhan (efisiensi)                                                              |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah  | -       | -6,14  | Sisa lelang                                                                                     |
| 4  | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | -       | -10,81 | Adanya larangan perjalanan dinas untuk menghindari penyebaran COVID-19                          |
| 5  | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah                | -       | -2,76  | Menyesuaikan kebutuhan serta agenda kegiatan                                                    |
| 6  | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah                                   | -       | -1,29  | Menyesuaikan dengan event yang ada                                                              |

# BIDANG KETERPADUAN PKPP

| NO | KEGIATAN                                                                                           | DEVIASI |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    | FISIK   | KEU    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | -7,42   | -10,99 | Agenda rapat fullboard Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditunda karena adanya wabah COVID-19 (meliputi belanja sewa hotel, honor narasumber, uang harian fullboard, dan transportasi dalam daerah)                                                                                                                                                                   |
| 2  | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | -0,77   | -1,80  | Beberapa agenda kegiatan ditunda karena adanya wabah COVID-19, yaitu:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah dan Rapat Pemetaan Peran Stakeholders yang meliputi belanja makan dan minum rapat</li><li>2. Penundaan koordinasi dengan pusat yang meliputi belanja transportasi luar daerah</li><li>3. Belanja transportasi dalam daerah</li></ol> |

# BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | KEGIATAN                                           | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    | FISIK   | KEU   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan Permukiman | -1,73   | -3,74 | Penundaan Kegiatan Rakor Pemantauan Kawasan Kumuh berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jateng no. 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Jawa Tengah poin 3 tentang Menunda dan/atau membatasi kegiatan yang menghadirkan orang banyak pada tempat-tempat umum, Rakor sesuai jadwal akan dilaksanakan 31 maret 2020 akan tetapi ditunda sampai dengan status darurat telah dicabut dan situasi sudah kondusif. (Meliputi sewa gedung, makan minum rapat, honor narasumber, moderator, tiket narasumber dan moderator dll.) |


# BIDANG PERUMAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                 | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          | FISIK   | KEU   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                              | -       | -0,42 | Efisiensi pada belanja penginapan dalam daerah, dan beberapa paket (belanja penggandaan, uang harian, dan transportasi perjalanan dinas luar daerah) masih dalam proses pencairan.                                                                                              |
| 2  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | -       | -5,80 | 1. Efisiensi pada belanja dekorasi dan dokumentasi, honor narasumber, sewa hotel, dan penggandaan juknis.<br>2. Beberapa paket masih belum dibayarkan: Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH, honor pejabat pengadaan, ATK, dan makan minum rapat |
| 3  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | -       | -1,41 | Efisiensi pada biaya transportasi dan penginapan Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                                                               |



# BIDANG PERTANAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                          | DEVIASI |        |                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                   | FISIK   | KEU    |                                                                                                                                                                                                |
| 1  | Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | -14,63  | -14,79 | Mundurnya jadwal Rapat Koordinasi Teknsi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena adanya pandemik COVID-19, yang meliputi belanja sewa hotel, ATK, dan honor narasumber. |



# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

STATUS AKHIR MARET 2020

# REKAP PENGADAAN BARANG/JASA

| NO | BIDANG             | PAGU           | SWAKELOLA      |     | BARANG/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA |     |                |     | JASA KONSULTANSI   |     |               |     | TOTAL PAKET    |     |
|----|--------------------|----------------|----------------|-----|--------------------------------|-----|----------------|-----|--------------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
|    |                    |                |                |     | PENGADAAN LANGSUNG             |     | TENDER         |     | PENGADAAN LANGSUNG |     | SELEKSI       |     |                |     |
|    |                    |                | Rp             | Jml | Rp                             | Jml | Rp             | Jml | Rp                 | Jml | Rp            | Jml | Rp             | Jml |
| 1  | SEKRETARIAT        | 6.480.000.000  | 4.518.500.000  | 63  | 1.116.400.000                  | 10  | 750.100.000    | 2   | 95.000.000         | 3   | 0             | 0   | 6.480.000.000  | 78  |
| 2  | PERUMAHAN          | 14.955.000.000 | 3.408.200.000  | 52  | 1.636.800.000                  | 10  | 9.090.000.000  | 15  | 250.000.000        | 4   | 570.000.000   | 3   | 14.955.000.000 | 84  |
| 3  | KAWASAN PERMUKIMAN | 5.251.500.000  | 1.221.500.000  | 47  | -                              | 0   | 3.150.000.000  | 6   | 170.000.000        | 3   | 710.000.000   | 2   | 5.251.500.000  | 58  |
| 4  | KETERPADUAN PKP    | 1.630.000.000  | 992.600.000    | 47  | 221.400.000                    | 4   | 0              | 0   | 416.000.000        | 7   | 0             | 0   | 1.630.000.000  | 58  |
| 5  | PERTANAHAN         | 1.765.000.000  | 1.657.500.000  | 40  | 42.500.000                     | 1   | -              | -   | 65.000.000         | 1   | -             | -   | 1.765.000.000  | 42  |
|    | TOTAL              | 30.081.500.000 | 11.798.300.000 | 249 | 3.017.100.000                  | 25  | 12.990.100.000 | 23  | 996.000.000        | 18  | 1.280.000.000 | 5   | 30.081.500.000 | 320 |

# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Maret 2020

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                    | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE | PROGRES LELANG                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                               |                     |        |                                                                    |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (8 bulan)               | 345.100.000         | Tender | Persiapan Lelang                                                   |
| 2                | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor                                  | 405.000.000         | Tender |                                                                    |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                               |                     |        |                                                                    |
| 3                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan | 525.000.000         | Tender | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga              |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang  | 840.000.000         | Tender | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga              |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak    | 735.000.000         | Tender | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga              |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara   | 560.000.000         | Tender | Pengumuman Pasca Kualifikasi                                       |
| 7                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati               | 490.000.000         | Tender | Belum tayang dan belum aanwijzing, kemungkinan depending Biro APBJ |
| 8                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes   | 840.000.000         | Tender | Pengumuman Pascakualifikasi                                        |
| 9                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemalang | 840.000.000         | Tender | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga              |

# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Maret 2020

| NO. | KEGIATAN | NAMA PAKET                                                        | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 10  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara | 455.000.000         | Tender  | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga |
| 11  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo     | 385.000.000         | Tender  | Pembukaan Dokumen Penawaran                           |
| 12  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung   | 455.000.000         | Tender  | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga |
| 13  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen      | 770.000.000         | Tender  | Pengumuman Pascakualifikasi                           |
| 14  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten       | 420.000.000         | Tender  | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga |
| 16  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen       | 385.000.000         | Tender  | Pengumuman Pascakualifikasi                           |
| 17  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo    | 840.000.000         | Tender  | Pembukaan Dokumen Penawaran                           |
| 18  |          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru                          | 200.000.000         | Seleksi | Persiapan Lelang                                      |

# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Maret 2020

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES<br>LELANG                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------|
| 19  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000         | Tender  | Dokumen Lelang sedang direview oleh Pokja |
| 20  |                                                                                                                                         | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000         | Seleksi | Pengiriman Persyaratan Kualifikasi        |
| 21  |                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000         | Seleksi | Pengiriman Persyaratan Kualifikasi        |

# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Maret 2020



| NO.                       | KEGIATAN                                                                   | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES<br>LELANG                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                            |                                      |                     |         |                                            |
| 22                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 1.000.000.000       | Tender  |                                            |
| 23                        |                                                                            | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 750.000.000         | Tender  |                                            |
| 24                        |                                                                            | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 500.000.000         | Tender  |                                            |
| 25                        |                                                                            | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  |                                            |
| 26                        |                                                                            | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  |                                            |
| 27                        |                                                                            | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  |                                            |
| 28                        |                                                                            | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 160.000.000         | Seleksi | Proses<br>Prakualifikasi                   |
| 29                        | Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman                            | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 550.000.000         | Seleksi | Sedang dalam<br>proses persiapan<br>lelang |



# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      |                                                                                                           |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020                                                                   |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020                                                                   |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Terkontrak 9 Maret 2020                                                                                   |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 197.600.000      |                                                                                                           |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       |                                                                                                           |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       |                                                                                                           |
| 8   |                                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      |                                                                                                           |
| 9   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Sudah melakukan koordinasi dengan konsultan, namun secara administratif bergantian dg paket kegiatan lain |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       |                                                                                                           |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       |                                                                                                           |
| 12  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020                                                                             |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                 | NAMA PAKET         | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                  |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 13  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Belanja Sewa Hotel | 86.400.000       | Sudah terlaksana 6-7 Maret 2020 |

| REKAP PENGADAAN LANGSUNG BIDANG PERUMAHAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                  |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                                        | KEGIATAN                                                                                                                                 | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                                                   |
| 1                                         | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                              | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020                                                     |
| 2                                         |                                                                                                                                          | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       | Proses Persiapan Lelang                                                                          |
| 3                                         |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 175.000.000      | Menunggu penandatanganan SK Gubernur                                                             |
| 4                                         | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      | Pembukaan Dokumen Penawaran                                                                      |
| 5                                         |                                                                                                                                          | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 64.800.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020                                                       |
| 6                                         |                                                                                                                                          | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 31 Januari 2020, masa kontrak 31 januari 2020 - 30 maret 2020 (60 Hari) |
| 7                                         | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan Akses Rusunawa Kota Semarang                                    | 50.000.000       |                                                                                                  |
| 8                                         |                                                                                                                                          | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      |                                                                                                  |
| 9                                         |                                                                                                                                          | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      |                                                                                                  |
| 10                                        |                                                                                                                                          | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      |                                                                                                  |
| 11                                        |                                                                                                                                          | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      |                                                                                                  |
| 12                                        |                                                                                                                                          | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      |                                                                                                  |
| 13                                        |                                                                                                                                          | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      |                                                                                                  |
| 14                                        |                                                                                                                                          | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      |                                                                                                  |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Sewa Hotel 1                                                                                                    | 56.700.000       | Ditunda terkait larangan perjalanan dinas dan berkumpul secara massal karena wabah COVID-19 |
| 2   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel 2                                                                                                    | 56.700.000       |                                                                                             |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       |                                                                                             |
| 4   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Terkontrak tanggal 17 Februari 2020 (Masa kontrak 2 bulan)                                  |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Reschedule                                                                                  |
| 6   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 3 Februari 2020 (Masa kontrak 11 bulan)                                  |
| 7   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 (Masa kontrak 10 bulan)                                 |
|     |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel Forum Pokja PKP Paket Fullboard Dalam Daerah                                                         | 54.000.000       |                                                                                             |
| 8   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 (Masa kontrak 10 bulan)                                 |
| 9   | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Belanja Sewa Hotel                                                                                                      | 54.000.000       |                                                                                             |
| 10  |                                                                                                    | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                 | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 12 Februari 2020 (Masa kontrak 10,5 bulan)                               |

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KAW. PERMUKIMAN**

| NO. | KEGIATAN                                       | NAMA PAKET                          | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 60.000.000       |                |
| 2   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 60.000.000       |                |
| 3   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 50.000.000       |                |

## REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                          | NAMA PAKET                             | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | Sewa Hotel Paket Full board            | 42.500.000       | Ditunda terkait larangan perjalanan dinas dan berkumpul secara massal karena wabah COVID-19 |
| 2   |                                                                                                   | Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi | 65.000.000       |                                                                                             |

# LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT

| MEDIA        | JAN       | FEB       | MAR       | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Facebook     | 1         | 3         | 1         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Instagram    | 2         | 1         | 1         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ponsel/SMS   | 7         | 5         | 7         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Web          | 11        | 10        | 4         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Whatsapp     | 10        | 5         | 4         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>TOTAL</b> | <b>31</b> | <b>24</b> | <b>17</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Jumlah Laporan yang masuk pada bulan Maret 2020 sebanyak 17 Laporan, dengan rincian :**

**a. TUNTAS DIJAWAB = 16 LAPORAN**

**b. MASIH DALAM PROSES BIDANG = 1 LAPORAN**

## RINCIAN PERTANYAAN LAPORGUB YANG MASIH DALAM PROSES BIDANG PERUMAHAN

Laporan Tidak Disertai Gambar



02-03-2020 22:39 WIB

Jenis : Non Infrastrukur

Melalui : instagram

Lokasi : -

Lampiran : Tidak ada.

Laporan : Lapor pak gubernur,mohon dicek bantuan rumah tidak layak huni di desa karangjati susukan banjarnegara.kemungkinan ada yang kurang sesuai Setau saya,kata pegawai desa skitar 10 jt untuk rumah plus jamban,lua ini baru harga matrial yg d kirim baru skitar 5 jt,kok sudah 4 bln ga d kirim lg tanpa ada penjelasan dari prangkat desa,pdahal ktanya dana rtlh sudah cair yg 2019.Lalu kmana dana itu.



**Jawaban : (dijawab tgl 6 April 2020, jam 14.24)**

Menanggapi laporan yang disampaikan ke Laporgub, bahwa dari hasil koordinasi dengan perangkat Desa Karangjati Kec. Susukan Banjarnegara bahwa seluruh bantuan berupa bantuan stimulant senilai Rp. 10 juta (belum termasuk potongan pajak) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah telah diserahkan ke warga. Adapun laporan pertanggungjawaban juga telah disampaikan ke DISPERAKIM Prov. Jawa Tengah.





LAT 7°29'22" S

MONDAY 04.06.2020

LONG 109°25'51" E

LOCAL TIME 12:48:42

Jl. Tugu Wayang, Pakopen Wetan, Karangjati, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah 53475,  
Indonesia, Jawa Tengah, Susukan, Indonesia, 53475



LAT 7°29'7" S

MONDAY 04.06.2020

LONG 109°25'52" E

LOCAL TIME 13:12:24

wetan lapangan, Krajan, Karangjati, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah 53475, Indonesia, Jawa  
Tengah, Susukan, Indonesia, 53475



# PENEKANAN APBD

1. Bagi bidang yang belum selesai menginput e-planning, harap untuk segera diselesaikan
2. Sesuai dengan Pergub Jateng no 59 th 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 pasal 49 ayat 1, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan pembayaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara serah terima hasil pekerjaan.
3. Sehubungan dengan penetapan Status Tanggap Darurat Pandemi COVID-19, maka diberlakukan beberapa prosedur pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Disperakim Jateng, antara lain: setiap orang yang akan memasuki gedung kantor harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan *hand sanitizer*, dan diukur suhunya menggunakan *thermal gun*, apabila suhu ybs di atas 38°C maka tidak diperbolehkan memasuki gedung kantor. Setiap karyawan/orang yang memasuki gedung kantor wajib mengenakan masker, serta wajib menjaga jarak satu-sama lain minimal 1 m. diberlakukan WFH (Work From Home) secara bergiliran, absen secara online menggunakan aplikasi Sinaga, dan rapat dapat dilaksanakan melalui video conference, serta penyemprotan disinfektan setiap 3 hari sekali.
4. Pelaksanaan workshop/seminar/FGD yang semula direncanakan bulan Maret - April ditunda sampai dengan dicabutnya status tanggap darurat wabah COVID-19.
5. Perlu adanya antisipasi terhadap pemotongan anggaran kegiatan tahap 2, seperti perjalanan dinas, makan minum rapat, serta penundaan atau pembatalan workshop/seminar/FGD.

# PENEKANAN APBD

- Setiap bidang harap mengumpulkan **isian Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. TW I** (format terlampir) **paling lambat RABU, 8 APRIL jam 14.00** dalam bentuk **soft file** yang berupa format **excel** dan hasil **scan** data tsb yang **sudah di paraf kabid dan kasi (ke email programdisperakim@gmail.com)** ke subag program.
- Bagi karyawan yang belum mengisi SPT (<https://efiling.pajak.go.id/efile/spt>) dan Sensus Penduduk Online (<https://sensus.bps.go.id/login>), harap untuk segera mengisi sebelum batas waktu yang ditentukan.


|                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                  |                                                            |                                 | FORM 2<br>CAPAIAN KINERJA PER URUSAN TAHUN 2020 |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| URUSAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                  |                                                            |                                 |                                                 |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| NO                                               | TUJUAN/ SASARAN /URUSAN/<br>PROGRAM PEMBANGUNAN/<br>KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM (OUTCOME)<br>DAN KEGIATAN<br>(OUTPUT)                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>RPJMD<br>2023 | REALISASI<br>PENCAPAIAN<br>KINERJA RPJMD<br>s/d TAHUN 2019 | TARGET<br>KINERJA<br>Tahun 2020 | REALISASI KINERJA TAHUN 2020                    |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                  |                                                            |                                 | JAN                                             |           | FEB    |           | MARET  |           | APRIL  |           | MEI    |           | JUN    |           | JUL    |           | AGST   |           | SEPT   |           | OKT    |           | NOV    |           |
|                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                  |                                                            |                                 | TARGET                                          | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                              | 4                                | 5                                                          | 6                               | 7                                               | 8         | 9      | 10        | 11     | 12        | 13     | 14        | 15     | 16        | 17     | 18        | 19     | 20        | 21     | 22        | 23     | 24        | 25     | 26        | 27     | 28        |
| 4.                                               | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                   |                                                                                                                                |                                  |                                                            |                                 |                                                 |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|                                                  | Tujuan : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas                                                      | 1). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak                                                     | 89,28%                           | 84,34%                                                     | 84,24%                          |                                                 |           | 84,34% |           |        |           |        |           |        |           | 84,34% |           |        |           |        |           | 84,34% |           |        |           |        |           |
|                                                  | Sasaran : Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan              | Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni                                                                                 | 34,16%                           | 5,04%                                                      | 5,95%                           |                                                 |           | 5,04%  |           |        |           |        |           |        |           | 5,04%  |           |        |           |        |           | 5,04%  |           |        |           |        |           |
| 1.                                               | Program Pembangunan Perumahan 6)                                                                                                                 | a). Persentase Rumah Layak Huni yang Disediakan                                                                                | 12,50%                           | 0,00%                                                      | 4,57%                           | 0,00%                                           |           | 0,00%  |           | 0,00%  |           | 0,00%  |           | 0,00%  |           | 0,00%  |           | 0,00%  |           | 0,00%  |           | 0,00%  |           | 0,00%  |           | 0,00%  |           |
|                                                  |                                                                                                                                                  | b). Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani                                                                          | 37,24%                           | 4,89%                                                      | 10,35%                          | 4,89%                                           |           | 4,89%  |           | 4,89%  |           | 4,89%  |           | 4,89%  |           | 5,13%  |           | 5,13%  |           | 5,13%  |           | 6,22%  |           | 6,22%  |           | 6,22%  |           |
| 1.a                                              | Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | Jumlah rumah yang ditangani                                                                                                    | 176.755                          | 68.304                                                     | 11.292                          | 0                                               |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 1.128  |           |        |           |        | 5.082     |        |           |        |           |        |           |
| 1.b                                              | Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Jumlah rumah terdampak bencana, fasilitasi relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya tertangani | 1124                             | 150                                                        | 120                             | 0                                               |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 116    |           |        |           |        |           |
| 1.c                                              | Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | Jumlah dokumen yang disusun                                                                                                    | 10                               | 2                                                          | 2                               | 0                                               |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 1      |           | 0      |           | 0      |           | 1      |           | 0      |           | 0      |           |
|                                                  |                                                                                                                                                  | Jumlah unit rumah yang dibangun                                                                                                | 3.500                            | 0                                                          | 250                             | 0                                               |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 0      |           | 61     |           | 0      |           | 0      |           | 189    |           | 0      |           | 0      |           |
|                                                  |                                                                                                                                                  | 2). Presentase kawasan permukiman yang layak huni dan                                                                          |                                  | 79,33%                                                     | 79,29%                          |                                                 |           | 79,33% |           |        |           |        |           |        |           | 79,33% |           |        |           |        | 79,33%    |        |           |        |           |        |           |

**APBN**



# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN


## PAGU – Rp 435.063.575.000

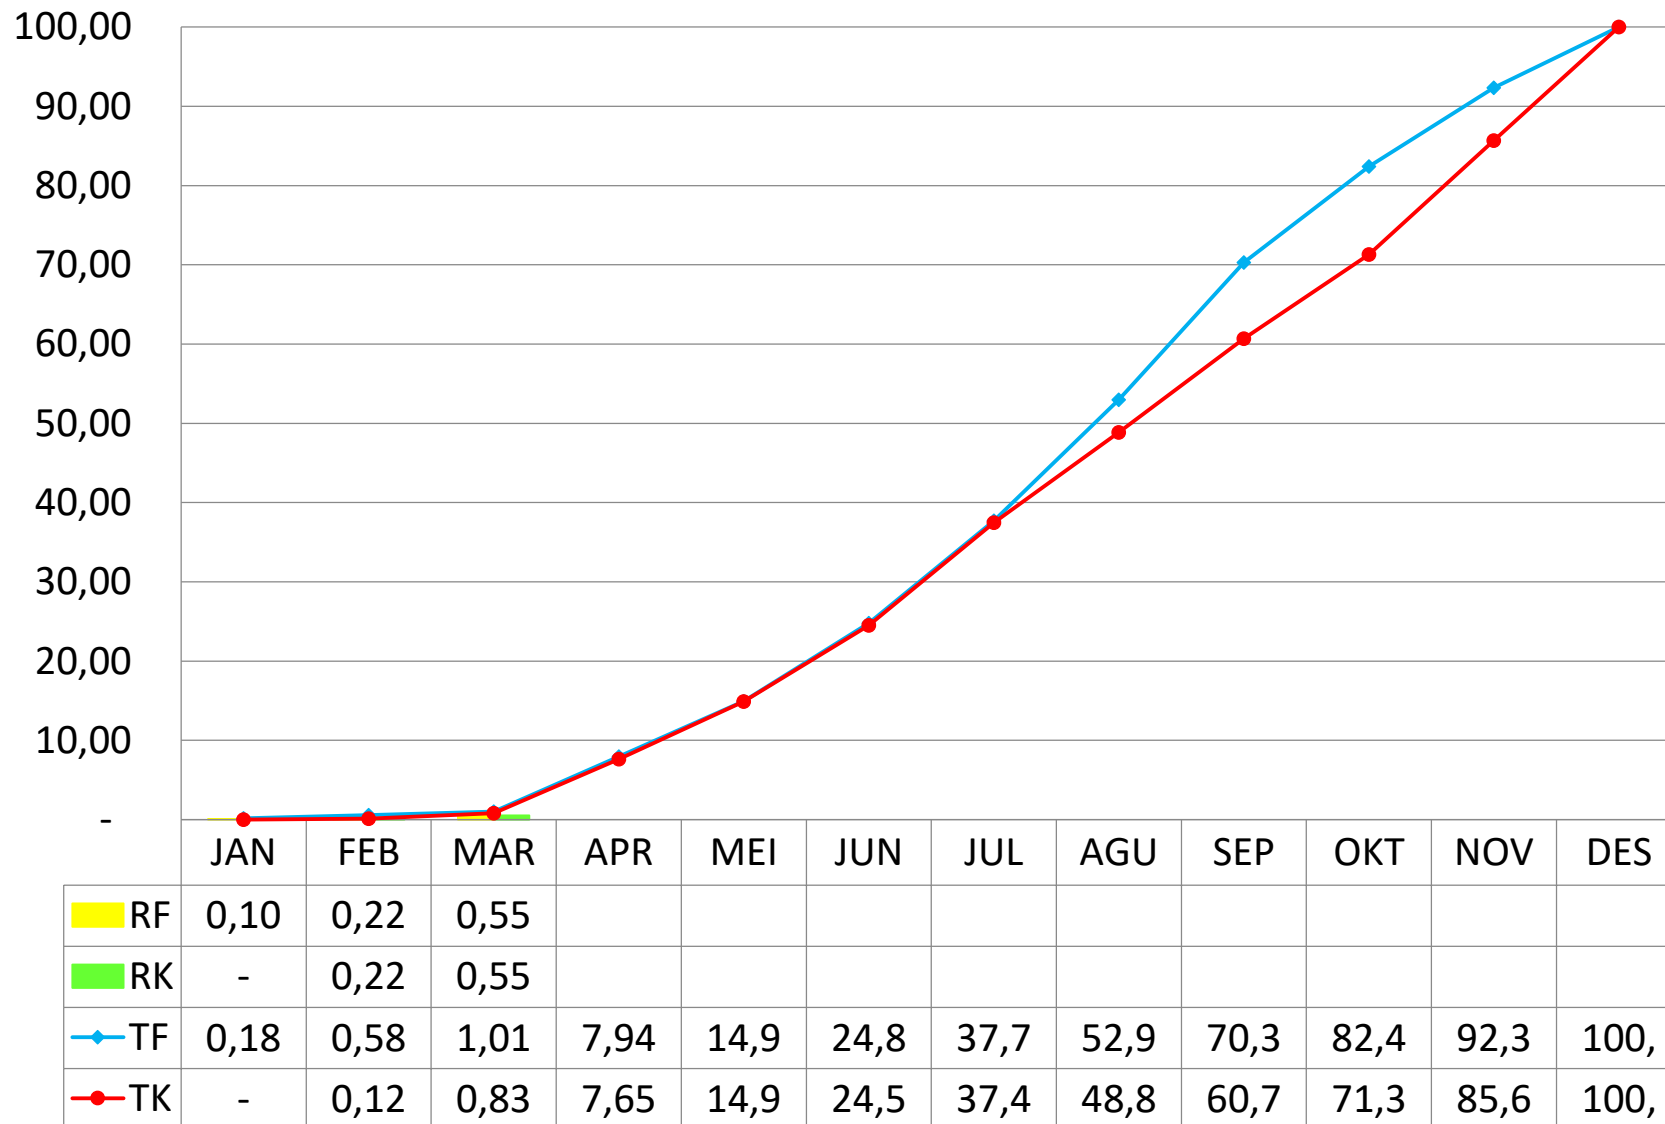

|             | Mar    | Apr  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 1,01   | 7,94 |
| Real. Fisik | 0,55   |      |
| Dev. Fisik  | (0,46) |      |
| Renc. Keu   | 0,83   | 7,65 |
| Real. Keu   | 0,55   |      |
| Dev. Keu    | (0,28) |      |

# BPPW JATENG

## PAGU – Rp 1.459.469.275,00

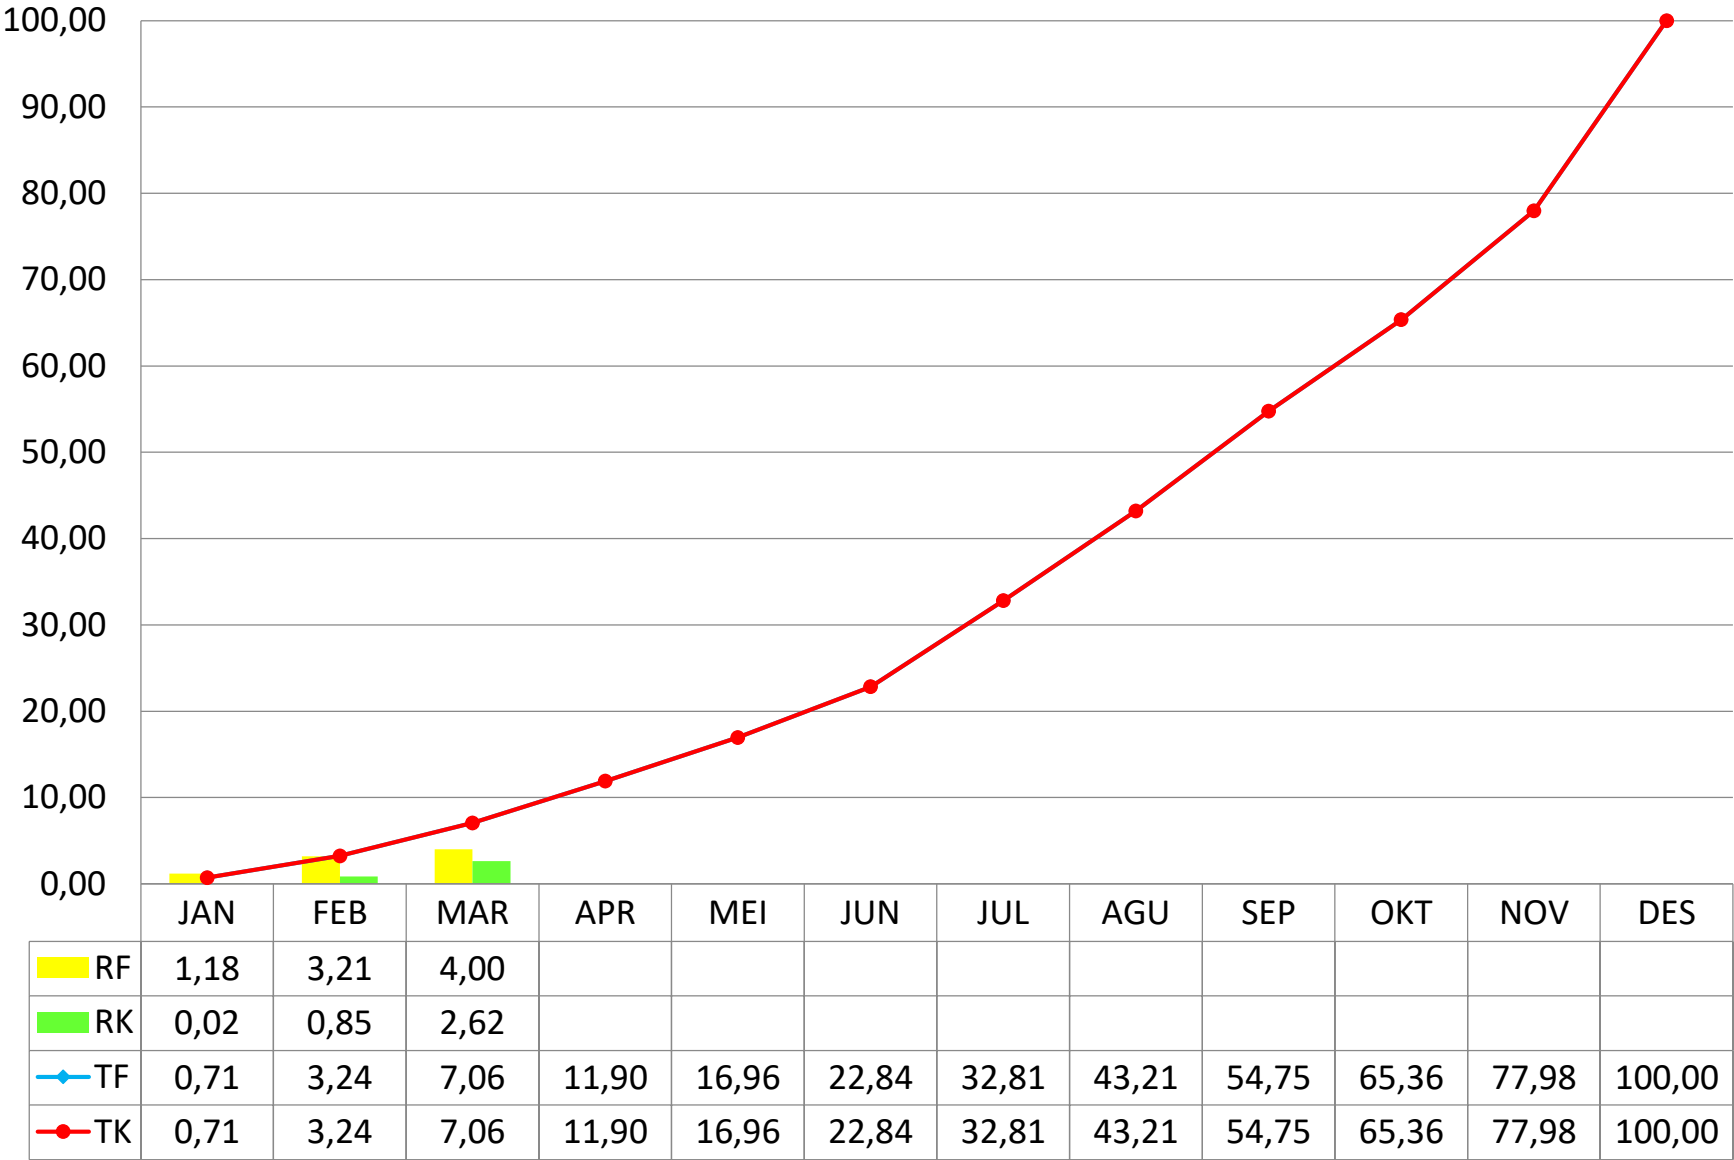

|             | Mar    | Apr   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 7,06   | 11,90 |
| Real. Fisik | 4,00   |       |
| Dev. Fisik  | (3,06) |       |
| Renc. Keu   | 7,06   | 11,90 |
| Real. Keu   | 2,62   |       |
| Dev. Keu    | (4,44) |       |



A solid red square is positioned on the left side of the image. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**

# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR FEBRUARI 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH






# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PENEKANAN APBD
7. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

# KOMPOSISI ANGGARAN

## DISPERAKIM TA. 2020

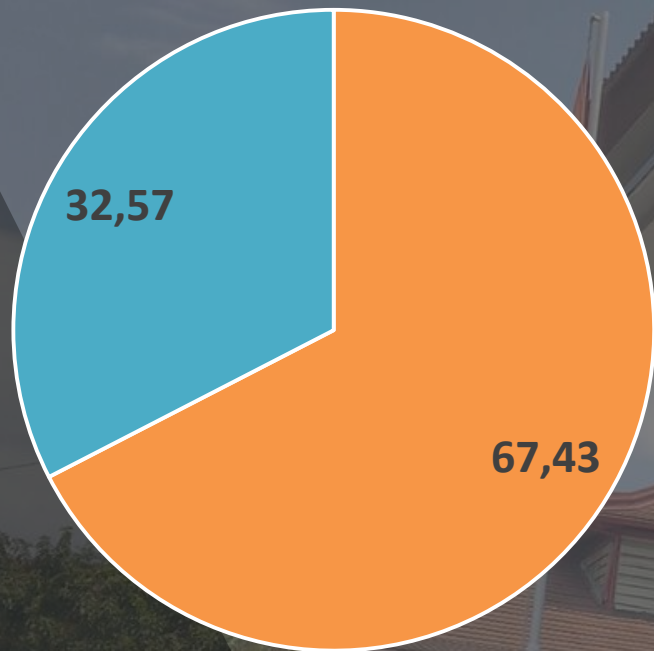


■ BELANJA LANGSUNG ■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

| NO | BELANJA                | PAGU           | %     |
|----|------------------------|----------------|-------|
| 1  | BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000 | 67,43 |
| 2  | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000 | 32,57 |
|    | TOTAL                  | 44.612.807.000 |       |



# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020

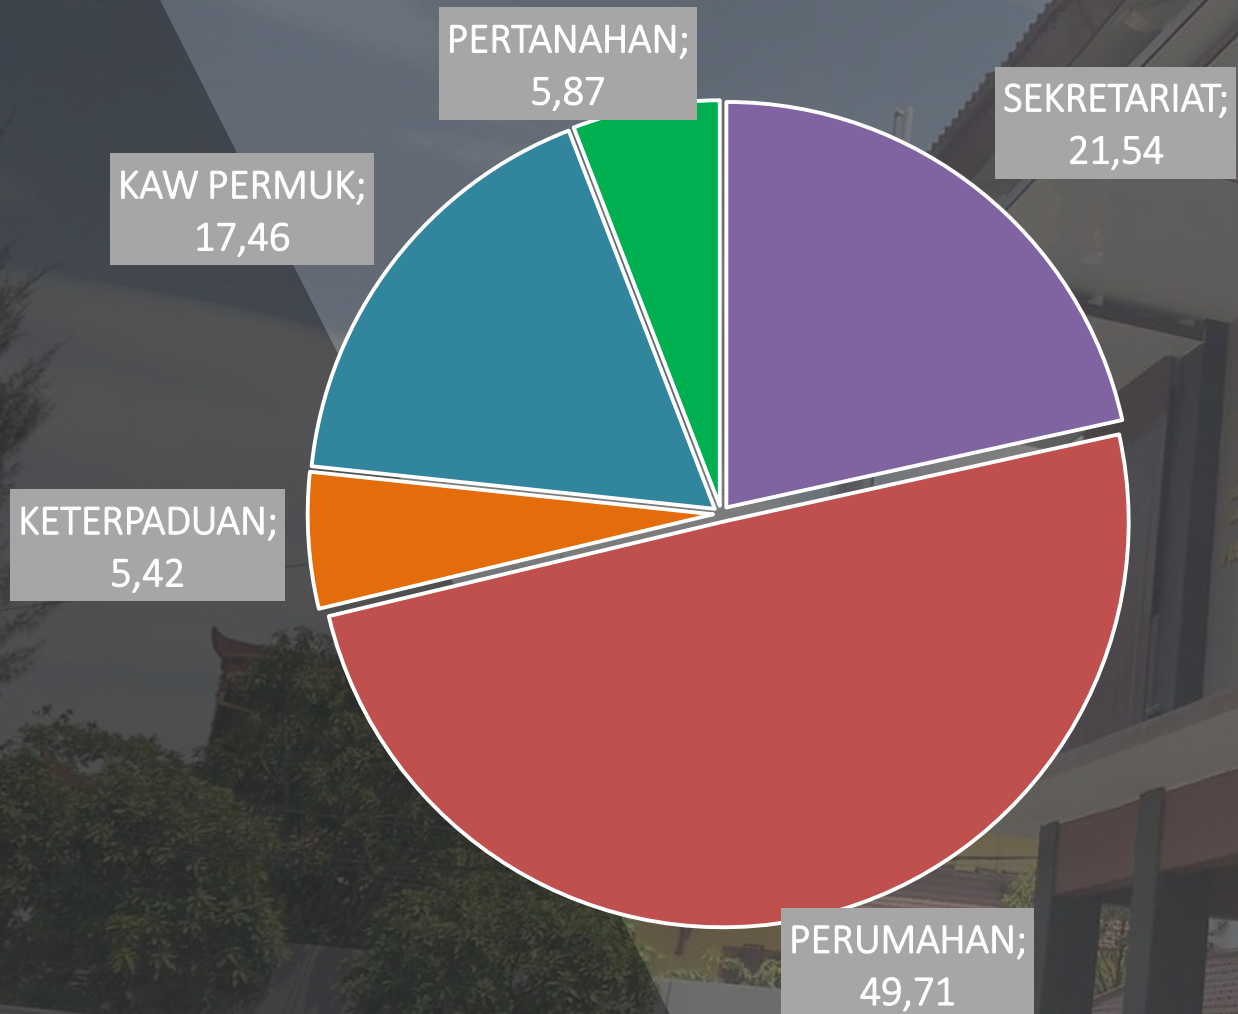


| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |



# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

STATUS AKHIR FEBRUARI 2020


# DISPERAKIM

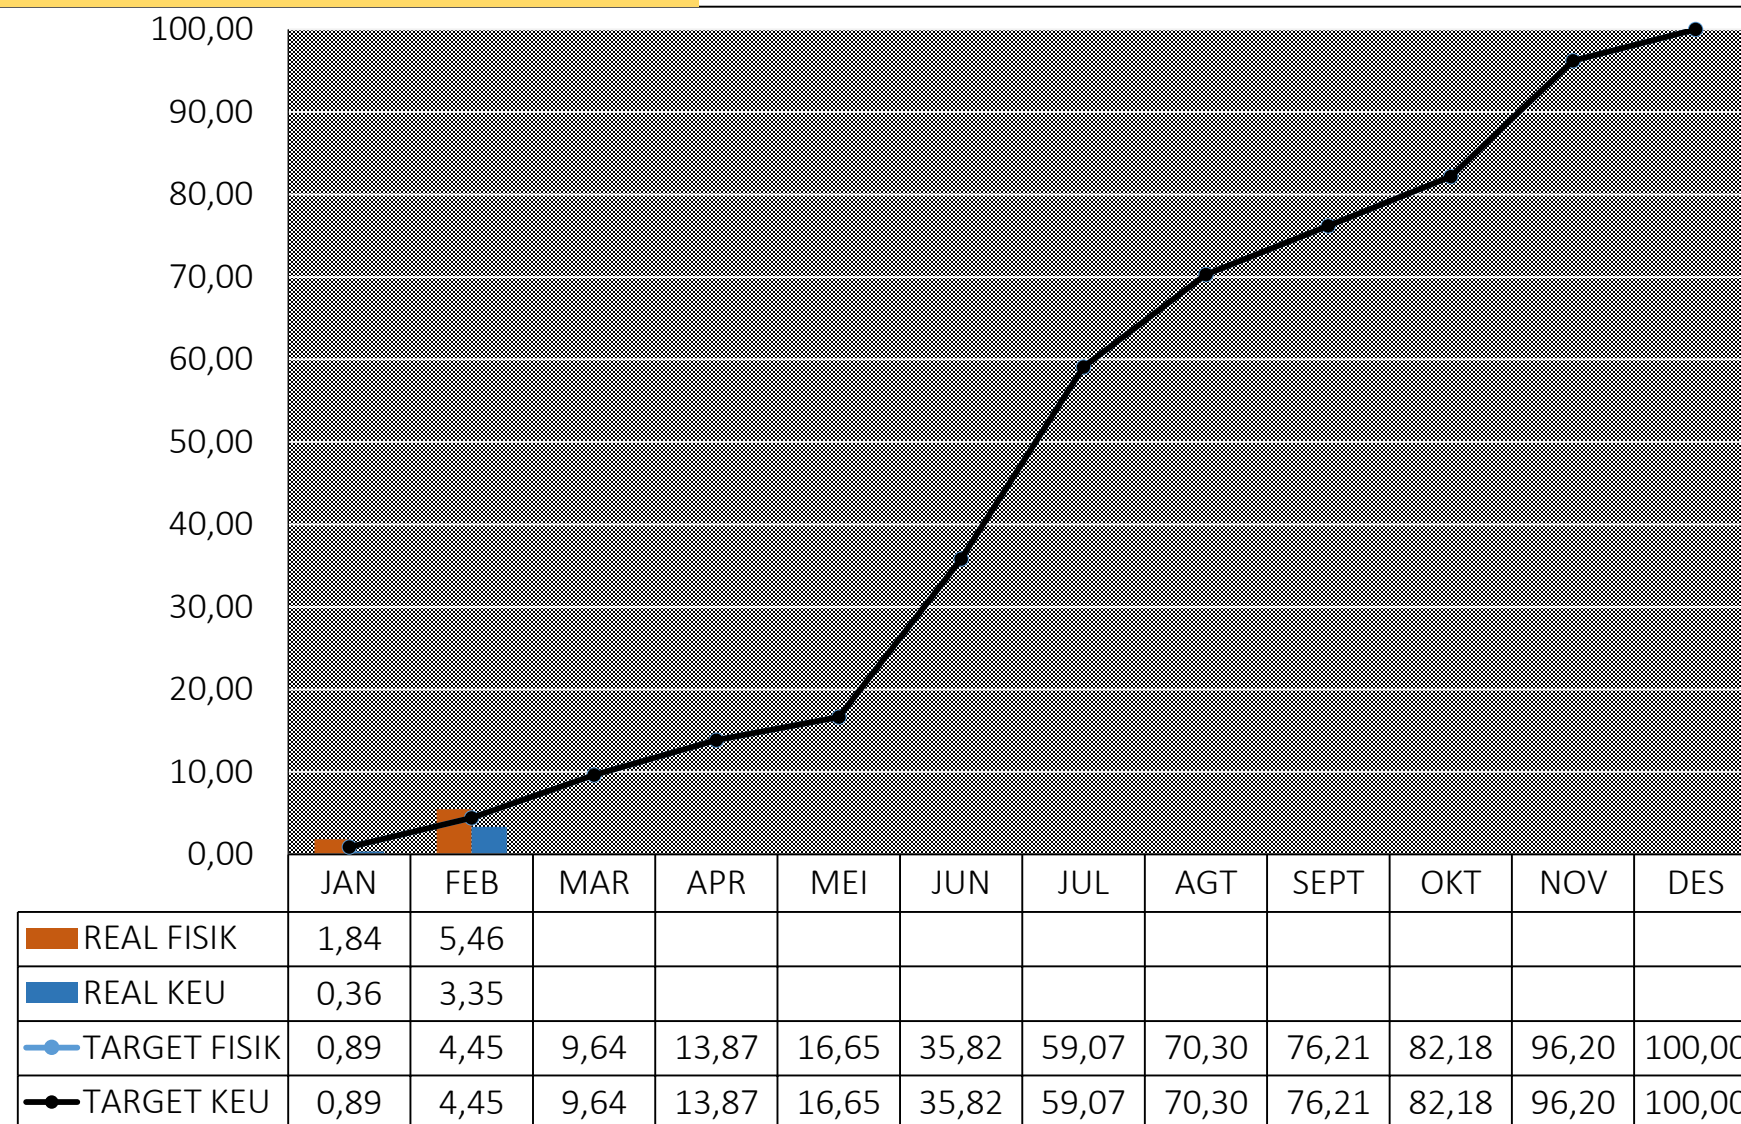

|             | Feb    | Mar  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 4,45   | 9,64 |
| Real. Fisik | 5,46   |      |
| Dev. Fisik  | 1,01   |      |
| Renc. Keu   | 4,45   | 9,64 |
| Real. Keu   | 3,35   |      |
| Dev. Keu    | (1,10) |      |




# SEKRETARIAT

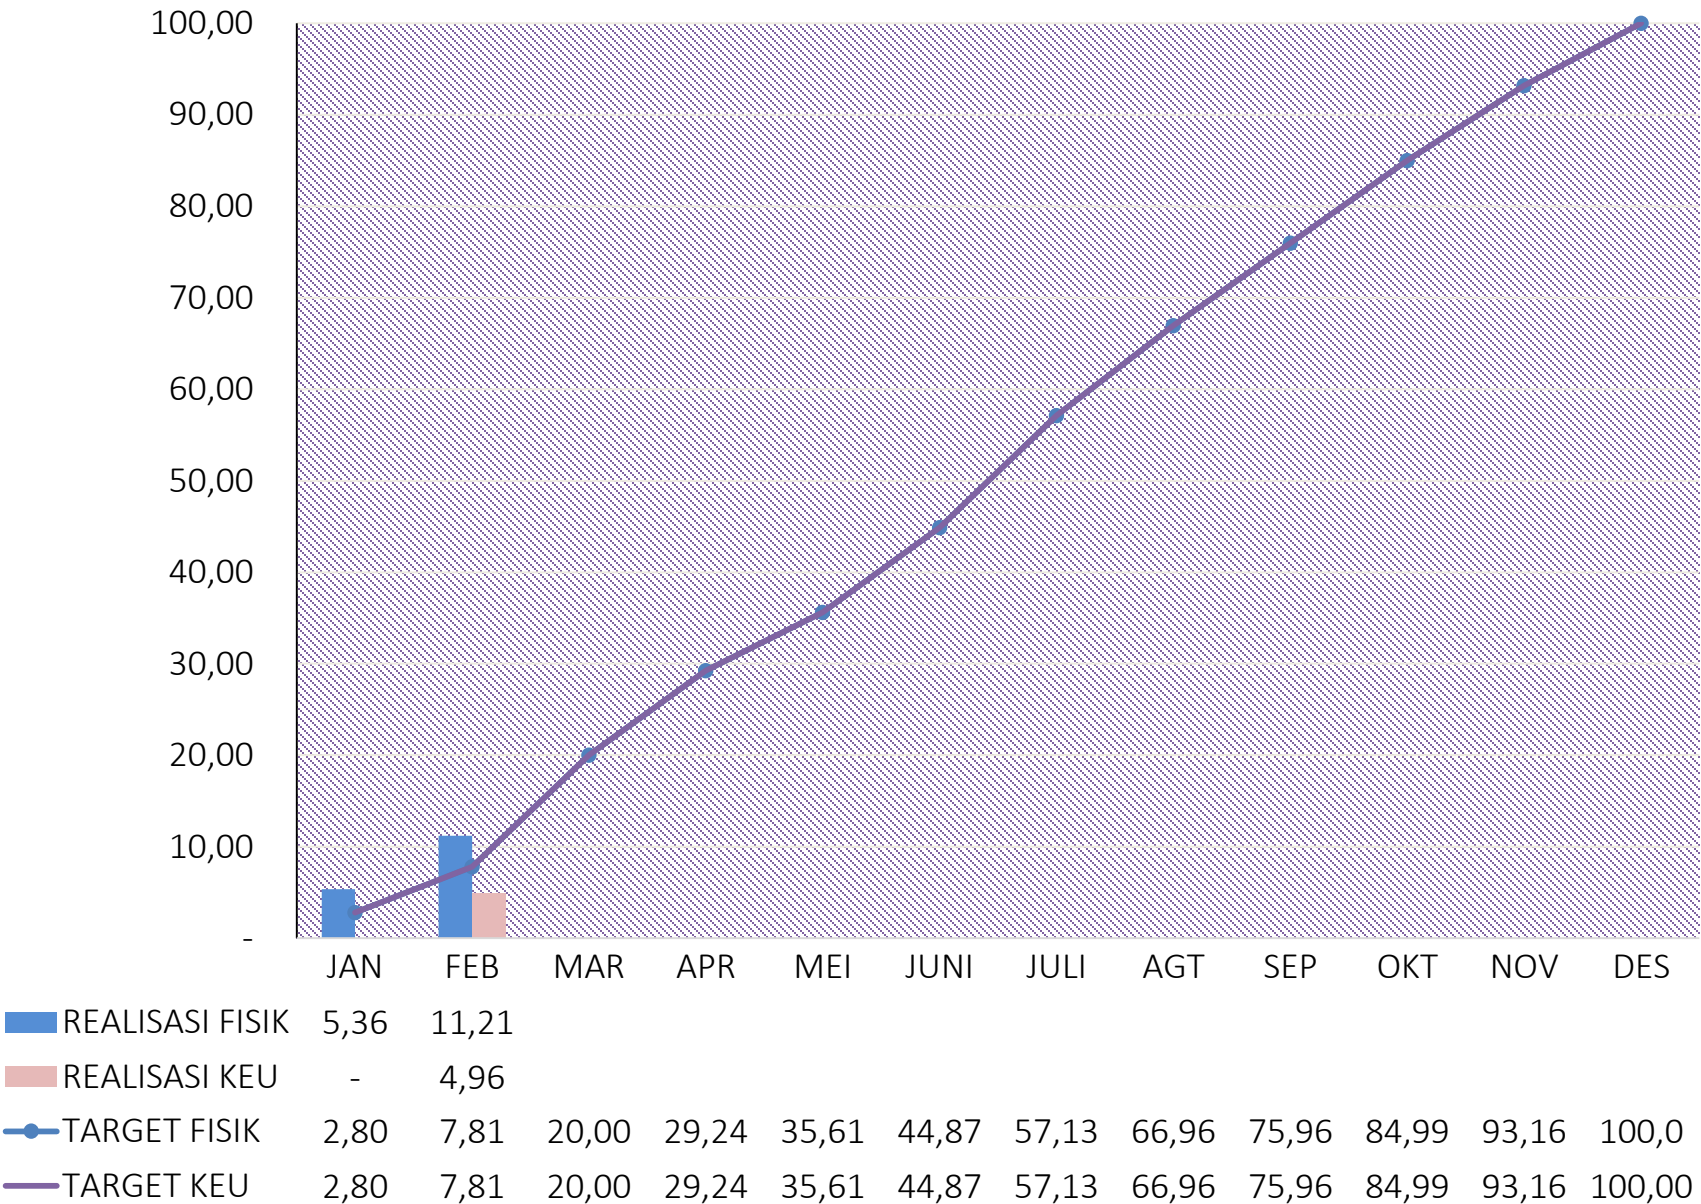


|             | Feb    | Mar   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 7,81   | 20,00 |
| Real. Fisik | 11,21  |       |
| Dev. Fisik  | 2,56   |       |
| Renc. Keu   | 7,81   | 20,00 |
| Real. Keu   | 4,96   |       |
| Dev. Keu    | (2,85) |       |

# PERUMAHAN

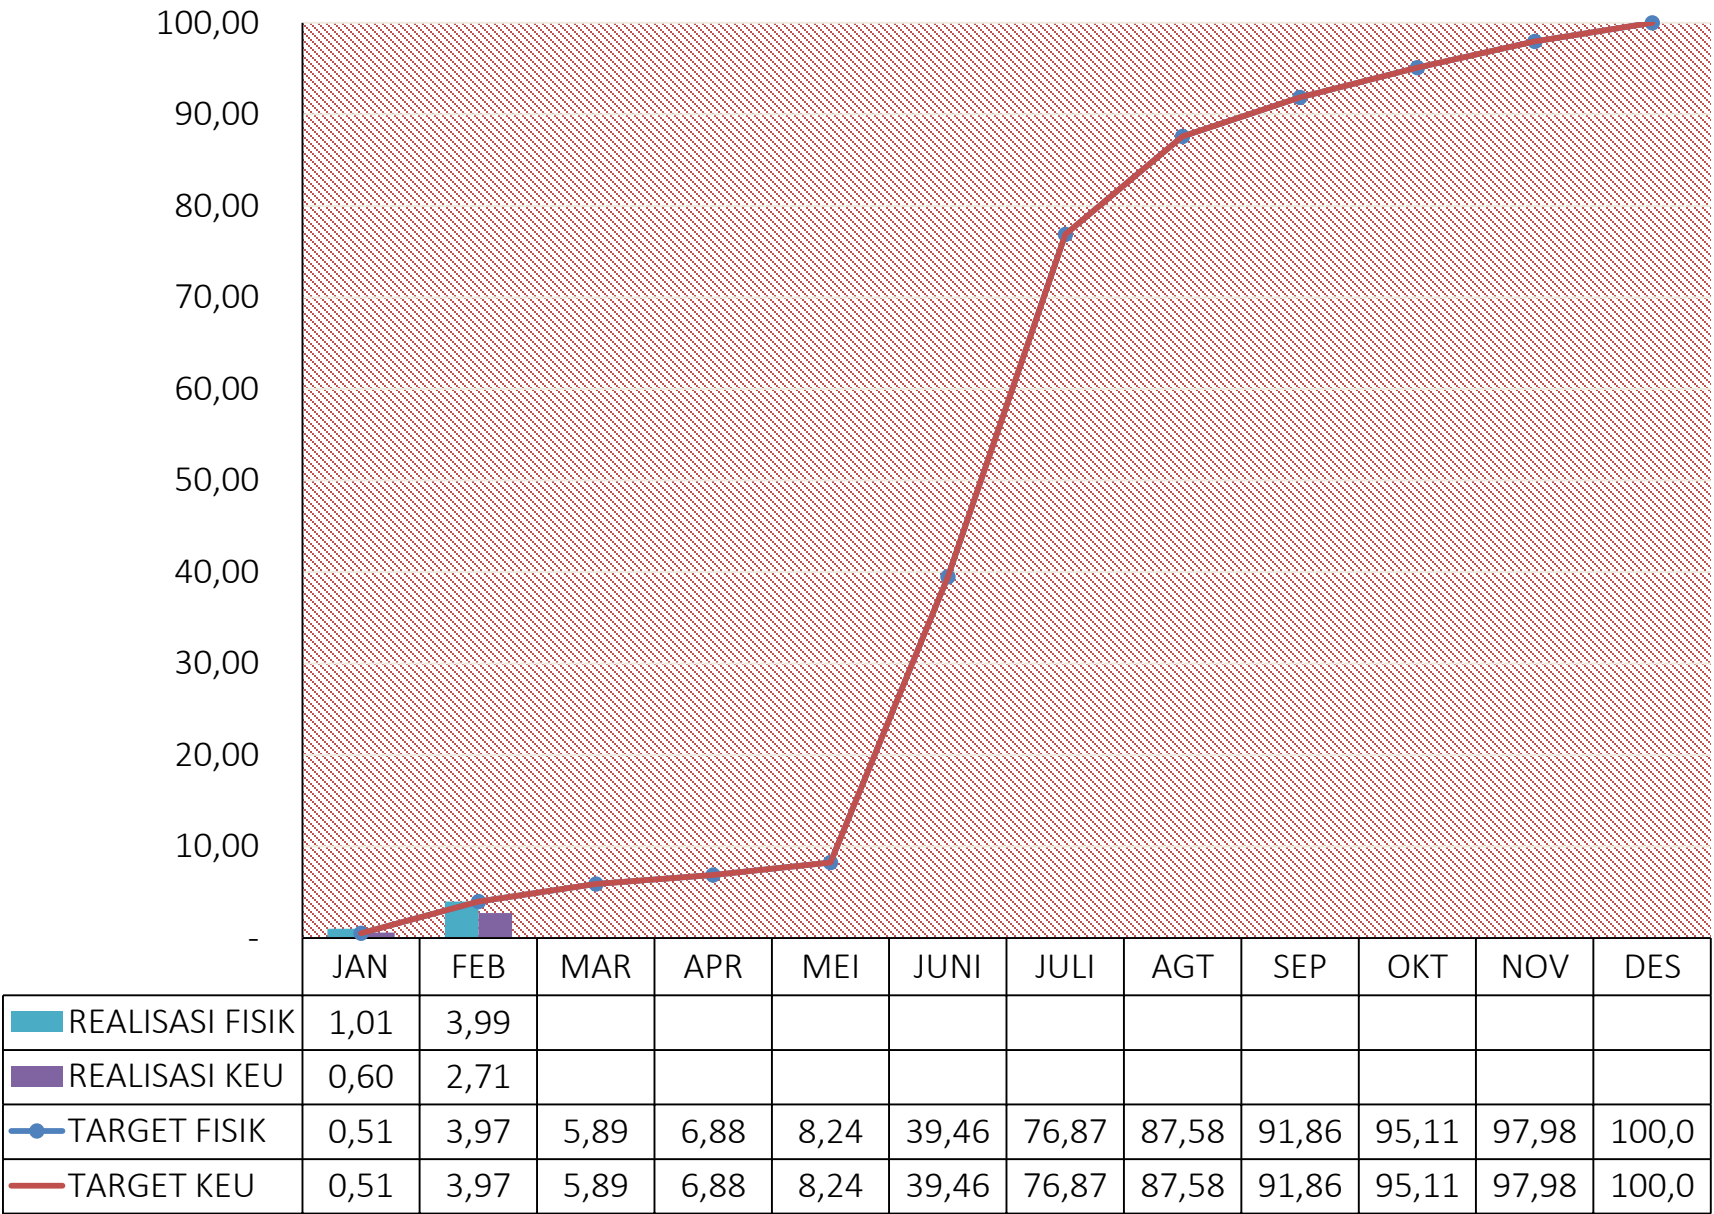


|             | Feb    | Mar  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 3,97   | 5,89 |
| Real. Fisik | 3,99   |      |
| Dev. Fisik  | 0,02   |      |
| Renc. Keu   | 3,97   | 5,89 |
| Real. Keu   | 2,71   |      |
| Dev. Keu    | (1,26) |      |

# KAWASAN PERMUKIMAN

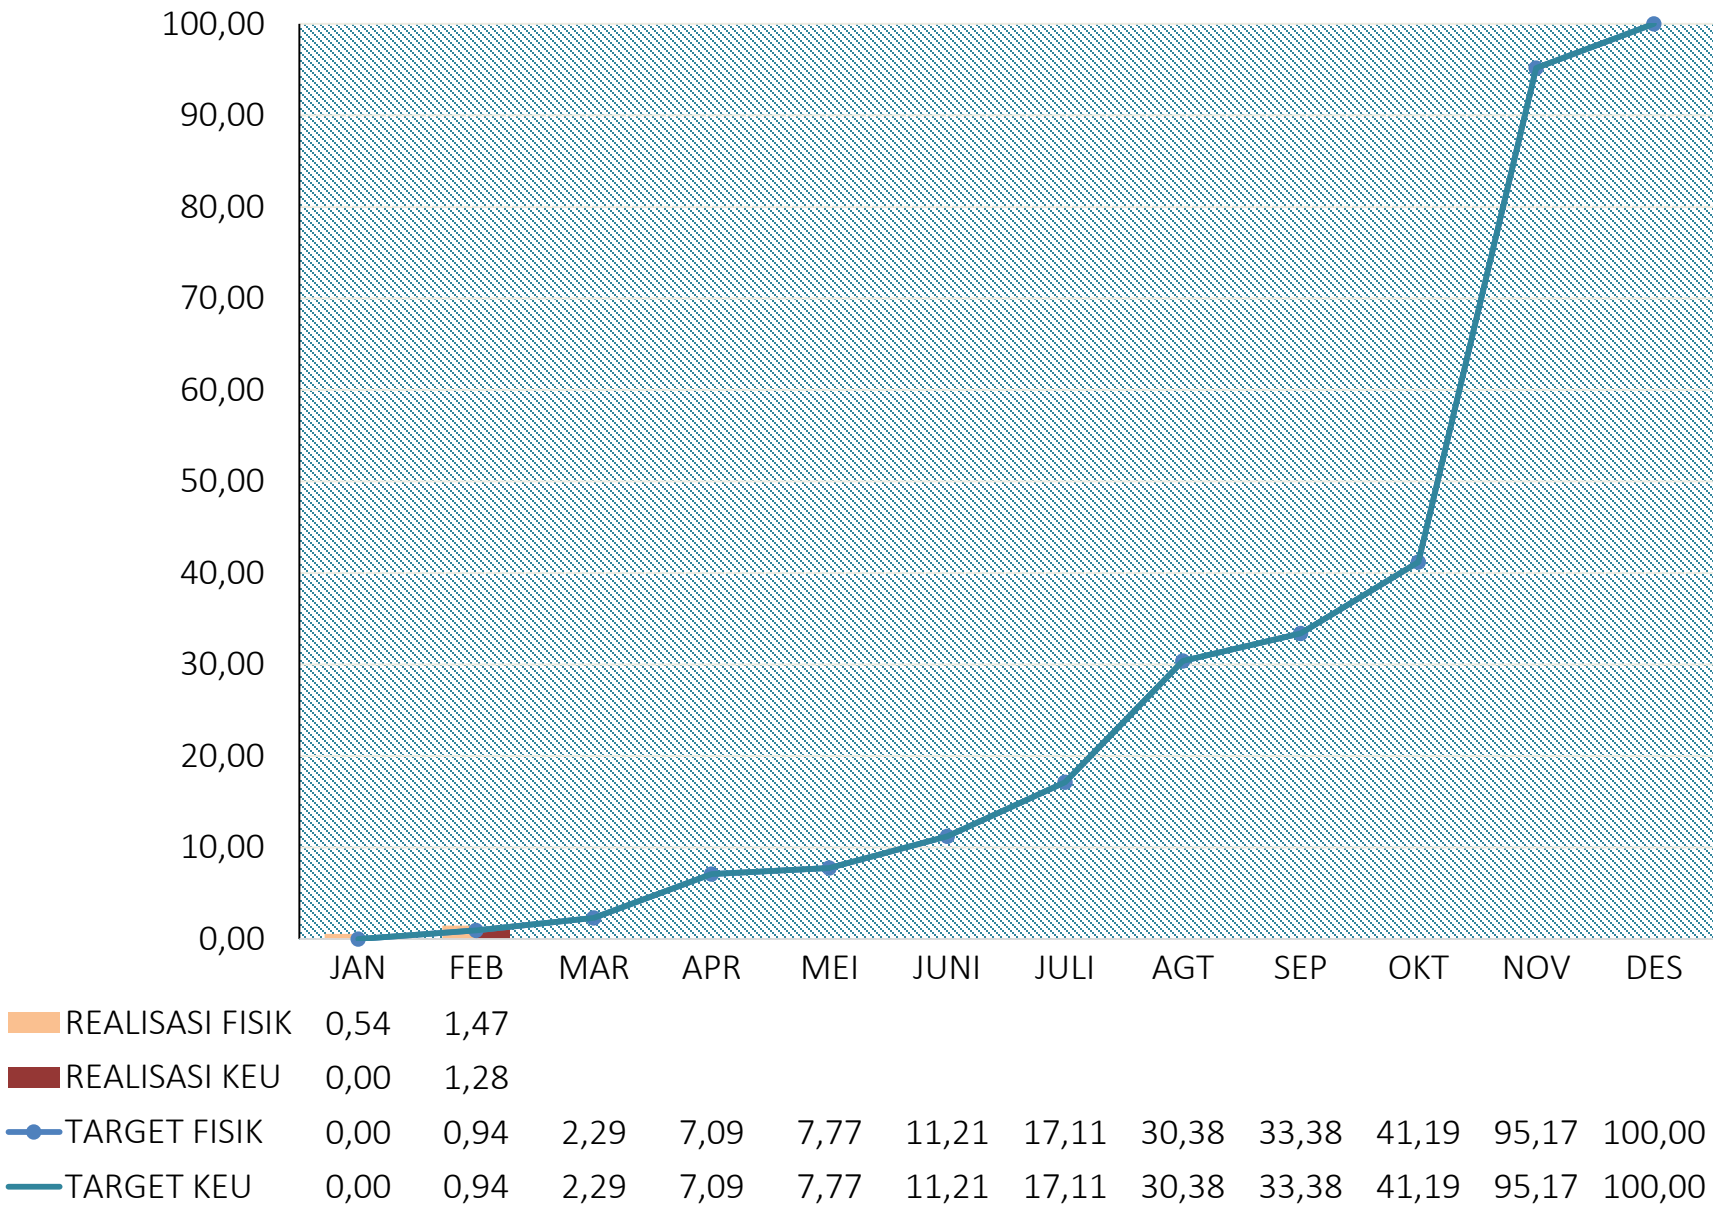


|             | Feb  | Mar  |
|-------------|------|------|
| Renc. Fisik | 0,94 | 2,29 |
| Real. Fisik | 1,47 |      |
| Dev. Fisik  | 0,53 |      |
| Renc. Keu   | 0,94 | 2,29 |
| Real. Keu   | 1,28 |      |
| Dev. Keu    | 0,34 |      |

# KETERPADUAN PKPP

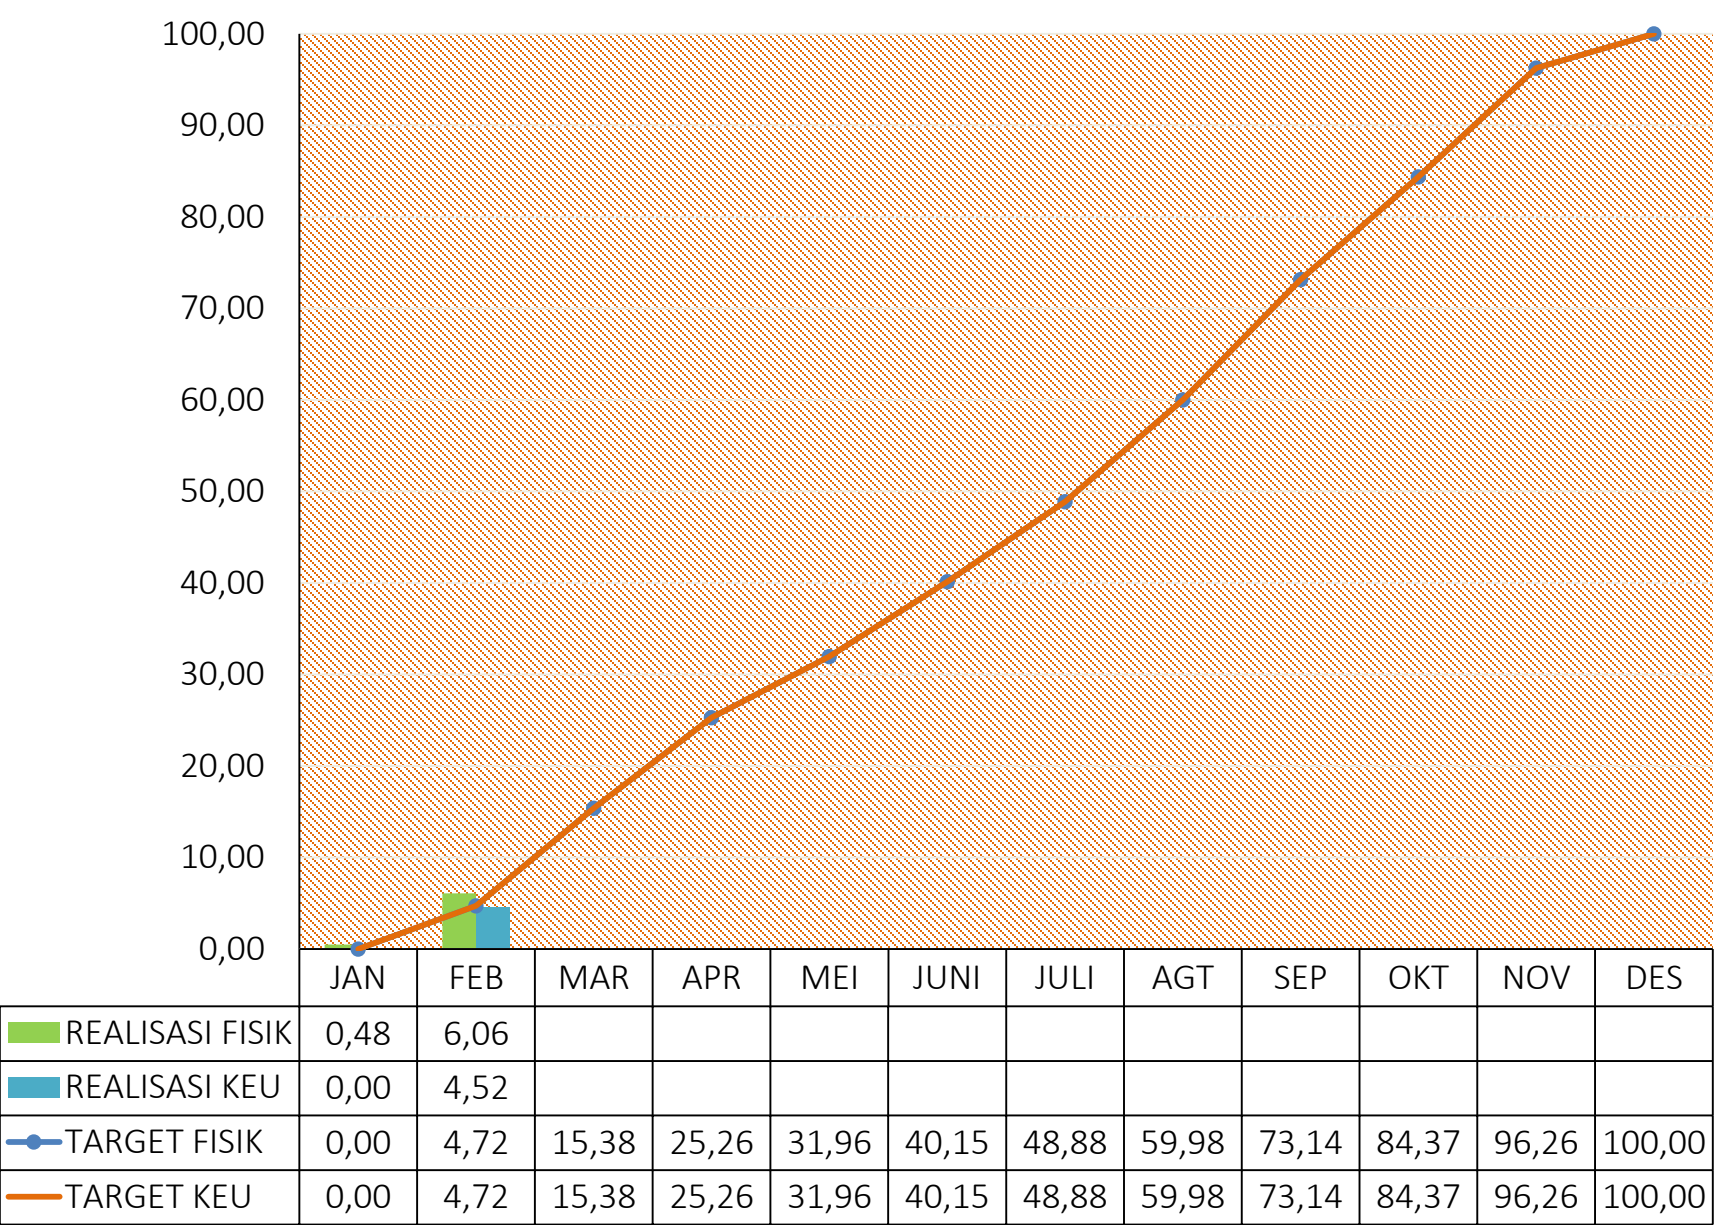

|             | Feb    | Mar   |
|-------------|--------|-------|
| Renc. Fisik | 4,72   | 15,38 |
| Real. Fisik | 6,06   |       |
| Dev. Fisik  | 1,34   |       |
| Renc. Keu   | 4,72   | 15,38 |
| Real. Keu   | 4,52   |       |
| Dev. Keu    | (0,20) |       |

# PERTANAHAN

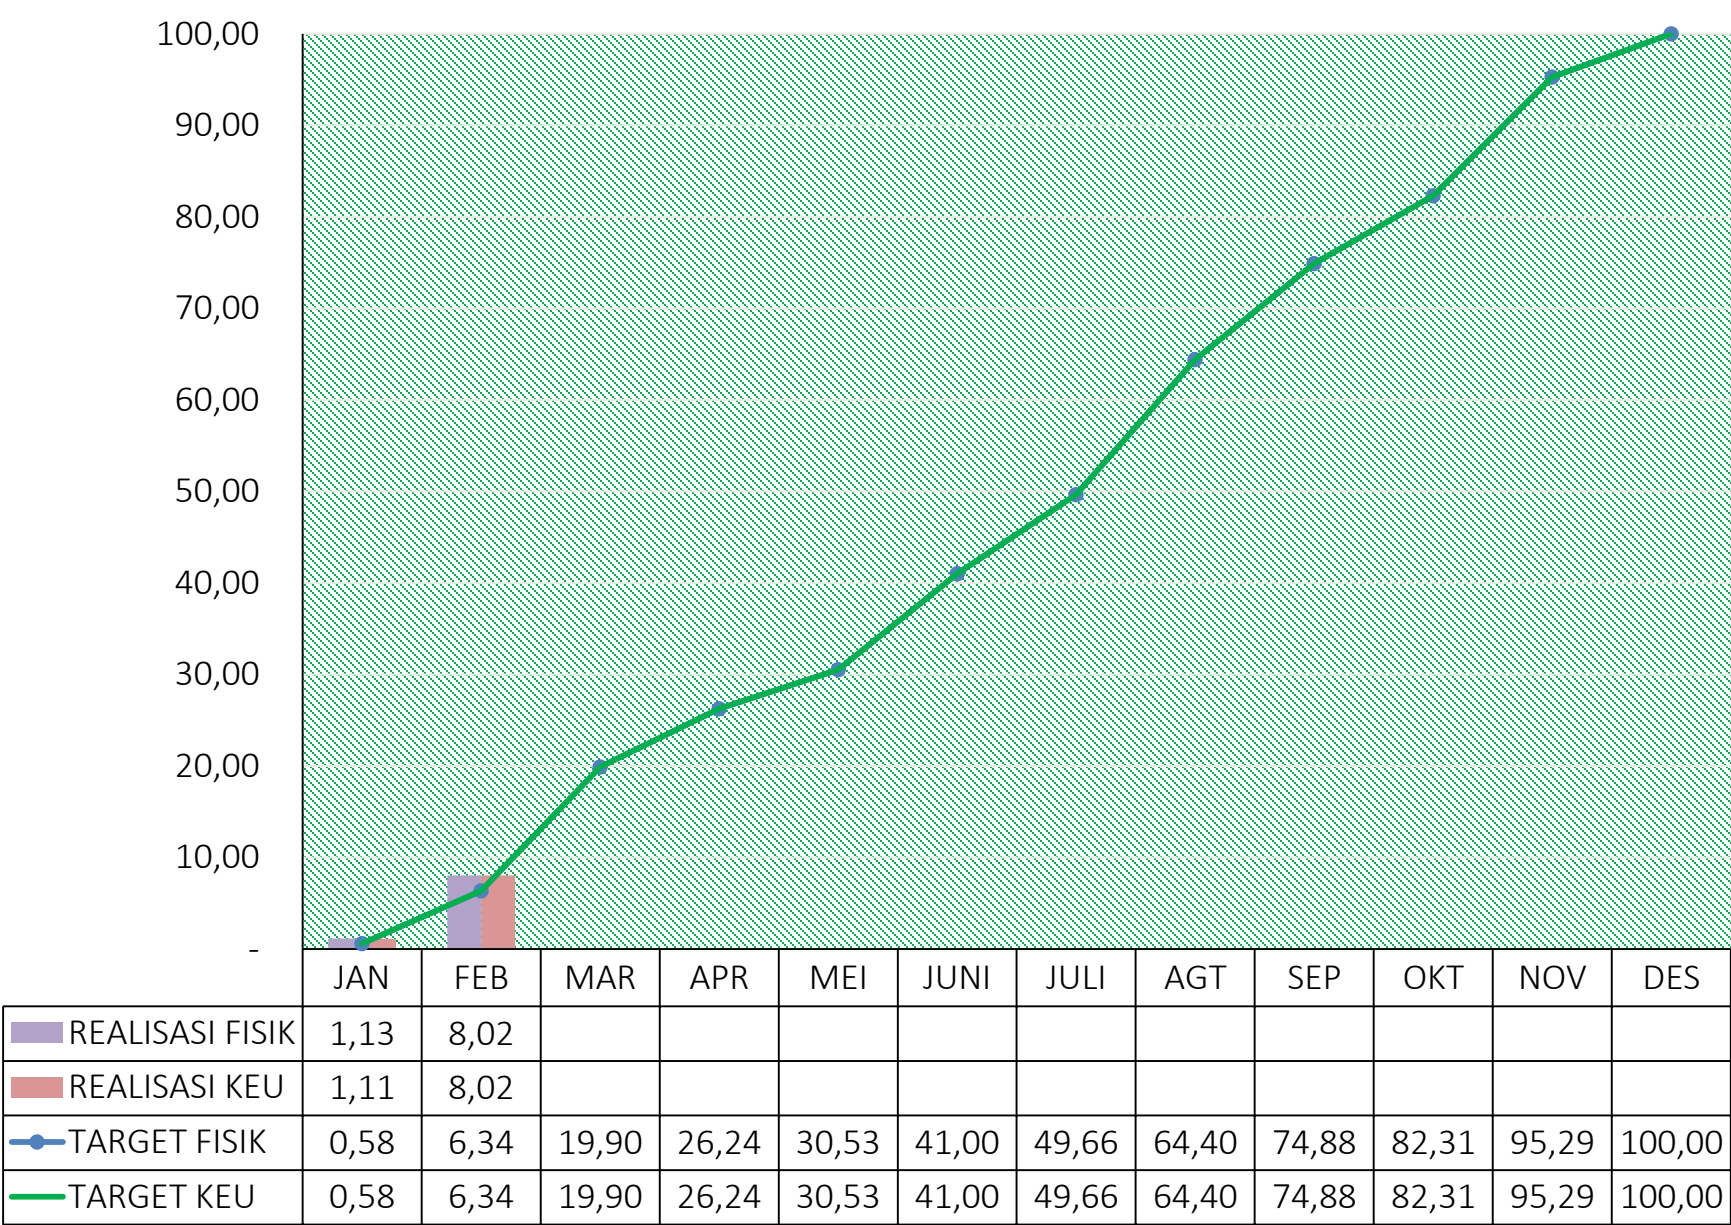

|             | Jan  | Feb   |
|-------------|------|-------|
| Renc. Fisik | 6,34 | 19,90 |
| Real. Fisik | 8,02 |       |
| Dev. Fisik  | 1,68 |       |
| Renc. Keu   | 6,34 | 19,90 |
| Real. Keu   | 8,02 |       |
| Dev. Keu    | 1,68 |       |




# **PENJELASAN KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**

STATUS AKHIR FEBRUARI 2020



# SEKRETARIAT

| NO | KEGIATAN                                                                                                                   | DEVIASI |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |                                                                                                                            | FISIK   | KEU    |
| 1  | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | -       | -4,86  |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah                                                      | -       | -10,73 |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah                                             | -       | -5,89  |
| 4  | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah                                            | -       | -7,06  |
| 5  | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah                                                           | -       | -2,65  |
| 6  | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah                                                                              | -       | -1,97  |
| 7  | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah                                                        | -       | -3,63  |
| 8  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | -       | -0,21  |



# BIDANG KETERPADUAN PKPP




| NO | KEGIATAN                                                                                           | DEVIASI |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                                                                    | FISIK   | KEU   |
| 1  | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | -       | -0,02 |
| 2  | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | -       | -0,28 |
| 3  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | -       | -0,45 |

# BIDANG PERUMAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                | DEVIASI |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                                                                                                         | FISIK   | KEU   |
| 1  | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | -       | -0,36 |
| 2  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | -       | -8,49 |
| 3  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | -0,28   | -0,51 |

# BIDANG PERTANAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                          | DEVIASI |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                                                                   | FISIK   | KEU   |
| 1  | Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | -1,14   | -1,14 |



# PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA

STATUS AKHIR FEBRUARI 2020

# REKAP PENGADAAN BARANG/JASA

| NO | BIDANG             | PAGU           | BARANG/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA |     |               |     |                    |     |                |     | JASA KONSULTANSI   |     |               |     | TOTAL PAKET    |     |
|----|--------------------|----------------|--------------------------------|-----|---------------|-----|--------------------|-----|----------------|-----|--------------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
|    |                    |                | SWAKELOLA                      |     |               |     | PENGADAAN LANGSUNG |     | TENDER         |     | PENGADAAN LANGSUNG |     | SELEKSI       |     |                |     |
|    |                    |                | MURNI                          |     | DIKECUALIKAN  |     |                    |     |                |     |                    |     |               |     |                |     |
|    |                    |                | Rp                             | Jml | Rp            | Jml | Rp                 | Jml | Rp             | Jml | Rp                 | Jml | Rp            | Jml | Rp             | Jml |
| 1  | SEKRETARIAT        | 6.480.000.000  | 3.755.995.000                  | 45  | 725.255.000   | 18  | 1.116.400.000      | 10  | 787.350.000    | 2   | 95.000.000         | 3   | -             | -   | 6.480.000.000  | 78  |
| 2  | PERUMAHAN          | 14.955.000.000 | 1.550.187.000                  | 25  | 1.858.013.000 | 27  | 1.476.800.000      | 10  | 9.300.000.000  | 16  | 200.000.000        | 3   | 570.000.000   | 3   | 14.955.000.000 | 84  |
| 3  | KAWASAN PERMUKIMAN | 5.251.500.000  | 879.804.000                    | 25  | 401.696.000   | 23  | -                  | -   | 3.150.000.000  | 6   | 110.000.000        | 2   | 710.000.000   | 2   | 5.251.500.000  | 58  |
| 4  | KETERPADUAN PKP    | 1.630.000.000  | 148.410.000                    | 4   | 898.190.000   | 44  | 247.400.000        | 3   | -              | -   | 336.000.000        | 7   | -             | -   | 1.630.000.000  | 58  |
| 5  | PERTANAHAN         | 1.765.000.000  | 1.320.860.000                  | 29  | 336.640.000   | 11  | 42.500.000         | 1   | -              | -   | 65.000.000         | 1   | -             | -   | 1.765.000.000  | 42  |
|    | TOTAL              | 30.081.500.000 | 7.655.256.000                  | 128 | 4.219.794.000 | 122 | 2.803.100.000      | 24  | 13.237.350.000 | 24  | 806.000.000        | 16  | 1.280.000.000 | 5   | 30.081.500.000 | 320 |

# REKAP TENDER/SELEKSI status akhir Februari 2020

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                    | NILAI PAKET (Rp) | METODE | PROGRES LELANG                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                               |                  |        |                                                                |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (9 bulan)               | 420.000.000      | Tender | Rencana dokumen masuk ke ULP pertengahan Maret                 |
| 2                | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor                                  | 405.000.000      | Tender | Proses finalisasi HPS dan dokumen perencanaan                  |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                               |                  |        |                                                                |
| 3                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan | 525.000.000      | Tender | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                              |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang  | 840.000.000      | Tender | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                              |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak    | 735.000.000      | Tender | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                              |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara   | 560.000.000      | Tender | Menunggu surat dari Biro APBJ kpd PPK untuk revisi Silalapbaja |
| 7                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati               | 490.000.000      | Tender | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                              |
| 8                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes   | 840.000.000      | Tender | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                              |
| 9                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemalang | 840.000.000      | Tender | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                              |

# REKAP TENDER/SELEKSI status akhir Februari 2020

| NO. | KEGIATAN | NAMA PAKET                                                        | NILAI PAKET (Rp) | METODE  | PROGRES LELANG                                                |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 10  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara | 455.000.000      | Tender  | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                             |
| 11  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo     | 385.000.000      | Tender  | Menunggu surat dari Biro APBJ kpd PPK untu revisi Silalapbaja |
| 12  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung   | 455.000.000      | Tender  | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                             |
| 13  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen      | 770.000.000      | Tender  | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                             |
| 14  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten       | 420.000.000      | Tender  | Proses Upload Dokumen ke App SPSE                             |
| 16  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen       | 385.000.000      | Tender  | Proses Upload Dokumen Penawaran ke App Silalapbaja            |
| 17  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo    | 840.000.000      | Tender  | Proses Upload Dokumen Penawaran ke App Silalapbaja            |
| 18  |          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru                          | 200.000.000      | Seleksi | Persiapan Lelang                                              |



# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Februari 2020

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES<br>LELANG                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 19  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000         | Tender  | Proses Upload Dokumen Penawaran ke App Silalapbaja |
| 20  |                                                                                                                                         | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000         | Seleksi | Proses Upload Dokumen Penawaran ke App Silalapbaja |
| 21  |                                                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000         | Seleksi | Proses Upload Dokumen Penawaran ke App Silalapbaja |

# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Februari 2020



| NO.                       | KEGIATAN                                                                      | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES<br>LELANG                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------|
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                               |                                      |                     |         |                                          |
| 22                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman -<br>Bidang Kawasan Permukiman | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 1.000.000.000       | Tender  |                                          |
| 23                        |                                                                               | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 750.000.000         | Tender  |                                          |
| 24                        |                                                                               | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 500.000.000         | Tender  |                                          |
| 25                        |                                                                               | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  |                                          |
| 26                        |                                                                               | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  |                                          |
| 27                        |                                                                               | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  |                                          |
| 28                        |                                                                               | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 160.000.000         | Seleksi | Sudah masuk ke<br>Aplikasi LPSE          |
| 29                        | Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman                               | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 550.000.000         | Seleksi | Sedang dalam<br>proses penyusunan<br>KAK |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **SEKRETARIAT**

| NO. | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                                                                | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah                                | Belanja Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas                                                         | 140.000.000      |                                               |
| 2   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov. Jateng (Gedung-1)                                                 | 197.000.000      | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020       |
| 3   |                                                                                | Jasa Kebersihan Gedung Disperakim Prov.Jateng (Gedung-2)                                                  | 98.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 2 Januari 2020       |
| 4   | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor                                | Pengadaan Sound Sistem dan Kelengkapannya                                                                 | 52.500.000       | Jadwal Terkontrak 9 Maret 2020                |
| 5   |                                                                                | Pengadaan Komputer Pc, Scanner High Speed A3 dan Laptop                                                   | 197.600.000      |                                               |
| 6   |                                                                                | Pengadaan CCTV dan Jaringan                                                                               | 46.300.000       |                                               |
| 7   |                                                                                | Pemasangan Instalasi Jaringan Baru Di Kantor dan pengadaan Projectors Wxga (1280 X 800), 2600 Lumens Ansi | 95.000.000       |                                               |
| 8   |                                                                                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin                                              | 128.600.000      |                                               |
| 9   | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Jasa Konsultansi Perencanaan                                                                              | 25.000.000       | Proses finalisasi HPS dan dokumen perencanaan |
| 10  |                                                                                | Pengawasan Rehab Gedung Kantor                                                                            | 20.000.000       |                                               |
| 11  |                                                                                | DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop)                                       | 50.000.000       | Persiapan Pembuatan Dokumen                   |
| 12  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas                                               | Belanja Pengadaan Pakaian Dinas                                                                           | 75.000.000       | Sudah Terkontrak 2 Maret 2020                 |
| 13  | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Belanja Sewa Hotel                                                                                        | 86.400.000       | Pelaksanaan Maret 2020                        |

| REKAP PENGADAAN LANGSUNG BIDANG PERUMAHAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                  |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                                        | KEGIATAN                                                                                                                                | NAMA PAKET                                                                                                      | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                                                   |
| 1                                         | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                                                                             | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 54.000.000       | Sudah terlaksana tanggal 19-20 Februari 2020                                                     |
| 2                                         |                                                                                                                                         | Konsultan Perencanaan Pembangunan Baru                                                                          | 50.000.000       |                                                                                                  |
| 3                                         |                                                                                                                                         | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Blora                                                      | 175.000.000      | Proses Upload Dokumen ke SPSE                                                                    |
| 4                                         | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Update Sistem Informasi RTLH                                             | 100.000.000      |                                                                                                  |
| 5                                         |                                                                                                                                         | Belanja Sewa Hotel                                                                                              | 64.800.000       | Sudah terlaksana tanggal 5-6 Februari 2020                                                       |
| 6                                         |                                                                                                                                         | Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layak Huni                                                                      | 50.000.000       | Sudah Terkontrak Tanggal 31 Januari 2020, masa kontrak 31 januari 2020 - 30 maret 2020 (60 Hari) |
| 7                                         | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitas Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Lahan Akses Rusunawa Kota Semarang                                    | 50.000.000       |                                                                                                  |
| 8                                         |                                                                                                                                         | Paket 1 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan   | 192.000.000      |                                                                                                  |
| 9                                         |                                                                                                                                         | Paket 2 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Tundagan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang       | 192.000.000      |                                                                                                  |
| 10                                        |                                                                                                                                         | Paket 3 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal               | 180.000.000      |                                                                                                  |
| 11                                        |                                                                                                                                         | Paket 4 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes            | 192.000.000      |                                                                                                  |
| 12                                        |                                                                                                                                         | Paket 5 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Kasinoman Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara  | 180.000.000      |                                                                                                  |
| 13                                        |                                                                                                                                         | Paket 6 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Sidakangen Kec. Kalibening Kab. Banjarnegara | 180.000.000      |                                                                                                  |
| 14                                        |                                                                                                                                         | Paket 7 (peningkatan kualitas rumah beserta PSU nya) lokasi : Desa Karangkemojing Kec. Gumelar Kab. Banyumas    | 192.000.000      |                                                                                                  |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KETERPADUAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                           | NAMA PAKET                                                                                                              | NILAI PAKET (Rp) | PROGRES LELANG                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Belanja Sewa Hotel 1                                                                                                    | 56.700.000       |                                                               |
| 2   |                                                                                                    | Belanja Sewa Hotel 2                                                                                                    | 56.700.000       |                                                               |
| 3   |                                                                                                    | Pengembangan Aplikasi Basis Data dan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah | 80.000.000       |                                                               |
| 4   |                                                                                                    | Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah                                 | 30.000.000       | Terkontrak tanggal 17 Februari 2020 (Masa kontrak 2 bulan)    |
| 5   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pendampingan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem Informasi                                        | 54.000.000       | Pengadaan Ulang tanggal 2 Maret 2020                          |
| 6   |                                                                                                    | Konsultan Individual Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan                                     | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 3 Februari 2020 (Masa kontrak 11 bulan)    |
| 7   | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan              | Konsultan Individual penyusunan kebijakan dan strategi bidang PKP dan pertanahan                                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 (Masa kontrak 10 bulan)   |
| 8   |                                                                                                    | Konsultan Individual Inventarisasi dan Sinkronisasi Keterpaduan Infrastruktur PKP Dan Pertanahan                        | 60.000.000       | Terkontrak tanggal 20 Februari 2020 (Masa kontrak 10 bulan)   |
| 9   | Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan             | Belanja Sewa Hotel                                                                                                      | 54.000.000       |                                                               |
| 10  |                                                                                                    | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                 | 66.000.000       | Terkontrak tanggal 12 Februari 2020 (Masa kontrak 10,5 bulan) |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KAWASAN**



| NO. | KEGIATAN                                       | NAMA PAKET                          | NILAI PAKET<br>(Rp) | PROGRES<br>LELANG |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 60.000.000          |                   |
| 2   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 50.000.000          |                   |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG KAW. PERMUKIMAN**

| NO. | KEGIATAN                                       | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET<br>(Rp) | PROGRES<br>LELANG |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  | 60.000.000          |                   |
| 2   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 160.000.000         |                   |
| 3   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  | 60.000.000          |                   |
| 4   |                                                | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  | 50.000.000          |                   |

# REKAP PENGADAAN LANGSUNG **BIDANG PERTANAHAN**

| NO. | KEGIATAN                                                                                          | NAMA PAKET                             | NILAI PAKET<br>(Rp) | PROGRES<br>LELANG |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | Sewa Hotel Paket Full board            | 42.500.000          |                   |
| 2   |                                                                                                   | Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi | 65.000.000          |                   |



100

[illegible]

# PENEKANAN APBD


1. Bagi yang belum melaporkan SPT (e-filing) untuk segera melaporkan scr online sebelum 31 Maret 2020
2. Seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan rafting besok pagi.
3. Menindaklanjuti hasil rapat hari Kamis Tanggal 27 Februari 2020 Perihal Pencermatan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, mohon untuk segera menyerahkan hasil usulan ke Subbag Program terkait BNBA dari Simperum yang akan dimasukkan ke Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2020.
4. Diharapkan setiap kegiatan kedinasan yang dilakukan di dalam maupun luar agar dibuatkan konten sesuai SOP yang disetujui oleh Kabid (tim pertimbangan pelayanan informasi), mengetahui Kepala Dinas Perakim (atasan PPID Pembantu Disperakim)

**APBN**



# BPPW WILAYAH 1

## PAGU – Rp 766.186.381.000

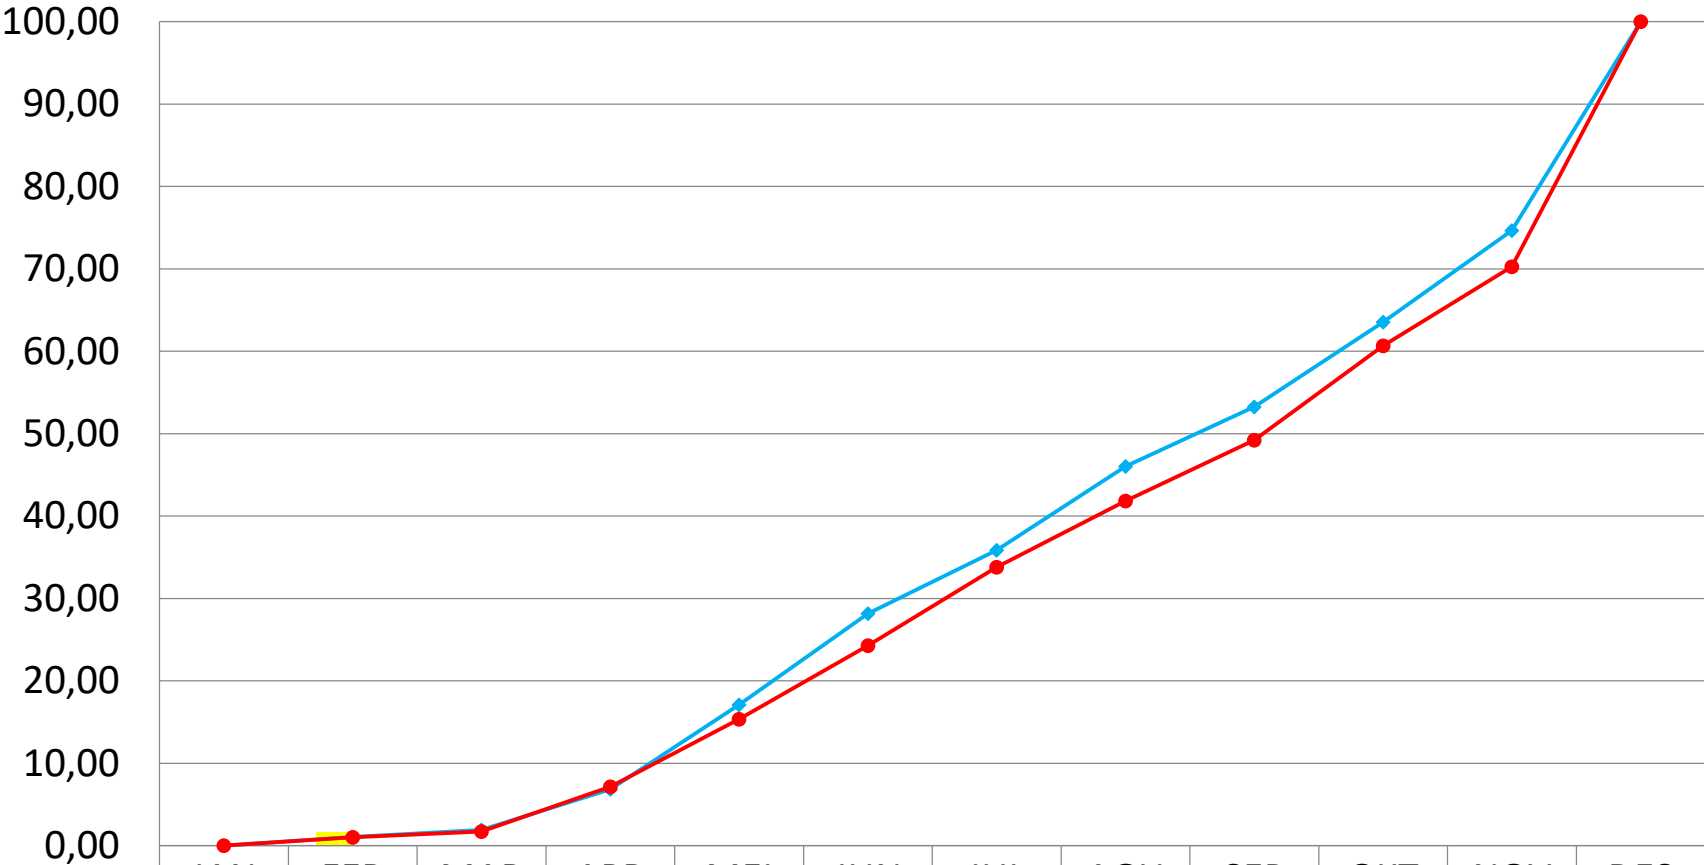


|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RF | 0,00 | 1,64 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RK | 0,00 | 0,01 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TF | 0,00 | 1,05 | 1,91 | 6,83 | 17,0 | 28,1 | 35,8 | 46,0 | 53,2 | 63,5 | 74,6 | 100, |
| TK | 0,00 | 1,03 | 1,72 | 7,17 | 15,3 | 24,2 | 33,8 | 41,8 | 49,2 | 60,6 | 70,2 | 100, |

|             | Feb    | Mar  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 1,05   | 1,91 |
| Real. Fisik | 1,64   |      |
| Dev. Fisik  | 0,59   |      |
| Renc. Keu   | 1,03   | 1,72 |
| Real. Keu   | 0,01   |      |
| Dev. Keu    | (1,02) |      |


# BPPW WILAYAH 2

## PAGU – Rp 633.787.824.000

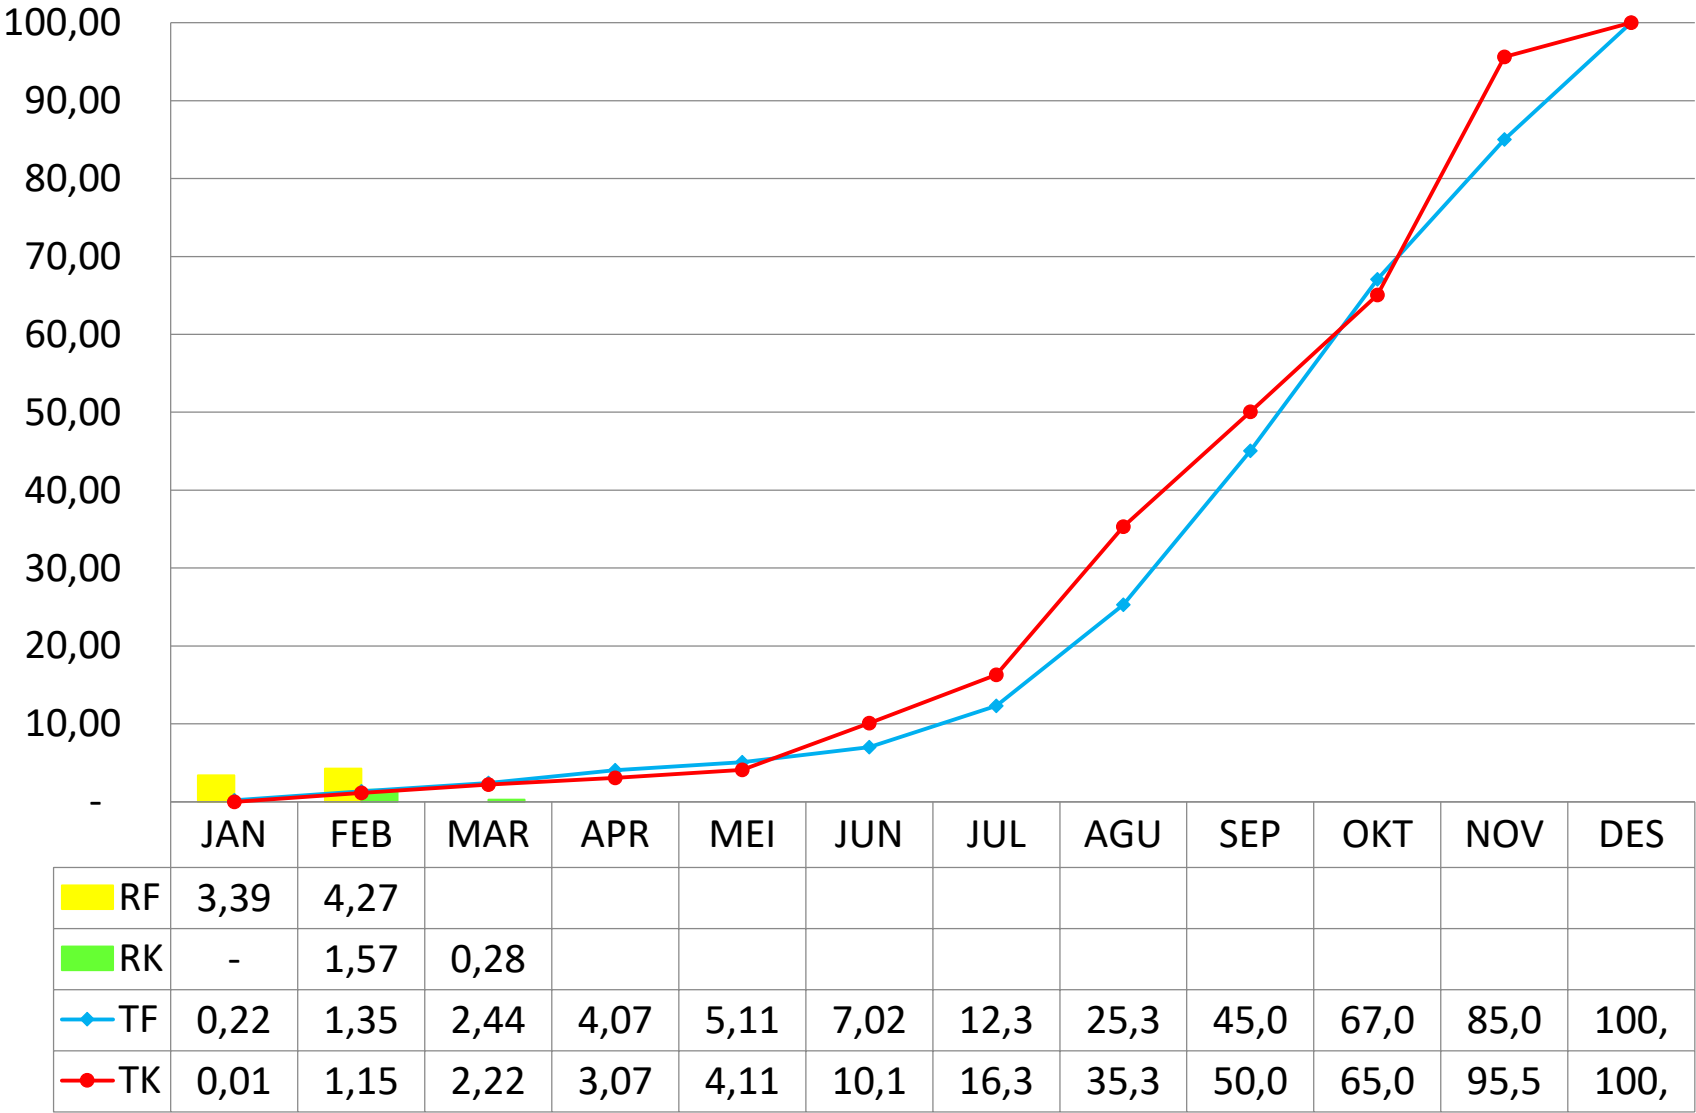

|             | Feb  | Mar  |
|-------------|------|------|
| Renc. Fisik | 1,35 | 2,44 |
| Real. Fisik | 4,27 |      |
| Dev. Fisik  | 2,92 |      |
| Renc. Keu   | 1,15 | 2,22 |
| Real. Keu   | 1,57 |      |
| Dev. Keu    | 0,42 |      |

# SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PAGU –

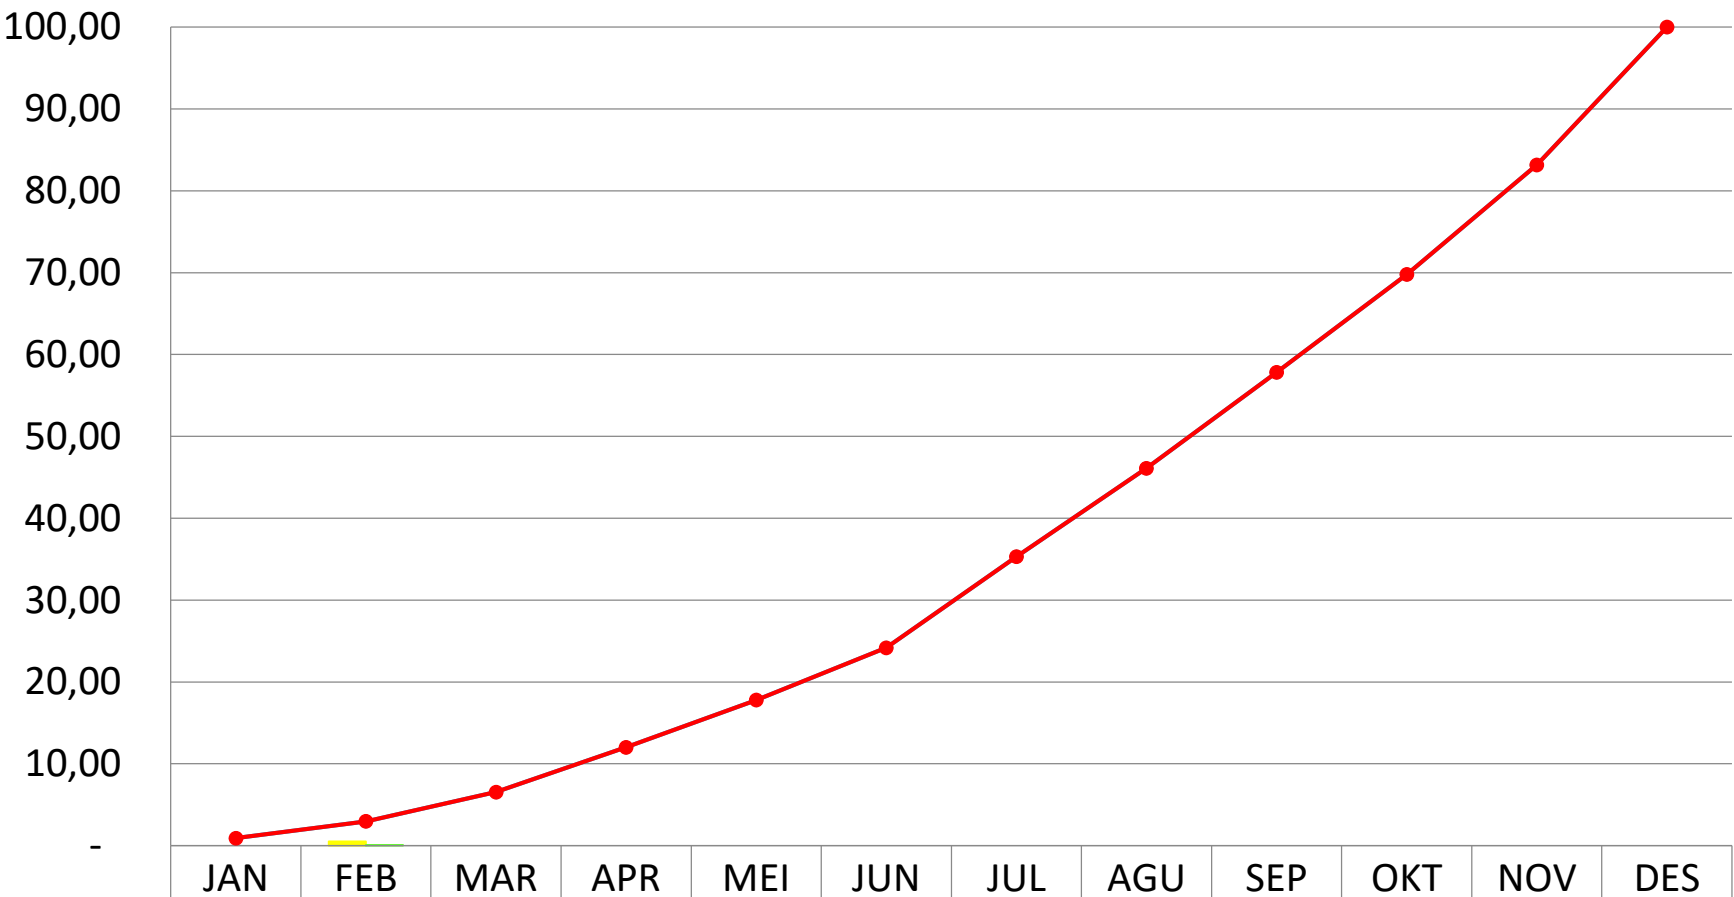

|    |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RF | -    | 0,50 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| RK | -    | 0,08 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TF | 0,92 | 2,96 | 6,54 | 12,02 | 17,78 | 24,18 | 35,29 | 46,10 | 57,82 | 69,78 | 83,17 | 100,0 |
| TK | 0,92 | 2,96 | 6,54 | 12,02 | 17,78 | 24,18 | 35,29 | 46,10 | 57,82 | 69,78 | 83,17 | 100,0 |

|             | Feb    | Mar  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 2,96   | 6,54 |
| Real. Fisik | 0,50   |      |
| Dev. Fisik  | (2,46) |      |
| Renc. Keu   | 2,96   | 6,54 |
| Real. Keu   | 0,08   |      |
| Dev. Keu    | (2,88) |      |

A solid red square is positioned on the left side of the slide. To its right are two thin, parallel white vertical lines.

**TERIMA KASIH**



# RAPAT KOORDINASI TINGKAT OPD

STATUS AKHIR JANUARI 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI JAWA TENGAH








# **OUTLINE PAPARAN**

1. KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020
2. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DISPERAKIM
3. PENJELASAN KEGIATAN DG DEVIASI NEGATIF
4. PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
5. REKAP LAPORAN/ADUAN MASYARAKAT YANG DITANGANI
6. PENEKANAN APBD
7. LAPORAN PELAKSANAAN PENANGANAN DESA DAMPINGAN
8. PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBN

# KOMPOSISI ANGGARAN

## DISPERAKIM TA. 2020

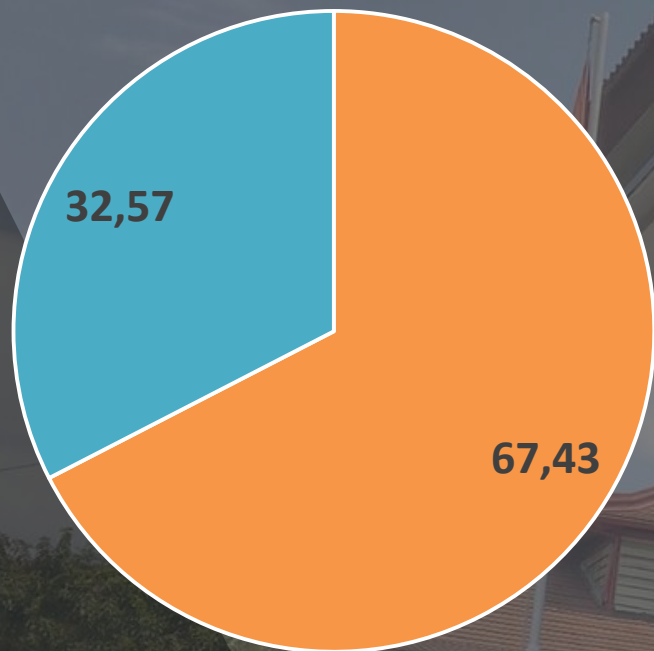


■ BELANJA LANGSUNG ■ BELANJA TIDAK LANGSUNG

| NO | BELANJA                | PAGU           | %     |
|----|------------------------|----------------|-------|
| 1  | BELANJA LANGSUNG       | 30.081.500.000 | 67,43 |
| 2  | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.531.307.000 | 32,57 |
|    | TOTAL                  | 44.612.807.000 |       |



# KOMPOSISI ANGGARAN DISPERAKIM TA. 2020

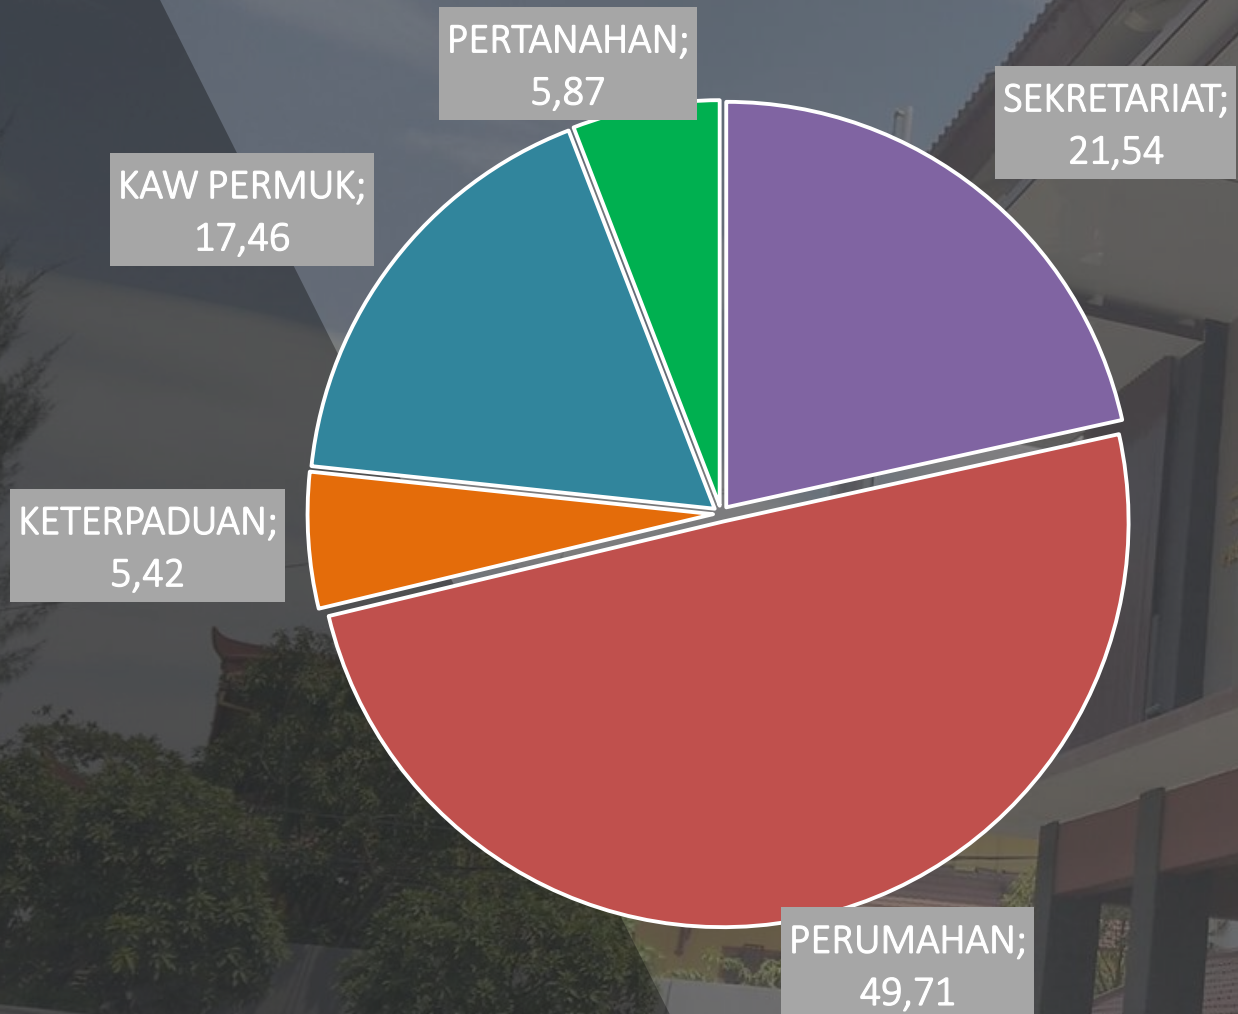


| NO    | BIDANG      | PAGU           | %      |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 1     | SEKRETARIAT | 6.480.000.000  | 21,54  |
| 2     | PERUMAHAN   | 14.955.000.000 | 49,71  |
| 3     | KETERPADUAN | 1.630.000.000  | 5,42   |
| 4     | KAW PERMUK  | 5.251.500.000  | 17,46  |
| 5     | PERTANAHAN  | 1.765.000.000  | 5,87   |
| TOTAL |             | 30.081.500.000 | 100,00 |



# PROGRES REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

STATUS AKHIR JANUARI 2020


# DISPERAKIM

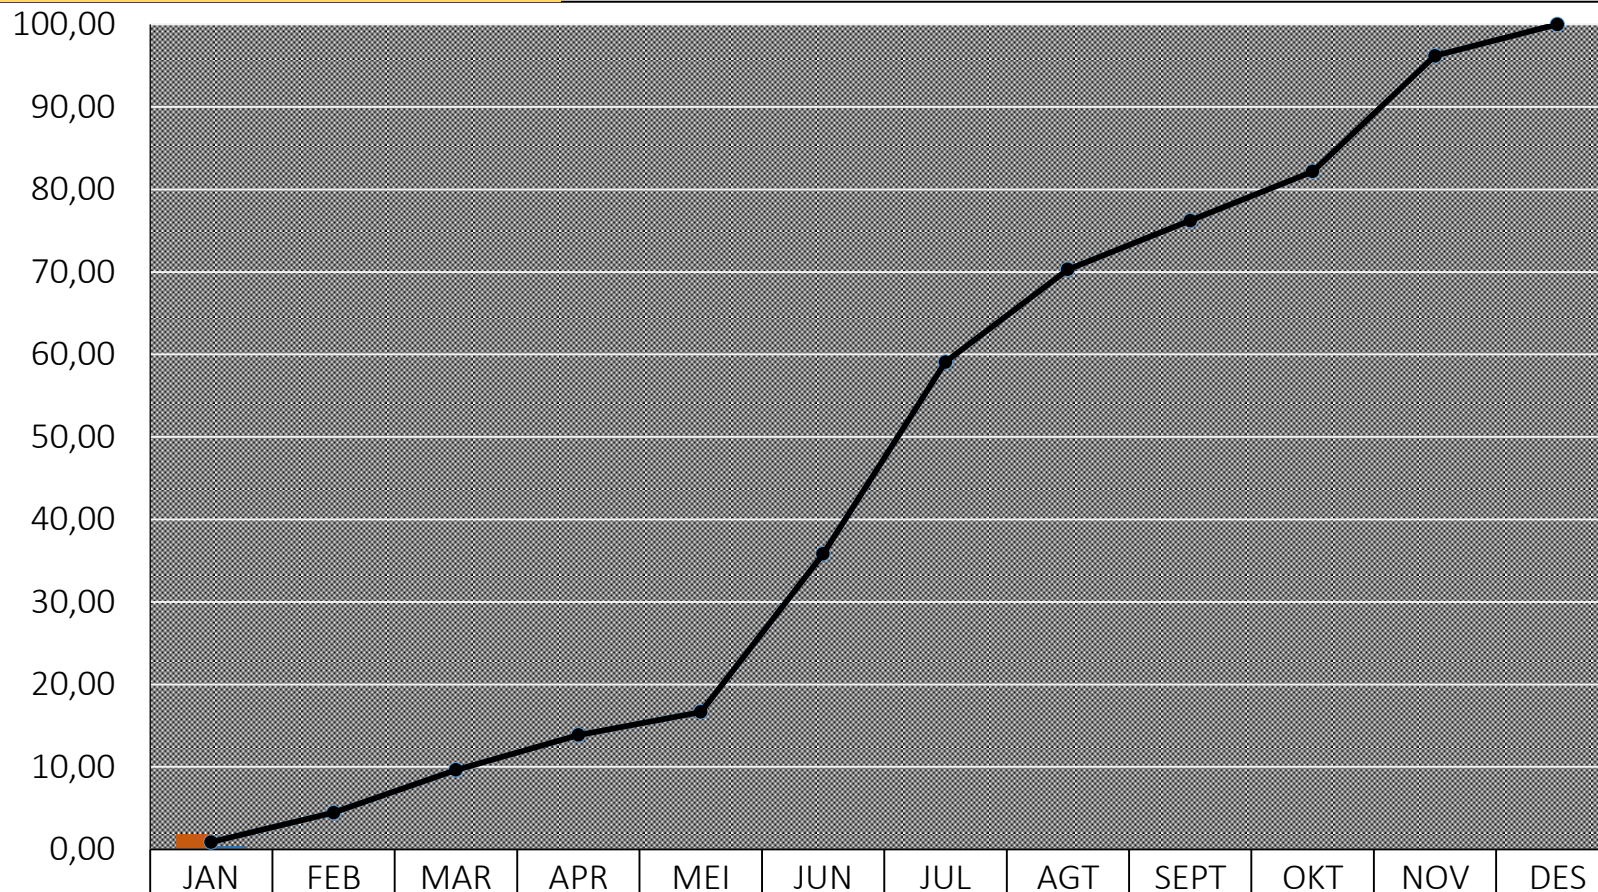

|              |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|--------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| REAL FISIK   | 1,84 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| REAL KEU     | 0,36 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| TARGET FISIK | 0,89 | 4,45 | 9,64 | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,00 |
| TARGET KEU   | 0,89 | 4,45 | 9,64 | 13,87 | 16,65 | 35,82 | 59,07 | 70,30 | 76,21 | 82,18 | 96,20 | 100,00 |

|             | Jan    | Feb  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 0,89   | 4,45 |
| Real. Fisik | 1,84   |      |
| Dev. Fisik  | 0,95   |      |
| Renc. Keu   | 0,89   | 4,45 |
| Real. Keu   | 0,36   |      |
| Dev. Keu    | (0,53) |      |


# SEKRETARIAT

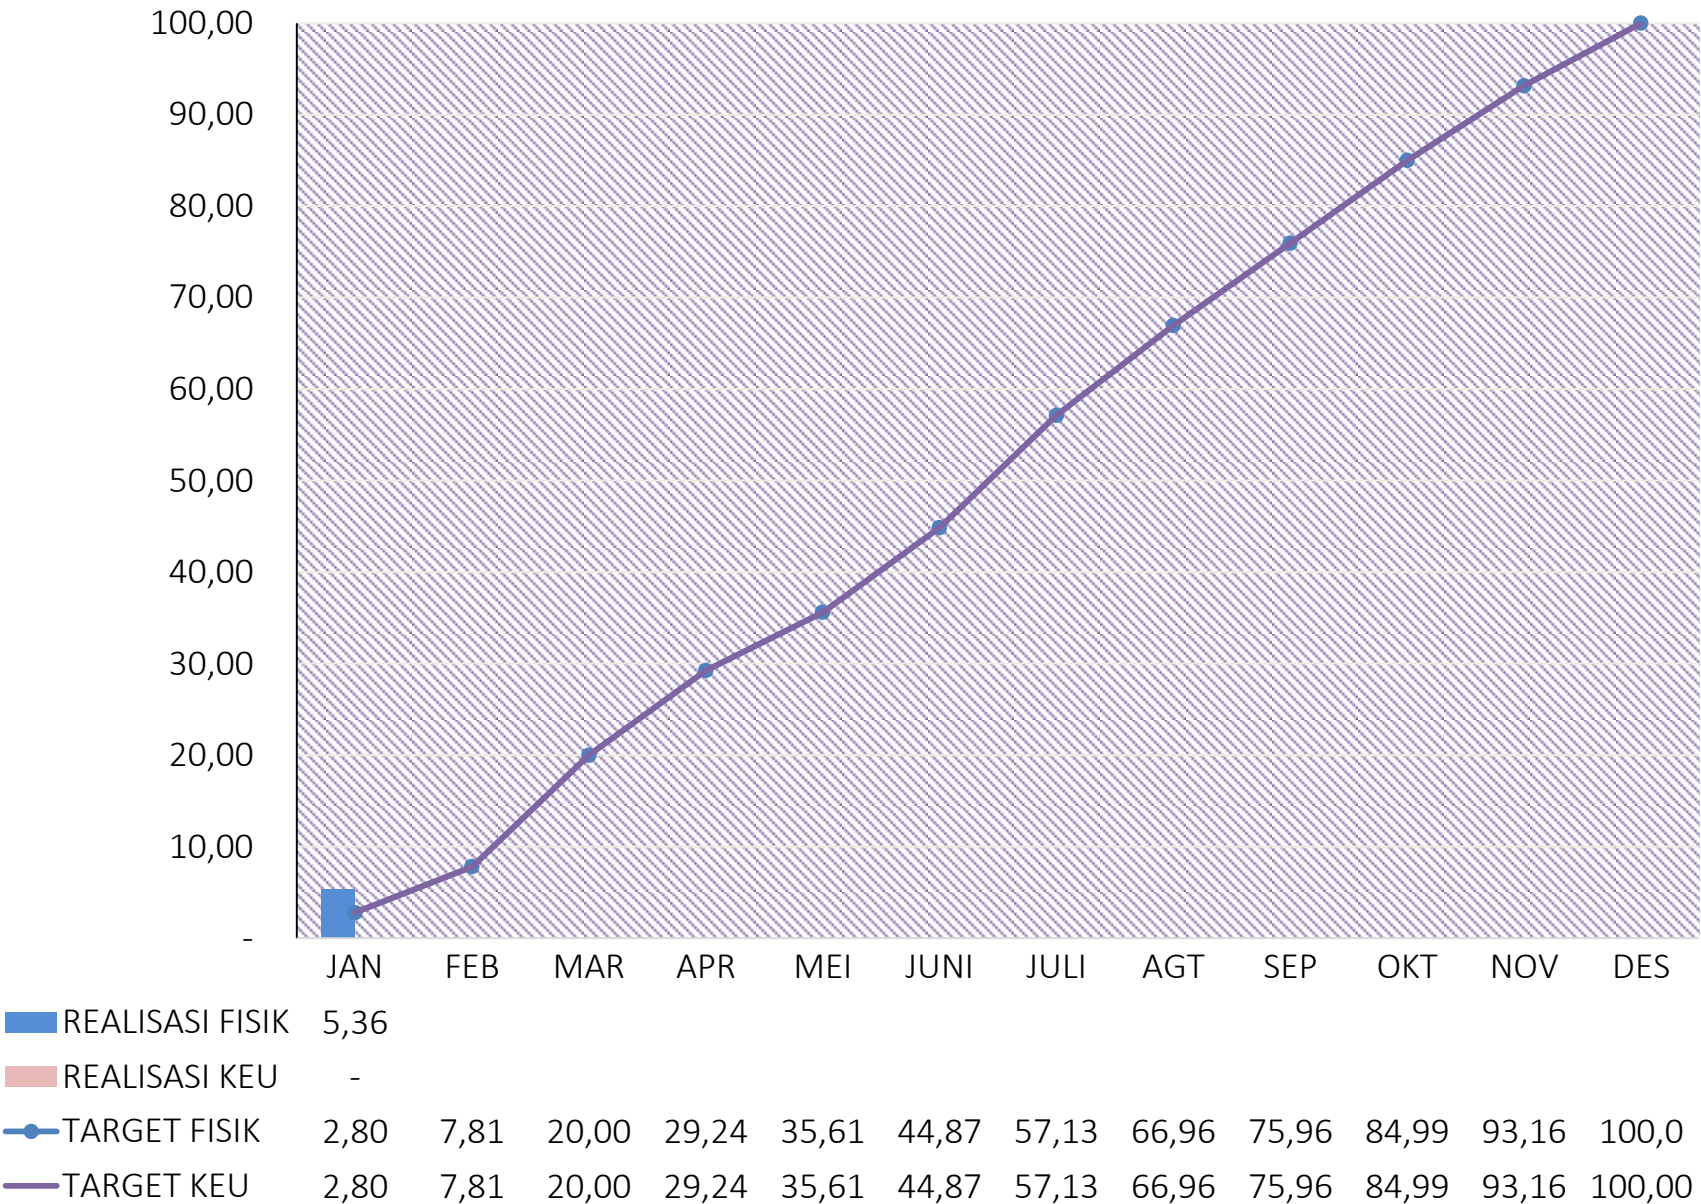

|             | Jan    | Feb  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 2,80   | 7,81 |
| Real. Fisik | 5,36   |      |
| Dev. Fisik  | 2,57   |      |
| Renc. Keu   | 2,80   | 7,81 |
| Real. Keu   | 0,00   |      |
| Dev. Keu    | (2,80) |      |




# PERUMAHAN

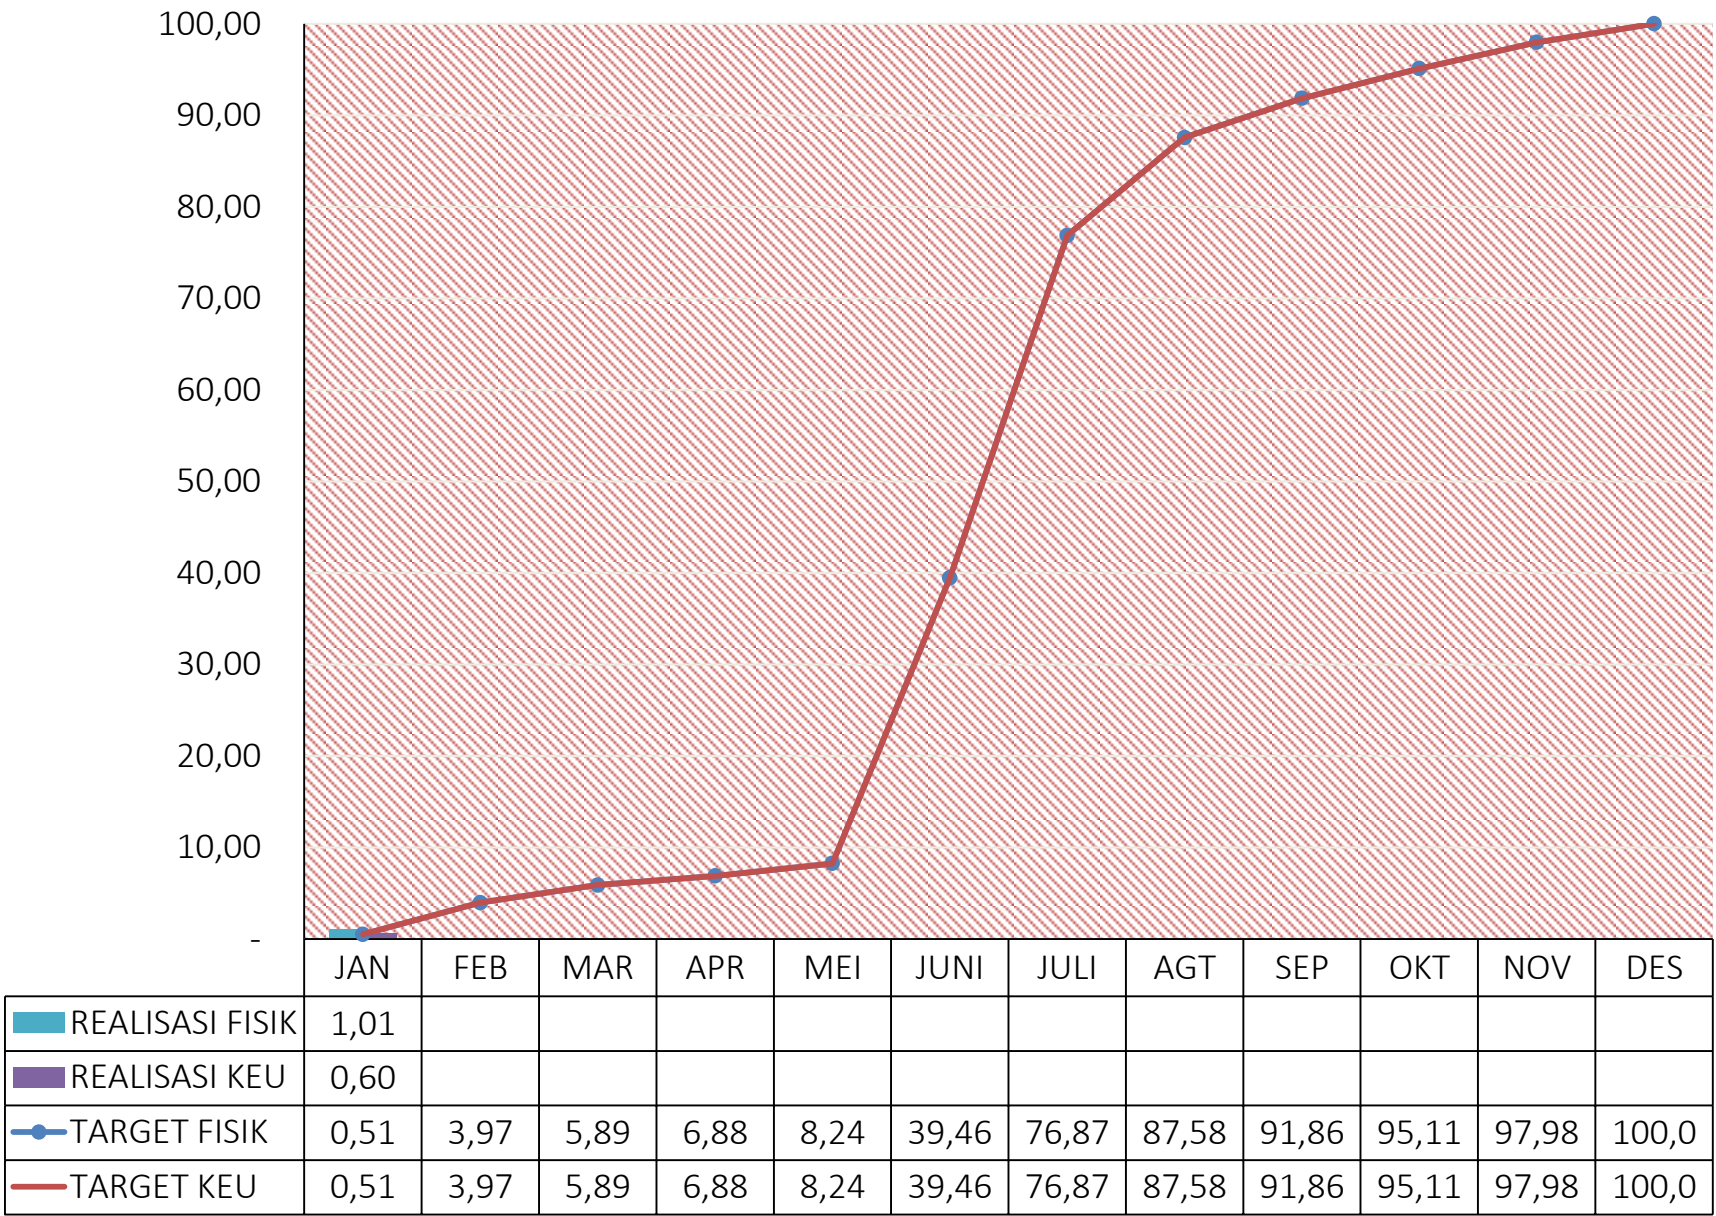


|             | Jan  | Feb  |
|-------------|------|------|
| Renc. Fisik | 0,51 | 3,97 |
| Real. Fisik | 1,01 |      |
| Dev. Fisik  | 0,50 |      |
| Renc. Keu   | 0,51 | 3,97 |
| Real. Keu   | 0,60 |      |
| Dev. Keu    | 0,09 |      |

# KAWASAN PERMUKIMAN

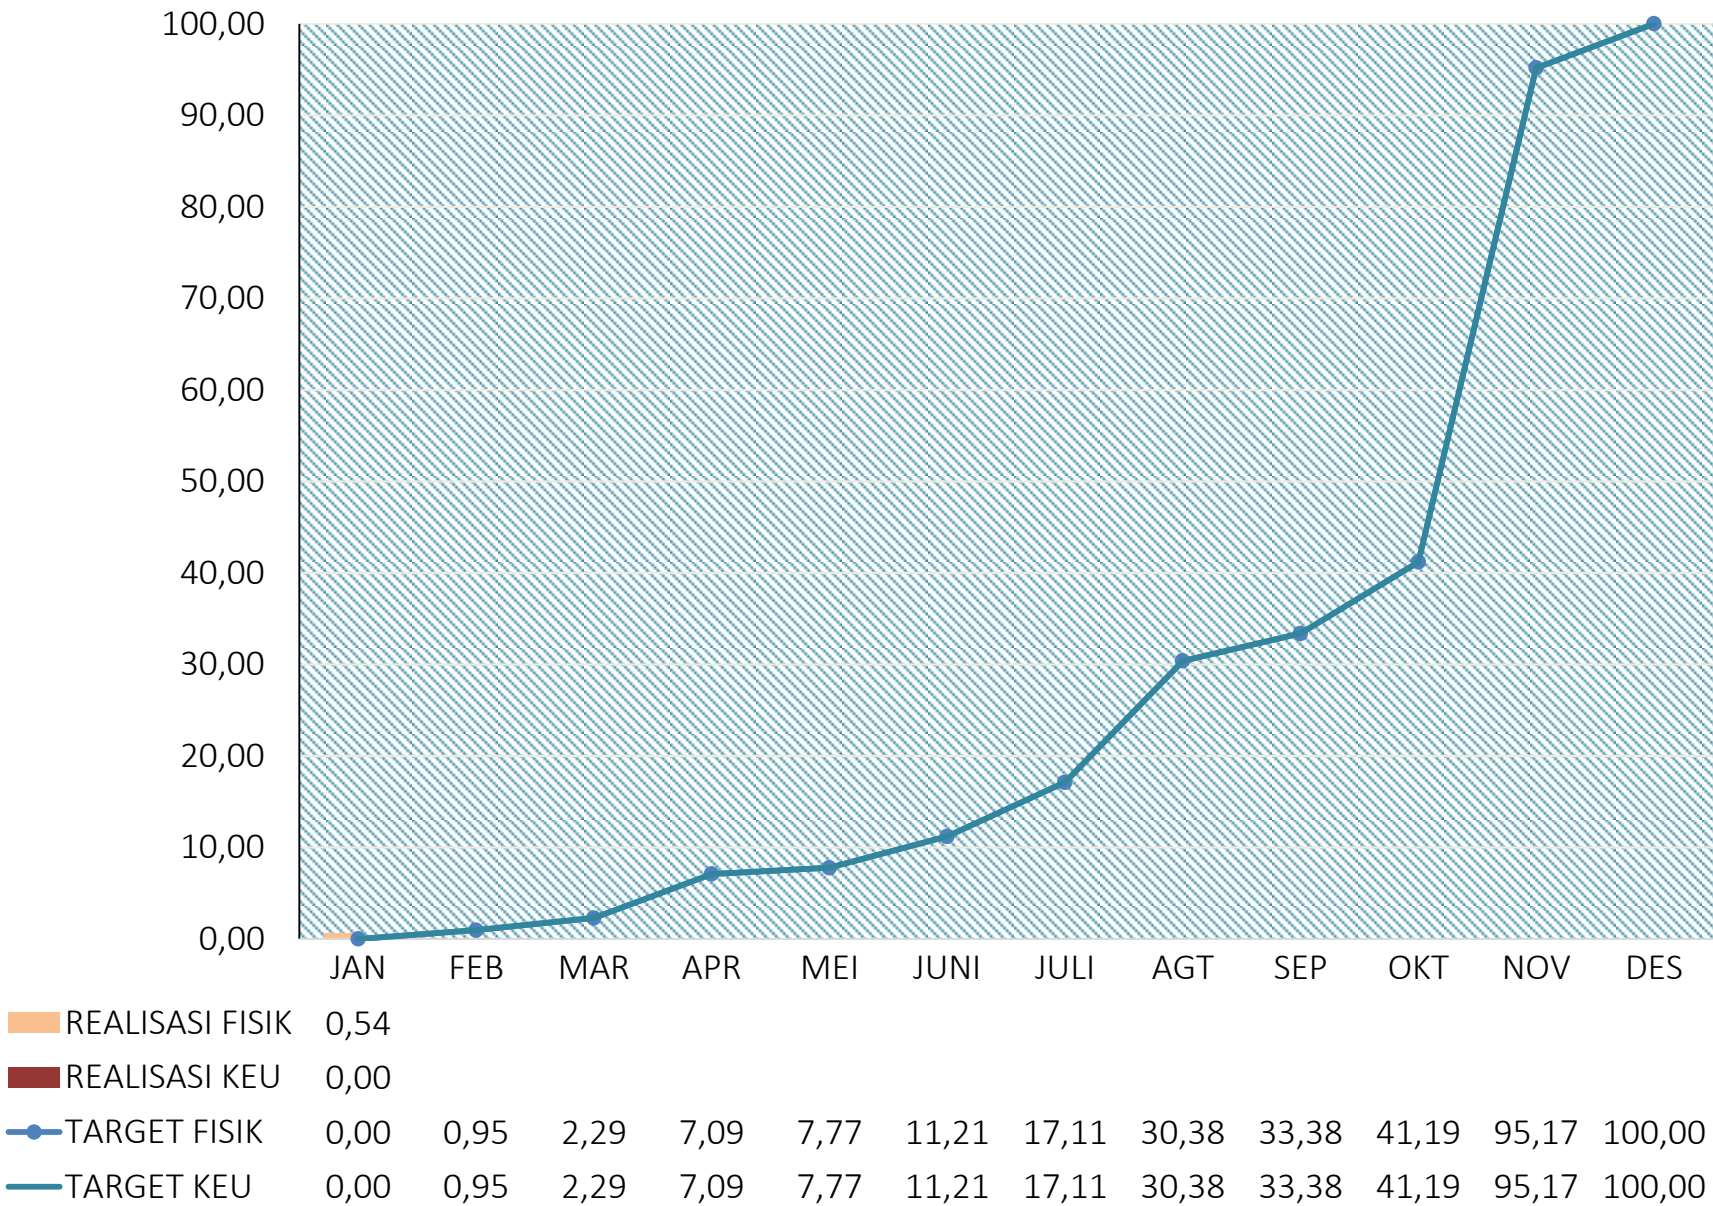


|             | Jan    | Feb  |
|-------------|--------|------|
| Renc. Fisik | 0,00   | 0,95 |
| Real. Fisik | 0,54   |      |
| Dev. Fisik  | 0,54   |      |
| Renc. Keu   | 0,00   | 0,95 |
| Real. Keu   | 0,00   |      |
| Dev. Keu    | (0.00) |      |

# KETERPADUAN PKPP

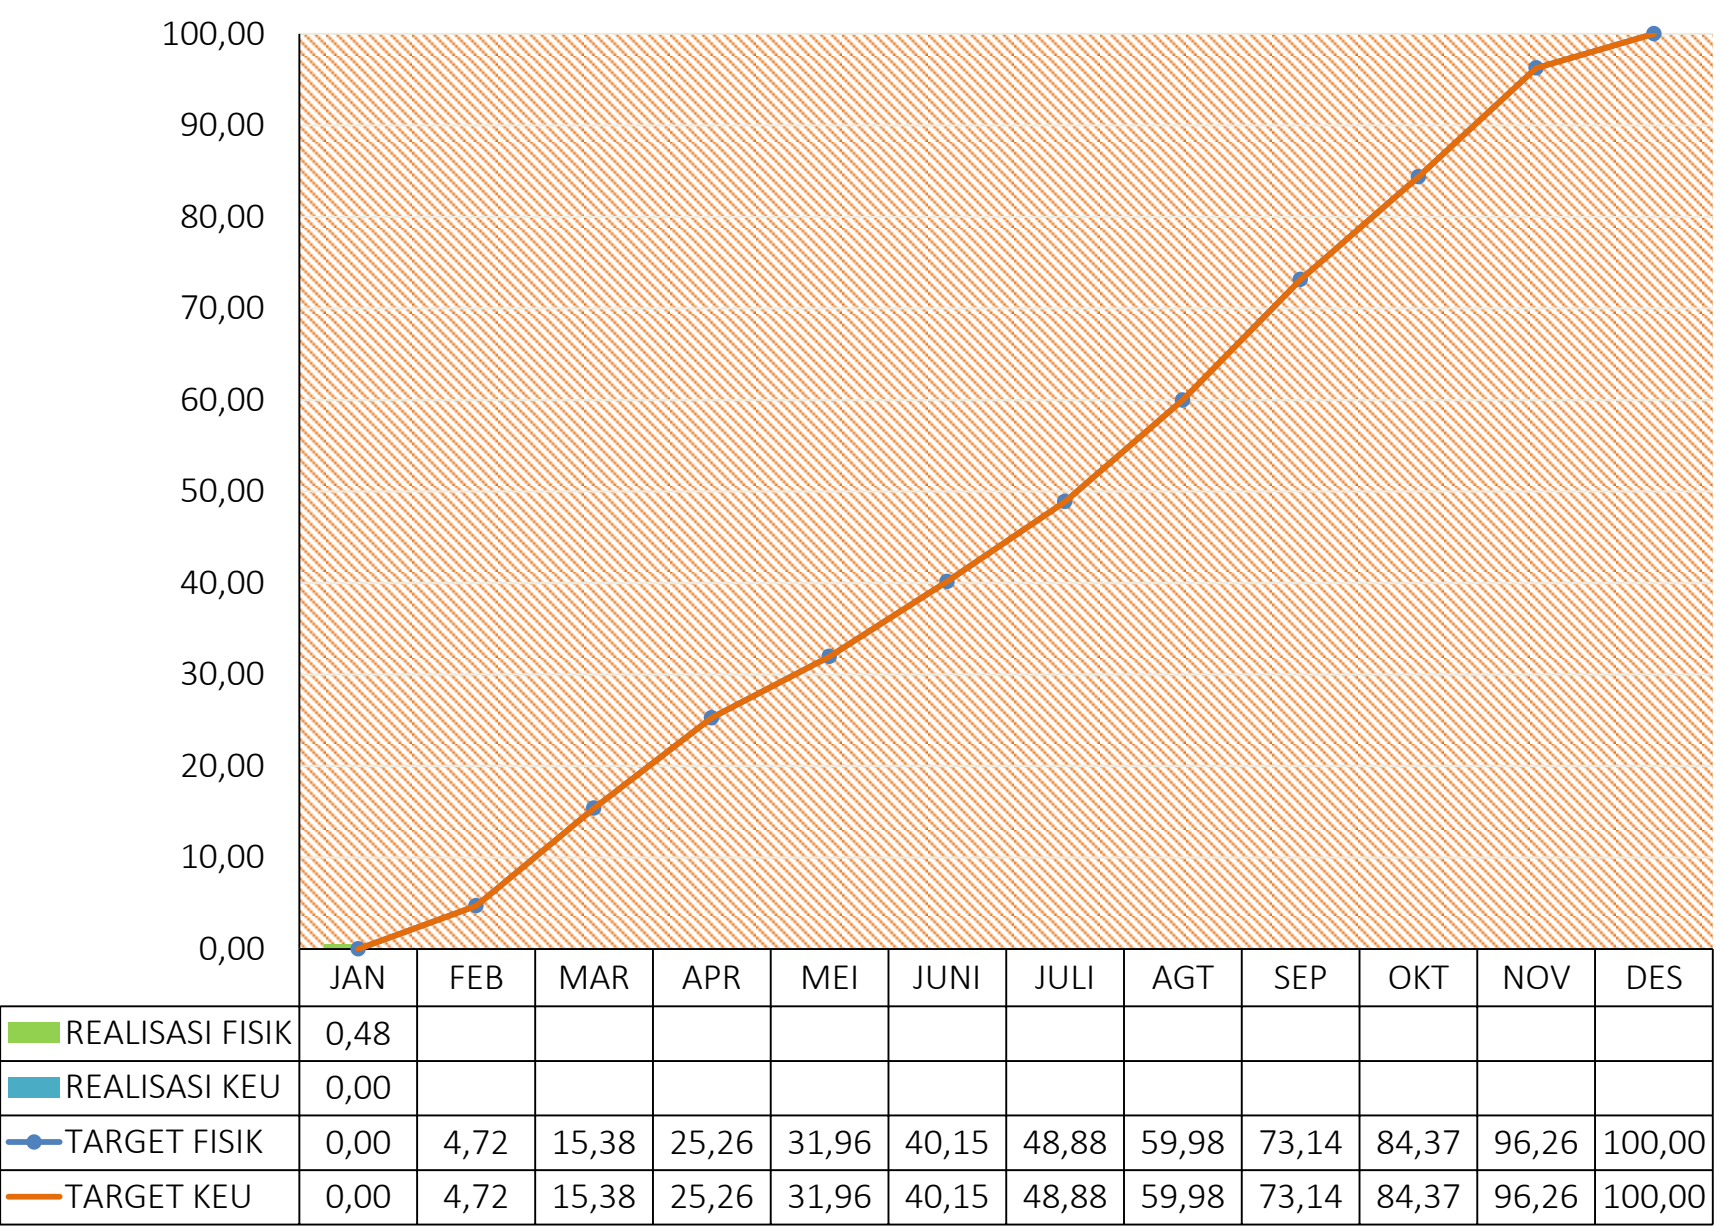

|             | Jan  | Feb  |
|-------------|------|------|
| Renc. Fisik | 0,00 | 4,72 |
| Real. Fisik | 0,48 |      |
| Dev. Fisik  | 0,48 |      |
| Renc. Keu   | 0,00 | 4,72 |
| Real. Keu   | 0,00 |      |
| Dev. Keu    | 0,00 |      |

# PERTANAHAN

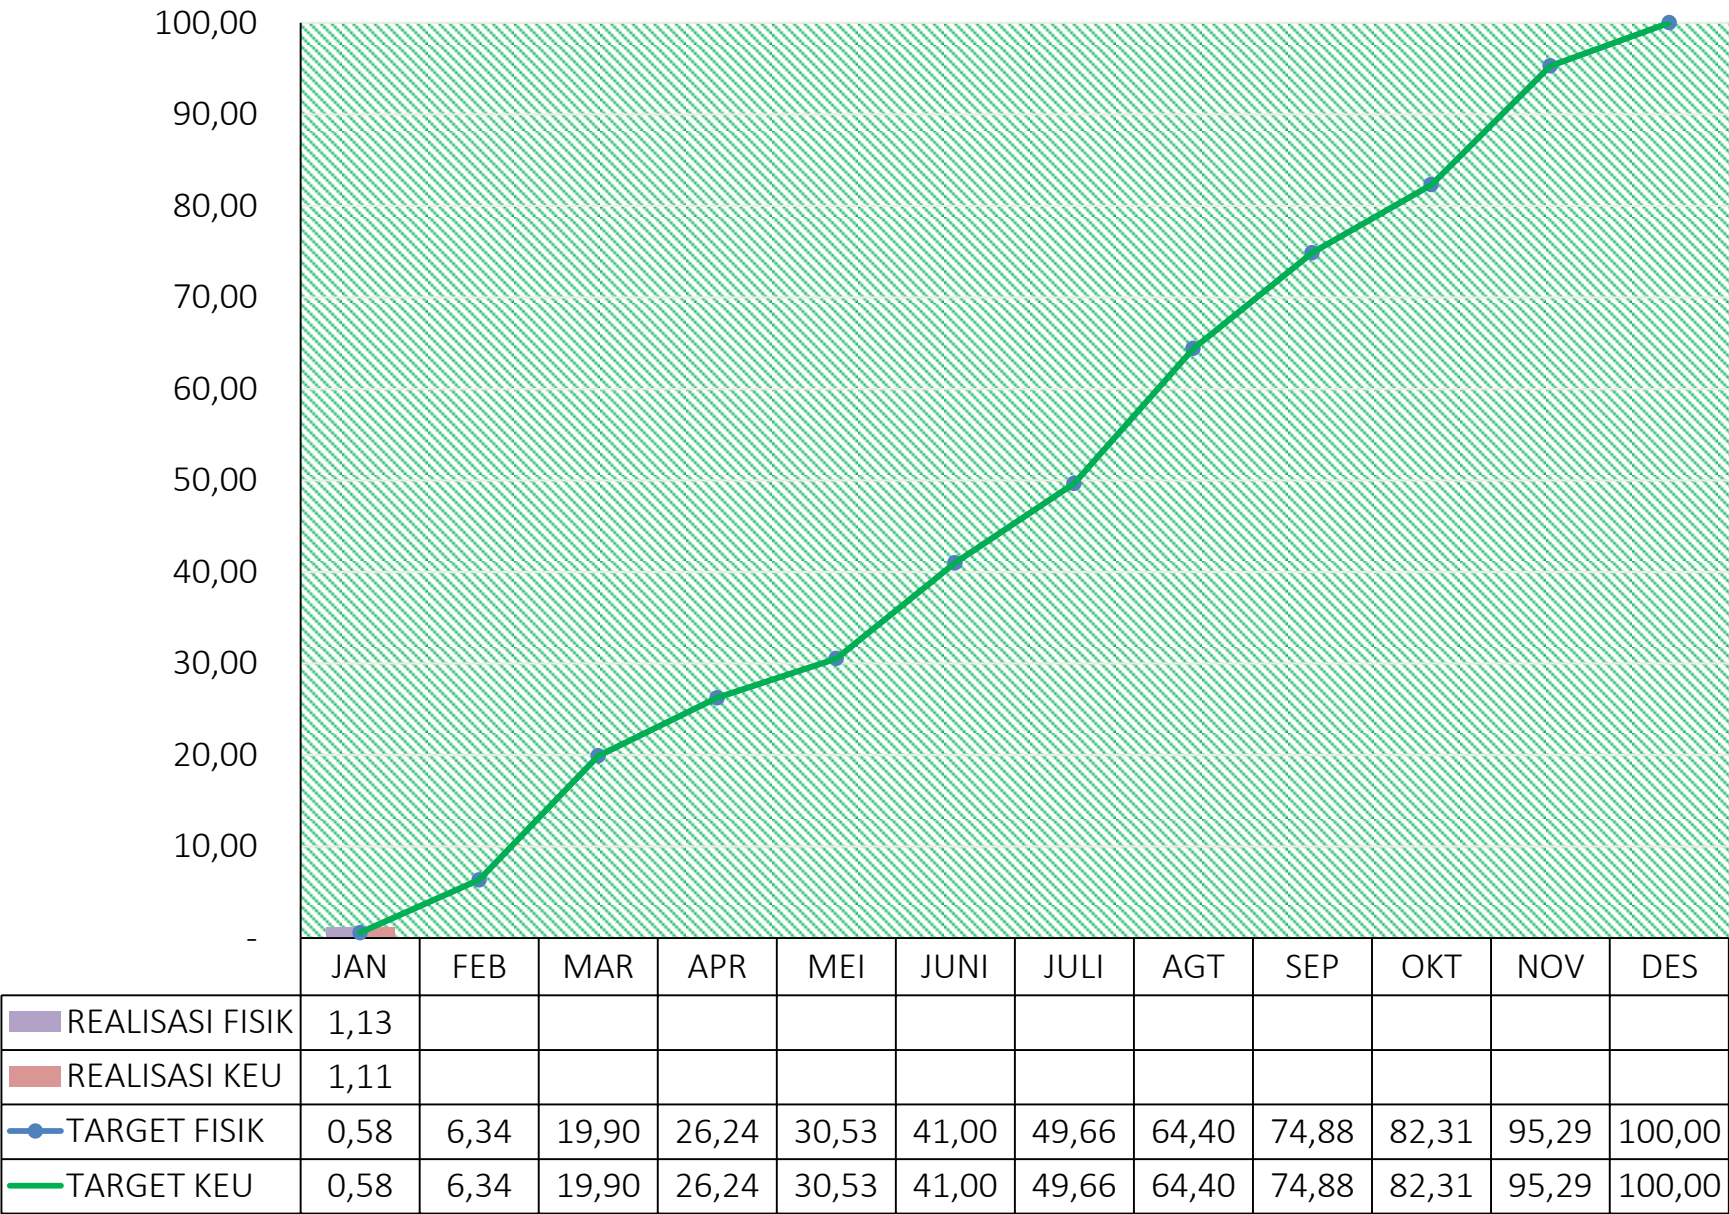

|             | Jan  | Feb  |
|-------------|------|------|
| Renc. Fisik | 0,58 | 6,34 |
| Real. Fisik | 1,13 |      |
| Dev. Fisik  | 0,55 |      |
| Renc. Keu   | 0,58 | 6,34 |
| Real. Keu   | 1,11 |      |
| Dev. Keu    | 0,53 |      |



# **PENJELASAN KEGIATAN DENGAN DEVIASI NEGATIF**

STATUS AKHIR JANUARI 2020

# SEKRETARIAT

| NO | KEGIATAN                                                                                                                   | DEVIASI |       | KETERANGAN                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                            | FISIK   | KEU   |                                                                                                 |
| 1  | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | -       | -0,60 | Kegiatan Masih Dilaksanakan Akhir Bulan Februari                                                |
| 2  | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat                                                             | -       | -3,61 | Menyesuaikan kebutuhan                                                                          |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah                                                      | -       | -8,33 | Menyesuaikan tagihan                                                                            |
| 4  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah                                             | -       | -5,50 | Proses SPJ                                                                                      |
| 5  | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah                                            | -       | -3,27 | Menyesuaikan dengan adanya undangan                                                             |
| 6  | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah                                                           | -       | -2,29 | Menyesuaikan dengan acara/kegiatan                                                              |
| 7  | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah                                                                              | -       | -0,11 | Menyesuaikan event                                                                              |
| 8  | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah                                                        | -       | -3,35 | Menyesuaikan kebutuhan                                                                          |
| 9  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | -       | -2,45 | Proses finalisasi HPS dan Dokumen                                                               |
| 10 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah                                       | -       | -1,73 | Menyesuaikan kondisi                                                                            |
| 11 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | -       | -0,08 | Ralisasi keuangan 4,48%, namun dalam aplikasi e-penatausahaan belum tersambung ke e-controlling |



# BIDANG PERUMAHAN

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                 | DEVIASI |       | KETERANGAN                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          | FISIK   | KEU   |                                                  |
| 1  | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya                                                                                            | -       | -0,61 | termin pembayaran ditagihkan pada bulan Februari |
| 2  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | -       | -0,60 | termin pembayaran ditagihkan pada bulan Februari |

# BIDANG PERTANAHAN

| NO | KEGIATAN                           | DEVIASI |       | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|---------|-------|------------|
|    |                                    | FISIK   | KEU   |            |
| 1  | Penanganan Permasalahan Pertanahan | -       | -0,07 |            |

# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Januari 2020

| NO.              | KEGIATAN                                                                       | NAMA PAKET                                                    | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE | PROGRES LELANG                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------|
| SEKRETARIAT      |                                                                                |                                                               |                     |        |                                                    |
| 1                | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Pengadaan Tenaga Outsourcing Keamanan (10 bulan)              | 420.000.000         | Tender | Rencana dokumen masuk ke ULP pertengahan Februari  |
| 2                | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah                                  | Kegiatan Rehab Gedung Kantor                                  | 405.000.000         | Tender | Proses finalisasi HPS dan dokumen                  |
| BIDANG PERUMAHAN |                                                                                |                                                               |                     |        |                                                    |
| 3                | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan                                    | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Grobogan | 525.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 4                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Rembang  | 840.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 5                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Demak    | 735.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 6                |                                                                                | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Jepara   | 560.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |

# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Januari 2020

| NO. | KEGIATAN | NAMA PAKET                                                        | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE | PROGRES LELANG                                     |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 7   |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Pati                   | 490.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 8   |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Brebes       | 840.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 9   |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Pemalang     | 840.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 10  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Banjarnegara | 455.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 11  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Wonosobo     | 385.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 12  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Temanggung   | 455.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 13  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Kebumen      | 770.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 14  |          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di kabupaten Klaten       | 420.000.000         | Tender | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |

# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Januari 2020

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                 | NAMA PAKET                                                                                                                                                   | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES<br>LELANG                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 16  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Sragen                                                                                                  | 385.000.000         | Tender  | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 17  |                                                                                                                                          | Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru di Kabupaten Purworejo                                                                                               | 840.000.000         | Tender  | Proses Upload Dokumen Penawadan ke App Silalapbaja |
| 18  |                                                                                                                                          | Verifikasi dan Validasi Pembangunan Baru                                                                                                                     | 200.000.000         | Seleksi |                                                    |
| 19  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | Paket Pengadaan Bahan Bangunan/Material Pembangunan baru rumah terdampak bencana beserta PSU nya di Kabupaten Purworejo                                      | 550.000.000         | Tender  |                                                    |
| 20  |                                                                                                                                          | Identifikasi Lahan Lokasi Rusunawa dalam mendukung Kawasan Industri Kab. Kendal, Kawasan Industri Kab. Brebes, dan Kawasan Strategis Borobudur Kab. Magelang | 170.000.000         | Seleksi |                                                    |
| 21  |                                                                                                                                          | Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Tengah                                                                                 | 200.000.000         | Seleksi |                                                    |

# REKAP TENDER/SELEKSI

status akhir Januari 2020



| NO.                       | KEGIATAN                                                                     | NAMA PAKET                           | NILAI PAKET<br>(Rp) | METODE  | PROGRES<br>LELANG |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                              |                                      |                     |         |                   |
| 22                        | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman -<br>Bidang Kawasan Pemukiman | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 1.000.000.000       | Tender  | Persiapan Lelang  |
| 23                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 750.000.000         | Tender  | Persiapan Lelang  |
| 24                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 500.000.000         | Tender  | Persiapan Lelang  |
| 25                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  | Persiapan Lelang  |
| 26                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  | Persiapan Lelang  |
| 27                        |                                                                              | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi  | 300.000.000         | Tender  | Persiapan Lelang  |
| 28                        |                                                                              | Belanja Jasa Konsultansi DED Habitat | 160.000.000         | Seleksi | Persiapan Lelang  |
| 29                        | Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman                              | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 550.000.000         | Seleksi | Persiapan Lelang  |

[illegible]




# PENEKANAN APBD

1. **Agendakan roadshow ke Jakarta / pemerintah Pusat Kadis bersama Pejabat Eselon III.**
2. Masing-masing bidang menyiapkan **RKO Manual (Fisik dan Keuangan)**, bukan RKO yg diinput pada **EPP**.
3. Bahan tersebut akan dirangkum untuk **menjadi bahan paparan “politik perumahan” bersama Gubernur** (dalam waktu dekat).
4. **Terkait Usulan TA. 2021**, hal-hal yang perlu diperhatikan, **Usulan Program dan Kegiatan mengacu pada:**
  - RPJMN, RPJMD
  - Perpres 79 th 2019
  - mendukung SPM
  - Visi Misi Gubernur dan Program Unggulan terutama dalam rangka penanggulangan Kemiskinan
  - Program-program kegiatan di Pusat Pertumbuhan
  - intervensi terhadap kabupaten merah dan desa merah
5. Mohon kepada **Abdul hafidz Bayu Aji, ST, MT** dan **Andi Setiawan, ST** untuk segera **mengumpulkan format isian LHKPN ke Subbag umpeg** sebagai bahan isian Daftar Informasi Publik 2020
6. Sesuai dengan peraturan LKPP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan, **metode akomodasi hotel, tiket transportasi, yang semula pengadaan langsung diubah menjadi dikecualikan.**

# PENEKANAN APBD

7. Apabila dalam **penyusunan pemaketan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen DPA** (terjadi penggabungan/pemecahan paket), agar **bidang melaporkan secara rinci dan tertulis kepada Kepala Dinas**.
8. Dimohon para Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kegiatan di masing-masing bidang, jika mengajukan TU nihil jangan di tanggal akhir bulan (2 hari sebelum hari terakhir). Karena SP2D biasanya terbit di awal bulan berikutnya, yang mengakibatkan realisasi keuangan bidang di e-penatausahaan tidak sesuai dengan yang muncul di e-controlling (POK).
9. Rencana FGD pemantapan Penyelenggaraan SPIP Disperakim 2020 akan dilaksanakan pada hari Jumat-Sabtu, 6-7 Maret 2020 di Hotel Surya Yudha Banjarnegara, akan diadakan rafting bersama di sungai serayu. Berangkat bersama menggunakan bis. Dimohon kehadiran tim satgas SPIP beserta tim pendukung.
10. Mulai tahun ini verifikasi LPJ khusus GU dilakukan oleh PPK dan Bidang akuntansi, angka realisasi keuangan keluar di econrolling setelah verifikasi akuntansi ( mengimplementasi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Kabid Akuntansi di pelatihan di cetos) bagi skpd yg tidak mengirimkan laporan akan ditunda GU berikutnya.


A solid red vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom of the text area.

# **LAPORAN PELAKSANAAN PENANGANAN DESA DAMPINGAN**

# PROGRES PENANGANAN DESA DAMPINGAN

| NO.              | KEGIATAN | PROGRES S.D. BULAN JANUARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RENCANA KEGIATAN BULAN FEBRUARI                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POKJA PERTANAHAN |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |
| 1.               | PTSL     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Persiapan acara penyuluhan PTSL dan Koordinasi Dengan DPUTARU Kabupaten Demak terkait pendampingan PTSL di Desa Binaan (6 Januari)</li> <li>Rembug Desa Binaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (9 Januari)</li> <li>Penyuluhan PTSL bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (27 Januari)</li> <li>Pelantikan Panitia Sertifikasi PTSL di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (29 Januari)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Panitia PTSL di Desa Binaan, Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak</li> <li>Rapat koordinasi rencana pemasangan patok / tanda batas</li> </ul> |

# TAHAPAN YANG SUDAH DILAKUKAN



## #1 PERSIAPAN

- Tinjauan Lapangan ke Desa Sumberejo
- Verifikasi dan validasi data ke Desa Sumberejo
- FGD Identifikasi Kebutuhan Penanganan dan Pengembangan Desa Sumberejo



## #2 PERENCANAAN

- Sinkronisasi Kegiatan Penanganan
  - OPD Prov. Jateng
  - CSR
  - OPD Kab. Demak
- Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Kemiskinan di Desa Sumberejo
- Rembug Desa
- Finalisasi Rencana Aksi Masyarakat



## #3 IMPLEMENTASI RENCANA AKSI

ON PROGRESS

## #4 EVALUASI DAN REVIEW

ON PROGRESS

# EVALUASI PENANGGARAN DESA BINAAN

(Sesuai 9 Indikator Karakteristik Masyarakat dengan tingkat Kesejahteraan Rendah)

| NO.              | PERMASALAHAN                                              | KEGIATAN YANG DILAKUKAN/BENTUK PENANGANAN                            | TAHAPAN/MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN | OPD/INSTANSI TERKAIT           | BENTUK BANTUAN                        | POKJA | BASELINE AWAL | HASIL VERTAL LAPANGAN | YANG PERLU DITANGANI | SATUAN | TARGET PENANGANAN |      |      |      |        | SISA baseline |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|----------------------|--------|-------------------|------|------|------|--------|---------------|
|                  |                                                           |                                                                      |                                        |                                |                                       |       |               |                       |                      |        | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   |               |
| Jumlah KK Miskin |                                                           |                                                                      |                                        |                                |                                       |       | 624           |                       |                      |        |                   |      |      |      |        |               |
| 1                | Tidak Masuk dalam Kepesertaan Program-Program Pemerintah  | KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)                                       | Koordinasi dg Instansi Terkait         | DINSOS KAB DEMAK               | PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN KKS         |       | 245           | 245                   | 245                  | KK     |                   |      |      |      |        | 245           |
|                  |                                                           | KIP (Kartu Indonesia Pintar)                                         |                                        | DIKNAS DAN DEPAG KAB DEMAK     | PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN KIP         |       | 595           | 595                   | 595                  |        |                   |      |      |      |        | 595           |
|                  |                                                           | KIS (Kartu Indonesia Sehat)                                          |                                        | DINSOS KAB DEMAK               | PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN KIS         |       | 92            | 90                    | 90                   |        |                   |      |      |      |        | 90            |
|                  |                                                           | PKH (Program Keluarga Harapan)                                       |                                        |                                | PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN PKH         |       | 542           | 542                   | 542                  |        | 257               |      |      |      |        | 257           |
|                  |                                                           | Rastra / BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)                             |                                        |                                | PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN RASTRA/BPNT |       | 51            | 50                    | 50                   |        |                   |      |      |      |        | 50            |
| 2                | Anggota Keluarga Yang Tidak Memiliki Kartu Identitas      | KTP                                                                  | Koordinasi dg Instansi Terkait         | DISPERMADESDUKC APIL PROVINSI  |                                       |       | 13            | 13                    | 13                   |        |                   |      |      |      |        | 13            |
|                  |                                                           | Akte Kelahiran                                                       |                                        | DISPERMADESDUKC APIL KAB DEMAK |                                       |       |               |                       |                      |        |                   |      |      |      |        |               |
|                  |                                                           | Kartu Pelajar                                                        |                                        |                                |                                       |       |               |                       |                      |        |                   |      |      |      |        |               |
| 3                | Anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah (7-18 tahun) | Program BOS                                                          | Koordinasi dg Instansi Terkait         | TIDAK SEKOLAH                  |                                       |       | 17            | 1                     | 1                    |        |                   |      |      |      |        | 1             |
|                  |                                                           |                                                                      |                                        | LULUS SD/MI                    |                                       |       | 2.577         | 2.577                 | 2.577                |        |                   |      |      |      | 2.577  |               |
|                  |                                                           |                                                                      |                                        | LULUS SLTP                     |                                       |       | 1.469         | 14.699                | 14.699               |        |                   |      |      |      | 14.699 |               |
| 4                | Anggota Rumah Tangga yang disabilitas                     | Rehabilitasi dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penyandang Disabilitas | Koordinasi dg Instansi Terkait         | DINSOS KAB DEMAK               | Pemberdayaan Masyarakat               |       | 6             | 6                     | 6                    |        |                   |      |      |      |        | 6             |





**STATUS: 13 JANUARI 2020**

| NO. | PERMASALAHAN                                                                                                 | KEGIATAN YANG DILAKUKAN/BENTUK PENANGANAN              | TAHAPAN/MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN | OPD/INSTANSI TERKAIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BENTUK BANTUAN                              | POKJA                                                | YANG PERLU DITANGANI        | SATUAN | TARGET PENANGANAN |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                              |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                      |                             |        | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1   | Sedimentasi di Bendung D.I Dolok (Bendung Barang) mengakibatkan di dalam bendungan tidak ada air             | usulan pengerukan sedimentasi dan normalisasi bendung  | Koordinasi dg Instansi Terkait         | BBWS Pemali Juana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akan dilaksanakan di tahun 2020             | PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, DAN INFRASTRUKTUR DESA |                             |        |                   |      |      |      |      |
| 2   | Kerusakan dan sedimentasi di beberapa titik saluran sekunder                                                 | usulan penanganan Saluran sekunder barang – kedawung   | Koordinasi dg Instansi Terkait         | Dinas PUSDATARU Prov. Jateng (BBWS Bodri Kuto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ditangani melalui Swakelola pada tahun 2019 | PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, DAN INFRASTRUKTUR DESA |                             |        |                   |      |      |      |      |
| 3   | Masih banyak tanah di Desa Sumberejo yang belum mempunyai bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah | Pengajuan Permohonan PTSL Tahun 2020 Untuk Desa Binaan |                                        | a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak<br>b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Demak<br>c. Kantor Pertanahan Kab. Demak.<br>d. Camat Mranggen<br>e. Kepala Desa Sumberejo.<br>f. Carik Desa Sumberejo<br>g. Danramil Mranggen<br>h. BPD Desa Sumberejo Kec. Mranggen<br>i. Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Demak.<br>j. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. | Fasilitasi sertifikasi                      | PERTANAHAN                                           | 4210 bidang<br>7 bidang TKD | Bidang | 4217              |      |      |      |      |




| NO. | PERMASALAHAN                                                                                                                        | KEGIATAN YANG DILAKUKAN/BENTUK PENANGANAN                   | TAHAPAN/MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN | OPD/INSTANSI TERKAIT                                      | BENTUK BANTUAN                                                                                                                                                                             | POKJA                  | YANG PERLU DITANGANI | SATUAN | TARGET PENANGANAN |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                     |                                                             |                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                            |                        |                      |        | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4   | Perlunya pemberdayaan masyarakat Sumberejo                                                                                          | Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat                        | Koordinasi dg Instansi Terkait         | a. Himperra<br>b. KKN UIN<br>c. KKN Undip<br>d. KKN Unnes | Program KKN Pemberdayan Masyarakat                                                                                                                                                         | KEMITRAAN              |                      |        |                   |      |      |      |      |
| 5   | Profil Desa yang belum lengkap, kurang tersosialisasikannya penginputan SID, belum terintegrasinya RPJM Desa dengan RPJM di atasnya |                                                             |                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                            |                        |                      |        |                   |      |      |      |      |
| 6   | Harga hasil pertanian setiap panen tidak stabil, serta sistem irigasi yang belum tertata dan kering saat musim kemarau              | 1 Dusun 1 Kebun Binaan: Sejuta Cantik dalam Sejuta Hamparan | 1. Permohonan bantuan bibit            | Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng                       | a. Pengusulan bantuan hibah barang masuk paling lambat bulan maret 2020 ke Distanbun (pelaksanaan 2021)<br>b. Tahun 2019 ada Pokmas Sumber Rejeki yang mengajukan bantuan tsb ke Distanbun | KEMITRAAN              |                      |        |                   |      |      |      |      |
| 7   |                                                                                                                                     | Pemberian Bantuan Sapi Bunting                              | Pemberian Bantuan Sapi Bunting         | Dinpertan Pangan Kab. Demak                               |                                                                                                                                                                                            | PENGENTASAN KEMISKINAN |                      | Ekor   | 10                |      |      |      |      |

|     |                                                                                      |                                           |                                        |                              |                                                                                                               |                                                      |                      |        | TARGET PENANGANAN |        |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|------|------|------|
| NO. | PERMASALAHAN                                                                         | KEGIATAN YANG DILAKUKAN/BENTUK PENANGANAN | TAHAPAN/MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN | OPD/INSTANSI TERKAIT         | BENTUK BANTUAN                                                                                                | POKJA                                                | YANG PERLU DITANGANI | SATUAN | 2019              | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8   | Kerusakan di beberapa ruas jalan lingkungan                                          | Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan     | Penanganan melalui kegiatan            | Dinas PU dan Taru            |                                                                                                               | PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, DAN INFRASTRUKTUR DESA |                      |        |                   |        |      |      |      |
|     |                                                                                      |                                           |                                        | Desa Sumberejo               | Pembangunan talud kanan kiri jalan menuju makam sudah ditangani melalui dana ADD TA. 2019 dan APBD Kab. Demak |                                                      |                      |        |                   |        |      |      |      |
|     |                                                                                      |                                           |                                        | Disperakim Demak             | Perkerasan Jalan Makam Puro ditangani melalui perubahan APBD TA. 2019 , dengan panjang jalan 200 m            |                                                      |                      |        |                   |        |      |      |      |
|     |                                                                                      |                                           |                                        | Dinpertan pangan             | Perkerasan Jalan Usaha Tani                                                                                   |                                                      |                      |        |                   |        |      |      |      |
| 9   | Permasalahan Banjir yang diakibatkan oleh bottle neck sungai serta luapan air sungai | Normalisasi Sungai rendeng                | Penanganan melalui kegiatan            | Dinas PU Taru Kab. Demak     | Normalisasi Sungai rendeng                                                                                    | PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, DAN INFRASTRUKTUR DESA |                      |        |                   |        |      |      |      |
| 10  | UMKM terkendala masalah packaging, pemasaran, keterampilan, dan modal usaha          | Bantuan KUBE                              | Koordinasi dg Instansi Terkait         | BANK JATENG                  | Bantuan dana                                                                                                  |                                                      |                      | Rp     |                   | 100 jt |      |      |      |
|     |                                                                                      |                                           |                                        | Dinas Sosial P2PA Kab. Demak | KUBE oleh Kemensos @ Rp 2.000.000 untuk 10 Kelompok                                                           |                                                      |                      | Rp     |                   | 25 jt  |      |      |      |

**APBN**





**BELUM TERDAPAT SERAPAN ANGGARAN  
MAUPUN FISIK DI APBN**

A solid red square is positioned on the left side of the image. To its right are two thin, parallel white vertical lines that extend from the top to the bottom of the frame.

**TERIMA KASIH**
